INFORME DE OBRA No 5

CONTRATO DE OBRA No. 015 DE 2024:

OBJETO: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA - SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

PERIODO DE SEGUIMIENTO: 1/06/2025 AL 30/06/2025

FECHA DEL INFORME: 30/06/2025

CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
CONSORCIO VG

JUNIO DE 2025

Dirección: CARRERA 7 No. 4-34
Correo Electrónico: claudiomejiag@gmail.com
Neiva – Huila

TABLA DE CONTENIDO

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 4

2. ASPECTO TÉCNICO. 6

2.1. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 6
2.2. CONTROL DE PROGRAMACION DE OBRA 7

3. RESUMEN DEL ESTADO DEL TIEMPO 13

4. ASPECTO ADMINISTRATIVO. 15

4.1. INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL. 15

5. SEGURIDAD SOCIAL 16

6. MEMORIA DIARIA O BITACORA 16

7. REGISTRO FOTOGRAFICO 16

8. ASPECTO JURÍDICO 17
8.1. ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA 17
8.2. ESTADO DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA 18

9. ENSAYOS DE LABORATORIO 22

10. ESTUDIOS Y DISEÑOS 22

11. COMITES DE OBRA 23

12. CORRESPONDENCIA 24

13. CALIBRACION DE EQUIPOS 24

14. CARTERAS TOPOGRAFICAS 24

15. CONCLUSIONES 25

Dirección: CARRERA 7 No. 4-34
Correo Electrónico: claudiomejiag@gmail.com
Neiva – Huila

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Municipios a intervenir: 5
Tabla 2. Valor inicial del contrato de obra 5
Tabla 3 Control de programación y avance de obra. 8
Tabla 4. Control de inversión ejecutado 14
Tabla 5. Tabla pluviométrica 17
Tabla 6. Gráfica de precipitación 22
Tabla 7. Maquinaria mínima requerida 27
Tabla 8. Personal Técnico requerido 27
Tabla 9. Condiciones contrato de obra. 29

ANEXOS

Anexo 1 Registro Fotográfico
Anexo 2 Programación
Anexo 3 Bitacora de Obra
Anexo 4 Comités de Obra
Anexo 5 Control Personal Obra
Anexo 6 Informe SST
Anexo 7 Correspondencia
Anexo 8 Calibración de equipos
Anexo 9 Laboratorios
Anexo 10 Cartera topográfica

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto a ejecutar se encuentra en el norte del Departamento del Huila partiendo de la ciudad de Neiva por la vía departamental cuyo código es 45 A01, en una longitud de 9.2km aproximadamente desde el inicio del primer tramo hasta el final del último tramo, el cual se encuentra el municipio de Tello, Departamento del Huila.

Esta vía actualmente cuenta con pavimento flexible, el cual presenta deterioro en su estructura, identificando veinticinco (25) tramos críticos para ser intervenidos y cuya rehabilitación es el objeto del presente contrato. Maokiller9008



Via Fortalecillas - Tello

El proyecto a desarrollar corresponde a la vía Fortalecillas- Tello, según la resolución 4611 de 2019 expedida por el Ministerio de Transporte y comprende la construcción de 5,33 km de pavimento flexible distribuidos en 25 tramos, donde se incluye el fresado de pavimento asfáltico, conformación de calzada, construcción de estructura de pavimento en base y sub base granular, mezcla densa en caliente MDC-19, riego de imprimación, construcción de filtros, fundición cunetas, muros en gaviones y líneas de demarcación para la señalización horizontal.

De acuerdo al anexo técnico del contrato de obra 015 de 2024 los tramos están comprendidos en las siguientes coordenadas así:

TRAMO	MUNICIPIO	UBICACIÓN	LONGITUD POR TRAMO (mts)	VIA	COORDENADA INICIO	COORDENADA FINAL
1	TELLO	VEREDA CUCHARITO	21,78	VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN COD 45A01 NEIVA SAN ANTONIO	E: 8708117.813	E: 870834.389
					N: 829114.321	N: 829128.151
2		VEREDA CUCHARITO	193		E: 872465.259	E: 872626.413
					N: 830243.272	N: 830349.328
3		VEREDA CUCHARITO	91,52		E: 872911.689	E: 872994.247
					N: 830480.790	N: 830520.292
4		VEREDA CUCHARITO	74,7		E: 873014.910	E: 873080.364
					N: 830529.547	N: 830565.457
5		VEREDA CUCHARITO	78		E: 873288.448	E: 873355.103
					N: 830691.417	N: 830731.927
6		VEREDA CUCHARITO	66		E: 873549.081	E: 873600.478
					N: 830870.461	N: 830911.783
7		VEREDA CUCHARITO	30		E: 873783.309	E: 873809.183
					N: 830988.643	N: 831003.786
8		VEREDA CUCHARITO	130		E: 873874.551	E: 873983.477
					N: 831045.673	N: 831116.631
9		VEREDA CUCHARITO	121,64		E: 873993.756	E: 874095.676
					N: 831123.447	N: 831189.854
10		VEREDA CUCHARITO	24,98		E: 874104.910	E: 874125.811
					N: 831195.799	N: 831209.475
11		VEREDA CUCHARITO	107,12		E: 874180.040	E: 874269.915
					N: 831245.012	N: 831303.300
12		VEREDA CUCHARITO	56,02		E: 874374.500	E: 874421.628
					N: 831370.522	N: 831400.812
13		VEREDA CUCHARITO	48,71		E: 874438.217	E: 874479.108
					N: 831411.498	N: 831437.974
14		VEREDA CUCHARITO	103,65		E: 874486.186	E: 874572.812
					N: 831442.528	N: 831499.437
15		VEREDA CUCHARITO	94,37		E: 874811.921	E: 874904.457
					N: 831595.297	N: 831613.806
16		VEREDA CUCHARITO	88,32		E: 874964.772	E: 876488.492
					N: 831626.175	N: 831727.129
17		VEREDA CUCHARITO	725,07		E: 875879.397	E: 876488.492
					N: 831449.881	N: 831727.129
18		VEREDA CUCHARITO	200,04		E: 876532.198	E: 876731.150
					N: 831728.958	N: 831745.452
19		MESA DEL TRAPICHE	1361,97		E: 876759.269	E: 878067.835
					N: 831741.316	N: 831795.883
20		MESA DEL TRAPICHE	206,36		E: 878254.143	E: 878459.126
					N: 831866.245	N: 831890.036
21		MESA DEL TRAPICHE	66,98		E: 878489.106	E: 878545.532
					N: 831897.396	N: 831932.956
22		VEREDA CUCHARITO	52		E: 879068.291	E: 879120.280
					N: 831700.165	N: 831701.231
23		VEREDA CUCHARITO	126		E: 879212.267	E: 879338.252
					N: 831702.244	N: 831704.152
24		VEREDA CUCHARITO	826,99		E: 879437.818	E: 880235.376
					N: 831710.540	N: 831827.137
25		VEREDA CUCHARITO	446,63		E: 880338.945	E: 880756.615
					N: 831793.934	N: 831640.332
TOTAL			5341,85			

Tabla 1. Municipios a intervenir:

UBICACIÓN		
MUNICIPIO	**NOMBRE DE LA VIA**	**LONGITUD A INTERVENIR (KM)**
TELLO	Ruta Código 45 A01 NEIVA- SAN ANTONIO	5,33 km

Fuente: Autor

Valor Costo Inicial del Proyecto.

Tabla 2. Valor inicial del contrato de obra

MUNICIPIO	CATEGORIA	VALOR TOTAL
TELLO	Vía de primer Orden	$ 8.258.002.715,00
VALOR TOTAL		**$ 8.258.002.715,00**

Fuente: Autor

Valor adicional según ajuste No 1 del contrato de obra

TELLO	Vía de primer Orden
VALOR ADICIONAL	$3.370.776.617,36
VALOR TOTAL ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 11.628.779.332,36

Plazo Inicial = Cuatro (4) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
Plazo adicional = Tres y medio (3.5) meses.
Plazo total contrato de obra = 7.5 meses.

2. ASPECTO TÉCNICO.

2.1. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

En anexo se adjunta las descripciones de las actividades que se realizaron hasta la fecha. (**Anexos 3** Copia Libro De Bitácora).

2.2. CONTROL DE PROGRAMACION DE OBRA

Se presentan las actividades ejecutadas: Hasta la fecha ha transcurrido cuatro y medio (5) meses (17 de junio de 2024 fecha de inicio).

A continuación, se detalla la trazabilidad del proyecto, los inconvenientes y el estado de avance de estos:

El día 17/06/2025 se envió comunicado CO-15-24-27 a la interventoría el informe No 4 correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo de 2025 del contrato de obra 015 de 2024.

El día 24/06/2025 se envió comunicado CO-15-24-28 a la Interventoría el acta parcial 01 del contrato de obra 015 de 2024 para revisión y aprobación.

El día 24/06/2025 se envió comunicado CO-15-24-29 a la Supervisión el informe No 3 correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril de 2025 del contrato de obra 015 de 2024.

El día 24/06/2025 se envió comunicado CO-15-24-30 a la Supervisión el informe No 4 correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo de 2025 del contrato de obra 015 de 2024.

El día 25/06/2025 se envió comunicado CO-15-24-31 a la Supervisión remitiendo el acta parcial 01 del contrato de obra 015 de 2024.

Actividades de obra física.

Vía Fortalecillas- Tello.

Actividades ejecutadas durante el periodo. (**Anexo.1** Registro fotográfico)

- **Ítem 2,1.** Se ejecutó corte en conglomerado para la excavación de filtros en el tramo No 24 sobre la margen derecha para un total acumulado de 1813,56 m3 que suma un valor de $ 42.615.032,88, teniendo un avance ejecutado acumulado en esta actividad del 8,07%.

- **Ítem 3,2.** Se ejecutó instalación de base granular en el tramo No 17 con una cantidad de 1008 m3; en el tramo No 18 con una cantidad de 280 m3; en el tramo No 19 una cantidad parcial de 130,22 m3, para un total acumulado de 2872 m3 que suma un valor de $ 416.440.000,00 teniendo un avance ejecutado acumulado en esta actividad del 38,47%.

- **Ítem 3,3.** Se ejecutó en el tramo No 19 una cantidad parcial de 84,48 m3, para un total acumulado de 1056 m3 que suma un valor de $ 1.604.295.264,00 teniendo un avance ejecutado acumulado en esta actividad del 28,46%.

- **Ítem 3,4.** Se ejecutó instalación de sub-base granular en el tramo No 19 una cantidad de 12,43 m3, para un total acumulado de 3701,93 m3 que suma un valor de $ 407.212.300,00 teniendo un avance ejecutado acumulado en esta actividad del 49,59%.

- **Ítem 3,5.** Se ejecutó riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0 en el tramo en el tramo No 19 una cantidad parcial de 844,80 m2, para un total acumulado de 10560 m2 que suma un valor de $ 36.072.960 teniendo un avance ejecutado acumulado en esta actividad del 30,00%.

- **Ítem 4,2.** Se ejecutó la instalación de material filtrante en el tramo No 24 con una cantidad 24,53 m3, para un total acumulado de 306,60 m3 que suma un valor de $ 54.253.218,91 teniendo un avance ejecutado acumulado en esta actividad del 11,19%.

- **Ítem 4,3.** Se ejecutó la instalación geotextil no tejido en el tramo No 24 una cantidad 143,08 m2, para un total acumulado de 1788,50 m2 que suma un valor de $ 39.919.829,72 teniendo un avance ejecutado acumulado en esta actividad del 11,00%.

- **Ítem 4,4.** Se ejecutó la instalación de tubería perforada de 4" en el tramo No 24 una cantidad de 40,88 ml para un total acumulado de 511 ml que suma un valor de $ 19.375.139,88 teniendo un avance ejecutado acumulado en esta actividad del 11,19%.

- **Ítem 4,5.** Se está construyendo un muro en Gavión en la parte final del tramo No 17 sobre la margen izquierda con una cantidad de 11,66 m3, para un total acumulado de 145,80 m3 que suma un valor de $ 71.840.195,69 teniendo un avance ejecutado acumulado en esta actividad del 50,10%.

- **Ítem 4,7.** Se ejecutó la fundición de base en concreto de 21 Mpa en con un espesor de 20 cm para el muro en Gavión ubicado en la parte final del tramo No 17 sobre la margen izquierda con una cantidad de 2,16 m3, para un total acumulado de 27 m3 que suma un valor de $ 27.612.323,74 teniendo un avance ejecutado acumulado en esta actividad del 100,00%.

- **Ítem 6,1.** Se ejecutó el transporte de material proveniente del corte en conglomerado de las excavaciones de los filtros en el tramo No 24, total acumulado de 25640,65 m3-km que suma un valor de $ 38.460.981,51, teniendo un avance ejecutado acumulado en esta actividad del 14,68%.

Tabla 3 Control de programación y avance de obra de acuerdo a condiciones actualizadas dentro del contrato de obra.

ITEMS	FRENTE DE TRABAJO	UND	CANTIDAD ACTUALIZADA EN EL CONTRATO	% PROGRAMADO MES	% EJECUTADO MES	% PROGAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO DE LA ACTIVIDAD SEGÚN LO PROGRAMADO
1.1	Localización y replanteo	Km	5,33	14,29%	0,00%	71,43%	75,10%	105,14%
1.2	Fresado de Pavimento asfáltco	M2	35.195,49	17,39%	0,00%	82,61%	75,07%	90,87%
2.1	Corte en Conglomerado	M3	22.483,80	17,39%	0,14%	69,57%	8,07%	11,60%
3.1	Conformación de calzada	M2	37.328,55	16,67%	0,00%	66,67%	47,98%	71,97%
3.2	base granular	M3	7.465,71	16,67%	1,74%	58,33%	38,47%	65,95%
3.3	Mezcla Densa en caliente MDC-19	M3	3.710,24	22,73%	2,28%	46,97%	28,46%	60,59%
3.4	Sub-base granular	M3	7.465,71	18,18%	0,17%	63,64%	49,59%	77,92%
3.5	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0	M3	35.195,49	18,18%	2,40%	54,55%	30,00%	55,00%
4.1	Cuneta de Concreto Vaciada In Situ; no incluye la conformación de la superficie de apoyo	M3	1.599,80	22,22%	0,00%	44,44%	0,00%	0,00%
N.P 4.2	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE. ESP. 673-13 INV.	M3	2.739,68	25,00%	0,90%	50,00%	11,19%	22,38%
N.P 4.3	GEOTEXTIL NO TEJIDO 2500. ESP. 673-13 INV.	M2	16.260,99	25,00%	0,88%	50,00%	11,00%	22,00%
N.P 4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFORADA DE 4"	ML	4.566,14	25,00%	0,90%	50,00%	11,19%	22,38%
N.P 4.5	GAVION EN PIEDRA ZONGA Y MEDIA ZONGA, MALLA C-12, ESCUADRÌA 10CM X 8CM, VENA C-10. INCLUYE ATIRANTAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL. ESP. 681 INV.	M3	291,00	50,00%	4,01%	100,00%	50,10%	50,10%
N.P 4.6	CONCRETO PARA REVESTIMIENTO DE GAVIONES	M3	225,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
N.P 4.7	BASE PARA PISO DE GAVIONES EN CONCRETO DE 21Mpa ESPESOR 20CMS	M3	27,00	100,00%	8,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6.1	Transporte proveniente de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros	M3-KM	174.632,53	19,05%	0,12%	76,19%	14,68%	19,27%

Tabla 4. Control de inversión ejecutado y programado

OBRA		
DESCRIPCION	**PERIODO DEL INFORME No 5**	**ACUMULADO**
obra programada (%)	21,75%	52,37%
valor de la obra programada	$2.528.686.060,56	$6.090.143.869,00
obra ejecutada (%)	1,46%	25,38%
valor de la obra ejecutada	$169.572.345,30	$2.951.277.295,35



De acuerdo a la programación a la fecha de cierre del presente informe se tiene un porcentaje programado acumulado del 52,37% y un porcentaje ejecutado acumulado del 25,38%, presentando un atraso del 26,99 %.

Plan de inversión del Anticipo

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO	
CONTRATANTE	GOBERNACION DEL HUILA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
CONTRATO DE OBRA No.	15-2024
1. DESCRIPCIÓN DE OBRAS	
REHABILITACIÓN VÍAS	
OBRA:	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CODIGO 45A01 NEIVA - SAN ANTONIO RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
VALOR CONTRATO	$8.258.002.715
% ANTICIPO	30%
VALOR ANTICIPO	$2.477.400.815,00
VALOR ANTICIPO AJUSTADO AL PESO	$2.477.400.815,00
DEDUCCIONES POR CONCEPTO DE IMPUESTOS (5%).	$123.870.041,00
VALOR NETO GIRADO.	$2.353.530.774,00

ITEM	DESCRIPCION	U.M.	% OBRA	VALOR	VALOR NETO
1	ALQUILER DE MAQUINARIA	HORA	25,000%	$588.382.693,50	$588.382.693,50
2	SUMINISTRO MATERIALES GRANULARES	M3	22,000%	$517.776.770,28	$517.776.770,28
3	SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA	M3	30,000%	$706.059.232,20	$706.059.232,20
4	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA	GLB	14,000%	$329.494.308,36	$329.494.308,36
5	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS	GLB	9,000%	$211.817.769,66	$211.817.769,66
			100,000%		$2.353.530.774,00
				TOTAL ANTICIPO A DESEMBOLSAR	$2.353.530.774,00

SON	$2.353.530.774,00
VALOR EN LETRAS	DOS MIL TRECIENTOS CIENCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

CONTRATISTA:	INTERVENTORIA:
CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA RL. CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO Contratista	ING. VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ R.L. CONSORCIO VG Interventoria

Este plan de inversión del anticipo del valor inicial del contrato de obra se aprobó por parte de la interventoría y el ente contratante, en el que se realizaron las siguientes ordenes de operaciones de pago:

ORDENES DE OPERACIONES CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO					
NIT 901.785.282-7					
No Fiducia 19100003460					
No ORDEN	NIT	BENEFICIARIO	REPRESENTANTE LEGAL	VALOR	ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSION
6	12138187	INGENIERIA CIVIL CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ	CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ	$ 253.840.532,19	1
7	901046409	DISTRIBUCIONES MEJIA UNO SAS	CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ	$ 329.494.308,36	4
8	901759608	INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS	CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ	$ 517.776.770,28	2
9	901759608	INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS	CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ	$ 56.059.232,00	3
10	813001515	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES OMEGA LTDA	JOSE WILLIAM GIRALDO ATEHORTUA	$ 650.000.000,00	3
12	813008120	PA COLOMBIA SAS	CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA	$ 293.996.604,00	1
13	900558342	CONCREMACK SAS	LUIS ENRIQUE JARAMILLO PEÑA	$ 211.817.769,66	5
14	901759608	INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS	CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ	$ 40.000.000,00	1

Plan de inversión del Anticipo Otro si No 1

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO	
CONTRATANTE	GOBERNACION DEL HUILA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
CONTRATO DE OBRA No.	15-2024
1. DESCRIPCIÓN DE OBRAS	
REHABILITACIÓN VÍAS	
OBRA:	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CODIGO 45A01 NEIVA - SAN ANTONIO RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
VALOR CONTRATO ADICIONAL 1	$ 3.370.776.617,36
% ANTICIPO	30%
VALOR ANTICIPO	$1.011.232.986,00
VALOR ANTICIPO AJUSTADO AL PESO	$1.011.232.986,00
DEDUCCIONES POR CONCEPTO DE IMPUESTOS (5%).	$50.561.649,00
VALOR NETO GIRADO.	$960.671.337,00

ITEM	DESCRIPCION	U.M.	% OBRA	VALOR	VALOR NETO
1	SUMINISTRO MATERIALES GRANULARES	M3	25,000%	$240.167.834,25	$240.167.834,25
2	SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA	M3	40,000%	$384.268.534,80	$384.268.534,80
3	MANO DE OBRA	GLB	20,000%	$192.134.267,40	$192.134.267,40
4	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS	GLB	15,000%	$144.100.700,55	$144.100.700,55
			100,000%		$960.671.337,00
				TOTAL ANTICIPO A DESEMBOLSAR	$960.671.337,00

SON	$960.671.337,00
VALOR EN LETRAS	NOVECIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE.

CONTRATISTA:	INTERVENTORIA:
CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA RL. CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO Contratista	ING. VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ R.L CONSORCIO VG Interventoría

Este plan de inversión del anticipo del valor adicional del contrato de obra se aprobó por parte de la interventoría y el ente contratante, y se encuentra en proceso de realizar las siguientes ordenes de operaciones de pago:

ORDENES DE OPERACIONES CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO					
NIT 901.785.282-7					
No Fiducia 19100003460					
No ORDEN	NIT	BENEFICIARIO	REPRESENTANTE LEGAL	VALOR	ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSION
15	901759608	INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS	CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ	$ 80.167.834,25	2
			CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ	$ 134.268.534,80	3
			CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ	$ 192.134.267,40	6
16	813001515	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES OMEGA LTDA	JOSE WILLIAM GIRALDO ATEHORTUA	$ 250.000.000,00	3
17	12138187	INGENIERIA CIVIL CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ	CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ	$ 144.100.700,55	5
18	900340491	MULTIMEZCLAS AGREGADOS SAS	DANIEL ALBERTO GONZALEZ ARCILA	$ 80.000.000,00	2
19	1075237530	DANIEL ALBERTO GONZALEZ ARCILA	DANIEL ALBERTO GONZALEZ ARCILA	$ 80.000.000,00	2

3. RESUMEN DEL ESTADO DEL TIEMPO

- Durante el periodo de este informe se presentaron precipitaciones que impidieron un rendimiento más alto en la ejecución de las actividades generando un gran atraso. A continuación, en las siguientes tablas se grafica el comportamiento meteorológico en el área de influencia del proyecto:

Tabla 5. Tabla pluviométrica

Entidad	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES				
Codigo Estacion	**Nombre Estación**	**Latitud**	**Longitud**	**Altitud**	**categoría**
21110040	HATO MILAGRO [21110040]	30.748.888.890,00	-75,16841667	548	Pluviometria
Municipio	**Fecha Instalación**	**Id Parámetro**	**Etiqueta**		
Tello	15/09/1971	PRECIPITACIÓN	PTPM_CON		
Descripción Serie	Frecuencia	Fecha	Valor	Grado	Nivel Aprobación
Dia pluviometro	Diaria	1-jun-25	6	50	900
Dia pluviometro	Diaria	2-jun-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	3-jun-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	4-jun-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	5-jun-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	6-jun-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	7-jun-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	8-jun-25	2	50	900
Dia pluviometro	Diaria	9-jun-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	10-jun-25	4	50	900
Dia pluviometro	Diaria	11-jun-25	8	50	900
Dia pluviometro	Diaria	12-jun-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	13-jun-25	10	50	900
Dia pluviometro	Diaria	14-jun-25	9	50	900
Dia pluviometro	Diaria	15-jun-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	16-jun-25	1	50	900
Dia pluviometro	Diaria	17-jun-25	10	50	900
Dia pluviometro	Diaria	18-jun-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	19-jun-25	1	50	900
Dia pluviometro	Diaria	20-jun-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	21-jun-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	22-jun-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	23-jun-25	8	50	900
Dia pluviometro	Diaria	24-jun-25	58	50	900
Dia pluviometro	Diaria	25-jun-25	1	50	900
Dia pluviometro	Diaria	26-jun-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	27-jun-25	2	50	900
Dia pluviometro	Diaria	28-jun-25	18	50	900
Dia pluviometro	Diaria	29-jun-25	5	50	900
Dia pluviometro	Diaria	30-jun-25	2	50	900

Información obtenida del banco de datos del Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Esttudios Ambientales (IDEAM) URL: http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/

De acuerdo a la estación meteorológica del IDEAM más cercana a la zona de influencia del proyecto, se puede observar precipitaciones fuertes a lo largo del periodo del presente, reduciendo considerablemente la ejecución de las actividades de acuerdo a la programación actual, generando atraso durante el periodo correspondiente al presente informe.

Table 6. Grafica de precipitación

FRECUENCIA	DIARIA
MESES	JUNIO
DIAS	mm/día
1-jun	6
2-jun	0
3-jun	0
4-jun	0
5-jun	0
6-jun	0
7-jun	0
8-jun	2
9-jun	0
10-jun	4
11-jun	8
12-jun	0
13-jun	10
14-jun	9
15-jun	0
16-jun	1
17-jun	10
18-jun	0
19-jun	1
20-jun	0
21-jun	0
22-jun	0
23-jun	8
24-jun	58
25-jun	1
26-jun	0
27-jun	2
28-jun	18
29-jun	5
30-jun	2



Elaboró: Ingeniero residente de Obra. Consorcio Infraestructura JPN Tello
Información obtenida del banco de datos del Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales (IDEAM)
URL: http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/

4. ASPECTO ADMINISTRATIVO.

4.1. INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL.

Informe De Equipo Del Contratista

En la siguiente tabla se muestra la maquinaria mínima exigida pliegos de condiciones, a continuación, los relacionamos.

Tabla 7. Maquinaria mínima requerida

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.	2
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	2
Mezcladora de concreto 9P3.	2
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	2
Carrotanque de agua (1000 galones)	2
Cortadora de pavimento	2
Formaleta metálica (Concreto hidráulico)	4
Vibrador de concreto	4
Camioneta D-300	1

Fuente. Anexo Técnico Cto No. 015-2024

Informe De Personal

En el presente periodo ya se presentaron a la interventoría las hojas de vida del personal mínimo requerido. **Anexo 5.** Control Personal Obra.

Tabla 8. Personal Técnico requerido

CARGO	CANTIDAD	DEDICACION
INGENIERO DIRECTOR DE OBRA	1	50%
INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE OBRA	2	100%
INSPECTOR DE OBRA	2	100%
PROFESIONAL SISO	2	80%
TOPOGRAFO	2	50%
AUX. TRANSITO	4	80%

Fuente. Anexo Técnico Cto No. 015-2024

5. SEGURIDAD SOCIAL

- De acuerdo a las obligaciones contractuales y según el pliego de condiciones se hacen las respectivas afiliaciones del personal que ejecuta el contrato, a un sistema de seguridad social (ARL, pensiones y salud).

- El Contratista de obra a la fecha del presente informe presentó el pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral. **Anexo 5**. Control Personal Obra.

6. MEMORIA DIARIA O BITACORA

- La Interventoría indica en la bitácora los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en conjunto (Contratista e Interventoría) de la ejecución de los trabajos, registrando la visita de los funcionarios, permitiendo la compresión general de la obra y desarrollo de las actividades. **Anexo 3** Copia libro de bitácora.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

- En el registro fotográfico se anexan las actividades más relevantes desarrolladas en el presente mes. **Anexo 1**. Registro fotográfico.

8. ASPECTO JURÍDICO

La Gobernación del Huila realizó seguimiento a las pólizas correspondientes al contrato de obra No.015-2024.

17

8.1. ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 9. Condiciones contrato de obra

DESCRIPCIÓN	CONTRATO DE OBRA
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT:	901.785.282-7
CONTRATO No.:	015 DE 2024
OBJETO.:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA - SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
ENTIDAD CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL HUILA
VALOR INICIAL:	$ 8.258.002.715,00
VALOR ADICIONAL:	$ 3.370.776.617,36
VALOR ACTUALIZADO:	$ 11.628.779.332,36
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
PLAZO ADICIONAL:	TRES Y MEDIO (3.5) MESES
PLAZO TOTAL	7.5 MESES
ACTA DE INICIO:	17 DE JUNIO DE 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN No 1:	26 DE JUNIO DE 2024
ACTA DE REINICIO No 1:	05 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025

8.2. ESTADO DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA

A continuación, se presenta las pólizas del Contrato de Obra, con base en el Acta de Inicio.

Aseguradora: Seguros del Estado S.A, póliza responsabilidad civil extracontractual No. 61-40-101019508, póliza cumplimiento entidades estatales No. 61-44-101053603.

Según contrato:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO –N° 61-44-101053603 SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**MONTO ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO	23/02/2024	30/12/2024	$ 1,651,600,543.00
BUEN MANEJO DELANTICIPO	23/02/2024	30/12/2024	$ 2,477,400,814.50
PAGO DE SALARIO	23/02/2024	30/06/2027	$ 825,800,271.50
ESTABILIDAD DE LA OBRA	Si ampara 5 años, o meses y -0 dias		$ 1,651,600,543.00
TOTAL			**$ 6,606,402,172.00**

Fuente. Autor

RESPONSABILIDAD CIVIL –N° 61-40-101019508 SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**MONTO ASEGURADO**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	23/02/2024	30/06/2024	$ 650,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	23/02/2024	30/06/2024	$ 650,000,000.00
VEHICULOS PROPIOSY NO PROPIOS	23/02/2024	30/06/2024	$ 650,000,000.00
TOTAL			**$ 650,000,000.00**

Fuente. Autor

Según acta de inicio:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO –N° 61-44-101053603 SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	MONTO ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	17/06/2024	24/04/2025	$ 1,651,600,543.00
BUEN MANEJO DELANTICIPO	17/06/2024	24/04/2025	$ 2,477,400,814.50
PAGO DE SALARIO	17/06/2024	23/10/2027	$ 825,800,271.50
ESTABILIDAD DE LA OBRA	si ampara 5 años, o meses y -1 dias		$ 1,651,600,543.00
TOTAL			$ **6,606,402,172.00**

Fuente. Autor

RESPONSABILIDAD CIVIL –N° 61-40-101019508 SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	MONTO ASEGURADO
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	17/06/2024	23/10/2024	$ 650,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	24/10/2023	24/06/2024	$ 650,000,000.00
VEHICULOS PROPIOSY NO PROPIOS	24/10/2023	24/06/2024	$ 650,000,000.00
TOTAL			$ **650,000,000.00**

Fuente. Autor

Según acta de Acta de reinicio No 1:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO –N° 61-44-101053603 SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	MONTO ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	17/06/2024	04/12/2025	$ 1,651,600,543.00
BUEN MANEJO DELANTICIPO	17/06/2024	04/12/2025	$ 2,477,400,814.50
PAGO DE SALARIO	17/06/2024	04/06/2028	$ 825,800,271.50
ESTABILIDAD DE LA OBRA	Si ampara 5 años, o meses y -1 dias		$ 1,651,600,543.00
TOTAL			**$ 6,606,402,172.00**

Fuente. Autor

RESPONSABILIDAD CIVIL –N° 61-40-101019508 SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	MONTO ASEGURADO
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	17/06/2024	03/06/2025	$ 711,500,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	17/06/2024	03/06/2025	$ 711,500,000.00
VEHICULOS PROPIOSY NO PROPIOS	17/06/2024	03/06/2025	$ 711,500,000.00
TOTAL			**$ 711,500,000.00**

Fuente. Autor

Según OTRO SI No 1:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO –N° 61-44-101053603 SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**MONTO ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO	17/06/2024	19/03/2026	$ 2,325,755,866.47
BUEN MANEJO DELANTICIPO	17/06/2024	19/03/2026	$ 2,477,400,814.50
PAGO DE SALARIOS	17/06/2024	19/09/2028	$ 1,162,877,933.24
ESTABILIDAD DE LA OBRA	Si ampara 5 años, o meses y -1 dias		$ 2,325,755,866.47
TOTAL			**$ 8,291,790,480.68**

Fuente. Autor

RESPONSABILIDAD CIVIL –N° 61-40-101019508 SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**MONTO ASEGURADO**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	17/06/2024	19/09/2025	$ 711,750,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	17/06/2024	19/09/2025	$ 711,750,000.00
VEHICULOS PROPIOSY NO PROPIOS	17/06/2024	19/09/2025	$ 711,750,000.00
TOTAL			**$ 711,500,000.00**

Fuente. Autor

9. ENSAYOS DE LABORATORIO

En este periodo del informe no se realizaron los siguientes ensayos (Ver anexo 9):

10. ESTUDIOS Y DISEÑOS

De acuerdo a lo considerado en el comité técnico el día 26 de junio de 2024, el contratista realizó la revisión y ajuste al diseño con los parámetros iniciales con la firma Especializada INGESUELOS DE COLOMBIA Ltda, cuyo representante legal es el Ingeniero Mario Trujillo Calderón Castro (Esp. En Ingeniería de Vías, T.P. 1920240632CAU) y se presentó a la interventoría el 10 de julio de 2024 a través del oficio CO-15-24-07 para la respectiva revisión. El ajuste del diseño por el método de la AASHTO y con revisión por el método racional se presentó una estructura homogénea para las secciones 1 y 2, teniendo en cuenta la poca diferencia en los CBR y una estructura para la sección 3.

Una vez presentada el ajuste de diseño a la interventoría. El Especialista de la interventoría realiza observaciones técnicas en cuanto a parámetros y factores utilizados para la utilización del método de la AASHTO y Método Racional. Dichas observaciones son contestadas y aclaradas por el Especialista del Contratista y aceptadas por la Interventoría.

Aclaradas las observaciones al ajuste del diseño se presenta el ajuste del diseño a la Secretaría de Vías e Infraestructura para la revisión y aprobación el día 23 de agosto de 2024 a través del oficio CO-15-24-11. Finalmente, la firma INGESUELOS DE COLOMBIA Ltda realiza el diseño completo con los parámetros iniciales reiterando la estructura de pavimento para las secciones 1, 2 y 3. Se unifica una estructura para las secciones 1 y 2 y otra estructura para la sección 3.

Sección 1.

ESPESORES PROPUESTOS PARA ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS EN SECCION 1				
ESTRUCTURA PROPUESTA	DETALLE DE CAPA	μ	Modulo E (Kg/cm2)	ESPESOR (mm)
DESCARGADERO				
	Rodadura en MDC-19	0.35	17569.78	100
	Base Granular (CBR>80%)	0.4	3167.68	200
	Subbase Granular (CBR>30%)	0.45	1417.13	200
	Subrasante	0.5	823.72	∞

Sección 2.

ESPESORES PROPUESTOS PARA ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS EN SECCION 2				
ESTRUCTURA PROPUESTA	DETALLE DE CAPA	μ	Modulo E (Kg/cm2)	ESPESOR (mm)
DESCARGADERO				
	Rodadura en MDC-19	0.35	17569.78	100
	Base Granular (CBR>80%)	0.4	3407.74	200
	Subbase Granular (CBR>30%)	0.45	1524.53	200
	Subrasante	0.5	923.86	∞

Sección 3.

ESPESORES PROPUESTOS PARA ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS EN SECCION 3				
ESTRUCTURA PROPUESTA	DETALLE DE CAPA	μ	Modulo E (Kg/cm2)	ESPESOR (mm)
DESCARGADERO				
	Rodadura en MDC-19	0.35	17569.78	120
	Base Granular (CBR>80%)	0.4	2777.83	200
	Subbase Granular (CBR>30%)	0.45	1242.73	200
	Subrasante	0.5	674.33	∞

Una vez presentada la solicitud del ajuste No 1 el día 21 de noviembre de 2024 a la Secretaría de Vías e Infraestructura y surtidos todos los procesos de revisión, finalmente mediante resolución No 283 de 2024 de fecha 30 de diciembre de 2024 y mediante decreto No 021 de 2025 de fecha 31 de enero de 2025, se aprueba la incorporación al presupuesto departamental del referido ajuste No 1.

11. COMITES DE OBRA

Durante el periodo del presente informe no se realizaron comités de obra: **Anexo 4** Comités de obra.

12. CORRESPONDENCIA

Durante el periodo del presente informe se tiene la siguiente correspondencia: **Anexo 7** Correspondencia.

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA INFORME No 5						
ITEM	PROCENDENCIA			DETALLE		
	ENTIDAD O PERSONA	LUGAR	N° DE CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	REFERENCIA
1	CONSORCIO VG	NEIVA	CO-15-24-27	17/06/2025	Informe de obra No 4 contrato de obra No 015 de 2024	Contrato de Obra No 015 DE 2024
2	CONSORCIO VG	NEIVA	CO-15-24-28	24/06/2025	Entrega Acta parcial No 1 contrato No 015 de 2024	Contrato de Obra No 0015 DE 2024
3	Supervisor del Contrato	NEIVA	CO-15-24-29	24/06/2025	Informe de obra No 3 contrato de obra No 015 de 2024	Contrato de Obra No 0015 DE 2024
4	Supervisor del Contrato	NEIVA	CO-15-24-30	24/06/2025	Informe de obra No 4 contrato de obra No 015 de 2024	Contrato de Obra No 0015 DE 2024
5	Supervisor del Contrato	NEIVA	CO-15-24-31	25/06/2025	Entrega acta parcial de obra No 1 contrato de obra No 015 de 2024	Contrato de Obra No 0015 DE 2024

13. CALIBRACION DE EQUIPOS

Durante el periodo del presente informe para la localización y replanteo se utilizó el siguiente equipo: **Anexo 8** Calibración de equipos.

- Estación Total de marca HI TARGET modelo HTS 720 con serie No VAWN16431991.

14. CARTERAS TOPOGRAFICAS

Durante el periodo del presente informe se instaló Base granular en los tramos No 19; Mezcla asfáltica MDC-19 en el tramo No 19: **Anexo 10** Cartera Topográfica.

15. CONCLUSIONES

De acuerdo a la estación meteorológica del IDEAM más cercana a la zona de influencia del proyecto, se puede observar precipitaciones a lo largo del mes de junio de 2025, disminuyendo el rendimiento en la ejecución de las actividades de acuerdo a la programación actual, generando atrasos durante el periodo correspondiente al presente informe.


A la fecha de cierre del informe se radicó a la supervisión el acta parcial de obra No 1 aprobada por la interventoría por un valor de $ 2.951.277.295,35

ING. CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ
Director de Obra CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

ANEXO 1.
REGISTRO FOTOGRAFICO

VIA FORTALECILLAS- TELLO RUTA 45 A01

Excavación de filtros en el tramo No 17,18,19,21 y 24

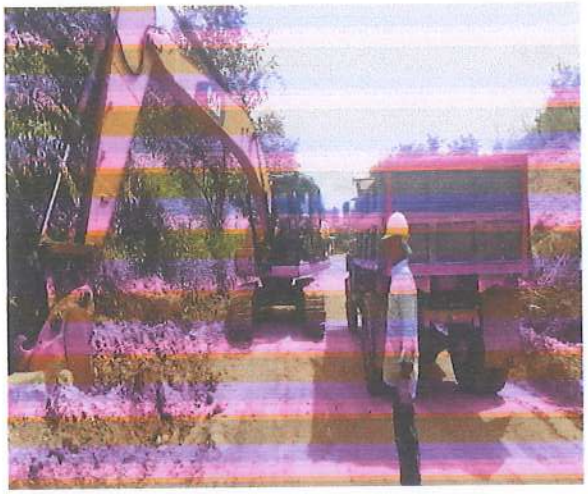









Instalación de base granular Tramo No 19

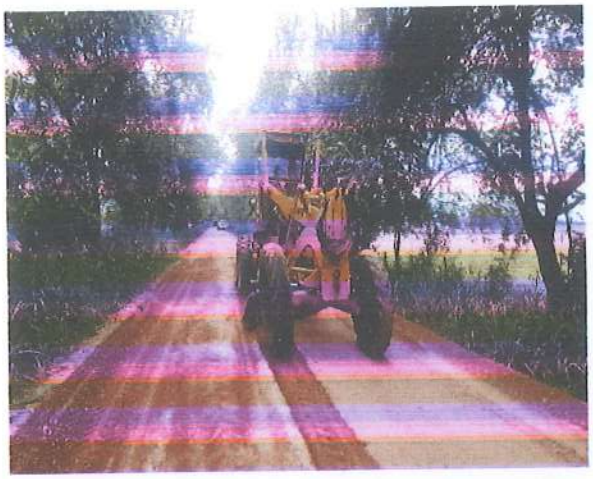


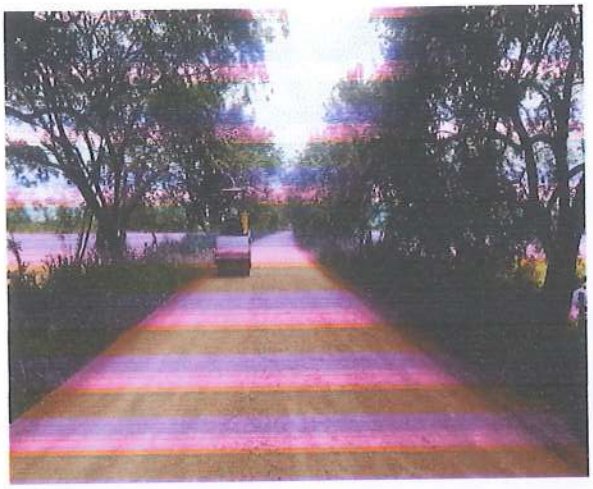







Instalación de Mezcla Densa en Caliente MDC-19 en el Tramos No 19

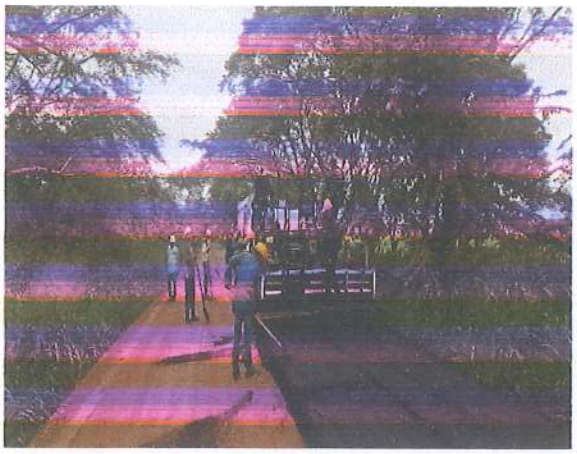

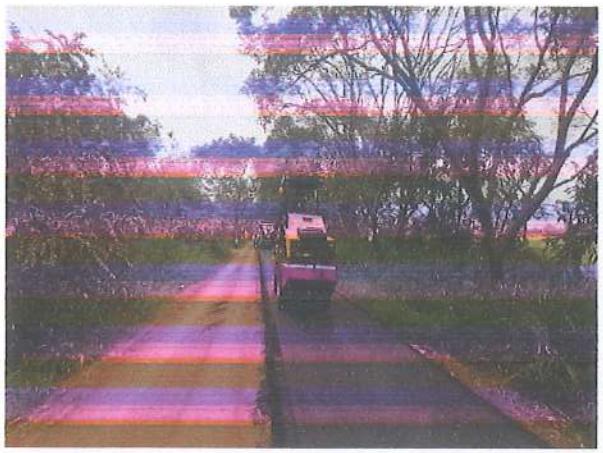



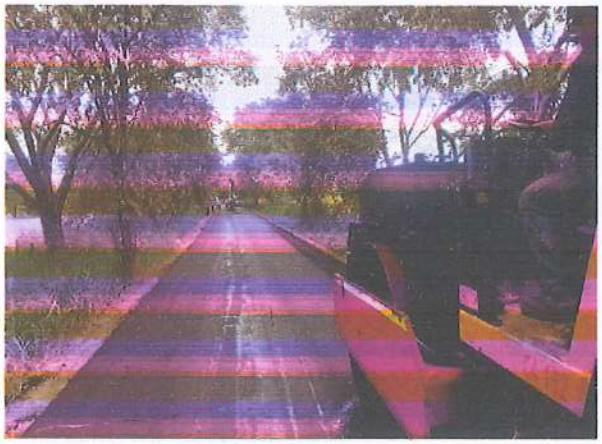

Instalación de sub-base granular Tramo No 19










Riego de imprimación con emulsión asfáltica en los Tramos No 19

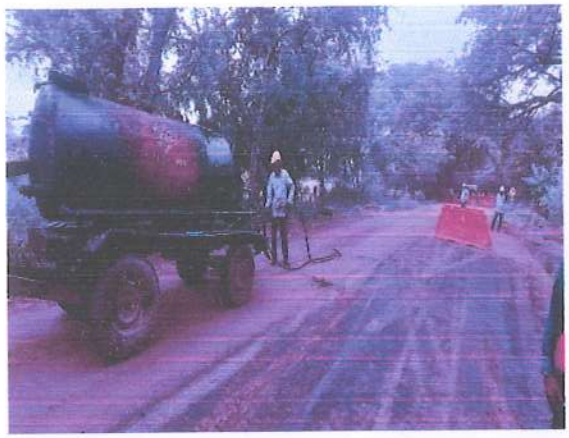







Material granular filtrante. ESP. 673-13 INV para filtros tramo No 24










Geotextil no tejido 2500. ESP. 673-13 INV. y suministro e instalación de tubería perforada de 4" para filtros tramo No 24

32





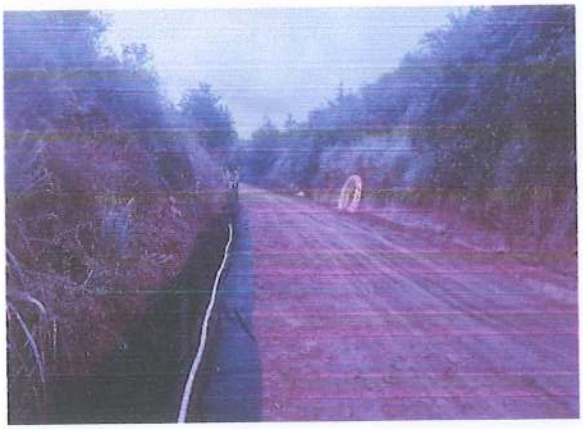







Gavión en piedra zonga y media zonga, malla c-12, escuadria 10cm x 8cm, vena c-10. incluye atirantamiento horizontal y vertical. ESP. 681 INV en el tramo No 17













Base para piso de gaviones en concreto de 21mpa espesor 20cms tramo No 17









Transporte proveniente de la excavación










Anexo 2
Programación

Nº	ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	%	1 MES	2 MES	3 MES	4 MES
1	1.1	Localización y replanteo	Km	12.229	$ 4.467.613,00	$ 27.097.907,20	0,21	$ 3.413.951,04	$ 3.413.951,04	$ 3.413.951,04	$ 3.413.951,04
2	1.2	Provisión y mantenimiento señalización	M2	22.165,44	$ 3.837,42	$ 121.007.977,12	1,19	$ 15.696.434,41	$ 22.261.912,54	$ 22.261.912,54	$ 22.261.912,54
SUBTOTAL PRELIMINARES						$ 151.053.084,43	1,21				
3	2.1	Cortes en Conglomerado	M3	20.462,87	$ 122.409,00	$ 521.254.209,06	4,54		$ 46.541.240,70	$ 114.653.101,55	$ 114.653.101,55
SUBTOTAL EXPLANACIONES						$ 521.254.209,06	4,54				
4	3.1	Conformación de la corona	M2	37.519,55	$ 2.170,02	$ 304.146.194,06	2,65		$ 17.297.776,75	$ 17.297.776,75	$ 17.297.776,75
5	3.2	Base granular	M3	3.462,21	$ 141.000,00	$ 1.003.647.000,00	8,74		$ 98.210.880,00	$ 180.421.320,00	$ 180.421.320,00
6	3.3	Mezcla Densa en caliente MDC-19 Cemento de Mezcla	M3	3.790,24	$ 1.318.219,00	$ 5.439.625.340,27	46,47		$ 74.657.100,00	$ 241.616.089,23	$ 1.024.848.243,69
7	3.4	Subbase granular	M3	2.465,71	$ 1.113.000,00	$ 521.236.190,00	7,06			$ 148.214.200,00	$ 148.214.200,00
8	3.5	Riego de Imprimación (Incluye Arena) CRLO	M2	20.167,44	$ 2.416,00	$ 1.0 217.773 [illegible]	9,03			$ 21.859.526,88	$ 21.859.526,88
SUBTOTAL CONSTRUCCION PAVIMENTO FLEXIBLE						$ 2.764.570.494,01	23,72				
9	4.1	Concreto de Concreto Vaciado in Situ [illegible]	M3	1.599,60	$ 965.321,00	$ 1.024.167.726,76	12,34				$ 326.590.617,71
10		ITEMS NO PREVISTOS					0,00				$ 121.197.550,38
11	UF 4.2	ITEM MUNICIPAL CIRCULAR PEATONAL ESP 0[illegible]	M2	2.239,40	$ 176.551,14	$ 464.790.201,91	4,12				$ 80.727.462,80
12	UF 4.5	ITEM CICLOVIA DE TENDO 2500 ESP [illegible]	M	16.260,80	$ 92.158,29	$ 762.948.301,16	7,72				$ 42.282.663,75
13	UF 4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA [illegible]	UN	1.565,14	$ 47.016,15	$ 171.100.[illegible]					
14	UF 4.5	ITEM CAMELLON EN PIEDRA ZOCALO Y SUELO ZOCALO MALLA C-131 ESCOBRILLADO 3 [illegible]	M3	341,90	$ 406.721,13	$ 141.544.702,71	1,20				$ 71.692.376,26
15	UF 4.6	ITEM CONCRETO PARA REVESTIMIENTO DE CANALES	M3	425,00	$ 107.806,45	$ 20.148.200,55	0,25				$ 27.532.223,74
16	UF 4.7	ITEM BASE PARA PISO DE CANCHA EN CONCRETO DE 3 [illegible]	M2	37,00	$ 1.003.874,00	$ 37.142.338,00	0,32				
17	UF 4.8	ITEM RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO [illegible]	M3	125,00	$ 105.895,60	$ 13.000.695,75	0,12				
SUBTOTAL CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS						$ 2.765.368.171,23	23,74				
17	5.1	Obras de demarcación con pintura en frío	LS	15.907,56	$ 2.512,50	$ 40.[illegible]	0,40				
SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD						$ 40.[illegible]	0,40				
18	6.1	Transporte proveniente de la excavación de la explanación, cortes y préstamos, para disposición final de material	M3-KM	114.[illegible]	$ 1.[illegible]	$ 261.[illegible]	2,25				
SUBTOTAL TRANSPORTES						$ 261.[illegible]	2,25				
					SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE PAI	$ 11.[illegible]		$ 6.607.200,00	$ 6.607.200,00	$ 6.607.200,00	$ 6.607.200,00
					FLUJO DE MANEJO DE TRANSITO (VER ITEM DE PAGO)	$ 47.[illegible]	0,40	$ 7.962.491,60	$ 7.962.491,60	$ 7.962.491,60	$ 7.962.491,60
					PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (VER CAPITULO COMPONENTE AMBIENTAL)	$ 97.[illegible]	0,83				
					VALOR TOTAL	$ 11.628.779.332,35		$ 34.660.677,05	$ 318.307.342,21	$ 915.582.645,80	$ 2.292.907.743,19
					%			0,30%	2,74%	7,87%	19,72%
					% ACUMULADO			0,30%	3,04%	10,91%	30,63%
					VALOR PROGRAMADO ACUMULADO			$ 34.660.677,05	$ 352.967.419,26	$ 1.268.550.065,05	$ 3.561.457.808,45

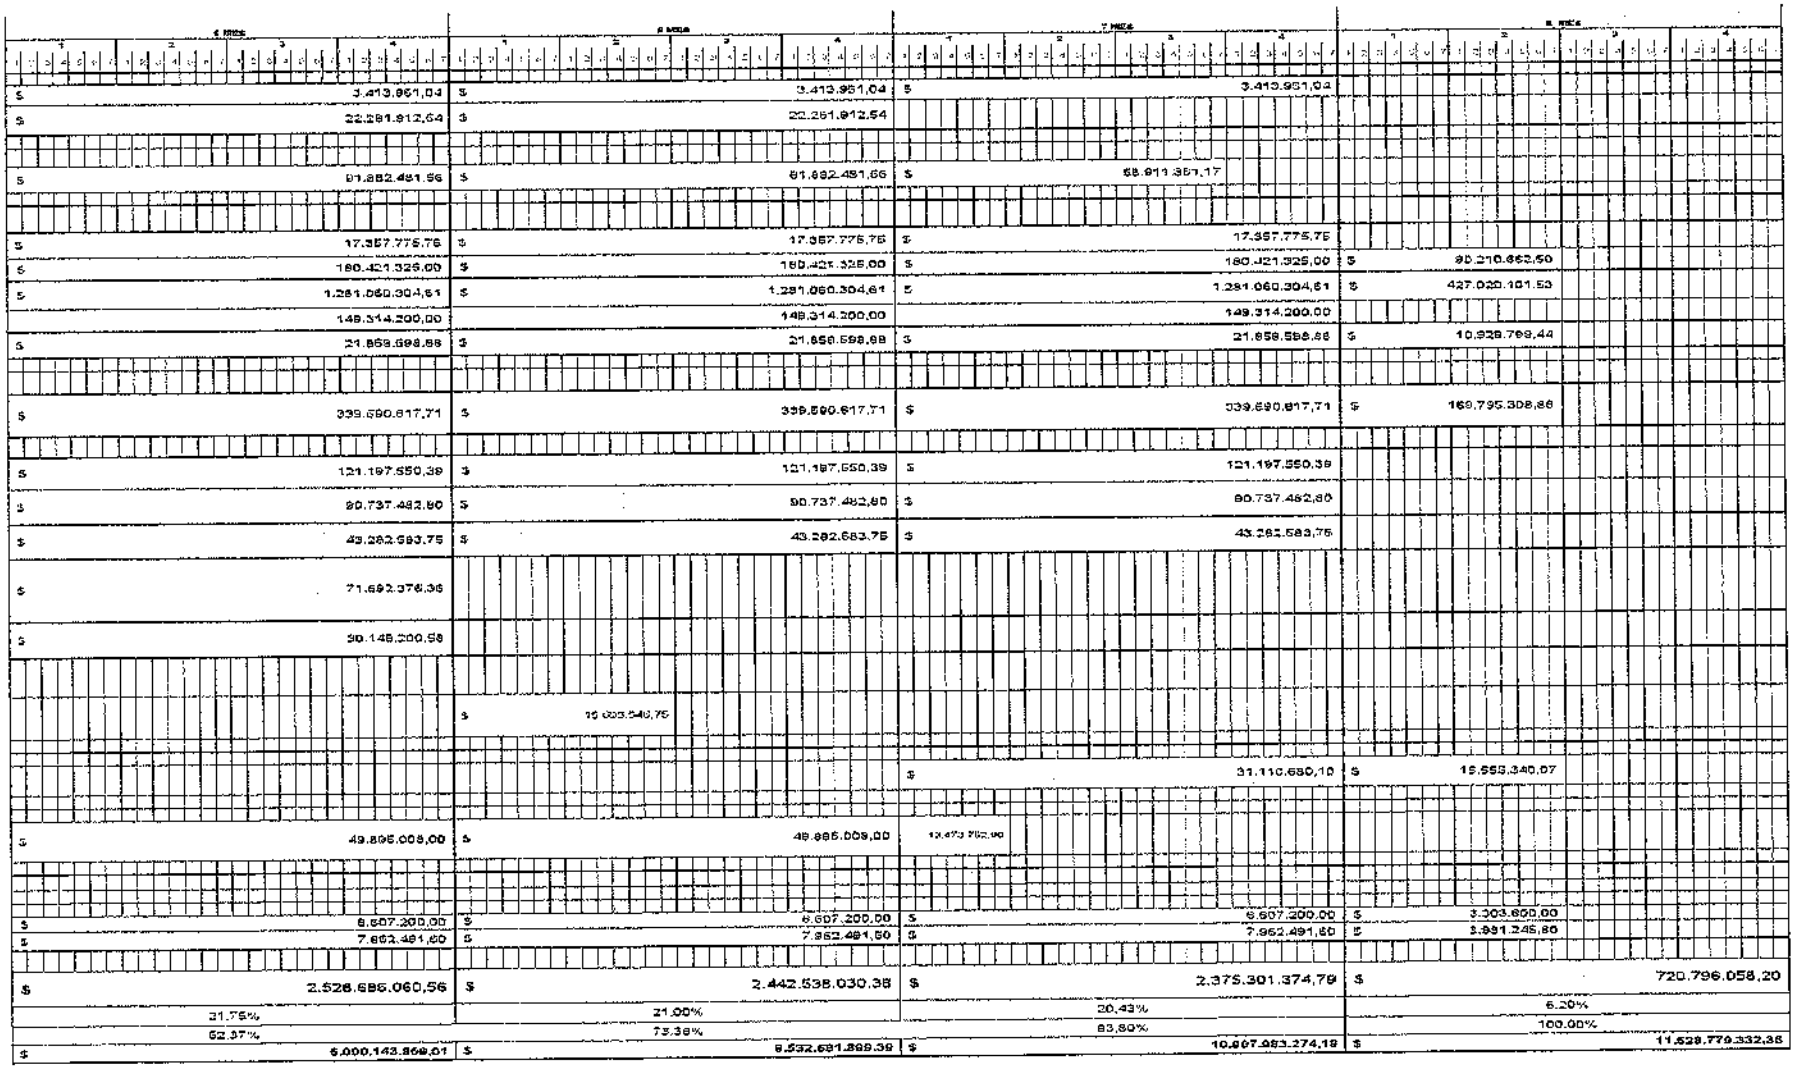

6 MES	5 MES	7 MES	8 MES
$ 3.413.951,04	$ 3.413.951,04	$ 3.413.951,04	
$ 22.281.912,64	$ 22.281.912,64		
$ 91.882.491,56	$ 91.882.491,56	$ 68.911.351,17	
$ 17.357.775,75	$ 17.357.775,75	$ 17.357.775,75	
$ 180.421.325,00	$ 180.421.325,00	$ 180.421.325,00	$ 90.210.662,50
$ 1.281.060.304,61	$ 1.281.060.304,61	$ 1.281.060.304,61	$ 427.020.101,53
149.314.200,00	149.314.200,00	149.314.200,00	
$ 21.858.598,88	$ 21.858.598,88	$ 21.858.598,88	$ 10.929.799,44
$ 339.590.617,71	$ 339.590.617,71	$ 339.590.617,71	$ 169.795.308,86
$ 121.197.550,39	$ 121.197.550,39	$ 121.197.550,39	
$ 90.737.482,80	$ 90.737.482,80	$ 90.737.482,80	
$ 43.282.583,75	$ 43.282.583,75	$ 43.282.583,75	
$ 71.692.376,36			
$ 90.148.200,58			
	$ 15.555.340,07		
		$ 31.110.680,10	$ 15.555.340,07
$ 49.895.008,00	$ 49.895.008,00		
$ 6.607.200,00	$ 6.607.200,00	$ 6.607.200,00	$ 3.303.600,00
$ 7.862.491,60	$ 7.862.491,60	$ 7.862.491,60	$ 3.931.245,80
$ 2.526.686.060,56	$ 2.442.538.030,36	$ 2.375.301.374,79	$ 720.796.058,20
31,75%	21,00%	20,43%	6,20%
52,37%	73,38%	83,80%	100,00%
$ 6.000.143.869,01	$ 8.532.681.869,39	$ 10.907.983.274,19	$ 11.628.779.332,38

Anexo 3
Bitacora de Obra

MAYO 30/25 bharda a cargo de las prof. S1 S.
Se extendió carpeta asfaltica en el sector 18.
Se ejecutaron gaviones en el sector 17
lluvias en horas de la tarde

MAYO 31/25 bharda a cargo de las prof. S1 S0
Se extendió carpeta asfaltica en el sector 18 y se iniciaron las excavaciones para filtros en el sector 24

JUNIO 3/25 bharda a cargo de las prof. S1 S0
Se continuó la construcción de gaviones y se continuaron excavaciones para filtros en el sector 24
Se presentaron lluvias en horas de la tarde.

Scanned with CamScanner

JUNIO 4/25 Charla a cargo de las prof. SISO
Continua la excavación para la construcción de filtros en el sector 24
Se extendió base en un tramo del sector 19 con acompañamiento permanente de la topografía.

JUNIO 5/25 Charla a cargo de las prof. SISO
Se construyó un tramo de filtro en el sector 24, se continuó el extendido de base en el sector 19.
Se continuó la construcción de gaviones en el sector 17

JUNIO 6/25 Charla a cargo de las prof. SISO
Se imprimó un tramo del sector 19
continúa la excavación para filtro en el sector 24 y la construcción de gaviones en el sector 17
Labores de topografía.

Scanned with CamScanner

JUNIO 7/25 labores a cargo de las prof. SISO
Lluvias permanentes en el sector, no permitieron la ejecución de trabajos en obra.

JUNIO 9/25 labores a cargo de las prof. SISO
Se construyeron filtros en el sector 24
Se continuó la construcción de gaviones en el sector 17
Se realizaron labores de topografía
Lluvias en horas de la tarde

JUNIO 10/25 labores a cargo de las prof. SISO
Lluvias en las primeras horas de la mañana.
Se extendió carpeta asfaltica en un sector del Tramo 19
Continuó la excavación para filtros en el sector 24
Labores de topografía

Scanned with CamScanner

JUNIO 11/25 Charla a cargo de las prof. 9150.
Continuó la construcción de gaviones en el sector 17
Retiro de cunetas en mal estado en el sector 24
Construcción de filtros en el sector 24
Labores de topografía.

JUNIO 12/25 Charla a cargo de las prof. 9150
Construcción de filtros en el sector 24
Retiro de cunetas en mal estado en el sector 24
Construcción de gaviones en el sector 17
Labores de topografía con acompañamiento de la comisión de la inventoria

JUNIO 13/25 Charla a cargo de las prof. 9150
Lluvias en horas de la mañana.
Retiro de cunetas en mal estado en el sector 24 y construcción de filtros
Labores de topografía.

Scanned with CamScanner

JUNIO 14/25 Charla a cargo de las prof. SISO
Se realizaron labores de retiro de
cobrantes en obra, con dos Volque
tes y minicargador
Labores de Topografía.

JUNIO 16/25 Charla a cargo de las prof. SISO
Se extendió base en el sector 19 y
se continuo la construcción de
filtros en el sector 24
Gaviones en el sector 17
Labores de interventoría.

JUNIO 17/25 Charla a cargo de las prof. SISO.
Se extendió base en el sector 19
Gaviones en el sector 17
filtros en el sector 24

Scanned with CamScanner

JUNIO 18/25 Charla a cargo de las prof. SISO
Se extendió base en el sector 19
Gaviones en el sector 17
Filtros en el sector 24
Alistado para cunetas en el sector 18
Rellenos en gaviones del sector 17

JUNIO 19/25 Charla a cargo de las prof. SISO
Carpeta asfáltica en el sector 19
Retiro de cunetas en el sector 23
Sub-base en el sector 20.
Gaviones en el sector 17
Labores de Topografía en el tramo 20

JUNIO 20/25 Charla a cargo de las prof. SISO
Sub-base en el sector 20
Gaviones en el sector 17
Retiro de cunetas en el sector 23.
Labores de topog. en el sector 20

JUNIO 21/25 charla a cargo de las prof. SISO
Sub base en el sector 20
Retiro de cunetas en el sector 22
Topografía en el sector 20
Gaviones en el sector 17

JUNIO 24/25 charla a cargo de las prof. SISO
base en el sector 20
Topografía en el sector 20
conformación mecánica en los sectores 24 y 25, mejorando la transitabilidad para las festividades

JUNIO 25/25 charla a cargo de las prof. SISO
Base en el sector 20
cunetas en el sector 18
gaviones en el sector 17
Topografía en el sector 21

Scanned with CamScanner

JUNIO 26/25 bharda a cargo de las prof. S150
barpeta asfaltica en el sector 20
bunetas en el sector 18
Topografia en el sector 21
gaviones en el sector 17

JUNIO 27/25 bharda a cargo de las prof. S150
barpeta asfaltica en el sector 20
bunetas en el sector 18
Gaviones en el sector 17
Topografia en el sector 21

Scanned with CamScanner

Anexo 4
Comités de Obra

Anexo 5
Control Personal Obra

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901785282	7	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO	CALLE 104 No 14A 45 OF 401	TELLO-HUILA	2150482	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1697458623	9490254236	E	2025/07/18	2025/08/13	BANCO DE BOGOTA	26	$6,382,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO (12 Afiliados)					$16,994,000	$2,719,200			$23,544,000	$942,000			$24,480,243	$979,500			$23,544,000	$1,638,800		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (12 Afiliados)					$16,994,000	$2,719,200			$23,544,000	$942,000			$24,480,243	$979,500			$23,544,000	$1,638,800		$0	$0
Ciudad: TELLO Depto: HUILA (12 Afiliados)					$16,994,000	$2,719,200			$23,544,000	$942,000			$24,480,243	$979,500			$23,544,000	$1,638,800		$0	$0
1	CC	1082804794	ALDANA MARIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	12101945	CUBIDES AURELIO		0	$0	$0	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF32	30	$4,000,000	$166,000	14-7	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
3	CC	1082804619	LOPEZ ANLLY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
4	CC	12127850	LUCUARA CARLOS	230201	5	$300,000	$48,000	EPS005	5	$300,000	$12,000	CCF32	5	$567,498	$22,700	14-7	5	$300,000	$20,900	5	$0	$0
5	CC	1082803924	MARTINEZ YASMIN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
6	CC	12138187	MEJIA CLAUDIO	231001	30	$4,000,000	$640,000	EPS037	30	$4,000,000	$160,000	CCF32	30	$4,000,000	$166,000	14-7	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
7	CC	26586026	OLIVEROS MAGALY	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
8	CC	1078778338	PERDOMO DANIELA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF32	30	$2,000,000	$83,000	14-7	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
9	CC	1075246363	PERDOMO EDGAR	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF32	30	$3,000,000	$124,500	14-7	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
10	CC	19105846	RUBIO HECTOR		0	$0	$0	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF32	30	$1,800,000	$72,000	14-7	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
11	CC	1079184726	SALAS MASLY	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF32	30	$2,000,000	$83,000	14-7	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
12	CC	4945986	TRUJILLO JAIME		0	$0	$0	EPS005	5	$750,000	$30,000	CCF32	5	$1,418,745	$56,800	14-7	5	$750,000	$52,200	5	$0	$0
Total		**Afiliados(12)**				$16,994,000	$2,719,200			$23,544,000	$942,000			$24,480,243	$979,500			$23,544,000	$1,638,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901785282	7	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO	CALLE 104 No 14A 45 OF 401	TELLO-HUILA	2150482	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1697458623	9490254236	E	2025/07/18	2025/08/13	BANCO DE BOGOTA	26	$6,382,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$2,719,200	$44,600	$0	$2,763,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$640,000	$10,500	$0	$650,500
COLPENSIONES	25-14	900.336,004	7	1	$480,000	$7,900	$0	$487,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,323,400	$21,600	$0	$1,345,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$275,800	$4,600	$0	$280,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,638,800	$26,800	$0	$1,665,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	12	$1,638,800	$26,800	$0	$1,665,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$979,500	$16,000	$0	$995,500
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	12	$979,500	$16,000	$0	$995,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$942,000	$15,500	$0	$957,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$512,000	$8,400	$0	$520,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$1,000	$0	$58,000
SANITAS	EPS005	800.251,440	6	6	$373,000	$6,100	$0	$379,100
TOTAL				12	$6,279,500	$102,900	$0	$6,382,400

2025/08/14 09:05 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901759608	4	INGENIERIA Y EQUIPOS MEA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 7 4 34	NEIVA-HUILA	3143131943	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1693813833	94902025I2	E	2025/07/03	2025/08/11	BANCOLOMBIA	39	$9,764,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)						$1,186,250	$189,800			$1,660,750	$66,500			$1,660,750	$66,500			$1,660,750	$8,700		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (2 Afiliados)						$1,186,250	$189,800			$1,660,750	$66,500			$1,660,750	$66,500			$1,660,750	$8,700		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)						$1,186,250	$189,800			$1,660,750	$66,500			$1,660,750	$66,500			$1,660,750	$8,700		$0	$0
1	CC	17667422	MEDINA ARCENIO		0	$0	$0	EPS005	10	$474,500	$19,000	CCF32	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	$2,500	10	$0	$0
2	CC	1075225734	VALDERRAMA AVICELVIS	230301	25	$1,186,250	$189,800	ESS062	25	$1,186,250	$47,500	CCF32	25	$1,186,250	$47,500	14-11	25	$1,186,250	$6,200	25	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: OBRA TELLO (16 Afiliados)						$32,851,835	$5,260,900			$30,377,835	$1,215,100			$30,377,835	$1,215,100			$30,377,835	$1,909,500		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS TELLO (2 Afiliados)						$3,223,500	$515,800			$3,223,500	$129,000			$3,223,500	$129,000			$3,223,500	$16,900		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)						$3,223,500	$515,800			$3,223,500	$129,000			$3,223,500	$129,000			$3,223,500	$16,900		$0	$0
3	CC	1003819875	CHARRY KIMBERLY	231001	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF32	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
4	CC	1076903614	RODRIGUEZ MARIANA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OPERARIOS MAQUINARIA TELLO (7 Afiliados)						$12,613,334	$2,018,100			$12,613,334	$504,600			$12,613,334	$504,600			$12,613,334	$878,300		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (7 Afiliados)						$12,613,334	$2,018,100			$12,613,334	$504,600			$12,613,334	$504,600			$12,613,334	$878,300		$0	$0
5	CC	854492E3	DE LUQUE JAVIER	25-14	30	$2,400,000	$384,000	EPS037	30	$2,400,000	$96,000	CCF32	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0
6	CC	1075252102	DIAZ JESUS	231001	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF32	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
7	CC	4898798	OSPINA LUIS	25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF32	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
8	CC	83233181	QUINTERO LUNIO	231001	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF32	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
9	CC	1082215917	ROJAS GUSTAVO	230201	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF32	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
10	CC	12228829	RUIZ CARLOS	25-14	19	$1,013,334	$162,200	EPS037	19	$1,013,334	$40,600	CCF32	19	$1,013,334	$40,600	14-11	19	$1,013,334	$70,600	19	$0	$0
11	CC	1075226651	VICTORIA FERNEY	25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$64,000	CCF32	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVOS TELLO (8 Afiliados)						$9,607,667	$1,537,500			$9,607,667	$384,700			$9,607,667	$384,700			$9,607,667	$668,900		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (8 Afiliados)						$9,607,667	$1,537,500			$9,607,667	$384,700			$9,607,667	$384,700			$9,607,667	$668,900		$0	$0
12	CC	1075265580	ALVAREZ MILTON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
13	CC	36301118	CEDEÑO DIANA	231001	4	$266,667	$42,700	EPS005	4	$266,667	$10,700	CCF32	4	$266,667	$10,700	14-11	4	$266,667	$18,600	4	$0	$0
14	CC	14921894	MANJARRES ISIDRO	25-14	15	$800,000	$128,000	EPS005	15	$800,000	$32,000	CCF32	15	$800,000	$32,000	14-11	15	$800,000	$55,700	15	$0	$0
15	CC	1082806583	MENDEZ EDINSON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
16	CC	83242741	QUINTERO SAUL	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
17	CC	4943631	REYES EVERLEDETH	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
18	CC	83242768	SANCHEZ RICARDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
19	CC	1003201176	VALDERRAMA DIEGO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: TOPOGRAFIA (2 Afiliados)						$4,933,334	$789,400			$4,933,334	$197,400			$4,933,334	$197,400			$4,933,334	$343,400		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)						$4,933,334	$789,400			$4,933,334	$197,400			$4,933,334	$197,400			$4,933,334	$343,400		$0	$0
20	CC	1075242622	GALLEGO MAHER	230301	24	$2,800,000	$448,000	EPS037	24	$2,800,000	$112,000	CCF32	24	$2,800,000	$112,000	14-11	24	$2,800,000	$194,900	24	$0	$0
21	CC	93129015	GUZMAN JOAQUIN	230301	20	$2,133,334	$341,400	EPS005	20	$2,133,334	$85,400	CCF32	20	$2,133,334	$85,400	14-11	20	$2,133,334	$148,500	20	$0	$0
Total			**Afiliados(21)**			$31,564,085	$5,050,700			$32,038,585	$1,282,200			$32,038,585	$1,282,200			$32,038,585	$1,916,200		$0	$0

2025/08/12 09:50 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901759608	4	INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 7 4 34	NEIVA-HUILA	3143131943	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	169363823	9490202512	E	2025/07/03	2025/08/11	BANCOLOMBIA	39	$9,764,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$5,050,700	$123,400	$0	$5,174,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,166,500	$28,500	$0	$1,195,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,186,200	$29,000	$0	$1,215,200
PORVENIR	230301	800.224.808	8	7	$1,890,400	$46,200	$0	$1,936,600
PROTECCION	230201	800.229,739	0	3	$807,600	$19,700	$0	$827,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,916,200	$46,900	$0	$1,963,100
ARL SURA	14-11	890.903,790	5	21	$1,916,200	$46,900	$0	$1,963,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,282,200	$31,400	$0	$1,313,600
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	21	$1,282,200	$31,400	$0	$1,313,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				21	$1,282,200	$31,500	$0	$1,313,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$47,500	$1,200	$0	$48,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$1,400	$0	$58,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$555,600	$13,600	$0	$569,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$171,000	$4,200	$0	$175,200
SANITAS	EPS005	800.251,440	6	8	$451,100	$11,100	$0	$462,200
TOTAL				21	$9,531,300	$233,200	$0	$9,764,500

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901759608	4	INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 7 4 34	NEIVA-HUILA	3143131943	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1668715285	94900403O3	E	2025/07/03	2025/08/05	BANCOLOMBIA	33	$625,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: OBRA TELLO (2 Afiliados)					$1,423,500	$227,900			$3,036,834	$121,600			$2,394,884	$95,900			$3,036,834	$166,800		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERARIOS MAQUINARIA TELLO (1 Afiliados)					$0	$0			$1,613,334	$64,600			$1,493,334	$59,800			$1,613,334	$104,000		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)					$0	$0			$1,613,334	$64,600			$1,493,334	$59,800			$1,613,334	$104,000		$0	$0
1	CC	4890672	SANCHEZ MILLER		0	$0	$0	EPS037	28	$1,493,334	$59,800	CCF32	28	$1,493,334	$59,800	14-11	28	$1,493,334	$104,000	28	$0	$0
2	CC	4890672	SANCHEZ MILLER		0	$0	$0	EPS037	2	$120,000	$4,800	CCF32	0	$0	$0	14-11	2	$120,000	$0	0	$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVOS TELLO (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,900			$1,423,500	$57,000			$901,550	$36,100			$1,423,500	$62,800		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,900			$1,423,500	$57,000			$901,550	$36,100			$1,423,500	$62,800		$0	$0
3	CC	1006522347	JIMENEZ HOLMAN	230301	19	$901,550	$144,200	EPS005	19	$901,550	$36,100	CCF32	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
4	CC	1006522347	JIMENEZ HOLMAN	230301	11	$521,950	$83,900	EPS005	11	$521,950	$20,900	CCF32	0	$0	$0	14-11	11	$521,950	$0	0	$0	$0
Total		**Afiliados(2)**				$1,423,500	$227,900			$3,036,834	$121,600			$2,394,884	$95,900			$3,036,834	$166,800		$0	$0

2025/08/12 09:59 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901159608	4	INGENIERIA Y EQUIPOS MEA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 7 4 34	NEIVA-HUILA	3145131943	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1660115285	94900480303	E	2025/07/03	2025/08/05	BANCOLOMBIA	33	$625,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,900	$4,700	$0	$232,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,900	$4,700	$0	$232,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$166,800	$3,500	$0	$170,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$166,800	$3,500	$0	$170,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$95,900	$2,000	$0	$97,900
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891.180,008	2	2	$95,900	$2,000	$0	$97,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$121,600	$2,600	$0	$124,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$64,600	$1,400	$0	$66,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$1,200	$0	$58,200
TOTAL				3	$612,700	$12,800	$0	$625,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901179608	4	INGENIERIA Y EQUIPOS MILA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 7 4 34	NEIVA-HUILA	3143131943	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	569388[illegible]749	94902022?7	Y	2025/07/03	2025/08/11	BANCOLOMBIA	39	$639,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: OBRA TELLO (7 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,968,050	$624,400		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVOS INDEPENDIENTES (7 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,968,050	$624,400		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (7 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,968,050	$624,400		$0	$0
1	CC	1083916902	ALDANA DYLAN		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	27	$1,281,150	$89,200	0	$0	$0
2	CC	7684878	ALDANA FARYD		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	27	$1,281,150	$89,200	0	$0	$0
3	CC	7700886	BUSTOS WILSON		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	27	$1,281,150	$89,200	0	$0	$0
4	CC	1075226298	MANRIQUE JUAN		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	27	$1,281,150	$89,200	0	$0	$0
5	CC	7707574	MOSQUERA JHON		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	27	$1,281,150	$89,200	0	$0	$0
6	CC	7714738	PERDOMO GUILLERMO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	27	$1,281,150	$89,200	0	$0	$0
7	CC	12137732	SOTO JOSE		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	27	$1,281,150	$89,200	0	$0	$0
Total			**Afiliados(7)**			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,968,050	$624,400		$0	$0

2025/08/12 11:26 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901759608	4	INGENIERIA Y EQUIPOS MILA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 7 4 34	NEIVA-HUILA	3142121943	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1893802749	9490202277	Y	2025/07/03	2025/08/11	BANCOLOMBIA	3%	$639,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$624,400	$15,300	$0	$639,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$624,400	$15,300	$0	$639,700
TOTAL				7	$624,400	$15,300	$0	$639,700

Anexo 6
Informe SST

INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No 5

CONTRATO DE OBRA No. 015 DE 2024:

OBJETO: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA - SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

FECHA DEL INFORME: 30/06/2025

CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

CONSORCIO VG

JUNIO DE 2025

1. INTRODUCCION 6
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 7
3. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 8
4. INDUCCION 9
ANEXO 1. Registro de asistencia a inducción 9
4.1. Registro fotográfico 9
5. EXAMENES MEDICO LABORALES 11
5.1. Exámenes de ingreso 11
ANEXO 2. Exámenes de ingreso 12
5.2. Exámenes de egreso 12
ANEXO 3. Exámenes de egreso 12
6. RECURSOS 12
6.1. Recursos humanos 12
6.2. Recursos técnicos 12
6.3. Recursos financieros 13
7. AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL 13
Relación personal junio. 13
ANEXO 4. Afiliaciones 14
7.1. PLANILA SEGURIDAD SOCIAL 14
7.1.1. RELACION DE PERSONAL 14
ANEXO 5. Planillas seguridad social 15
8. CHARLAS DE SEGURIDAD 15
ANEXO 6. Registros de asistencia 16
8.1. Registro fotográfico 17
9. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SAUD EN ELTRABAJO 18
ANEXO 7. Actualización COPASST 18
10. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 18
ANEXO 8. Actualización COCOLA 18

11. BRIGADAS DE EMERGENCIA 18
12. CONTROL DE VEHICULOS 19
ANEXO 9. Documentación maquinaria 20
13. INSPECCIONES 20
13.1. Inspección de vehículos y maquinaria 20
13.2. Registro de maquinaria en el mes de junio 21
ANEXO 10. Inspección pre operacional 21
13.3.Inspecciones de equipos de emergencia 22
ANEXO 11. Inspección equipos de emergencia 22
13.4. Registro fotográfico 23
14. DOTACION Y EPP 23
ANEXO 12. Registros entrega de epp y dotación 24
15.1. Registro fotográfico. 24
15. ACCIDENTES DE TRABAJO 25
ANEXO 13. Accidente de trabajo 25
16. MATRIZ DE INDENTIFICACION DE PELIGROS 25
17. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTION AMBIENTAL 25
17.1. Conformación del grupo de gestión social y ambiental 26
ANEXO 10. Acta de Conformación del Grupo Ambiental 26
17.1.1. Indicador 26
17.2. Capacitación ambiental al personal en obra 26
NOTA: ver anexo 6 asistencia charlas 26
17.2.1. Indicador 26
17.3. Cumplimiento de los requisitos legales 27
Nota: Titulo minero y licencia ambiental reposa en el informe # 3 ANEXO 12 27
17.3.1. Indicador 27
ANEXO 16. Titulo minero 27
18. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 27
18.1. Almacenamiento y manejo integral de los materiales de construcción. 27

18.1.1. Indicador 28
18.2. Registro fotográfico 28
18.3. Señalización frentes de obra y sitios temporales 29
18.3.1. Indicador 29
18.4. Presupuesto PMT 29
18.4. Registro fotográfico 31
18.5. PRESUPUESTO PMA 32
18.6. Manejo y disposicion final de escombros 33
NOTA: el permiso reposa en el informe No. 2 del mes de marzo del 2025 33
18.6.1. Indicador 33
18.7. Manejo y disposición de residuos sólidos convencionales y especiales 33
18.8. Registro fotográfico 34
18.9. Orden y Aseo 35
ANEXO. 14. Actualización Brigada de Orden y Aseo. 35
18.10. Registro fotográfico 36
19. GESTION RECURSO HIDRICO 38
19.1. Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales 38
20. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES 38
20.1. Indicador 38
20.2. Manejo de maquinaria equipos y vehículos 38
20.3. Registro de maquinaria del mes de junio 39
NOTA: el anexo de este numeral reposa en el informe No.1 del mes de febrero del 2025 39
20.4. Indicador 39
21. GESTIÓN SOCIAL 39
21.1. Localización del proyecto 39
21.2. Proyecto de atención a la comunidad 40
21.2.1. Registro fotográfico 40
21.3. Información y divulgación 41
21.3.1. Indicador 41
21.4. Conformación de veedurías 41

21.5. Directorio del municipio de Tello 42
21.6. Contratación mano de obra.....43
21.6.1. Indicador 44
21.7. Perfil sociodemográfico.....44
ANEXO 15. Perfil sociodemográfico.....44

1. INTRODUCCION

El presente documento relaciona las actividades de Seguridad y Salud en el trabajo que corresponden, al mes de junio del presente año, realizadas en la ejecución del proyecto **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 15 DE 2024, REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA – SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.**

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es un pilar fundamental de la empresa, ya que busca garantizar condiciones laborales seguras, prevenir accidentes y proteger el bienestar físico y mental de los trabajadores. A través de la identificación, evaluación y control de riesgos, se promueve un entorno de trabajo saludable y eficiente.

La ejecución de medidas de SST no solo cumple con normativas legales, sino que también mejora la productividad, reduce costos asociados a incidentes laborales y fortalece la cultura organizacional. Una adecuada gestión de la seguridad laboral es clave para fomentar el compromiso de los trabajadores y garantizar la sostenibilidad de la empresa.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objetivo la construcción de 5,33 km de pavimento flexible, donde se incluye el fresado de pavimento asfáltico, conformación de calzada, construcción de estructura de pavimento en base y sub base granular, mezcla densa en caliente MDC-19, riego de imprimación, construcción de filtros, fundición cunetas, muros en gaviones y líneas de demarcación para la señalización horizontal.

DESCRIPCIÓN	CONTRATO DE OBRA
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT:	901.785.282-7
CONTRATO No.:	015 DE 2024
OBJETO.:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA - SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
ENTIDAD CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL HUILA
VALOR INICIAL:	$ 8.258.002.715,00
VALOR ADICIONAL:	$ 3.370.776.617,36
VALOR ACTUALIZADO:	$ 11.628.779.332,36
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
ACTA DE INICIO:	17 DE JUNIO DE 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN No 1:	26 DE JUNIO DE 2024
ACTA DE REINICIO No 1:	05 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	27 DE MAYO DE 2025

4. INDUCCION

La **inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)** es un proceso fundamental para garantizar que todos los trabajadores de la obra conozcan los riesgos laborales y las medidas preventivas que deben seguir para desarrollar sus actividades de manera segura.

En la inducción al personal se les dio a conocer la siguiente información:


- Explicar las normas y procedimientos de seguridad que deben cumplir.
- Informar a los trabajadores sobre los riesgos asociados a la ejecución de sus actividades.
- Reglamento y horarios de trabajo
- capacitar sobre en el uso adecuado de los Equipos de Protección Personal (EPP).
- Sensibilizar sobre la importancia de la prevención de accidentes y enfermedades laborales.


En el mes de junio se realizó la inducción a 3 personas que ingresaron al proyecto.

ANEXO 1. Registro de asistencia a inducción

4.1. Registro fotográfico

JPNTELLO

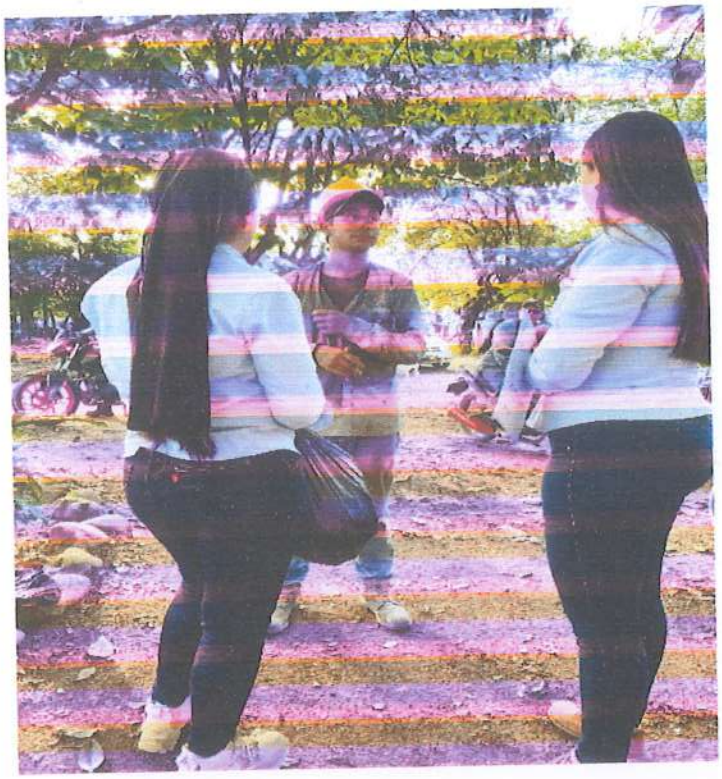

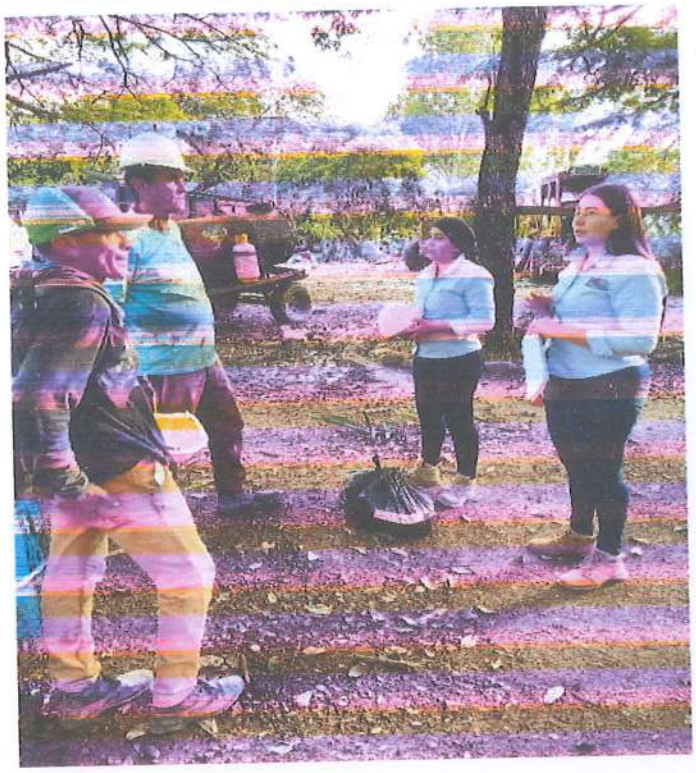





5. EXAMENES MEDICO LABORALES

En cumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y con el objetivo de proteger la salud de los trabajadores, se han realizado los **exámenes médicos laborales** requeridos para la ejecución de las actividades en obra.

Estos exámenes permiten evaluar la condición física y aptitud médica del personal, asegurando que se encuentren en condiciones óptimas para desempeñar sus funciones sin riesgo para su bienestar.

- Todos los trabajadores han sido evaluados de acuerdo con el perfil ocupacional de su cargo.
- Se cuenta con los certificados médicos que respaldan la aptitud del personal.
- Se garantiza la confidencialidad de los resultados y el cumplimiento de la normatividad en salud ocupacional.

La realización de estos exámenes médicos contribuye a la prevención de enfermedades laborales y refuerza el compromiso de la empresa con la seguridad y el bienestar de su equipo de trabajo

5.1. Exámenes de ingreso

- Verificar que el trabajador se encuentra **apto física y mentalmente** para desempeñar el cargo.
- Identificar condiciones de salud preexistentes.
- Garantizar que las tareas asignadas no representen un riesgo para su salud ni para la de terceros

Personal que realizaron los exámenes de ingreso el mes junio

NOMBRE	CEDULA	CARGO
HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO
JOAQUIN GUZMAN SANCHEZ	93.129.015	CADENERO 1
AVICELVIS VALDERAMA SALAZAR	1.075.225.724	AYUDANTE

ANEXO 2. Exámenes de ingreso

5.2. Exámenes de egreso

NOMBRE	CARGO	FECHA DE SALIDA
CARLOS ALBERTO LUCUARA	CADENERO	5/06/2025
JAIME TRIJULLO SALAZAR	TOPOGRAFO	5/06/2025

- Evaluar el estado de salud del trabajador al momento de su retiro.
- Identificar si se produjo algún deterioro relacionado con la exposición a factores de riesgo durante su permanencia en la empresa.
- Dejar un registro clínico oficial que pueda usarse en caso de reclamaciones o procesos legales.

ANEXO 3. Exámenes de egreso

6. RECURSOS

6.1. Recursos humanos

Responsable del SG-SST: Profesional en seguridad y salud en el trabajo encargado de la gestión y supervisión del sistema.

Nombre Profesional	Cargo
Brian Alexander Hernández Olaya	Profesional SST
Nasly Melisa Salas Sánchez	Auxiliar SST
Daniela Perdomo Horta	Profesional SST

6.2. Recursos técnicos

- Equipos de Protección Personal (EPP): Cascos, guantes, gafas de seguridad, botas punta de acero, chalecos reflectivos, entre otros.

- Señalización y demarcación: Avisos de prevención, zonas de riesgo y prohibiciones.
- Herramientas y equipos seguros: Equipos en buen estado, revisados periódicamente para evitar fallos o accidentes.

6.3. Recursos financieros

- Presupuesto para seguridad y salud en el trabajo: Inversión en capacitación, compra de EPP, señalización y equipos de seguridad

7. AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL

De acuerdo con las obligaciones contractuales y en cumplimiento del pliego de condiciones, se han realizado las respectivas afiliaciones del personal que ejecuta el contrato a los sistemas de seguridad social obligatorios. Estas afiliaciones incluyen:

- Administradora de Riesgos Laborales (ARL): Garantiza la cobertura en caso de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

- Fondo de Pensiones: Asegura la cotización para la jubilación o protección en casos de invalidez o fallecimiento.

- Sistema de Salud: Proporciona acceso a servicios médicos y prestaciones asistenciales.

Se cuenta con los soportes correspondientes que evidencian la afiliación y pago de aportes del personal vinculado. Además, se han implementado medidas de control para garantizar el cumplimiento continuo de estas obligaciones durante la ejecución del contrato.

Relación personal junio.

NOMBRE	CEDULA	CARGO
HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO
JOAQUIN GUZMAN SANCHEZ	93.129.015	CADENERO 1
AVICELVIS VALDERAMA SALAZAR	1.075.225.724	AYUDANTE

ANEXO 4. Afiliaciones

7.1. PLANILA SEGURIDAD SOCIAL

En cumplimiento de la normatividad legal vigente en Colombia y de las obligaciones contractuales establecidas, la empresa realizo el pago de la **Planilla Integrada de Liquidación de Aportes**, como evidencia del cumplimiento de las afiliaciones y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral para el personal vinculado al proyecto.

7.1.1. RELACION DE PERSONAL

PERSONAL CONSORCIO JPN		
NOMBRE	**CEDULA**	**CARGO**
CLAUDIO MEJIA GUTIERREZ	12.138.187	ING. DIRECTOR
EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE
AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE
JAIME TRUJILLO SALAZAR	4.945.986	TOPOGRAFO
HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2
CARLOS ALBERTO LUCUARA PARRACI	12.127.850	CADENERO 1
ANLLY ASTRRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA
MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA
MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA
DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST
YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA
NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	AUX. SST
PERSONAL INGENIERIA Y EQUIPOS MA SAS		
GUSTAVO ADOLFO ROJAS VARGAS	1.082.215.917	OPE. RETRO EXCAVADORA
LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR
JESUS DAVID DIAZ GONZALES	1.075.252.102	OPE. RETRO EXCAVADORA
JAVIER JESUS DE LUQUE CABARGA	85.449.283	OPE. MOTONIVELADORA
RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE
FERNEY VICTORIA CHAVARRO	1.075.236.051	CONDUCTOR DE VOLQUETA
LUNIO POLANIA QUINTERO	83.233.181	CONDUCTOR DE VOLQUETA
MILLER SANCHEZ LEON	4.980.672	CONDUCTOR DE VOLQUETA
MILTON ANDRES ALVAREZ	1.075.285.580	OFICIAL

DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFICIAL
EVERLEDETH REYES DIAZ	83.242.741	AYUDANTE
HOLMAN JIMENEZ DIAZ	1.006.528.347	AYUDANTE
EDINSON MENDEZ PERDOMO	1.082.806.583	AYUDANTE

ANEXO 5. Planillas seguridad social

8. CHARLAS DE SEGURIDAD

En cumplimiento de las normativas de seguridad y salud en el trabajo, antes de iniciar la jornada laboral se realizan charlas de seguridad con el objetivo de informar y sensibilizar a los trabajadores sobre la importancia de la prevención de riesgos.

Estas charlas reflejan el compromiso de la empresa contratista con la seguridad y el bienestar del personal, permitiendo:

- Analizar situaciones que podrían derivar en accidentes.
- Evaluar los riesgos a los cuales están expuestos en la ejecución de las actividades.
- Identificar y aplicar medidas de control adecuadas.


El profesional SST es el encargado de dirigir estas charlas diarias, explicando las tareas programadas, los riesgos asociados y las acciones preventivas a implementar.
La capacitación o charla pre operacional es de carácter obligatorio y debe realizarse todos los días antes del inicio de las actividades con la participación de todo el personal de obra.
Se llevan registros de asistencia y temas tratados durante el mes de junio como evidencia del cumplimiento de este requisito.


FECHA	TEMA
3/06/2025	Uso adecuado de epp – recomendaciones
4/06/2025	Prevención y control del ruido
5/05/2025	Convivencia laboral
6/06/2025	Trabajo en equipo


7/06/2025	Acoso Laboral
9/06/2025	Recomendaciones frente a un sismo
10/06/2025	Prevención de accidentes por el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas
11/06/2025	Calestenia
12/06/2025	Sindrome del burnout
13/06/2025	Respeto y buen trato
14/06/2025	Dinámica colectiva
16/06/2025	Prevención de accidentes e incidentes de transito
17/06/2025	Somnolencia laboral
18/06/2025	Recomendaciones para jornada de asfalto
19/06/2025	Concentración en los puestos de trabajo
20/06/2025	Exposición a vibraciones- recomendaciones sst
21/06/2025	Pausas activas
24/06/2025	Socialización y actualización copasst y cocola
25/06/2025	Salud física
24/05/2025	Recomendaciones para la jornada de Asfalto
26/06/2025	Orden y aseo
27/07/2025	Disposición adecuada de residuos

ANEXO 6. Registros de asistencia

8.1. Registro fotográfico

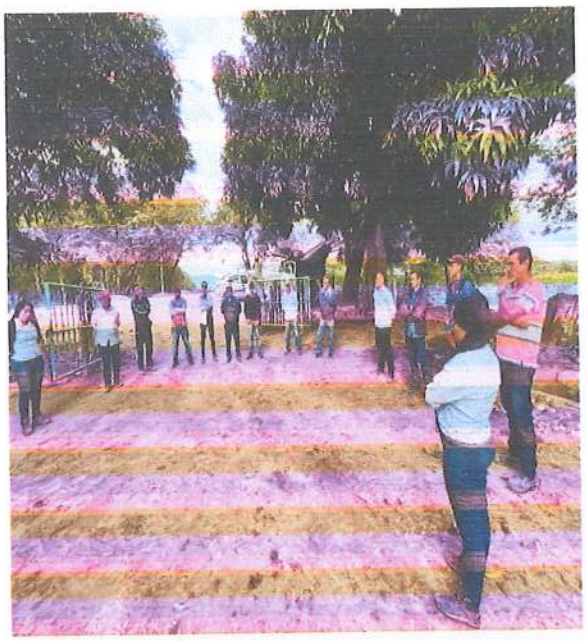

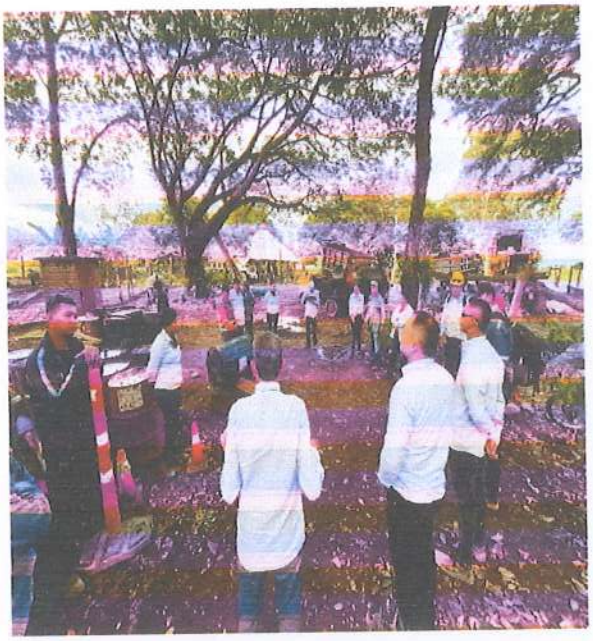

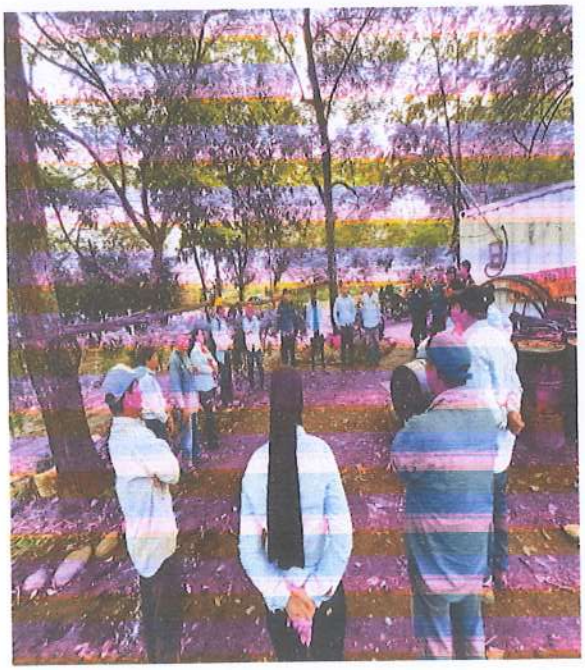



9. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SAUD EN ELTRABAJO

En cumplimiento de la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se encuentra conformado y actualizado el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST, el cual tiene como función principal la promoción y vigilancia del cumplimiento de las normas y programas de prevención de riesgos laborales dentro de la obra.

ANEXO 7. Actualización COPASST

10. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo y bienestar organizacional, se encuentra conformado y actualizado el Comité de Convivencia Laboral (CCL), con el propósito de prevenir y atender situaciones de acoso laboral, promoviendo un ambiente de trabajo sano, respetuoso y armonioso.

ANEXO 8. Actualización COCOLA

11. BRIGADAS DE EMERGENCIA

En cumplimiento del Plan de Emergencias y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), se encuentran conformadas las Brigadas de Emergencia, con el propósito de garantizar:

- actuar de manera organizada y eficiente ante situaciones de emergencia.
- Proteger la vida e integridad de los trabajadores y visitantes en la obra.
- coordinar acciones de prevención, atención y recuperación en caso de incidentes.
- Reducir el impacto de emergencias mediante respuestas rápidas y efectivas.

NOTA: El acta de conformación reposa en el informe No. 2 del mes de marzo del 2025

12. CONTROL DE VEHICULOS

El control adecuado de vehículos livianos, pesados y maquinaria amarilla es clave para la seguridad vial en la obra. Implementar protocolos de inspección, mantenimiento y capacitación ayuda a reducir riesgos, mejorar la eficiencia operativa y cumplir con la normativa vigente

Durante el mes de junio el consorcio conto con vehículos Livianos, pesados y maquina amarilla para la ejecución de actividades en obra, se relacionan a continuación

LISTADO DE MAQUINARIA AMARILLA

No.	MAQUINARIA	MARCA	REFERENCIA	MODELO	TARJETA REGISTRO
1	Motoniveladora	Champión	710 a	1989	157-694-19629
2	Motoniveladora	Champión	715 a	2006	715ª-101-0705-2
3	Retroexcavadora	Caterpilar	320 D	2008	CPPAB06905
4	Retroexcavadora	Caterpilar	320 CL	2006	CAT0320CPPAB06905
5	Vibro compactador	Dynapac	CA125D	1998	64220324
6	Vibro compactador	Dynapac	CA 15	1989	MC107136
7	Finisher	Rodatec	207 with eagle	2006	RP-190

LISTADO DE VEHICULOS LIVIANOS

No.	VEHICULO	MARCA	REFERENCIA	MODELO	PLACA
1	Camioneta	CHEVROLET	LUV D MAX DSL	2006	CMQ 423
2	Camioneta	FORD	RANGER	2012	TDS 050

LISTADO DE VOLQUETAS					
No.	VEHICULO	MARCA	REFERENCIA	MODELO	PLACA
1	VOLQUETA	CHEVROLET	C 70 149	1998	OWH 749
2	VOLQUETA	CHEVROLET	C 70 149	1983	OZD 276
3	VOLQUETA	CHEVROLET	C 79 189	1982	OWH 442

ANEXO 9. Documentación maquinaria

Nota: la documentación del resto de maquinaria y vehículos reposa en el informe 1 del mes de febrero del 2025

13. INSPECCIONES

13.1. Inspección de vehículos y maquinaria

Las inspecciones de seguridad y pre operacionales de maquinaria son estrategias preventivas implementadas por la empresa para identificar peligros y controlar riesgos antes de que puedan ocasionar daños a los trabajadores o afectar el entorno donde se desarrollan las actividades.

A través de estas inspecciones se busca:

- Verificar el estado mecánico y operativo de la maquinaria.
- Detectar posibles fallas o condiciones inseguras que puedan generar accidentes.
- Asegurar que los equipos cumplan con las normas de seguridad y mantenimiento establecidas.
- Evaluar el correcto uso de los sistemas de protección y dispositivos de seguridad de la maquinaria.

Estas inspecciones son realizadas antes del inicio de cada jornada laboral o previo a la operación de cualquier equipo, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento y minimizar riesgos.

Se lleva un registro detallado de cada inspección y documentando.

13.2. Registro de maquinaria en el mes de junio

NOMBRE	CODIGO
Volqueta	OWH 749
Volqueta	OZD 276
Volqueta	OWH 442
Motoniveladora	710 A
Retro excavadora	CAT 320 CL
Vibrocompactador	CA 152
Finisher	Rodatec

ANEXO 10. Inspección pre operacional

Registro fotográfico







13.3. Inspecciones de equipos de emergencia

En el mes de junio se realizan inspecciones a los equipos de emergencia con el objetivo de verificar su estado, funcionamiento y disponibilidad, garantizando una respuesta efectiva ante cualquier eventualidad en la obra.

En la locación contamos con

- Camilla de emergencia con inmovilizador cervical
- Extintores
- Botiquines
- Kit antiderrame
-

ANEXO 11. Inspección equipos de emergencia

13.4. Registro fotográfico



14. DOTACION Y EPP

En cumplimiento de las normativas de seguridad y salud en el trabajo, se ha realizado la entrega de dotación y elementos de protección personal (EPP) a los trabajadores vinculados a la obra, garantizando su seguridad y bienestar durante la ejecución de las actividades.

La dotación y los EPP suministrados cumplen con los estándares de calidad y normativas vigentes, asegurando su adecuada protección. Entre los elementos entregados se encuentran:

- Protección para la cabeza: Casco de seguridad con suspensión ajustable.
- Protección ocular y facial: Gafas de seguridad
- Protección auditiva: Tapones o protectores auditivos.
- Protección respiratoria: Tapabocas.
- Protección de manos: Guantes de seguridad

- Protección corporal: Pantalón, camisas y chaleco reflectivo para alta visibilidad.
- Protección de pies: Botas de seguridad con puntera de acero.

Se ha registrado la entrega de los elementos a cada trabajador mediante actas de recepción firmadas, como también se capacita al personal en el uso correcto de los elementos entregados y su mantenimiento.
El suministro y control de la dotación y los EPP hacen parte del compromiso de la empresa con la seguridad y salud en el trabajo, minimizando riesgos y garantizando el cumplimiento de la normativa vigente.

ANEXO 12. Registros entrega de epp y dotación

15.1. Registro fotográfico.





15. ACCIDENTES DE TRABAJO

Un accidente de trabajo es todo suceso que cause daño o perjuicio a la salud del trabajador mientras desempeña sus actividades laborales, ya sea en el lugar de trabajo o durante el desempeño de las labores, siempre que exista una relación directa con la actividad laboral.

Durante el periodo del mes de junio se presentó un accidente de trabajo.

ANEXO 13. Accidente de trabajo

16. MATRIZ DE INDENTIFICACION DE PELIGROS

La Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos (IPER) es una herramienta fundamental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), mediante la cual se identifican, analizan y valoran los riesgos a los que están expuestos los trabajadores durante el desarrollo de sus actividades laborales.

Esta matriz permite determinar el nivel de riesgo de cada actividad, establecer controles existentes y proponer medidas de intervención para prevenir accidentes, enfermedades laborales y daños a la propiedad o al medio ambiente.

NOTA: La matriz de identificación de peligros y valoración de los riesgos reposa en el informe No.2 del mes de marzo del 2025

17. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTION AMBIENTAL

Es un instrumento de planificación y ejecución ambiental diseñado para garantizar la incorporación efectiva de criterios de sostenibilidad ambiental en el proyecto, desde la etapa de diseño hasta la construcción, operación, mantenimiento y cierre. Este programa busca prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales negativos derivados de actividades humanas.

El DAGA no solo busca cumplir con las exigencias legales y normativas ambientales, sino también establecer una cultura organizacional orientada al

respeto por el medio ambiente, al uso eficiente de los recursos y a la participación de todo el personal del proyecto.

17.1. Conformación del grupo de gestión social y ambiental

La brigada del grupo de gestión ambiental se encuentra conformada , garantizando el cumplimiento y desarrollo eficaz de las acciones propuestas en cada programa de la GUIA Ambiental (PAGA).

ANEXO 10. Acta de Conformación del Grupo Ambiental

17.1.1. Indicador

(4/4) *100= 100% Siendo (Número de profesionales contratados/Número de profesionales Requeridos)

*100 donde los valores > 100 demuestran el cumplimiento del indicador.

17.2. Capacitación ambiental al personal en obra

Durante el mes de junio, se llevaron a cabo charlas de sensibilización ambiental dirigidas al personal operativo y técnico de la obra, con enfoque en los siguientes temas clave:

- Clasificación Adecuada de los residuos. (orgánicos, inorgánicos reciclables, peligrosos).
- Prácticas de orden y aseo en frentes de trabajo y zonas comunes.

Estas actividades formaron parte de las acciones del Programa de Desarrollo y Aplicación de la Gestión Ambiental (DAGA), con el objetivo de reducir los impactos ambientales generados por las actividades constructivas, promover el cumplimiento de las medidas del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y fomentar una cultura ambiental responsable dentro del equipo de trabajo.

NOTA: ver anexo 6 asistencia charlas

17.2.1. Indicador

(2/2) *100= 100% Siendo (Número de profesionales contratados/Número de profesionales Requeridos

*100 donde los valores > 100 demuestran el cumplimiento del indicador.

17.3. Cumplimiento de los requisitos legales

En cumplimiento de la normativa ambiental vigente para el desarrollo del proyecto, se cuenta con el abastecimiento de materiales provenientes de las empresas **Construcciones Lagos Ltda y pavimentos y construcciones OMEGA LMTA.**, las cuales poseen un título minero vigente que la habilita legalmente para la explotación y comercialización de materiales de construcción.

Estas empresas cumplen con los requisitos establecidos en la normativa ambiental y minera, garantizando que los materiales suministrados al proyecto:

- Provienen de fuentes autorizadas y con licencia ambiental.
- Cuentan con los permisos y autorizaciones requeridos por la autoridad competente.
- Se extraen bajo criterios técnicos y ambientales que minimizan el impacto al entorno natural.

El abastecimiento responsable de materiales es una parte fundamental del Programa de Desarrollo y Aplicación de la Gestión Ambiental (DAGA), ya que contribuye al cumplimiento de los requisitos legales, al uso sostenible de los recursos naturales y a la trazabilidad de las materias primas utilizadas en obra.

Nota: Titulo minero y licencia ambiental reposa en el informe # 3 ANEXO 12.

17.3.1. Indicador

(2/2) *100= 100% Siendo (Número de Permisos otorgados /Número de Permisos requeridos

*100 donde los valores > 100 demuestran el cumplimiento del indicador.

ANEXO 16. Titulo minero

18. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

18.1. Almacenamiento y manejo integral de los materiales de construcción.

Durante el periodo correspondiente al mes de junio, evidencio 1 acopio temporal de materiales en obra. Todos los materiales requeridos para las actividades constructivas son transportados directamente desde la planta de producción

(empresa Construcciones Lagos Ltda.) hasta los puntos específicos de utilización en el frente de trabajo.

Esta modalidad de operación responde a una estrategia de optimización logística y ambiental, con los siguientes beneficios:

- Reducción de riesgos ambientales asociados al almacenamiento prolongado de materiales (dispersión de partículas, escurrimientos, contaminación del suelo).
- Minimización del uso de áreas de acopio, evitando la afectación de zonas naturales o espacios improductivos.
- Mejor control del volumen de materiales ingresados y utilizados, lo que contribuye a una gestión más eficiente de los recursos.

18.1.1. Indicador

(2/2)*100 Número de acopios debidamente demarcados y señalizados / Número de acopios de material de obra

*100 donde los demuestran que no fueron establecidos para este periodo.

18.2. Registro fotográfico



18.3. Señalización frentes de obra y sitios temporales

De acuerdo al plan de manejo de tránsito (PMT) La señalización de la obra es un elemento fundamental para garantizar la seguridad de los trabajadores, peatones y conductores que transitan por la zona de intervención. Su correcta implementación permite informar, advertir y regular la circulación, minimizando riesgos y evitando accidentes.

La señalización vial debe cumplir con las normativas vigentes y ser visible en todo momento, asegurando que los usuarios de la vía puedan identificar oportunamente las condiciones del tránsito y las restricciones generadas por la obra.

Diariamente se realiza una verificación de la señalización para garantizar su correcto estado y visibilidad, asegurando que:

- Las señales estén bien ubicadas y en condiciones óptimas.
- Los dispositivos de seguridad cumplan su función.
- Se implementen ajustes según el avance de la obra y las condiciones del tráfico.

La correcta aplicación de la señalización en obra vial contribuye a la prevención de accidentes y al ordenamiento del tránsito, garantizando un entorno seguro para todos los involucrados.

18.3.1. Indicador

(2/2)*100 Número de acopios debidamente demarcados y señalizados / Número de acopios de material de obra

*100 donde los demuestran el cumplimiento de este indicador para este periodo.

18.4. Presupuesto PMT

Descripción	Unidad	Cantidad
Barricada de listones, con tablero "SEÑAL VÍA CERRADA"	UND	0
Paleta de control PARE-SIGA	UND	0
Señal INICIO DE OBRA (Velocidad menor o igual de 50km/h)	UND	0
Señal FIN DE OBRA (Velocidad menor o igual de 50km/h)	UND	0
Señal SPO-1 TRABAJOS EN LA VÍA (Velocidad menor o igual de 50km/h) Vía rural	UND	0
Señal SPO-02 MAQUINARIA EN LA VÍA (Velocidad menor o igual de 50km/h) Vía rural	UND	0
Señal SPO-03 AUXILIAR DE TRÁNSITO (Velocidad menor o igual de 50km/h) Vía rural	UND	0
Delineador compuesto separado cada 11 metros	UND	0
Cinta de demarcación (500m)	UND	0
Radio teléfono Banda VHF (Frecuencia 151-161 MHZ) Banda UHF (Frecuencia 462-469 MHZ) 8 Canales	UND	0
Chalecos reflectivos	UND	0
Planos Plan de Manejo de Tráfico	UND	0

18.4. Registro fotográfico



18.5. PRESUPUESTO PMA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD:
I-GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL		
Descripción	Unidad	Cantidad
Reuniones informativas con la comunidad del Área de influencia directa e indirecta del proyecto - socialización de inicio, avance y fin de obra	Und	0
II-CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES		
Descripción	Unidad	Cantidad
Baños Portátiles (Incluye mantenimiento y disposición de aguas residuales)	mes	0
III-PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS INTERVENIDAS		
Descripción	Unidad	Cantidad
Desmantelamiento obras provisionales	m2	0
Restauración de las áreas intervenidas (zonas de depósito, campamento y acopio de material sobrante)	m2	0
Riego de plantas tapizantes, de cobertura y de empradización durante cuatro meses desde el primer día, cada ocho días (10 lts)	m2	0
IV-MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DIFERENTES A ESCOMBROS Y LODOS		
Descripción	Unidad	Cantidad
Kit para desperdicios sólidos (Incluye kits antiderrames, cubrimientos y señalización de la obra, cinta de peligro, avisos proximidad)	Und	
V-ATENCIÓN E INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD		
Descripción	Unidad	Cantidad
Talleres ambientales dirigidos a los centros educativos ubicados en el área de influencia del proyecto	Und	0
VI-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
Descripción	Unidad	Cantidad
Kit de primeros auxilios y extintores	Und	0

18.6. Manejo y disposicion final de escombros

Durante este periodo se han gestionado diferentes Permisos para la Disposición Final del Material de excavación, el cual autoriza la disposición adecuada de los residuos y materiales sobrantes generados durante la ejecución de la obra.

NOMBRE	PERMISO Y /O AUTORIZACION	FECHA / ENTIDAD APROBATORIA
JUAN CARLOS MEDINA ROBLES	Autorización para el suministro de material de excavación para ser acopiado en predio del municipio	17 marzo del 2025 Sec. General y de gobierno Alcaldía de Tello- Huila

NOTA: el permiso reposa en el informe No. 2 del mes de marzo del 2025

18.6.1. Indicador

(67 m3 /67 m3 *100= 100% Siendo (Volumen de materiales de escombro excavación de cajeo tramo 18 dispuestos /Volumen de material de escombro generado excavación de cuneta tramo 18)
*100 donde los valores > 100 demuestran el cumplimiento del indicador.

18.7. Manejo y disposición de residuos sólidos convencionales y especiales

Como parte de las estrategias de gestión ambiental, se ha implementado un Punto Ecológico dentro de la obra, con el propósito de promover la separación adecuada de residuos y minimizar el impacto ambiental generado por las actividades laborales.

El punto ecológico se establece con el fin de:

- Facilitar la clasificación y disposición adecuada de los residuos generados en la obra.
- Fomentar la cultura de reciclaje y el manejo responsable de los desechos.

- Contribuir a la reducción de la contaminación ambiental.
- Cumplir con la normativa ambiental vigente en cuanto a gestión de residuos.

El adecuado funcionamiento del **Puntos Ecológico** refleja el compromiso del consorcio con la **gestión ambiental sostenible**, promoviendo una cultura de responsabilidad ecológica dentro del entorno laboral.

La entidad encargada de realizar la recolección de residuos es **EMPRESAS PUBLICAS DE TELLO (EPT)**

18.8. Registro fotográfico



18.9. Orden y Aseo

El mantenimiento del orden y aseo en el área de trabajo es fundamental para garantizar un ambiente seguro, eficiente y saludable dentro de la obra. Estas acciones permiten prevenir accidentes, mejorar la productividad y asegurar el cumplimiento de las normas de **Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y gestión ambiental.**

las jornadas de orden y aseo tienen como finalidad:

- prevenir accidentes laborales causados por desorden o acumulación de materiales.
- Mantener los diferentes frentes de trabajo organizados, facilitando la movilidad del personal y el almacenamiento adecuado de implementos de obra.
- Cumplir con normativas ambientales, promoviendo una correcta separación y disposición de residuos.

La entidad encargada de realizar la recolección de residuos es **EMPRESAS PUBLICAS DE TELLO (EPT)**

El compromiso con el **orden y aseo** no solo mejora la seguridad y eficiencia operativa, sino que también refuerza una cultura de prevención de riesgos y responsabilidad ambiental dentro de la empresa.

NOTA: La solicitud de recolección de residuos reposa en el informe No. 1 y el acta de conformación de brigada de orden y aseo fue actualizada para este periodo.

ANEXO. 14. Actualización Brigada de Orden y Aseo.

18.10. Registro fotográfico





19. GESTION RECURSO HIDRICO

19.1. Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales

Para el periodo del mes de junio no contamos con baterías sanitarias.

20. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES

Durante la ejecución del proyecto, se ha dispuesto la instalación de infraestructura temporal para el soporte de las actividades constructivas, en cumplimiento con los lineamientos del Plan de Manejo Ambiental y el Programa de Desarrollo y Aplicación de la Gestión Ambiental (DAGA).

El proyecto cuenta con un **campamento de obra debidamente establecido en el Tramo 17**, específicamente en el **sector de Los Guásimos**. Este campamento cumple la función de centro operativo para el personal técnico y operativo del proyecto, y se encuentra adecuadamente habilitado para apoyar las actividades constructivas en la zona.

20.1. Indicador

(1/1)*100 Número de acopios debidamente demarcados y señalizados / Número de acopios de material de obra

*100 donde los demuestran que no fueron establecidos para este periodo.

20.2. Manejo de maquinaria equipos y vehículos

El mantenimiento mensual de la maquinaria se basa en el **cambio de filtros y aceite cada 250 horas de operación**. Este procedimiento se realizará **en el sitio de trabajo**, con la excepción de las volquetas, cuyo mantenimiento se llevará a cabo en el taller correspondiente.

Para garantizar una adecuada gestión ambiental, los **aceites y filtros usados** serán recolectados en **recipientes específicos** y almacenados en **sitios adecuados** para su correcta disposición final, cumpliendo con las normativas ambientales vigentes y evitando la contaminación del entorno.

20.3. Registro de maquinaria del mes de junio

NOMBRE	CODIGO
Volqueta	OWH 749
Volqueta	OZD 276
Volqueta	OWH 442
Motoniveladora	710 A
Retro excavadora	CAT 320 CL
Vibrocompactador	CA 152
Finisher	Rodatec

NOTA: el anexo de este numeral reposa en el informe No.1 del mes de febrero del 2025.

20.4. Indicador

(4/4)*100 Número de volquetas con revisión tecno mecánica vigente / Número total de volquetas utilizadas en el mes. X 100 donde los demuestran que no fueron establecidos para este periodo.

21. GESTIÓN SOCIAL

21.1. Localización del proyecto

El proyecto se encuentra ubicado en el departamento del Huila entre el cruce de Villavieja (cucara) y la cabecera municipal de Tello, consiste en el mantenimiento del 5,33 kilómetro de vía en los sectores más deteriorados de la misma distribuidos en 25 tramos seleccionados previamente, de acuerdo a ales necesidades.

El proyecto tiene como objetivo la construcción de 5,33 km de pavimento flexible, donde se incluye el fresado de pavimento asfáltico, conformación de calzada, construcción de estructura de pavimento en base y sub base granular, mezcla densa en caliente MDC-19, riego de imprimación, construcción de filtros, fundición cunetas, muros en gaviones y líneas de demarcación para la señalización horizontal.


21.2. Proyecto de atención a la comunidad


El punto de atención al ciudadano se encuentra ubicado en el tramo 17 ubicado en el sector los guásimos, donde se atiende a la comunidad y personal de obra y los PQRS. De igual manera se recibe y atiende via correo electrónico para mayor facilidad.

El PAC se encuentra dotado por escritorios, sillas, computador, impresora, tableros, archivadores, todo esto con el fin de dar la mejor atención a la comunidad.

Para el mes de junio no se recibieron PQRS

21.2.1. Registro fotográfico

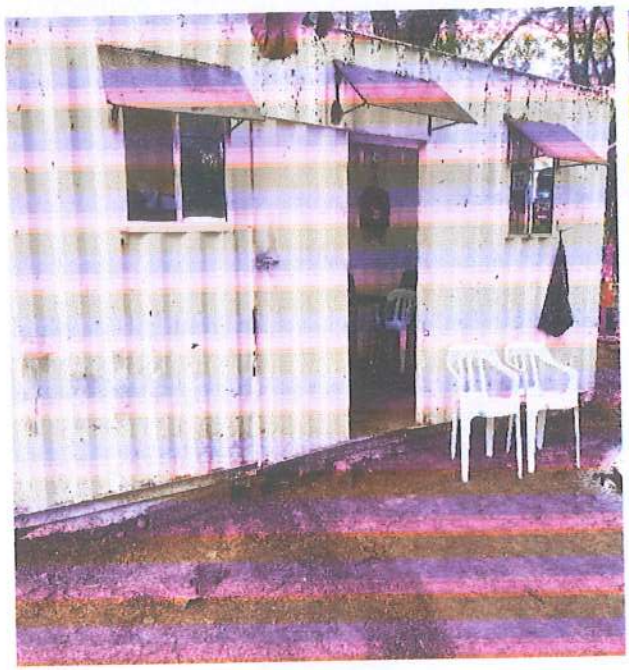

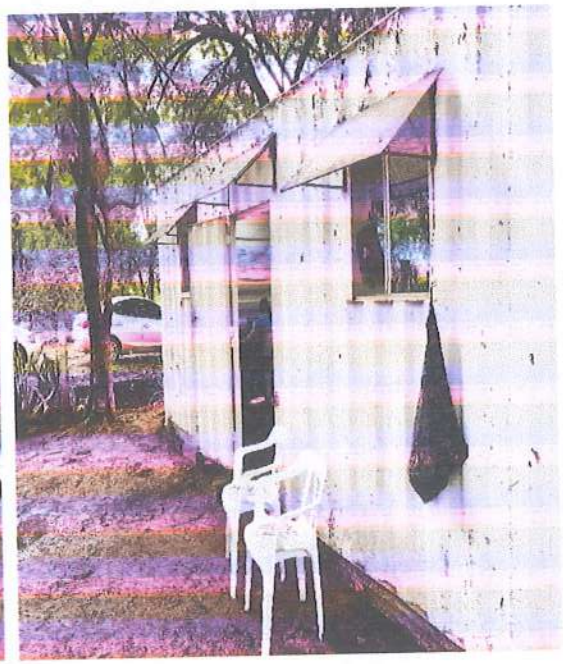

VEEDURÍA SOCIAL POR TELLO		
NOMBRE	**C.C**	**CARGO**
OSCAR IVÁN MARTÍNEZ	83.242.784	N/A
JOSÉ EDGAR TELLO BERRIO	12.225.095	N/A
RAÚL CARDOZO RODRÍGUEZ	4.942.911	N/A

NOTA: El anexo de la conformación de las veedurías reposa en el informe No. 1 del mes de febrero del 2025

21.5. Directorio del municipio de Tello

A continuación, se relaciona las entidades públicas para las atenciones a la comunidad

NOMBRE	CARGO	E-MAIL	CONTACTO
Fernando Alipio Solano G	Alcalde Municipal	contactenos@tello-huila.gov.co	3209013619
Edna Lorena Diaz	Secretaria de planeación	contactenos@tello-huila.gov.co	3123668197
Juan Carlos Medina R	Secretario general y de gobierno	contactenos@tello-huila.gov.co	3228169110
Erit Francisco	Comisario de familia	contactenos@tello-huila.gov.co	3228169110
Ivon Duarte	Inspector de policía	contactenos@tello-huila.gov.co	3228169110
Maidy Cangrejo Quintero	Personería	Personeria@tello-huila.gov.co	3158232480
Yuli Paola González	Gerente	contactenos@esemiguelbarretolopez.gov.co	3185672046

	Miguel Barreto López		
Bomberos	Cuerpo voluntario de Tello	bomberosvoluntariosdetello@gmail.com	3144835629

21.6. Contratación mano de obra

listado del personal contratado de la región para la ejecución del proyecto

PERSONAL DE LA ZONA			
NOMBRE	**CEDULA**	**CARGO**	**MUNICIPIO**
ANLLY ASTRRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Tello
MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	Tello
MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Tello
SMITH SAMARA ESPINOSA VALDERRAMA	1.082.807.042	PALETERA	Tello
DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Baraya
KELLYA YARETH MURCIA SOTO	1.075.296.777	AUXILIAR SST	Tello
ISIDRO MANJARRES VANEGAS	11.323.894	CELADOR	Tello
RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Tello
YASMIN ROCIO MARTINES MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Tello
NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Baraya
MILLER SANCHEZ	4.890.672	CONDUCTOR VOLQUETA	Fortalecillas
EDINSON MENDEZ PERDOMO	1.082.806.583	AYUDANTE	Tello

EVERLEDETH REYES ROCHA	4.943.631	AYUDANTE	Tello

21.6.1. Indicador

(12/12)*100 Número de trabajadores contratados del área de influencia/por Número de trabajadores en obra x100% donde los valores > 100 demuestran el cumplimiento del indicador.

21.7. Perfil sociodemográfico

La caracterización sociodemográfica del personal que participa en el desarrollo del proyecto tiene como propósito identificar y comprender las condiciones sociales, culturales, educativas y de salud que pueden incidir directa o indirectamente en la gestión de los riesgos laborales y en el desempeño de las actividades. Esta información permite establecer estrategias más eficaces de intervención, promoción y prevención desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo.

la población trabajadora vinculada al proyecto presenta una composición diversa en términos de edad, nivel educativo, procedencia y condiciones de salud. Esta diversidad implica una responsabilidad institucional en la adopción de medidas de gestión del riesgo que consideren las características individuales y colectivas del recurso humano, priorizando estrategias de intervención ajustadas al perfil real de los trabajadores.

ANEXO 15. Perfil sociodemográfico

ANEXO 1. INDUCCIONES SST

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPN TELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

REGISTRO DE ASISTENCIA				
TEMA	Induccion SST			
HORA	2:15 - 3:20.			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1.	JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	93.129.015	CADENERO 1	

FIRMA PROFESIONAL SST: _____

NOMBRE: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA				
TEMA	Induccion SST.			
HORA	7:15 - 3:25.			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1.	AVICELVIS VALDERRAMA SALAZAR	1.075.215.724	AYUDANTE	Avicelvis Valderrama.

FIRMA PROFESIONAL SST: _____

NOMBRE: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPN TELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

REGISTRO DE ASISTENCIA				
TEMA	Inducción SST.			
HORA	7:15 - 7:25.			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1.	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	

FIRMA PROFESIONAL SST: _____

NOMBRE: _____

Powered by CamScanner

ANEXO 2. EXAMENES DE INGRESO



CLIPSALUD IPS S.A.S

Nit: 900304743-4
Calle 18 No 5ª-48 NEIVA - HUILA . TEL (8) 874 5789. CEL: 3182917591
Barrio Quirinal - www.clipsalud.com

Identificacion	Codigo Unico Paciente:
1075225724	45391

Nombre Paciente: Avicelvis Valderrama Salazar

Fecha Nacimiento: 11/04/2005

Empresa: INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS

Direccion: CALLE 28 SUR # D 26A 36 | Acompañante: NO REFIERE | Teléfono:No Refiere

Ingreso Nro.	Sexo:	Edad:		Estado Civil:	Nivel Educativo:	Ciudad:	Fecha Consulta
68014	Masculino	20	Años	Union Libre	10 - 11 (Media Tecnica)	NEIVA	04/06/2025 07:54:33

Objetivo:	Ingreso	E.P.S.:	ASMED SALUD	A.R.L.:	NO REFIERE	Cargo:	AYUDANTE
Contrato:		Clasificacion del Riesgo:		CLASE II		Estrato:	[2] - Bajo

CONCEPTO DE APTITUD LABORAL

Los Resultados de Paraclinicos y Valoracion del Paciente fueron consignados en una Historia Clinica Ocupacional que reposa en los archivos de Salud Ocupacional de la IPS. Y se obtuvo el siguiente resultado:

CONCEPTO INGRESO:

☑	APTO para el Cargo
☐	No APTO para el Cargo
☐	Aplazado

TRABAJOS ESPECIALES:

Alturas	
Espacios Confinados	
Manipulacion de Alimentos	

CONCEPTO EGRESO:

☐	Satisfactoria		
☐	No Satisfactoria		
Valoracion por:	E.P.S. ☐	A.R.L. ☐	

☐ PERIODICO, CAMBIO DE OCUPACION O POST-INCAPACIDAD ☐ Reubicar Trabajador ☐ Continua en el Cargo

PREVENCION EN RIESGO LABORALES - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

☐ Auditivo ☐ Visual ☐ CardioVascular ☐ Respiratorio ☐ Ergonomico ☐ Dermatologia ☐ Otros

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES EXAMENES Y/O PROCEDIMIENTOS

Se Realizaron los siguientes examenes: EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO, GLICEMIA EN SANGRE, PERFIL LIPÍDICO COMPLETO (TRIGLICÉRIDOS, COLESTEROL TOTAL, HDL Y LDL), VISIOMETRIA, AUDIOMETRIA OCUPACIONAL.

DESCRIPCION RESULTADOS DEL CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

Apto para el cargo..

RESTRICCIONES

Ninguna para el Cargo

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

MANTENER UN PESO SALUDABLE MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE HÁBITOS ALIMENTICIOS EQUILIBRADOS Y ACTIVIDAD FÍSICA REGULAR.USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ,REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGÚN PROTOCOLO DE LA EMPRESA , ALTERNAR POSTURAS DURANTE JORNADA LABORAL

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVAS A LOS EXAMENES: Las Resoluciones 2346 del 11 de julio de 2007 y 1918 de Junio 5 de 2009 del Ministerio de Trabajo y Protección Social, reglamenta la práctica de las evaluaciones médicas con el objeto de monitorear la exposición a los factores de riesgo ocupacional e identificar posibles alteraciones temporales, permanentes o agravamiento del estado de salud del trabajador, ocasionadas por la labor o por el medio ambiente de trabajo, y para detectar precozmente enfermedades de origen común, con el fin de establecer un manejo preventivo. También establece que la Empresa solo puede conocer el CERTIFICADO MEDICO del aspirante. Los documentos completos de la Historia Clinica Ocupacional están sometidos a reserva profesional y quedan bajo nuestra guarda y custodia, acorde con lo establecido en la Resolución 1918 de Junio 5 de 2009 y el trabajador puede obtener una copia de ellos cuando lo requiera, entendiendo que hacen parte integral de su historial médico.

Carolina Losada

Carolina Losada Peña - C.C. 1127625985 / RM: RM. 9164/2021
UCMG - CUBA Resolución SST 6896/2022

04/06/2025 13:08:37
Generado por SGMI - TERRASOFT, NIT 74814574-9, www.terrasoft.co

Avicelvis

Firma y Huella del Paciente o Responsable



Indice Derecho

Importante: Valide su certificado de aptitud en www.clipsalud.com Opción RESULTADOS EN LINEA NEIVA



CLIPSALUD IPS S.A.S

Nit: 900304743-4
Calle 18 No 5ª-46 NEIVA - HUILA . TEL (8) 874 5789. CEL: 3182917591
Barrio Quirinal - www.clipsalud.com

Identificacion	Codigo Unico Paciente:
1075242622	45414

Nombre Paciente: Haner Alberto Gallego Mejia

Empresa: INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS

Fecha Nacimiento: 28/12/1989

Direccion: calle 8 # 100 - 75 | Acompañante: NO REFIERE | Teléfono:No Refiere

Ingreso Nro.	Sexo:	Edad:		Estado Civil:	Nivel Educativo:	Ciudad:	Fecha Consulta
68061	Masculino	35	Años	Soltero	Profesional Universitario	NEIVA	06/06/2025 08:52:39

Objetivo:	Ingreso	E.P.S.:	NUEVA EPS	A.R.L.:	NO REFIERE	Cargo:	TOPOGRAFO
Contrato:		Clasificacion del Riesgo:		CLASE II		Estrato:	[2] - Bajo

CONCEPTO DE APTITUD LABORAL

Los Resultados de Paraclinicos y Valoracion del Paciente fueron consignados en una Historia Clinica Ocupacional que reposa en los archivos de Salud Ocupacional de la IPS. Y se obtuvo el siguiente resultado:

CONCEPTO INGRESO:

☑	APTO para el Cargo
☐	No APTO para el Cargo
☐	Aplazado

TRABAJOS ESPECIALES:

Alturas	
Espacios Confinados	
Manipulacion de Alimentos	

CONCEPTO EGRESO:

☐	Satisfactoria		
☐	No Satisfactoria		
Valoracion por:	E.P.S. ☐	A.R.L. ☐	

☐ PERIODICO, CAMBIO DE OCUPACION O POST-INCAPACIDAD ☐ Reubicar Trabajador ☐ Continua en el Cargo

PREVENCION EN RIESGO LABORALES - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

☐ Auditivo ☐ Visual ☐ CardioVascular ☐ Respiratorio ☐ Ergonomico ☐ Dermatologia ☐ Otros

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES EXAMENES Y/O PROCEDIMIENTOS

Se Realizaron los siguientes examenes: EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO, GLICEMIA EN SANGRE, PERFIL LIPÍDICO COMPLETO (TRIGLICÉRIDOS, COLESTEROL TOTAL, HDL Y LDL), VISIOMETRIA, AUDIOMETRIA OCUPACIONAL.

DESCRIPCION RESULTADOS DEL CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

Apto para el cargo..

RESTRICCIONES

Ninguna para el Cargo

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

GENERALES: Higiene Postural, Utilizacion EPP. SEGUN I.M.C.: Dieta , Ejercicio Regular, Valoracion Por Nutricion.

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVAS A LOS EXAMENES: Las Resoluciones 2346 del 11 de julio de 2007 y 1918 de Junio 5 de 2009 del Ministerio de Trabajo y Protección Social, reglamenta la práctica de las evaluaciones médicas con el objeto de monitorear la exposición a los factores de riesgo ocupacional e identificar posibles alteraciones temporales, permanentes o agravamiento del estado de salud del trabajador, ocasionadas por la labor o por el medio ambiente de trabajo, y para detectar precozmente enfermedades de origen comun, con el fin de establecer un manejo preventivo. También establece que la Empresa solo puede conocer el CERTIFICADO MEDICO del aspirante. Los documentos completos de la Historia Clinica Ocupacional están sometidos a reserva profesional y quedan bajo nuestra guarda y custodia, acorde con lo establecido en la Resolución 1918 de Junio 5 de 2009 y el trabajador puede obtener una copia de ellos cuando lo requiera, entendiendo que hacen parte integral de su historial médico.

Juan Sebastian Bermeo Parra - C.C. 1081156875 / RM: Rm. 1081156875/2016 Ucco

06/06/2025 15:03:03
Generado por SGMI - TERRASOFT. NIT 74814574-9. www.terrasoft.co

Firma y Huella del Paciente o Responsable

Indice Derecho

Importante: Valide su certificado de aptitud en www.clipsalud.com Opción RESULTADOS EN LINEA NEIVA



CLIPSALUD IPS S.A.S

Nit: 900304743-4
Calle 18 No 5ª-48 NEIVA - HUILA . TEL (8) 874 5789. CEL: 3182917591
Barrio Quirinal - www.clipsalud.com

		Identificacion	Codigo Unico Paciente:
Nombre Paciente:	Joaquin Marcelo Guzman Sanchez	93129015	45447
Empresa:	INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS	**Fecha Nacimiento:**	01/04/1973
Direccion:	CHAPARRAL | Acompañante: NO REFIERE | Teléfono:No Refiere		

Ingreso Nro.	Sexo:	Edad:		Estado Civil:	Nivel Educativo:	Ciudad:	Fecha Consulta
68125	Masculino	52	Años	Casado	10 - 11 (Media Tecnica)	NEIVA	09/06/2025 09:35:38

Objetivo:	Ingreso	**E.P.S.:**	SANITAS	**A.R.L.:**	NO REFIERE	**Cargo:**	CADENERO
Contrato:			**Clasificacion del Riesgo:**		CLASE II	**Estrato:**	[2] - Bajo

CONCEPTO DE APTITUD LABORAL

Los Resultados de Paraclinicos y Valoracion del Paciente fueron consignados en una Historia Clinica Ocupacional que reposa en los archivos de Salud Ocupacional de la IPS. Y se obtuvo el siguiente resultado:

CONCEPTO INGRESO:

☑	APTO para el Cargo
☐	No APTO para el Cargo
☐	Aplazado

TRABAJOS ESPECIALES:

Alturas	
Espacios Confinados	
Manipulacion de Alimentos	

CONCEPTO EGRESO:

☐	Satisfactoria		
☐	No Satisfactoria		
Valoracion por:	E.P.S. ☐	A.R.L. ☐	

☐ PERIODICO, CAMBIO DE OCUPACION O POST-INCAPACIDAD ☐ Reubicar Trabajador ☐ Continua en el Cargo

PREVENCION EN RIESGO LABORALES - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

☐ Auditivo ☐ Visual ☐ CardioVascular ☐ Respiratorio ☐ Ergonomico ☐ Dermatologia ☐ Otros

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES EXAMENES Y/O PROCEDIMIENTOS

Se Realizaron los siguientes examenes: EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO, GLICEMIA EN SANGRE, PERFIL LIPÍDICO COMPLETO (TRIGLICÉRIDOS, COLESTEROL TOTAL, HDL Y LDL), AUDIOMETRIA OCUPACIONAL, VISIOMETRIA.

DESCRIPCION RESULTADOS DEL CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

Apto para el cargo con recomendaciones

RESTRICCIONES

Ninguna para el Cargo

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

MANTENER UN PESO SALUDABLE MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE HÁBITOS ALIMENTICIOS EQUILIBRADOS Y ACTIVIDAD FÍSICA REGULAR. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ,REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGÚN PROTOCOLO DE LA EMPRESA , ALTERNAR POSTURAS DURANTE JORNADA LABORAL , USO DE CORRECION OPTICA PERMANENTE,CONTROL ANUAL POR OPTOMETRIA,REALIZAR AUDIOMETRIA CLINICA COMFIRMATORIA CONTROL AUDIOLOGICO SEMESTRAL .

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVAS A LOS EXAMENES: Las Resoluciones 2346 del 11 de julio de 2007 y 1918 de Junio 5 de 2009 del Ministerio de Trabajo y Protección Social reglamenta la práctica de las evaluaciones médicas con el objeto de monitorear la exposición a los factores de riesgo ocupacional e identificar posibles alteraciones temporales, permanentes o agravamiento del estado de salud del trabajador, ocasionadas por la labor o por el medio ambiente de trabajo. y para detectar precozmente enfermedades de origen común, con el fin de establecer un manejo preventivo. También establece que la Empresa solo puede conocer el CERTIFICADO MEDICO del aspirante. Los documentos completos de la Historia Clínica Ocupacional están sometidos a reserva profesional y quedan bajo nuestra guarda y custodia, acorde con lo establecido en la Resolución 1918 de Junio 5 de 2009 y el trabajador puede obtener una copia de ellos cuando lo requiera, entendiendo que hacen parte integral de su historial médico

Carolina Losada

Carolina Losada Peña - C.C. 1127625985 / RM: RM. 9184/2021
UCMG - CUBA Resolución SST 6896/2022

09/06/2025 15:35:17
Generado por SGMI - TERRASOFT.
NIT. 74814574-9. www.terrasoft.co

Firma y Huella del Paciente o Responsable



Indice Derecho

Importante: Valide su certificado de aptitud en www.clipsalud.com Opción RESULTADOS EN LINEA NEIVA

ANEXO 3. EXAMENES DE EGRESO

INGEMAQ M&A S.A.S
Ingeniería Civil y Maquinaria Pesada

DESISTIMIENTO DE LA PRACTICA DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE EGRESO

Neiva, 5 de junio 2025

Señores:
INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS

Asunto: Examen médico ocupacional de Egreso

Por medio de la presente Yo, **CARLOS ALBERTO LUCUARA PARRACAI**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. **12.127.850** expedida en Neiva, quien desempeño funciones hasta la fecha 4 de junio del 2025, en el cargo de **CADENERO** manifiesto que por voluntad propia y por razones ajenas a la empresa desisto a realizarme el examen médico de egreso y eximo de toda responsabilidad a la empresa INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS.

Cordialmente

CARLOS ALBERTO LUCUARA PARRACAI
C.C No. 12.127.850

Powered by CamScanner



DESISTIMIENTO DE LA PRACTICA DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE EGRESO

Neiva, 5 de junio 2025

Señores:
INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS

Asunto: Examen médico ocupacional de Egreso

Por medio de la presente Yo, **JAIME TRUJILLO SALAZAR**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. **4.945.986** expedida en Neiva, quien desempeño funciones hasta la fecha 4 de junio del 2025, en el cargo de **TOPOGRAFO** manifiesto que por voluntad propia y por razones ajenas a la empresa desisto a realizarme el examen médico de egreso y eximo de toda responsabilidad a la empresa INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS.

Cordialmente

JAIME TRUJILLO SALAZAR
C.C No. 4.945.986

Powered by CamScanner

ANEXO 4. AFILIACIONES

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

CERTIFICA QUE:

AVICELVIS VALDERRAMA SALAZAR, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.075.225.724**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.**

La presente certificación se expide el 5 de Junio del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

CERTIFICA QUE:

HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.075.242.622**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.**

La presente certificación se expide el 11 de Junio del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

CERTIFICA QUE:

JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **93.129.015**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir.**

La presente certificación se expide el 11 de Junio del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co *y actualice su Historia Laboral.*

ARL | sura

Medellín, 05 de June de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL HUILA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1075225724	VALDERRAM SALAZAR AVICELVIS	06/06/2025		205G1601	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 05/06/2025 08:04:06 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.158.248.29, 192.230.104.8, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARL | sura

Medellín, 06 de June de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL HUILA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1075242622	GALLEGO MEJIA HANER ALBERTO	07/06/2025		38aD2501	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 06/06/2025 10:28:38 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.158.248.29, 198.143.41.29, 172.16.42.57

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

ARL | sura

Medellín, 10 de June de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL HUILA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C93129015	GUZMAN SANCHEZ JOAQUIN MARCELO	11/06/2025		9520255C	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 10/06/2025 11:13:55 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.158.248.29, 198.143.41.29, 172.16.42.57

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

EPS Sanitas

Bogota 16.06.2025

Señores,
INGENIERIA Y EQUIPOS M Y A SAS - NI 901759608
Ciudad

Asunto : CERTIFICADO DE RADICACION

Respetados Señores :

Por medio del presente nos permitimos CERTIFICAR el recibido de 1 usuarios enviados para tramite de novedad web radicadas el 2025-06-16 con numero de radicado 6840323 :

Cordialmente,

Gestión de la Afiliación - Operaciones - EPS Sanitas

NUMERO DE RADICADO : 6840323

EPS Sanitas

Keralty

Lesvy Juliana Puentes Cuellar <lejpuentes@epssanitas.com>

Solicitud Afiliación Sanitas EPS

11 de junio de 2025, 8:03

INGEMAQ M&A SAS <ingemaqmyasas@gmail.com>
Para: Lesvy Juliana Puentes Cuellar <lejpuentes@epssanitas.com>

Buenos Dias,

Comedidamente me permito solicitar la afiliación a la EPS del siguiente trabajador

Información de la empresa
Nit 901759608 - 4
Razón Social: Ingenieria y Equipos M&A S.A.S
Dirección: Carrera 7 # 4-34
Teléfono: 872082
Correo Electrónico: ingemaqmyasas@gmail.com
Nombre del encargado de las afiliaciones en la empresa:Kimberly Charry

Nombre del Trabajador: **JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ**
Cédula : **93.129.015**
AFP: PORVENIR SA
Fecha de Ingreso: 10/06/2025
Ingreso base de Cotización – IBC: **$1.423.500**
Cargo: CADENERO
ARL: SURA
Dirección del Empleado: MZH CASA 19 BARRIO JOSE MARIA MELO
Ciudad de Residencia del empleado: CHAPARRAL -TOLIMA
Numero de Celular: 3222196483
Correo Electrónico: yajorma.1221@gmail.com

Gracias.

CC JOAQUIN GUZMAN SANCHEZ.pdf
116K

122

Barbly Santiesteo
Gestión de la Afiliación - Operaciones - EPS Sanitas

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 11/06/2025, el empleador INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS identificado con NIT número 901759608 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
8887227	11/06/2025	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1075242622	HANERALBERTO GALLEGO MEJIA	1423500	TOPOGRAFO	2025-06-06

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 11 días del mes de Junio del año 2025.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

124

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Esta afiliación se encuentra radicada en el sistema de Información de Asmet Salud EPS SAS

ESSC62

Formulario No. 3470941355418
Fecha de radicación 07/06/2025

I. DATOS TRÁMITE

Tipo de Trámite			Tipo de afiliación:			Regimen		Contribución Solidaria	
A.Afiliación	B.Reporte de Novedades X	A.Individual	-Cotizante o Cabeza de familia	X	A.Contributivo	X	SI	
			-Beneficiario o afiliado adicional		B.Subsidiado		NO	X
		B.Colectiva	C.Institucional	D.De oficio				

Tipo de afiliado:				Tipo de Cotizante				Código	
A.Cotizante	X	B.Cabeza de familia	C.Beneficiario	A.Dependiente	X	B.Independiente	C.Pensionado	registrar por la EPS	1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BASICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
VALDERRAMA	SALAZAR	AVICELVIS	

Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Sexo Biológico		Sexo Identificación					
		Femenino	Masculino X	F	M X	T	NB	Otro	Cuál:
CC	1075225724								

Nacionalidad	País de nacimiento	Departamento de nacimiento	Municipio de nacimiento	Fecha de nacimiento
COL	COLOMBIA	TOLIMA	ATACO	11/04/2005

III. DATOS COMPLEMENTARIOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

Datos personales

Etnia	Comunidad	Discapacidad	Categoría de discapacidad
06 - Otros		SI NO X	No aplica

Tiene encuesta SISBEN		Nivel SISBEN	Grupo SISBEN	Grupo de población especial
SI	NO X	No aplica		09 - Víctimas del conflicto armado.

Administradora de Riesgos Laborales	Administradora de Pensiones	Ingreso base de cotización IBC	Tarifa contribución solidaria
14-28: ARL Sura	230301: Fondo de Pensiones y Cesantias Porvenir	$ 1.423.500	

Dirección Residencia	Teléfono fijo	Celular	Correo electrónico cotizante
CL 38 16 36		3229400717	ingemaqmyasas@gmail.com

Departamento	Municipio/Distrito	Localidad/Comuna	Zona				
			Cab Municipal X	Centro poblado	Rural disperso	Resto rural
TOLIMA	ATACO					

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

NO HAY BENEFICIARIOS EN EL GRUPO FAMILIAR

Selección de la IPS Primaria

No	Nombre de la IPS primaria	Código de la IPS
0	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOURDES - CRA 5 #4-39	231

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

Nombre o Razón social	Identificación	Tipo de aportante o pagador de pensiones
INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS	NI901759608	

Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Municipio/Distrito	Departamento
KR 7 4 34		ingemaqmyasas@gmail.com	NEIVA	HUILA

B. REPORTE DE NOVEDADES

Tipo Novedad

SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO 018000941576

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Esta afiliación se encuentra radicada en el sistema de Información de Asmet Salud EPS SAS

Formulario No. 3470941355418

Fecha de radicación 07/06/2025

ESSC62

	1. Modificación de datos básicos de identificación.		12. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
	2. Corrección de datos básicos de identificación.		13. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
	3. Actualización del documento de identificación	X	14. Movilidad: X A. Régimen Contributivo
	4. Actualización y corrección de datos complementarios.		B. Régimen Subsidiado
	5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código:		15. Traslado: A. Mismo Régimen
	6. Reporte de pago a través de un tercero		B. Diferente Régimen
	7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.		16 Reporte de fallecimiento del cotizante o Cabeza de familia.
	8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.		17. Reporte de trámite de protección al cesante.
X	9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.		18. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
	10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.		19. Reporte de la calidad de Pensionado.
	11. Inscripción EPS retorno al país.		20. Ingreso a Contribución Solidaria.
			21. Retiro de Contribución Solidaria.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	Identificación	Sexo biológico	Sexo identificación

Fecha de nacimiento	Fecha	EPS anterior	Motivo del traslado	Caja de compensación familiar o pagador de pensiones
	06/06/2025			

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

X	Declaración de dependencia económica de los beneficiarios o afiliados adicionales.
X	Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción
X	Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios
X	Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud
X	Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficianos o afiliados adicionales
X	Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte novedades en la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
X	Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto ente Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
X	Autorización para que la EPS envie información al correo electrónico o el celular como mensajes de texto

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que se hará cargo del pago de la contribución solidaria

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Numero de documento de identidad

IX. FIRMAS

El cotizante, cabeza de familia o beneficiario

El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio

RADICADO ASMET SALUD EPS SAS 0180009136726

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Esta afiliación se encuentra radicada en el sistema de Información de Asmet Salud EPS SAS

Formulario No. 3470941355418

Fecha de radicación 07/06/2025

ESSC62

X. ANEXOS

X	56. Anexo copia de documento de identidad	CN	RC	TI	CC	PA	CE	CD	SC		
	Cantidad:				1					Total	1

Certificacion de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas

Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud

Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio. sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación date unión marital

Copia de la orden judicial o decreto administrativo de custodia

Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliacion de oficio

Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente

Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital

Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres

XI. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

Municipio Entidad Territorial	Departamento Entidad Territorial	No ficha SISBÉN	Puntaje SISBÉN	Nivel SISBÉN	Fecha radicación	Fecha validación

Primer apellido Funcionario	Segundo apellido Funcionario	Primer nombre Funcionario	Segundo nombre Funcionario	Firma del Funcionario

Tipo de documento de identificación	Número de identificación

Observaciones

Observaciones:

Empresa:, Asesor:nashary.idrobo, Sucursal:, Teléfono:, Correo Electrónico:nashary.idrobo@asmetsalud.com

Puede verificar la autenticidad de este formulario en la página web de Asmet Salud EPS SAS e ingresando el código:

Url: https://boxaludrc.asmetsalud.org.co/Publico/BoxaludPublico/Publico/CQR.aspx

124

SERVICIO DE ATENCIÓN GRATUITO 018000913876

ANEXO 5. SEGURIDAD SOCIAL

aportes en linea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901185282	7	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO	B - MENOS DE 300 COTIZANTES	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO	CALLE 104 No 14A 45 OF 401	TELLO-HUILA	2150482	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	169745862	9490254236	E	2025/07/18	2025/08/13	BANCO DE BOGOTA	26	$6,382,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Aportante: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO (12 Afiliados)					$16,994,000	$2,719,200			$23,544,000	$942,000			$24,480,243	$979,500			$23,544,000	$1,638,800		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (12 Afiliados)					$16,994,000	$2,719,200			$23,544,000	$942,000			$24,480,243	$979,500			$23,544,000	$1,638,800		$0	$0
Ciudad: TELLO Depto: HUILA (12 Afiliados)					$16,994,000	$2,719,200			$23,544,000	$942,000			$24,480,243	$979,500			$23,544,000	$1,638,800		$0	$0
1	CC	1082804794	ALDANA MARIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	12101945	CUBIDES AURELIO		0	$0	$0	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF32	30	$4,000,000	$160,000	14-7	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
3	CC	1082804610	LOPEZ AMELY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
4	CC	12127850	LUCUARA CARLOS	230201	5	$300,000	$48,000	EPS005	5	$300,000	$12,000	CCF32	5	$367,498	$22,700	14-7	5	$300,000	$20,900	5	$0	$0
5	CC	1082803924	MARTINEZ YASMIN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
6	CC	12138187	MEJIA CLAUDIO	230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS037	30	$4,000,000	$160,000	CCF32	30	$4,000,000	$160,000	14-7	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
7	CC	26586026	OLIVEROS MAGALY	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
8	CC	1078778338	PERDOMO DANIELA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF32	30	$2,000,000	$86,000	14-7	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
9	CC	1075246305	PERDOMO EDGAR	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF32	30	$3,000,000	$120,000	14-7	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
10	CC	19105846	RUBIO HECTOR		0	$0	$0	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF32	30	$1,800,000	$72,000	14-7	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
11	CC	1079184726	SALAS NASLY	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF32	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
12	CC	4945986	TRUJILLO JAIME		0	$0	$0	EPS005	5	$750,000	$30,000	CCF32	5	$1,416,745	$56,800	14-7	5	$750,000	$52,200	5	$0	$0
Total Afiliados(12)					$16,994,000	$2,719,200			$23,544,000	$942,000			$24,480,243	$979,500			$23,544,000	$1,638,800		$0	$0

2025/08/14 09:05 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901785282	7	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO	CALLE 104 No 14A 45 OF 401	TELLO-HUILA	2150482	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1697458623	9490254236	E	2025/07/18	2025/08/13	BANCO DE BOGOTA	26	$6,382,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$2,719,200	$44,600	$0	$2,763,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$640,000	$10,500	$0	$650,500
COLPENSIONES	25-14	900.336,004	7	1	$480,000	$7,900	$0	$487,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,323,400	$21,600	$0	$1,345,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$275,800	$4,600	$0	$280,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,638,800	$26,800	$0	$1,665,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	12	$1,638,800	$26,800	$0	$1,665,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$979,500	$16,000	$0	$995,500
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	12	$979,500	$16,000	$0	$995,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$942,000	$15,500	$0	$957,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$512,000	$8,400	$0	$520,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$1,000	$0	$58,000
SANITAS	EPS005	800.251,440	6	6	$373,000	$6,100	$0	$379,100
TOTAL				12	$6,279,500	$102,900	$0	$6,382,400

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901159608	4	INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 7 4 34	NEIVA-HUILA	3143136943	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1693813823	94902002512	E	2025/07/02	2025/08/11	BANCOLOMBIA	39	$9,764,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)						$1,186,250	$189,800			$1,660,750	$66,500			$1,660,750	$66,500			$1,660,750	$8,700		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (2 Afiliados)						$1,186,250	$189,800			$1,660,750	$66,500			$1,660,750	$66,500			$1,660,750	$8,700		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)						$1,186,250	$189,800			$1,660,750	$66,500			$1,660,750	$66,500			$1,660,750	$8,700		$0	$0
1	CC	17667482	MEDINA ARCENIO		0	$0	$0	EPS005	10	$474,500	$19,000	CCF32	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	$2,500	10	$0	$0
2	CC	1075225724	VALDERRAMA AVICELVIS	230301	25	$1,186,250	$189,800	ES5062	25	$1,186,250	$47,500	CCF32	25	$1,186,250	$47,500	14-11	25	$1,186,250	$6,200	25	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: OBRA TELLO (15 Afiliados)						$30,477,084	$4,860,900			$30,477,834	$1,283,700			$30,477,834	$1,216,700			$30,477,834	$1,907,500		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS TELLO (2 Afiliados)						$3,223,500	$515,800			$3,223,500	$129,000			$3,223,500	$129,000			$3,223,500	$16,900		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)						$3,223,500	$515,800			$3,223,500	$129,000			$3,223,500	$129,000			$3,223,500	$16,900		$0	$0
3	CC	1003819875	CHARRY KIMBERLY	231001	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF32	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
4	CC	1076903614	RODRIGUEZ MARIANA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OPERARIOS MAQUINARIA TELLO (7 Afiliados)						$12,613,334	$2,018,200			$12,613,334	$504,600			$12,613,334	$504,600			$12,613,334	$878,300		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (7 Afiliados)						$12,613,334	$2,018,100			$12,613,334	$504,600			$12,613,334	$504,600			$12,613,334	$878,300		$0	$0
5	CC	85449283	DE LUQUE JAVIER	25-14	30	$2,400,000	$384,000	EPS037	30	$2,400,000	$96,000	CCF32	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0
6	CC	1075252102	DIAZ JESUS	231001	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF32	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
7	CC	4898798	OSPINA LUIS	25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF32	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
8	CC	83233181	QUINTERO LUNIO	231001	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF32	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
9	CC	1082215917	ROJAS GUSTAVO	230201	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF32	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
10	CC	12228829	RUIZ CARLOS	25-14	19	$1,013,334	$162,200	EPS037	19	$1,013,334	$40,600	CCF32	19	$1,013,334	$40,600	14-11	19	$1,013,334	$70,600	19	$0	$0
11	CC	1075236051	VICTORIA FERNEY	25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$64,000	CCF32	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVOS TELLO (8 Afiliados)						$9,607,667	$1,537,500			$9,607,667	$384,700			$9,607,667	$384,700			$9,607,667	$668,900		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (8 Afiliados)						$9,607,667	$1,537,500			$9,607,667	$384,700			$9,607,667	$384,700			$9,607,667	$668,900		$0	$0
12	CC	1075285500	ALVAREZ MILTON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
13	CC	36301148	CEDEÑO DIANA	231001	4	$266,667	$42,700	EPS005	4	$266,667	$10,700	CCF32	4	$266,667	$10,700	14-11	4	$266,667	$16,600	4	$0	$0
14	CC	11323894	MANJARRES ISIDRO	25-14	15	$800,000	$128,000	EPS005	15	$800,000	$32,000	CCF32	15	$800,000	$32,000	14-11	15	$800,000	$55,700	15	$0	$0
15	CC	1062806503	MENDEZ EDINSON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
16	CC	83242741	QUINTERO SAUL	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
17	CC	4943631	REYES EVERLEDETH	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
18	CC	83242768	SANCHEZ RICARDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
19	CC	1003801176	VALDERRAMA DIEGO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: TOPOGRAFIA (2 Afiliados)						$4,933,334	$789,400			$4,933,334	$197,400			$4,933,334	$197,400			$4,933,334	$343,400		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)						$4,933,334	$789,400			$4,933,334	$197,400			$4,933,334	$197,400			$4,933,334	$343,400		$0	$0
20	CC	1075242622	GALLEGO HANER	230301	24	$2,800,000	$448,000	EPS037	24	$2,800,000	$112,000	CCF32	24	$2,800,000	$112,000	14-11	24	$2,800,000	$194,900	24	$0	$0
21	CC	93129015	GUZMAN JOAQUIN	230301	20	$2,133,334	$341,400	EPS005	20	$2,133,334	$85,400	CCF32	20	$2,133,334	$85,400	14-11	20	$2,133,334	$148,500	20	$0	$0
Total Afiliados(21)						$31,564,085	$5,050,700			$32,038,585	$1,282,200			$32,038,585	$1,282,200			$32,038,585	$1,916,200		$0	$0

2025/08/12 09:50 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901759608	4	INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS	B - MENOS DE 300 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 7 4 34	NEIVA-HUILA	3143131943	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	169381023	94902202512	E	2025/07/03	2025/08/11	BANCOLOMBIA	39	$9,764,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$5,050,700	$123,400	$0	$5,174,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,166,500	$28,500	$0	$1,195,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,186,200	$29,000	$0	$1,215,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,890,400	$46,200	$0	$1,936,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$807,600	$19,700	$0	$827,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,916,200	$46,900	$0	$1,963,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	21	$1,916,200	$46,900	$0	$1,963,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,282,200	$31,400	$0	$1,313,600
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	21	$1,282,200	$31,400	$0	$1,313,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				21	$1,282,200	$31,500	$0	$1,313,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$47,500	$1,200	$0	$48,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$1,400	$0	$58,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$555,600	$13,600	$0	$569,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$171,000	$4,200	$0	$175,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$451,100	$11,100	$0	$462,200
TOTAL				21	$9,531,300	$233,200	$0	$9,764,500

2025/08/12 09:50 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901759608	4	INGENIERIA Y EQUIPOS VEGA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 7 # 34	NEIVA-HUILA	3143931943	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	3693892746	94902022 77	Y	2025/07/03	2025/08/11	BANCOLOMBIA	39	$639,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Empresa: VEGA YEPES (7 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,968,050	$624,400		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVOS INDEPENDIENTES (7 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,968,050	$624,400		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (7 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,968,050	$624,400		$0	$0
1	CC	1083916902	ALDANA DYLAN		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	27	$1,281,150	$89,200	0	$0	$0
2	CC	7684878	ALDANA FARYD		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	27	$1,281,150	$89,200	0	$0	$0
3	CC	7700886	BUSTOS WILSON		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	27	$1,281,150	$89,200	0	$0	$0
4	CC	1075220290	MANRIQUE JUAN		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	27	$1,281,150	$89,200	0	$0	$0
5	CC	7707574	MOSQUERA JHON		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	27	$1,281,150	$89,200	0	$0	$0
6	CC	7714738	PERDOMO GUILLERMO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	27	$1,281,150	$89,200	0	$0	$0
7	CC	12137722	SOTO JOSE		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	27	$1,281,150	$89,200	0	$0	$0
Total		Afiliados(7)				$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,968,050	$624,400		$0	$0

2025/08/12 11:26 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901159608	4	INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 7 4 34	NEIVA-HUILA	3143131943	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1693802749	9490202277	Y	2025/07/03	2025/08/11	BANCOLOMBIA	39	$639,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$624,400	$15,300	$0	$639,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$624,400	$15,300	$0	$639,700
TOTAL				7	$624,400	$15,300	$0	$639,700

2025/08/12 11:26 AM

ANEXO 6. REGISTRO DE ASISTENCIA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	3 - 06 - 2025.			
TEMA	Uso adecuado de epp. - Recomendaciones			
HORA	7:15. 7:25.			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
	JAIME TRUJILLO SALAZAR	4.945.986	TOPOGRAFO	
	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
	CARLOS ALBERTO LUCUARA PARRACI	12.127.850	CADENERO 1	
	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.566.026	PALETERA	
	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana
	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo
	LUNIO QUINTERO POLANIA	83233181	CONDUCTOR	
10	MILLER SANCHEZ	4890672	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo J. S
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martinez
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Nasly melissa salas s
16	FERNEY VICTORIA CHAVARRO	1.075.236.051	CONDUCTOR	
17	JAVIER JESUS DE LUQUE CABARCA	85.449.283	OPE. MOTONIVELADORA	
18	JESUS DAVID DIAZ GONZALEZ	1.075.252.102	OPE.RETRO EXCABADORA	Jesús David Diaz G
19	GUSTAVO ADOLFO ROJAS VARGAS	1.082.215.917	OPE.RETRO EXCABADORA	
20	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
21	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
22	HOLMAN JIMÉNEZ DIAZ	1.006.528.347	AYUDANTE	Holman Jimenez

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPN TELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

23	EDISON MENDEZ PERDOMO	1.082.806.583	AYUDANTE	
24	EVERLEDETH REYES ROCHA	4'943.631	AYUDANTE	

FIRMA PROFESIONAL SST: _____

NOMBRE: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	4 - Junio - 2025.			
TEMA	Prevención y Control del ruido			
HORA	7:15 - 7:20.			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X.
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	JAIME TRUJILLO SALAZAR	4.945.986	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	CARLOS ALBERTO LUCUARA PARRACI	12.127.850	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	Magaly Oliveros Sotto
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana.
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo H.
9	LUNIO QUINTERO POLANIA	83233181	CONDUCTOR	
10	MILLER SANCHEZ	4890672	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo J. S.
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martinez
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Nasly Melisa Salas S.
16	FERNEY VICTORIA CHAVARRO	1.075.236.051	CONDUCTOR	
17	JAVIER JESUS DE LUQUE CABARCA	85.449.283	OPE. MOTONIVELADORA	
18	JESUS DAVID DIAZ GONZALEZ	1.075.252.102	OPE.RETRO EXCABADORA	Jesús David Diaz Gonzalez
19	GUSTAVO ADOLFO ROJAS VARGAS	1.082.215.917	OPE.RETRO EXCABADORA	
20	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
21	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
22	HOLMAN JIMÉNEZ DIAZ	1.006.528.347	AYUDANTE	Holman Jimenez

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

23	EDISON MENDEZ PERDOMO	1.082.806.583	AYUDANTE	
24	EVERLEDETH REYES ROCHA	4'943.631	AYUDANTE	

FIRMA PROFESIONAL SST: _____

NOMBRE: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901765282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	5 Junio del 2025.			
TEMA	Convivencia Laboral			
HORA	7:15. - 7:35			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X.
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	JAIME TRUJILLO SALAZAR	4.945.986	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	CARLOS ALBERTO LUCUARA PARRACI	12.127.850	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.585.026	PALETERA	Magaly Oliveros Sotto.
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana.
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	
9	LUNIO QUINTERO POLANIA	83233181	CONDUCTOR	
10	MILLER SANCHEZ	4890672	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo J. S.
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	Luis Carlos Ospina
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martinez
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Nasly Melisa Salas.
16	FERNEY VICTORIA CHAVARRO	1.075.236.051	CONDUCTOR	
17	JAVIER JESUS DE LUQUE CABARCA	85.449.283	OPE. MOTONIVELADORA	
18	JESUS DAVID DIAZ GONZALEZ	1.075.252.102	OPE.RETRO EXCABADORA	Jesus David Diaz G.
19	GUSTAVO ADOLFO ROJAS VARGAS	1.082.215.917	OPE.RETRO EXCABADORA	
20	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
21	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
22	HOLMAN JIMÉNEZ DIAZ	1.006.528.347	AYUDANTE	Holman Jimenez

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPN TELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

23	EDISON MENDEZ PERDOMO	1.082.806.583	AYUDANTE	
24	EVERLEDETH REYES ROCHA	4'943.631	AYUDANTE	

FIRMA PROFESIONAL SST: _____

NOMBRE: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	6 - Junio - 2025			
TEMA	Trabajo en equipo			
HORA	7:15 - 7:25.			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	JAIME TRUJILLO SALAZAR	4.945.986	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	CARLOS ALBERTO LUCUARA PARRACI	12.127.850	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.566.026	PALETERA	
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana.
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo
9	LUNIO QUINTERO POLANIA	83233181	CONDUCTOR	
10	MILLER SANCHEZ	4890672	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo J. S.
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martinez
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Nasly Melisa Salas S.
16	FERNEY VICTORIA CHAVARRO	1.075.236.051	CONDUCTOR	
17	JAVIER JESUS DE LUQUE CABARCA	85.449.283	OPE. MOTONIVELADORA	
18	JESUS DAVID DIAZ GONZALEZ	1.075.252.102	OPE.RETRO EXCABADORA	Jesus David Diaz Gonzalez
19	GUSTAVO ADOLFO ROJAS VARGAS	1.082.215.917	OPE.RETRO EXCABADORA	
20	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
21	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
22	HOLMAN JIMÉNEZ DIAZ	1.006.528.347	AYUDANTE	Holman Jimenez

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPN TELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

23	EDISON MENDEZ PERDOMO	1.082.806.583	AYUDANTE	
24	EVERLEDETH REYES ROCHA	4'943.631	AYUDANTE	

FIRMA PROFESIONAL SST: _____

NOMBRE: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	7 de junio 2025.			
TEMA	Acoso Laboral.			
HORA	7:15 - 7:25			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	JAIME TRUJILLO SALAZAR	4.945.986	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	CARLOS ALBERTO LUCUARA PARRACI	12.127.850	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.566.026	PALETERA	
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo H.
9	LUNIO QUINTERO POLANIA	83233181	CONDUCTOR	
10	MILLER SANCHEZ	4890672	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo J. S.
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martinez M
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Nasly Melisa Salas S
16	FERNEY VICTORIA CHAVARRO	1.075.236.051	CONDUCTOR	
17	JAVIER JESUS DE LUQUE CABARCA	85.449.283	OPE. MOTONIVELADORA	
18	JESUS DAVID DIAZ GONZALEZ	1.075.252.102	OPE.RETRO EXCABADORA	Jesús David Diaz Gonzalez
19	GUSTAVO ADOLFO ROJAS VARGAS	1.082.215.917	OPE.RETRO EXCABADORA	
20	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
21	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
22	HOLMAN JIMÉNEZ DIAZ	1.006.528.347	AYUDANTE	Holman Jiménez

Aurelvis Valderrama Salazar

Aurelvis

144

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

23	EDISON MENDEZ PERDOMO	1.082.806.583	AYUDANTE	
24	EVERLEDETH REYES ROCHA	4'943 631	AYUDANTE	

FIRMA PROFESIONAL SST:

NOMBRE: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901705282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	9 - JUNIO - 2025.			
TEMA	Prevención hacia Movimientos Sísmicos - Reforzamiento Prevención			
HORA	7:15 - 7:25			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	JAIME TRUJILLO SALAZAR	4.945.986	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	CARLOS ALBERTO LUCUARA PARRACI	12.127.850	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.566.026	PALETERA	Magaly Oliveros Sotto
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo
9	LUNIO QUINTERO POLANIA	83233181	CONDUCTOR	Lunio Quintero
10	MILLER SANCHEZ	4890672	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo J.S.
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	Luis Carlos Ospina
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martinez
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Nasly Melisa Salas.
16	FERNEY VICTORIA CHAVARRO	1.075.236.051	CONDUCTOR	
17	JAVIER JESUS DE LUQUE CABARCA	85.449.283	OPE. MOTONIVELADORA	
18	JESUS DAVID DIAZ GONZALEZ	1.075.252.102	OPE.RETRO EXCABADORA	Jesús David Diaz Gonzalez
19	GUSTAVO ADOLFO ROJAS VARGAS	1.082.215.917	OPE.RETRO EXCABADORA	
20	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
21	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
22	HOLMAN JIMÉNEZ DIAZ	1.006.528.347	AYUDANTE	

Aviecluis Valderrama Salazar

Aviecluis

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT 901785282 -7

JPNIELLO

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

23	EDISON MENDEZ PERDOMO	1.082.808.583	AYUDANTE	
24	EVERLEDETH REYES ROCHA	4 943 031	AYUDANTE	

FIRMA PROFESIONAL SST: _____

NOMBRE: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPNTELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	10 - Junio - 2024.			
TEMA	Prevención de accidentes por uso de alcohol y Sustancias Psicoactivas.			
HORA	7:15 - 7:25			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	x
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	JAIME TRUJILLO SALAZAR	4.945.986	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	CARLOS ALBERTO LUCUARA PARRACI	12.127.850	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.604.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana.
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	
9	LUNIO QUINTERO POLANIA	83233181	CONDUCTOR	
10	MILLER SANCHEZ	4890672	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo T. S
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martin
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Nasly Melisa Salas S
16	FERNEY VICTORIA CHAVARRO	1.075.236.051	CONDUCTOR	
17	JAVIER JESUS DE LUQUE CABARCA	85.449.283	OPE. MOTONIVELADORA	
18	JESUS DAVID DIAZ GONZALEZ	1.075.252.102	OPE.RETRO EXCABADORA	Jesus David Diaz Gonza
19	GUSTAVO ADOLFO ROJAS VARGAS	1.082.215.917	OPE.RETRO EXCABADORA	
20	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
21	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
22	HOLMAN JIMÉNEZ DIAZ	1.006.528.347	AYUDANTE	

Aurelio Cubides Valderrama Salazar 1075225724 Ayudante Aurelio
Haner Alberto Gallego Mejia 1075242822 Topografo
Joaquin Marcelo Guzman Sanchez 93.129.015 Cadenero 1

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPNTELLO

23	EDISON MENDEZ PERDOMO	1.082.806.503	AYUDANTE	
24	EVERLEDETH REYES ROCHA	4'943.631	AYUDANTE	
25	AVICELVIS VALDERRAMA SALAZAR	1.075.225.724	AYUDANTE	

FIRMA PROFESIONAL SST: _____

NOMBRE: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	11 - Junio - 2025.			
TEMA	Calentería - Recomendaciones			
HORA	7:15 - 7:25.			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	93.129.015	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	Magaly Oliveros Sotto
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo
9	LUNIO QUINTERO POLANIA	83233181	CONDUCTOR	Lunio Quintero
10	MILLER SANCHEZ	4890672	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo J. S.
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.896.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martinez
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Nasly Melissa Salas S.
16	FERNEY VICTORIA CHAVARRO	1.075.236.051	CONDUCTOR	
17	JAVIER JESUS DE LUQUE CABARCA	85.449.283	OPE. MOTONIVELADORA	
18	JESUS DAVID DIAZ GONZALEZ	1.075.252.102	OPE.RETRO EXCABADORA	Jesus David Diaz Gonzalez
19	GUSTAVO ADOLFO ROJAS VARGAS	1.082 215.917	OPE.RETRO EXCABADORA	
20	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
21	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
22	HOLMAN JIMÉNEZ DIAZ	1.006.528.347	AYUDANTE	
	Aurelio Valderrama Jaimes	1075225724	Ayudante	Aurelio

150

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPN TELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

23	EDISON MENDEZ PERDOMO	1.082.606.583	AYUDANTE	
24	EVERLEDETH REYES ROCHA	4'943.631	AYUDANTE	
25	AVICELVIS VALDERRAMA SALAZAR	1.075.225.724	AYUDANTE	

Diogenes Yucuma 4.947-318 operario

FIRMA PROFESIONAL SST: _____

NOMBRE: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	12 de Junio 2025.			
TEMA	Síndrome del burnout - Recomendaciones SST			
HORA	7:15 - 7:26			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	93.129.015	CADENERO 1	
5	ANILLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anilly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana.
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo
9	LUNIO QUINTERO POLANIA	83233181	CONDUCTOR	Lunio Quint
10	MILLER SANCHEZ	4890672	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo J. S.
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martinez
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Nasly Melisa Salas S
16	FERNEY VICTORIA CHAVARRO	1.075.236.051	CONDUCTOR	
17	JAVIER JESUS DE LUQUE CABARCA	85.449.283	OPE. MOTONIVELADORA	
18	JESUS DAVID DIAZ GONZALEZ	1.075.252.102	OPE.RETRO EXCABADORA	Jesús David Diaz Gonzalez
19	GUSTAVO ADOLFO ROJAS VARGAS	1 082 215 917	OPE.RETRO EXCABADORA	
20	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
21	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
22	HOLMAN JIMÉNEZ DIAZ	1.006.528.347	AYUDANTE	

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPN TELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

23	EDISON MENDEZ PERDOMO	1.082.806.583	AYUDANTE	
24	EVERLEDETH REYES ROCHA	4'943.631	AYUDANTE	
25	AVICELVIS VALDERRAMA SALAZAR	1.075.225.724	AYUDANTE	

FIRMA PROFESIONAL SST: _____

NOMBRE: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	13 Junio - 2025.			
TEMA	Respeto y el buen trato			
HORA	7:05 - 7:15.			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	93.129.015	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana.
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	
9	LUNIO QUINTERO POLANIA	83233181	CONDUCTOR	
10	MILLER SANCHEZ	4890672	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	
16	FERNEY VICTORIA CHAVARRO	1.075.236.051	CONDUCTOR	
17	JAVIER JESUS DE LUQUE CABARCA	85.449.283	OPE. MOTONIVELADORA	
18	JESUS DAVID DIAZ GONZALEZ	1.075.252.102	OPE.RETRO EXCABADORA	
19	GUSTAVO ADOLFO ROJAS VARGAS	1 082 215 917	OPE.RETRO EXCABADORA	
20	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
21	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
22	HOLMAN JIMÉNEZ DIAZ	1.006.528.347	AYUDANTE	

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPNTELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

23	EDISON MENDEZ PERDOMO	1.082.806.583	AYUDANTE	
24	EVERLEDETH REYES ROCHA	4'943.631	AYUDANTE	
25	AVICELVIS VALDERRAMA SALAZAR	1.075.225.724	AYUDANTE	

FIRMA PROFESIONAL SST: _____

NOMBRE: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	14. - Junio - 2025.			
TEMA	Dinámica integración entre Compañeros de trabajo			
HORA	7:15 - 7:25.			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X.
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	93.129.015	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.336	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo
9	LUNIO QUINTERO POLANIA	83233181	CONDUCTOR	Lunio Quintero
10	MILLER SANCHEZ	4890672	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo J. S.
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martinez
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Nasly Melisa Salas S.
16	FERNEY VICTORIA CHAVARRO	1.075.236.051	CONDUCTOR	
17	JAVIER JESUS DE LUQUE CABARCA	85.449.283	OPE. MOTONIVELADORA	
18	JESUS DAVID DIAZ GONZALEZ	1.075.252.102	OPE.RETRO EXCABADORA	Jesus David Diaz G.
19	GUSTAVO ADOLFO ROJAS VARGAS	1.082.215.917	OPE.RETRO EXCABADORA	
20	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
21	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
22	HOLMAN JIMÉNEZ DIAZ	1.006.528.347	AYUDANTE	Holman Jimenez

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPN TELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

23	EDISON MENDEZ PERDOMO	1.082.806.583	AYUDANTE	
24	EVERLEDETH REYES ROCHA	4'943.631	AYUDANTE	
25	AVICELVIS VALDERRAMA SALAZAR	1.075.225.724	AYUDANTE	

Diogenes Yucuma 4897318 OPE. Mini cargador

FIRMA PROFESIONAL SST: _____

NOMBRE: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPN TELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	16 - Junio - 2025.			
TEMA	Prevención de accidentes e incidentes de trabajo			
HORA	7:05 - 7:15.			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	x
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	93.129.015	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo
9	LUNIO QUINTERO POLANIA	83233181	CONDUCTOR	
10	MILLER SANCHEZ	4890672	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo J. S.
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martinez
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Nasly Melisa Salas
16	FERNEY VICTORIA CHAVARRO	1.075.236.051	CONDUCTOR	
17	JAVIER JESUS DE LUQUE CABARCA	85.449.283	OPE. MOTONIVELADORA	
18	JESUS DAVID DIAZ GONZALEZ	1.075.252.102	OPE.RETRO EXCABADORA	Jesus David Diaz Gonzalez
19	GUSTAVO ADOLFO ROJAS VARGAS	1.082.215.917	OPE.RETRO EXCABADORA	
20	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
21	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
22	HOLMAN JIMÉNEZ DIAZ	1.006.528.347	AYUDANTE	

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPN TELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

23	EDISON MENDEZ PERDOMO	1.082.806.583	AYUDANTE	
24	EVERLEDETH REYES ROCHA	4'943.631	AYUDANTE	
25	AVICELVIS VALDERRAMA SALAZAR	1.075.225.724	AYUDANTE	

Diogenes Yaguna

FIRMA PROFESIONAL SST: _____

NOMBRE: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	17- Junio - 2025.			
TEMA	Somnolencia laboral + prevención.			
HORA	7:05 - 7:15.			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	x
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	93.129.015	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	Magaly Oliveros Sotto
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo H.
9	LUNIO QUINTERO POLANIA	83233181	CONDUCTOR	
10	MILLER SANCHEZ	4890672	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo J. S.
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	Luis Carlos Espn
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martinez
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Nasly Melisa Salas S.
16	FERNEY VICTORIA CHAVARRO	1.075.236.051	CONDUCTOR	
17	JAVIER JESUS DE LUQUE CABARCA	85.449.283	OPE. MOTONIVELADORA	
18	JESUS DAVID DIAZ GONZALEZ	1.075.252.102	OPE.RETRO EXCABADORA	Jesus David Diaz Gonzalez
19	GUSTAVO ADOLFO ROJAS VARGAS	1.082.215.917	OPE.RETRO EXCABADORA	
20	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
21	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.680	OFCIAL	
22	HOLMAN JIMÉNEZ DIAZ	1.006.528.347	AYUDANTE	

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPNTELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

23	EDISON MENDEZ PERDOMO	1.082.806.583	AYUDANTE	
24	EVERLEDETH REYES ROCHA	4'943.631	AYUDANTE	
25	AVICELVIS VALDERRAMA SALAZAR	1.075.225.724	AYUDANTE	

Diogenes Yucuma 4893718 OPE. Mini cargador

FIRMA PROFESIONAL SST: _____

NOMBRE: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	18 - Junio - 2025.			
TEMA	Recomendaciones para Jornada de Asfalto.			
HORA	7:15. - 7:25.			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X.
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	93.129.015	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	Magaly Oliveros Sotto.
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo
9	LUNIO QUINTERO POLANIA	83233181	CONDUCTOR	
10	MILLER SANCHEZ	4890672	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo J. S.
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	Luis Carlos Ospina
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martinez
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Nasly Melisa Salas.
16	FERNEY VICTORIA CHAVARRO	1.075.236.051	CONDUCTOR	
17	JAVIER JESUS DE LUQUE CABARCA	85.449.283	OPE. MOTONIVELADORA	
18	JESUS DAVID DIAZ GONZALEZ	1.075.252.102	OPE.RETRO EXCABADORA	Jesus David Diaz G.
19	GUSTAVO ADOLFO ROJAS VARGAS	1.082.215.917	OPE.RETRO EXCABADORA	
20	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
21	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
22	HOLMAN JIMÉNEZ DIAZ	1.006.528.347	AYUDANTE	

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPN TELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

13	EDISON MENDEZ PERDOMO	1.082.806.583	AYUDANTE	
14	EVERLEDETH REYES ROCHA	4'943.631	AYUDANTE	
15	AVICELVIS VALDERRAMA SALAZAR	1.075.225.724	AYUDANTE	

Drogenes Yucuma C.C. 8997318 OPE Mini cargador

FIRMA PROFESIONAL SST: _____

NOMBRE: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	19 - Junio - 2025			
TEMA	Concentración en los puestos de trabajo.			
HORA	7:15 - 7:25			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	93.129.015	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo
9	LUNIO QUINTERO POLANIA	83233181	CONDUCTOR	
10	MILLER SANCHEZ	4890672	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo J. S.
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martinez
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Nasly Melisa Salas S.
16	FERNEY VICTORIA CHAVARRO	1.075.236.051	CONDUCTOR	
17	JAVIER JESUS DE LUQUE CABARCA	85.449.283	OPE. MOTONIVELADORA	
18	JESUS DAVID DIAZ GONZALEZ	1.075.252.102	OPE.RETRO EXCABADORA	Jesús David Diaz G.
19	GUSTAVO ADOLFO ROJAS VARGAS	1.082.215.917	OPE.RETRO EXCABADORA	
20	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
21	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
22	HOLMAN JIMÉNEZ DIAZ	1.006.528.347	AYUDANTE	

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPN TELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

23	EDISON MENDEZ PERDOMO	1.082.606.583	AYUDANTE	
24	EVERLEDETH REYES ROCHA	4'943.631	AYUDANTE	
25	AVICELVIS VALDERRAMA SALAZAR	1.075.225.724	AYUDANTE	

Drogenes Yucuma 4'897319

FIRMA PROFESIONAL SST.

NOMBRE:

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPNTELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	20 - Junio - 2025.			
TEMA	Exposición a vibraciones - Recomendaciones SST			
HORA	7:15. - 7:25.			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	93.129.015	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo
9	LUNIO QUINTERO POLANIA	83233181	CONDUCTOR	
10	MILLER SANCHEZ	4890672	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo J. S.
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.698.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martinez
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Nasly melisa Salas S.
16	FERNEY VICTORIA CHAVARRO	1.075.236.051	CONDUCTOR	
17	JAVIER JESUS DE LUQUE CABARCA	85.449.283	OPE. MOTONIVELADORA	
18	JESUS DAVID DIAZ GONZALEZ	1.075.252.102	OPE.RETRO EXCABADORA	Jesus David Diaz G
19	GUSTAVO ADOLFO ROJAS VARGAS	1.082.215.917	OPE.RETRO EXCABADORA	
20	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
21	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.560	OFCIAL	
22	HOLMAN JIMÉNEZ DIAZ	1.006.528.347	AYUDANTE	

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901765282 -7	JPNTELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

23	EDISON MENDEZ PERDOMO	1.082.806.583	AYUDANTE	
24	EVERLEDETH REYES ROCHA	1'943.631	AYUDANTE	
25	AVICELVIS VALDERRAMA SALAZAR	1.075.225.724	AYUDANTE	

Diogenes Yucuma -4897310

FIRMA PROFESIONAL SST: _____

NOMBRE: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPN TELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	21 - Junio - 2025.			
TEMA	Pausas Activas - Recomendaciones.			
HORA	7:15 - 7:25			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	93.129.015	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	Luz Oliveros
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo
9	LUNIO QUINTERO POLANIA	83233181	CONDUCTOR	
10	MILLER SANCHEZ	4890672	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.766	AYUDANTE	Ricardo J. S.
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Martinez
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	
16	FERNEY VICTORIA CHAVARRO	1.075.236.051	CONDUCTOR	
17	JAVIER JESUS DE LUQUE CABARCA	85.449.283	OPE. MOTONIVELADORA	
18	JESUS DAVID DIAZ GONZALEZ	1.075.252.102	OPE.RETRO EXCABADORA	
19	GUSTAVO ADOLFO ROJAS VARGAS	1.082.215.917	OPE.RETRO EXCABADORA	
20	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
21	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
22	HOLMAN JIMÉNEZ DIAZ	1.006.526.347	AYUDANTE	

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPN TELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

23	EDISON MENDEZ PERDOMO	1.082.806.583	AYUDANTE	
24	EVERLEDETH REYES ROCHA	4'943.631	AYUDANTE	
25	AVICELVIS VALDERRAMA SALAZAR	1.075.225.724	AYUDANTE	

Drogenes Yucuma 4.847.318

FIRMA PROFESIONAL SST: _____

NOMBRE: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	24 - JUNIO - 2025.			
TEMA	Socialización y actualización Coprast y covid.			
HORA	7:15 - 7:25			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	93.129.015	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	Mag Oliveros
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo H.
9	LUNIO QUINTERO POLANIA	83233181	CONDUCTOR	
10	MILLER SANCHEZ	4890672	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	V. cabo T. S.
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martinez
15	NASLY MELISA BALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Nasly Melisa Balas S.
16	FERNEY VICTORIA CHAVARRO	1.075.236.051	CONDUCTOR	
17	JAVIER JESUS DE LUQUE CABARCA	85.449.283	OPE. MOTONIVELADORA	
18	JESUS DAVID DIAZ GONZALEZ	1.075.252.102	OPE.RETRO EXCABADORA	Jesús David Diaz Gonzalez
19	GUSTAVO ADOLFO ROJAS VARGAS	1.082.215.917	OPE.RETRO EXCABADORA	
20	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
21	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
22	HOLMAN JIMÉNEZ DIAZ	1.006.528.347	AYUDANTE	

Diogenes Yucuma 1184731B OD

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPN TELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

23	EDISON MENDEZ PERDOMO	1.082.806.583	AYUDANTE	
24	EVERLEDETH REYES ROCHA	4'943.631	AYUDANTE	
25	AVICELVIS VALDERRAMA SALAZAR	1.075.225.724	AYUDANTE	Avicelvis

FIRMA PROFESIONAL SST: _____

NOMBRE: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

REGISTRO DE ASISTENCIA					
FECHA	25 - Julio - 2025.				
TEMA	Salud Física				
HORA	7:15 - 9:25				
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X	
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN		

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	93.129.015	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana.
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo
9	LUNIO QUINTERO POLANIA	83233181	CONDUCTOR	
10	MILLER SANCHEZ	4890672	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo J. S.
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	Luis carlos Ospina
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martinez
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Nasly Melisa Salas S
16	FERNEY VICTORIA CHAVARRO	1.075.236.051	CONDUCTOR	
17	JAVIER JESUS DE LUQUE CABARCA	85.449.283	OPE. MOTONIVELADORA	
18	JESUS DAVID DIAZ GONZALEZ	1.075.252.102	OPE.RETRO EXCABADORA	Jesús David Diaz Gonzalez
19	GUSTAVO ADOLFO ROJAS VARGAS	1.082.215.917	OPE.RETRO EXCABADORA	
20	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
21	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
22	HOLMAN JIMÉNEZ DIAZ	1.006.528.347	AYUDANTE	
	Diogenes Yuccma	4897318	OPE	

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPNTELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

23	EDISON MENDEZ PERDOMO	1.082.806.583	AYUDANTE	
24	EVERLEDETH REYES ROCHA	4'943.631	AYUDANTE	
25	AVICELVIS VALDERRAMA SALAZAR	1.075.225.724	AYUDANTE	

FIRMA PROFESIONAL SST: _____

NOMBRE: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPN TELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	26 - Junio - 2025.			
TEMA	Orden y Aseo			
HORA	7:15 - 9:25.			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	93.129.015	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	Magaly Oliveros Sotto
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana...
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo
9	LUNIO QUINTERO POLANIA	83233181	CONDUCTOR	
10	MILLER SANCHEZ	4890672	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo T. S.
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martinez
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Nasly Melissa Salas.
16	FERNEY VICTORIA CHAVARRO	1.075.236.051	CONDUCTOR	
17	JAVIER JESUS DE LUQUE CABARCA	85.449.283	OPE. MOTONIVELADORA	
18	JESUS DAVID DIAZ GONZALEZ	1.075.252.102	OPE.RETRO EXCABADORA	Jesus David Diaz Gonzalez
19	GUSTAVO ADOLFO ROJAS VARGAS	1.082.215.917	OPE.RETRO EXCABADORA	
20	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
21	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
22	HOLMAN JIMÉNEZ DIAZ	1.006.528.347	AYUDANTE	
	Diogenes Yacama	4897718	Opera	

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPN TELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

23	EDISON MENDEZ PERDOMO	1.082.806.583	AYUDANTE	
24	EVERLEDETH REYES ROCHA	4'943.631	AYUDANTE	
25	AVICELVIS VALDERRAMA SALAZAR	1.075.225.724	AYUDANTE	

FIRMA PROFESIONAL SST: _____

NOMBRE: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	27 - Junio - 2025			
TEMA	Manejo de Residuos.			
HORA	7:15 - 7:25.			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	93.129.015	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	Magaly Oliveros Sotto.
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana.
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo
9	LUNIO QUINTERO POLANIA	83233181	CONDUCTOR	
10	MILLER SANCHEZ	4890672	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo T. S.
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	Luis Carlos Ospina
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martinez M
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Nasly Melisa Salas
16	FERNEY VICTORIA CHAVARRO	1.075.236.051	CONDUCTOR	
17	JAVIER JESUS DE LUQUE CABARCA	85.449.283	OPE. MOTONIVELADORA	
18	JESUS DAVID DIAZ GONZALEZ	1.075.252.102	OPE.RETRO EXCABADORA	Jesus David Diaz Gonzalez
19	GUSTAVO ADOLFO ROJAS VARGAS	1.082.215.917	OPE.RETRO EXCABADORA	
20	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
21	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
22	HOLMAN JIMÉNEZ DIAZ	1.006.528.347	AYUDANTE	

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPN TELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

23	EDISON MENDEZ PERDOMO	1.082.806.583	AYUDANTE	
24	EVERLEDETH REYES ROCHA	4´943.631	AYUDANTE	
25	AVICELVIS VALDERRAMA SALAZAR	1.075.225.724	AYUDANTE	
26	DIOGENES YUCUMA	4.897.318	OPE. MINICARGADOR	

FIRMA PROFESIONAL SST: _____

NOMBRE: _____

Powered by CamScanner

ANEXO 7. ACTUALIZACION DE COPASST

JPNTELLO

CONSTITUCION Y ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COPASST

El día 12 de junio de 2025, en las instalaciones **CONSORCIO E INFRAESTRUCTURA JPNTELLO**, con **NIT. 813 008 120 -1** se reunieron los trabajadores dando cumplimiento a lo establecido en la resolución 2013 de 1986, modificada por el decreto 1295 de 1994 emanados del Ministerio de la Protección Social, han realizado la conformación el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Para la organización de este Comité la Compañía ha asignado a **(2)** representante por parte de la empresa con su correspondiente suplente, y ha solicitado a los trabajadores que entre ellos elijan **(2)** representante con su correspondiente suplente para hacer parte del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En reunión realizada el día 12 de junio, se reúnen **(25)** trabajadores, número correspondiente al (100%) del total de los empleados.

Los trabajadores escogieron libremente como candidatos a:

CANDIDATOS	# VOTOS
Haner Alberto Gallego Mejía	10
Anlly Astrid López Vega	8
Lunio Quintero Polonia	5
Jesús David Díaz Gonzales	3
Votos en blanco	0
Votos anulados	0
TOTAL, VOTOS	25

Integrado el comité, se procedió de acuerdo a la Resolución 2013 de 1986, nombrar un presidente y un secretario con el objeto de mantener la coordinación, organización y mantenimiento del comité.

Entre los miembros del Comité la empresa se designa

REPRESENTANTE POR LA EMPRESA	SUPLENTE
Aurelio Cubides Rodríguez	Héctor Rubio Díaz

y por votación de los trabajadores se nombra a:

REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES	SUPLENTE
Haner Alberto Gallego Mejía	Anlly Astrid López Vega

Una vez asignadas las personas que van a ser cabezas visibles del comité se procedió a darle la instalación al mismo, para lo cual se hizo conocer lo establecido en la Resolución

Powered by CamScanner

2013 de 1986 como funciones principales que en ésta se establece para cada uno de los miembros, así como para el Presidente y Secretario; así como las responsabilidades que estos tienen en dicho organismo.

OBJETIVOS DEL COMITÉ

Participar de las actividades del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo y vigilar su desarrollo

En la empresa.

RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ

Las siguientes son algunas de las responsabilidades del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo:

- Vigilar el cumplimiento del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Colaborar con el análisis de las causas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y proponer las medidas correctivas a que haya lugar para evitar su ocurrencia.
- Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar la maquinaria y equipos con los cuales se realizan las labores diarias e informar sobre su estado y los posibles riesgos que estos generan con el fin de adoptar medidas correctivas.
- Servir como organismo de coordinación entre empleador y trabajadores en la búsqueda de las soluciones en lo que hace referencia a Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Demás funciones que le señalen las normas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.

FUNCIONES DEL PRESIDENTE

- Presidir y orientar las reuniones del comité.
- Llevar a cabo los arreglos necesarios para determinar el sitio de las reuniones.
- Preparar los temas de cada reunión.
- Tramitar ante la dirección de la empresa las recomendaciones aprobadas en el seno del comité.

FUNCIONES DEL SECRETARIO

- Verificar la asistencia a las reuniones programadas.
- Tomar atenta nota de todos los temas tratados en cada reunión.
- Elaborar el acta de cada reunión y someterla a votación.
- Llevar el archivo referente a las actividades desarrolladas por el comité.

Powered by CamScanner

JPNTELLO

Con la creación del Comité Paritario Seguridad y Salud en el Trabajo se está dando cumplimiento a las normas legales vigentes en lo que a Seguridad y Salud en el Trabajo se refiere.

INTEGRANTES DEL COMITÉ POR LA EMPRESA

NOMBRE	FIRMA
Aurelio Cubides Rodríguez	
Héctor Rubio Díaz	

INTEGRANTES DEL COMITÉ POR LOS TRABAJADORES

NOMBRE	FIRMA
Haner Alberto Gallego Mejía	
Anlly Astrid López Vega	Anlly Lopez Vega

Powered by CamScanner

ANEXO 8. ACTUALIZACION COCOLA

JPNTELLO

CONSTITUCION Y ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA

El dia 11 de junio de 2025, en las instalaciones de **CONSORCIO E INFRAESTRUCTURA JPNTELLO.**, con **NIT. 813 008 120 -1** se reunieron los trabajadores dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 652 de 2012 y Ley 1010 de 2006, han realizado la conformación el Comité de Convivencia.

Para la organización de este Comité la Compañía ha asignado a **(2)** representante por parte de la empresa con su correspondiente suplente, y ha solicitado a los trabajadores que entre ellos elijan **(2)** representante con su correspondiente suplente para hacer parte del Comité de Convivencia.

En reunión realizada el día 11 de junio del 2025, se reúnen **(25)** trabajadores, número correspondiente al (100%) del total de los empleados.

Los trabajadores escogieron libremente como candidatos a:

CANDIDATOS	# VOTOS
Magaly Oliveros Sotto	6
Yazmín Roció Martínez	9
Maria Edith Aldana Hoyos	10
Votos en blanco	0
Votos anulados	0
TOTAL, VOTOS	25

Integrado el comité, se procedió a nombrar un presidente y un secretario con el objeto de mantener la coordinación, organización y mantenimiento del comité.

Entre los miembros del Comité la empresa se designa

REPRESENTANTE POR LA EMPRESA	SUPLENTE
Aurelio Cubides Rodriguez	Haner Alberto Gallego Mejía

y por votación de los trabajadores se nombra a:

REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES	SUPLENTE
María Edith Aldana Hoyos	Yazmin Roció Martínez

Una vez asignadas las personas que van a ser cabezas visibles del comité se procedió a darle la instalación al mismo, para lo cual se hizo conocer lo establecido, como funciones principales que en ésta se establece para cada uno de los miembros, así como para el Presidente y Secretario; así como las responsabilidades que estos tienen en dicho organismo.

Powered by CamScanner

OBJETIVOS DEL COMITÉ

Participar de las actividades del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo y vigilar su desarrollo

En la empresa.

RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ

Las siguientes son algunas de las responsabilidades del Comité de Convivencia Laboral:

1 Estricta confidencialidad de la información que conozcan en ejercicio de sus funciones. Para lo cual se firmará una cláusula de confidencialidad.

2 Asesorar y aportar de manera ética al comité sus conceptos con el fin de facilitar la toma de decisiones.

3 Asistir puntualmente a las reuniones programadas y presentar de manera oportuna el cumplimiento de las tareas asignadas por el comité.

4 Las demás que se sugieran y aprueben por unanimidad de los miembros del comité.

5 Declarase impedido en los casos que por razones éticas lo amerite.

FUNCIONES DEL PRESIDENTE

1 Convocar a los miembros del Comité a las sesiones ordinarias y extraordinarias.

2 Presidir y orientar las reuniones ordinarias y extraordinarias en forma dinámica y eficaz.

3 Tramitar ante la administración de la entidad pública o empresa privada, las recomendaciones aprobadas en el Comité.

4 Gestionar ante la alta dirección de la entidad pública o empresa privada, los recursos requeridos para el funcionamiento del Comité.

FUNCIONES DEL SECRETARIO

1 Recibir y dar trámite a las quejas presentadas por escrito en las que se describan las situaciones que puedan constituir conflicto laboral, así como las pruebas que las soportan.

2 Enviar por medio físico o electrónico a los miembros del Comité la convocatoria realizada por el presidente a las sesiones ordinarias y extraordinarias, indicando el día, la hora y el lugar de la reunión.

3 Citar individualmente a cada una de las partes involucradas en las quejas, con el fin de escuchar los hechos que dieron lugar a la misma.

4 Citar conjuntamente a los trabajadores involucrados en las quejas con el fin de

Powered by CamScanner

establecer compromisos de convivencia.

5 Llevar el archivo de las quejas presentadas, la documentación soporte y velar por la reserva, custodia y confidencialidad de la información.

6 Elaborar el orden del día y las actas de cada una de las sesiones del Comité.

7 Enviar las comunicaciones con las recomendaciones dadas por el Comité a las diferentes dependencias de la entidad pública o empresa privada.

8 Citar a reuniones y solicitar los soportes requeridos para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada una de las partes involucradas.

9 Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a la alta dirección de la entidad pública o empresa privada.

10 La responsabilidad de la ARL, con base en la información disponible por las empresas en factores de riesgo psicosocial, llevarán a cabo acciones de asesoría y asistencia técnica para el desarrollo de medidas preventivas y correctivas que deban ser gestionadas por los Comités de Convivencia según la legislación actual.

Con la creación del Comité de Convivencia se está dando cumplimiento a las normas legales vigentes.

INTEGRANTES DEL COMITÉ POR LA EMPRESA

NOMBRE	FIRMA
Aurelio Cubides Rodríguez	
Haner Alberto Gallego Mejía	

INTEGRANTES DEL COMITÉ POR LOS TRABAJADORES

NOMBRE	FIRMA
María Edith Aldana Hoyos	María Aldana.
Yasmin Roció Martínez Medina	Yasmin Rocio Medina

Powered by CamScanner

ANEXO 9. DOCUMENTACION MAQUINARIA

HOJA DE VIDA MAQUINARIA PESADA No. 0029

DATOS

TIPO:		VIBROCOMPACTADOR			
AÑO	1989	MARCA	DYNAPAC	MODELO	CA15
SERIE	672B689	COLOR	AMARILLO	CAPACIDAD	7200 Kg
MOTOR	LD864IB320902	COMBUSTIBLE	ACPM	REFRIGERACION	AGUA
ACEITES		MOTOR	15W40	HIDRAULICO	B125
LLANTAS		DELANTERAS	N/A	TRASERAS	12-16NHS-R10 / 45 LGS



FILTROS

COMBUSTIBLE	A-243004	ACE. MOTOR	HCX - 3900	UNIVERSAL	GF-62
AIRE EXTERNO		RS 3845	AIRE INTERNO		TFPL6001853110

OBSERVACIONES:

FICHA TECNICA PARA MANTENIMIENTO

ITEM	FECHA	CONSUMIBLES Y/O MANTENIMIETO	REFERENCIA	CANT.	ITEM	FECHA	CONSUMIBLES Y/O MANTENIMIETO	REFERENCIA	CANTIDAD
1	16-Jun-25	Tapa Frontal	4BT	1 Un.	16				
2	16-Jun-25	Filtro de Combustible	A-243004	1 Un.	17				
3	16-Jun-25	Filtro de Combustible	A-4DSP	1 Un.	18				
4	16-Jun-25	Filtro de Aceite	BT-42	1 Un.	19				
5	16-Jun-25	Filtro universal gasolina malla		2 Gal.	20				
6	16-Jun-25	Tapizado de la silla		1 Un.	21				
7	16-Jun-25	Manguera Bomba combustible		2 Un.	22				
8					23				
9					24				
10					25				
11					26				
12					27				
13					28				
14					29				
15					30				

FIRMA INGENIERO MAQUINARIA:

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

INVOICE

ROADTEC, INC.

BILL TO	SHIP TO	
Banco De Occidente Nit 890.300.27-4 Carrera 13 # 26-45 Piso 12	Vicon, S.A. Nit 860.030.917.7 Colombia	Invoice # R11-126 Invoice Date March 31, 2011

DATE	SALES REP.	F.O.B.	TERMS
03/31/11	Lavaud	Miami Port	Pmt. In Full Prior To Shipment

QTY	DESCRIPTION	UNIT PRICE	TOTAL
1	Used 2006 Roadtec RP190 Rubber Tire Paver, Serial Number 207 with Eagle 10 Screed, Serial Number 116	$113,700.00	$113,700.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		Subtotal	$113,700.00
		Tax	0.00
		Shipping	0.00
		BALANCE DUE	$113,700.00

Wire Instructions:
Roadtec, Inc.
Wachovia Bank, N.A.
230 4th Avenue North
Nashville, TN 37219
Account # - 2000031376196
ABA #: 111025013 (Wire Transfer)
ABA# 062000080 (ACH Payments)
SWIFT: PNBPUS33CHA

Billing Questions:
Regina Moffitt
(423) 622-9202

Remit Payment To:
Roadtec, Inc.
2909 Riverside Drive
Chattanooga, TN 37406

Roadtec, Inc.
2909 Riverside Dr.
Chattanooga, Tn 37406

PHONE (423) 622-9202
FAX (423) 622-7318

CamScanner

DO 181108209

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año 2011

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de Formulario

4820110002310 88-4

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 890306279 | 6. DV: 4 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: BANCO DE OCCIDENTE

13. Dirección: CR 4 7 61 P 14 | 15. Teléfono: 8851111 | 16. Cód. Actividad: 48 | 16. Cód. Dpto.: 76 | 17. Cód. Ciudad/Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 811001259 | 25. DV: 7 | 26. Apellidos y nombres o Razón Social: AGENCIA DE ADUANAS ROLDAN S A NIVEL 1 | 27. Tipo Documento: 26 | 28. Cód. Usuario: 0105

29. Número de Identificación: 30770975 | 30. Apellidos y nombres: FUENTES HERRERA DILSIA

31. Clase Declarante	32. Tipo Declaración	33. Cód.	34. No. Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cód. Aduana	37. Declaración Corrección	38. Año - Mes - Día	39. Cód. Modelo
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cód. Lugar Arribo	41. Cód. Depósito	42. Manifiesto de Carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de Transporte	45. Año - Mes - Día
CTG	7201	No 116575002352553	2011 - 06 - 23	No PEVCTG55237	2011 - 06 - 17

46. Nombre exportador o proveedor en el Exterior: ROADTEC, INC | 47. Ciudad: CHATTANOOGA | 48. Cód. País Exportación: 249

46. Dirección exportador o proveedor en el Exterior: 2909 RIVERSIDE DR CHATTANOOGA, TN | 50. Email: WWW.ROADTEC.COM

51. No. de Factura	52. Año - Mes - Día	53. Cód. país procedencia	54. Cód. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cód. Puerto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ vs
R11-120	2011 - 03 - 31	249	1	434	25	CARIBBEAN AMERICAN SHIPPING AGENCY LTDA	1,772.32

S

59. Subpartida arancelaria	60. Cód. Complementario	61. Cód. Suplementario	62. Cód. Mercancía	63. No. unidades	64. Valor en USD	65. Posición del ítem	66. Cód. país de origen	67. Cód. Arancel
8479100000	XX	XX	C136	XX	XXXX	XX	249	XXX

68. Forma de pago	69. Tipo de importación	70. Cód. país compra	71. Peso bruto kgs	72. Peso neto kgs	73. Código embalaje	74. No. Bultos	75. Subpartidas	76. Cód. unidad comercial	77. Cantidad de unidades
01	01	249	18,098.00	18,098.00	PK	1	1	u	1.00

78. Valor FOB USD	79. Valor flete USD	80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Subtotal otros fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajustes USD
113,700.00	6,347.51	272.88	980.05	7,600.44	0.00

84. Valor aduana $	85. Cód. tipo cambio	86. Monto
121,300.44	L	2075,889

87. Cód. tipo ítem	88. Año	89. Programa No.	90. Cód. tipo operación
3	2011	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	214,963,196	0	0	0
IVA	16.00	214,963,196	34,397,000	0	0
Subpartidas	0.00	0	0	0	0
Otros Conceptos	0.00	0	0	0	0
Otros Ajustes	0	0	0	0	0
Sanciones	0	0	0	0	
Intereses	0	0	0	0	
Total			34,397,000		0

91. Descripción de las mercancías (Marca, tipo de referencia, calidad, modelo, clase, grado, capacidad, componentes, accesorios, uso o destino, y demás características que permitan identificar comercialmente la mercancía)

IMPORTADO BAJO EL 181108209 NOS ACOGEMOS AL DECRETO 1571/251 MAQUINA ASFALTADORA MARCA ROADTEC MODELO RP-190 CON MESA RADIAL Y CONTROLES MUDA, MOTOR DIESEL DE 200HP DE POTENCIA, SISTEMA DE PROPULSION CON BOMBAS HIDRAULICAS DE CAUDAL VARIABLE, NEUMATICOS MOTRICES, RENGLON VIBRATORIO DE 70PULGADAS, SISTEMA RATIACION DE GASES, MANDO HIDROSTATICO DIRECTO, DOBLE PUESTO DE OPERACION, CON SUS ACCESORIOS PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO, EQUIPO USADO AÑO FABRICACION 2006, PRECIO DE NUEVA US$90.000,00 PAVIMENTADORA ROADTEC 8 DE IDENTIFICACION; MAQUINA ROADTEC RP-190,NO. DE IDENTIFICACION: RP-190-267, EAQUE 10-516, CON MOTOR MARCA, CAT, MODELO: C7 ACERT, S/N: 1100367, LLANTAS TRASERAS MARCA: GALAXY 18.00 25, PISTA MANUAL MODA, TYPE: SONIC-SP) (CANT. ART. NO. 31-100)(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Forma de pago anterior: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Autorización Embarque Especial (Automóviles)	131. Espacio reservado para Autoridad Monetaria, de Regulación y Estadísticas	132. No. Aceptación Declaración: 4820110002310 88
		133. Fecha: 2011 07 05

134. Levante No: 4820110002078 29	135. Fecha: 2011 - 07 - 05	Firma(s) autorizada(s)	136. Aforador: 137. C.C. No.

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad financiera (Fecha efectiva de la transacción)

Cancele el importe de la casilla 980 en efectivo o cheque de este formulario

980. Pago Total $: 0

Número de Formulario

BOGOTA
Autoadhesivo 0120410[illegible]
Fecha presentacion 2[illegible]18 00:00
Valor pagado $0

CamScanner

Fecha de Impresión 2011-07-06 08:01:31

20114165401496

384

DO 181108209

DIAN
REPUBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : 482011000231088-4
Subpartida : 8479100000

105 Continuación descripción mercancías (incluya marcas, seriales y otros)

28. S/N: 5087-095 095, ART. NO. 04-21-10020, S/N: 5086-095 095 PIEF. 67130 CANT: 1 UM:

AGENCIA ROLDAN S.A.

NIT 8110012597

REMISION No. 05112383
FECHA: CARTAGENA, 2011-07-14

D.O: 181008209 PEDIDO No : MQ-279 CTO.180-73099 VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A - VICON
DESTINATARIO : BANCO DE OCCIDENTE
DIRECCION : CR 4 7-61 PISO 14
TRANSPORTADOR : MUNDITRANSPORTES
PROVEEDOR : ROADTEC, INC
INSTRUCCIONES : DADAS AL TRANSPORTADOR POR PARTE DEL CLIENTE

Remitimos el cargamento procedente de ESTADOS UNIDOS amparado por el documento de transporte No. PEVCTG09237 ubicado en CONTECAR TERMINAL CONEDOR. DE C/GENA S.A. El cual arribo en la motonave HEINRICH SIBUM el dia 2011-06-20

BULTOS	DESCRIPCION	PESO
1.00	MAQUINA ASFALTADORA	[illegible]

OBSERVACIONES : ANEXAMOS, COPIAS DECLARACIONES, BL
FECHA DESPACHO : 2011-07-14
PARCIALES : TOTAL
CONDUCTOR : PENDIENTE POR CONFIRMAR
PLACA : PENDIENTE POR CONFIRMAR

AGENCIA DE ADUANAS ROLDAN S.A. NIVEL 1 - EMERSON NOGUERA VALIENTE C.C 73582643

COMO TRANSPORTADOR DECLARO QUE HE(MOS) RECIBIDO EN PERFECTO ESTADO, SIN AVERIA, SENALES DE SAQUEO, NI FALTA DE PESO EL CARGAMENTO A QUE SE REFIERE ESTA REMISION Y POR LO TANTO CUALQUIER DANO O FALTANTE SERA MI (NUESTRA) RESPONSABILIDAD.

RECIBIDO TRANSPORTADOR

NOMBRES:

CC:

RECIBIDO CLIENTE

NOMBRES:

CC:

CamScanner

VICON

Bogotá D.C. 25 de agosto de 2011.

Señores:
BANCO DE OCCIDENTE
Ciudad.

Respetados Señores:

Por medio de la presente informamos el recibido a entera satisfacción del bien relacionado en los contrato de Leasing No. 18073099.

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	PAVIMENTADORA ROADTEC MODELO RP190-10 (MÁQUINA ASFALTADORA)

Cordialmente,

VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. – VICON S.A.
NIT N°. 860.030.977-7
Representada legalmente por
ALFONSO VEJARANO GALLO
C.C N°. 17.010.931

CamScanner

KING OCEAN SERVICES

King Ocean Services LTD.

BILL OF LADING
International Bill of Lading

Shipper - Exporter / Proveedor - Exportador
ROADTEC (TN)
2909 RIVERSIDE DRIVE
CHATTANOOGA,FTN 37406

Bill of Lading **PEVCTG09237**
Booking Number: 10071256 Job Number 00111086-02

Export References
CONS: 06500/11

Forwarder Agent / Agente Expedidor Broker:

Forwarder Ref. F.M.C. No.

Consignee / Consignatario
BANCO DE OCCIDENTE
NIT: 890.300.279-4
CRA 13 # 26-46 PISO 4
BOGOTA, COLOMBIA
TEL: 57-1-4892000.CTC: ALVARO MONTOYA

Notify Party / Notificar
VICON S.A
NIT: 860.030.917-7
UNITED LOGISTIC SERVICE S.A
NIT: 805.009.473-5 / TEL: 571-6060200
OPERACIONES6@ULSCARGO.COM

Routing and Instructions / Ruta e Instrucciones

Place of Receipt / Lugar de Recibo	Precarriage by / Transportado por	Loading Pier / Terminal	Type of Move / Modalidad
PORT EVERGLADES, US	.NOT AVAILABLE.	PORT EVERGLADES CONTAINER YARD	LOOSE CARGO
Vessel and Voyage	**Port of Loading / Puerto de Carga**		
HEINRICH SIBUM / 38SB	PORT EVERGLADES, UNITED		
Port of Discharge / Puerto de Descargue	**Place of Delivery - Lugar de Destino Final**	**Point and Country of Origin**	**Service Contract**
CARTAGENA, CO	CARTAGENA, CO	PORT EVERGLADES	.N/A.

PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER

Marks & Numbers	DR/TIR	No. of Pkgs	HM	Description of Packages and Goods	Gross Weight	Measurements
AS ADDRESSED	99033	1 UN		USED 2006 ROADTEC RP190 10' RUBBER TIRE PAVER, SERIAL NUMBER 207 WITH EAGLE 10 SCREED, SERIAL NUMBER 116 CTO 180-73699	39,899.26 LB 18,098.00 KG	2,700.62 CF 76.476 M3

'Freight Collect
-.CARRIER NOT RESPONSIBLE FOR DENTS, SCRATCHES AND/OR ANY CARGO STOWED LOOSE IN VEHICLES. THIS APPLIES TO ALL USED VEHICLES.
'' EXPRESS RELEASE B/L AT DESTINATION ''
X20110608012284
THESE COMMODITIES, TECHNOLOGY OR SOFTWARE WERE EXPORTED FROM THE UNITED STATES IN ACCORDANCE WITH THE EXPORT ADMINISTRATION REGULATIONS. DIVERSION CONTRARY TO U.S. LAW PROHIBITED.

TOTALS	1	39,899.26 LB 18,098.00 KG	2,700.62 CF 76.476 M3

Shipper declared value $ _____ AS PER TARIFF OR 0.50 PER LB

Charge Description	Prepaid	Collect

TOTAL FREIGHT AND CHARGES IN US $ _____

NON-NEGOTIABLE

Dated At PORT EVERGLADES, UNITED On June 17, 2011

By (Name of Agent) KING OCEAN AGENCY INC.

For (for the Master)

TERMS OF BILL OF LADING CONTINUED ON BACK HEREOF

CamScanner

OO 181108209

DIAN — Declaración de Importación

Privada | 500

1 Año: 2011

4 Número de Formulario: 482011000231088-4

5 Nit: 860306279 | 6 DV: 4 | 13 Nombre: BANCO DE OCCIDENTE

14 Dirección: CR 4 7 61 P 14 | 15 Teléfono: 3561111 | 16 Cód. Depto: 48 | 16 Cód. Ciudad: 76 | 17 Cód. Ciudad/Municipio: 001

24 Nit: 811001259 | 25 DV: 7 | 26 Primer apellido del Importador: AGENCIA DE ADUANAS ROLDAN S A NIVEL 1 | 27 Tipo nombre: 26 | 28 Cód. sucursal: 0105

29 Número de identificación: 3077676 | 30 Apellidos y nombres: FUENTES HERRERA DILSIA

31 Cl...: 02 | 32 Tipo persona: Jurídica | 33 Cl...: 1 | 34 No Aceptación: XXXXXXXXXXXXX | 35 Adm...: YYYY - XX - XX | 36 ...: XX | 37 Modalidad: No XXXXXXXXXXXXXX | 38 Adm. Mod. Dec: YYYY - XX - YX | 39 ...: XX

40 Lugar de pago: CTG | 41 Cód. Dep.: 7201 | 42 Manifiesto de Carga: No 116575002302553 | 43 Fe...: 2011 - 06 - 23 | 44 Documento de Transporte: No PEVU70 | 45 Adm. Mod. Dec: 2011 - 06 - 27

46 Nombre: ROADTEC INC | 47 Ciudad: CHATTANOOGA | 48 Cód. Exportador: 242

49 Dirección: 5909 RIVERSIDE DR CHATTANOOGA TN | 50 Email: WWW.ROADTEC.COM

51 Partida Arancel: R11.120 | 52 Adv. Mes Día: 2011 - 03 - 31 | 53 Cód. Ciudad Procedencia: 249 | 54 Cód. Modo Transporte: 1 | 55 Código de Bandera: 434 | 56 Cód. Origen: 25 | 57 Empresa Transporte: CARIBBEAN AMERICAN SHIPPING AGENCY LTDA | 58 Tasa de cambio $ por USD: 1,772.32

S | 59 Subpartida Arancelaria: 8479100000 | 60 Cód. Complementario: XX | 61 Cód. Suplementario: XX | 62 Cód. Mercancía: C136 | 63 No. unidades Arancel: XX | 64 Valor en USD: XXXX | 65 Peso Bruto (kilos): XX | 66 Cód. País de Origen: 249 | 67 Cl. Arancel: XXX

68 Forma de pago: 01 | 69 Tipo de cambio: 01 | 70 Cód. país Comprador: 249 | 71 Peso bruto kgs: 18,099.00 | 72 Peso neto kgs: 18,099.00 | 73 Código Unidad Medida: PK | 74 No Unidades: 1 | 75 Subpartidas: 1 | 76 Cód. unidad Comercial: u | 77 Cantidad Unidades: 1.00

78 Valor FOB USD: 113,700.00 | 79 Valor Bruto USD: 6,347.51

80 Valor Seguros USD: 272.56 | 81 Valor Otros Gastos USD: 980.05

82 Valor Deducciones USD: 7,600.44 | 83 Valor Aduana USD: 0.00

[illegible]: 7,221,000.44 | 85 Tipo Liquidación: L | 86 No. Liquidación: 2073[illegible]

87 Cód. Ciudad: 3 | 88 Año: 2011 | 89 Programa No: XXXXXXXXXX | 90 Consecutivo Adición: 0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
[illegible]	0.00	214,983,196	0	0	0
IVA	16.00	214,983,196	34,397,000	0	0
[illegible]	0.00	0	0	0	0
[illegible]	0.00	0	0	0	0
[illegible]	0	0	0	0	0
[illegible]	0	0	0	0	
[illegible]	0	0	0	0	
		Total	34,397,000		0

81 Observaciones: ADICION DO 181108209 NOS ACOGEMOS AL DECRETO 1971/2011 MAQUINA ASFALTADORA MOTA RTAD,mod MODELO RP-190 CON MESA EXTRA Y CONTROL DE MESA, MOTOR DIESEL DE 215HP DE POTENCIA, SISTEMA DE PROPULSION CON BOMBAS HIDRAULICAS DE CAUDAL VARIABLE, REMATADOR HIDRAULICO, PESADOR VIBRATORIO DE TUBERIAS, SISTEMA EXTRACTOR DE GASES, MANDO HIDROSTATICO DIRECTO, DOBLE PUESTO DE OPERACION, CON SUS ACCESORIOS PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO, EQUIPO USADO AÑO FABRICACION 2006, PRECIO DE IDICIA USADO/DEPRECIADO PAVIMENTADORA ROADTEC # DE SERIE [illegible]2621256; MAQUINA ROADTEC REMOLQUE, DE COMPACTACION RP-190-207, BANDA DE [illegible] CON MESA MOTA CAT, MODEL: C7 ACERT, SERIE: [illegible] DE 238, LLANTAS TRASERAS NEUMATICAS GALAXY 16.00 20, FIBRA MANUAL MOTA, TIPO: SUPERSIZE [illegible], AÑO DE [illegible]

177 Valor pagos Anticipados: 0 | 178 Forma de pago: XXXXXXXXXXXXX | 179 Fecha: XXXX XX XX

202 Entidad financiera donde se realizó el pago: [illegible] | 211 Entidad financiera donde se Presentó Esta Declaración: [illegible] | 212 No. Autoadhesivo del recibo: 482011000231088 | 213 Fecha: 2011 07 06

214 Consecutivo: 482011000231088 | 215 Fecha: 2011 - 07 - 06 | Espacio reservado para uso exclusivo de la DIAN | 216 Firma:

Firma declarante: | 997 Fecha límite para el pago de la declaración: | 998 Pago Total $: 0

BOGOTA
Autoadhesivo: 0120[illegible]
Fecha presentación: [illegible]
Valor pagado $0

Fecha de Impresión: 2011-07-06 06:01:31

20114165401496

CamScanner

DO 181008209

DIAN
REPUBLICA DE COLOMBIA

Declaración de Importación

Aceptación : 482011000231088-4
Subpartida : 8479100000

Página 1 de

VICON S.A - Yolanda Bohórquez

De: Diego Mauricio Gonzalez [operaciones6@ulscargo.com]
Enviado el: viernes, 27 de mayo de 2011 16:57
Para: Nancy Leon Moreno (ROLDAN)
CC: administracion@vicon-sa.com; Jennyffer Angel
Asunto: ULS/ CONFIRMACION DE DESPACHO//DESPACHO MARITIMO ROADTEC - VICON S.A./7443

Bogotá D.C., 27 de Mayo de 2011

Señores
BANCO DE OCCIDENTE/VICON SA
Atn. Sra. Nancy Leon
Ciudad

Apreciados Sres., adjunto encontrarán información referente a su embarque:

BOOKING NUMBER	11IM057443
CARRIER	KING OCEAN
VESSEL	MERWE TRADER
ETD ORIGIN PORT	03 DE JUNIO DE 2011
POL	PORT EVERGLADES
POD	CARTAGENA
ETA DEST. PORT	08 DE JUNIO DE 2011 APROX

** Itinerario sujeto a cambio sin previo aviso **

Cualquier inquietud no dude en consultarnos. Recuerde que estamos para servirle,

Gracias por confiar en nuestros servicios.

Regards/ Cordialmente,

Diego Gonzalez
Unimal Logistics Services S.A
Carrera 9 # 80-15 of. 02 - Bogotá-Colombia
Tel: (57) (1) 6050200 EXT. 731
operaciones6@ulscargo.com
www.epllogistics.com
www.ulscargo.com

CamScanner

KING OCEAN SERVICES

King Ocean Services LTD.

7811- 8209

BILL OF LADIN(

International Bill of Lading

Shipper - Exporter / Proveedor - Exportador
ROADTEC (TN)
2909 RIVERSIDE DRIVE
CHATTANOOGA,FTN 37406

Bill of Lading **PEVCTG09237**

Booking Number 10071256 Job Number 00111065-02

Export References
CONS: 06500/11

Forwarder Agent / Agente Expedidor Broker

Consignee / Consignatario
BANCO DE OCCIDENTE
NIT: 890.300.279-4
CRA 13 # 26-45 PISO 4
BOGOTA, COLOMBIA
TEL: 57-1-4882000.CTC: ALVARO MONTOYA

Cartagena Terminal Services Agency
Agencia de Servicios
Cartagena de Cartagena

Forwarder Ref.

Notify Party / Notificar
VICON S.A
NIT: 860.030.917-7
UNITED LOGISTIC SERVICE S.A
NIT: 806.009.473-5 / TEL: 571-6050200
OPERACIONES6@ULSCARGO.COM

Entrar Instrucciones / Ruta e-Instrucciones

24 JUN 2011

Place of Receipt / Lugar de Recibo	Precarriage by / Transportado por		
PORT EVERGLADES, US	.NOT AVAILABLE.		
Vessel and Voyage	Port of Loading / Puerto de Carga	Loading Pier / Terminal	Type of Move / Movimiento
HEINRICH SIBUM / 38SB	PORT EVERGLADES, UNITED	PORT EVERGLADES CONTAINER YARD	LOOSE CARGO
Port of Discharge / Puerto de Descargue	Place of Delivery / Lugar de Destino Final	Port and Country of Origin	Service Contract
CARTAGENA, CO	CARTAGENA, CO	PORT EVERGLADES	.N/A.

PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER

Marks & Numbers	DRITR	No. of Pkgs	HM	Description of Packages and Goods	Gross Weight	Measurement
AS ADDRESSED	99033	1 UN		USED 2006 ROADTEC RP190 10' RUBBER TIRE PAVER, SERIAL NUMBER 207 WITH EAGLE 10 SCREED, SERIAL NUMBER 116 CTO 180-73099	39,899.26 LB 18,098.00 KG	2,700.62 (76.476 M

"Line does not make itself responsible for freight amount represented on this BL".
**Freight Collect*
-CARRIER NOT RESPONSIBLE FOR DENTS, SCRATCHES AND/OR ANY CARGO STOWED LOOSE IN VEHICLES. THIS APPLIES TO ALL USED VEHICLES.
*** EXPRESS RELEASE B/L AT DESTINATION ***
X20110608012284
THESE COMMODITIES, TECHNOLOGY OR SOFTWARE WERE EXPORTED FROM THE UNITED STATES IN ACCORDANCE WITH THE EXPORT ADMINISTRATION REGULATIONS. DIVERSION CONTRARY TO U.S. LAW PROHIBITED.

TOTALS	1	39,899.26 LB 18,098.00 KG	2,700.62 (76.476 M

Shipper declared value $ _____ AS PER TARIFF AND CARRIER'S LIABILITY LIMITS (SEE CLAUSE 13 OVERLEAF)

Charge Description	Prepaid	Collect

KING OCEAN SERVICES
Cartagena
NIT ...

AS PER AGREEMENT

ORIGINAL

Received by the Carrier for shipment by ocean vessel between port of loading and port of discharge, and for land arrangement or procurement of pre-carriage from place of receipt and on carriage to place of delivery where same above. The goods as specified above in apparent good order and condition unless otherwise state. The goods to be delivered at the aforementioned port of discharge or place of delivery, whichever is applicable, subject to the exceptions, limitations, conditions and liberties set out on the reverse side hereof to which the Shipper and Consignee agree to accepting this Bill of Lading.
IN WITNESS WHERE OF three (3) original Bills of Lading have been signed not otherwise stated above one of which being accomplished, the others shall be void.

Dated At PORT EVERGLADES, UNITED On June 17, 2011

By (Name of Agent) KING OCEAN AGENCY INC.

Per (for the Master)

CamScanner

TERMS OF BILL OF LADING CONTINUED ON BACK HEREOF

392

VICON S.A - Yolanda Bohórquez

De: Nancy Leon Moreno (ROLDAN) [NLeon@bancodeoccidente.com.co]
Enviado el: viernes, 20 de mayo de 2011 12:10
Para: administracion@vicon-sa.com
CC: Nubia Clemencia Martinez Rocha; Juan C Ferrans
Asunto: MQ-279 CTO. 18073099 VICON SA

Yolanda buen día

Le confirmo el estado de la licencia.

Número Solicitud: LIC-20795889-19052011
Radicador: AGENCIA DE ADUANAS ROLDAN S. A. NIVEL 1 - FREDY MANUEL ESTERLING HILL
Fec Radicacion: 2011-05-19T17:04:27.297
Etapa: CNT_Concepto Produccion Nacional
Estado: ASIGNADO

Número Solicitud: LIC-20795889-19052011
Radicador: AGENCIA DE ADUANAS ROLDAN S. A. NIVEL 1 - FREDY MANUEL ESTERLING HILL
Fec Radicacion: 2011-05-19T17:04:27.297
Etapa: RDA PREVIA Revision de Datos y Anexos
Estado: NOTIFICADO

Cordialmente,

Nancy León Moreno
ROLDAN LOGISTICA
Inhouse Banco de Occidente
Cra. 13 No. 26-45 Piso 4
Bogotá - Colombia
Phone. (571) 4882000 Ext. 1230
Fax : 571-3520413 / 17
Celular. 315-7712986

Este mensaje de correo electrónico y los archivos adjuntos están dirigidos exclusivamente a los destinatarios especificados. Puede contener información confidencial o legalmente protegida. Si usted no es el destinatario, por favor le solicitamos que lo elimine. Se informa que directa o indirectamente, usar, revelar, distribuir, imprimir o copiar alguna de las partes de este mensaje está prohibido. Para fines de soporte legal los mensajes de correo electrónico están contemplados en la Ley 527 de 1999, en la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos por medios electrónicos

De: Nancy Leon Moreno (ROLDAN)
Enviado el: Jueves, 19 de Mayo de 2011 03:15 p.m.
Para: 'administracion@vicon-sa.com'
CC: Nubia Clemencia Martinez Rocha; Juan C Ferrans; Alvaro Edgar Montoya Beltran; Consuelo Burgos Hurtado (ROLDAN)
Asunto: RE: MQ-279 CTO. 18073099 VICON SA

Yolanda buena tarde

De acuerdo al decreto 1571 de 2011, la partida arancelaria informada sobre el bien a importar es de gravamen 0% vigencia mayo 17 de 2012.

Cordialmente,

Nancy León Moreno
ROLDAN LOGISTICA
Inhouse Banco de Occidente
Cra. 13 No. 26-45 Piso 4

CamScanner

VICON S.A - Yolanda Bohórquez

De: Jennyffer Angel [sales9@ulscargo.com]
Enviado el: viernes, 20 de mayo de 2011 11:17
Para: NLeon@bancodeoccidente.com.co
CC: VICON S.A - Yolanda Bohórquez; Alba Del Rio
Asunto: Seguimiento: ULS/ Coordinacion Embarque Maquina Pavimentadora/Pev - Ctg/ Roadtec - Vicon S.A// MQ-279 CTO. 18073099 VICON S.A.

Estimadas Nancy y Yolanda

Buenos días, nos permitimos informar detalles de la reserva para transporte Marítimo de la Maquina Pavimentadora

Naviera:	KING OCEAN
Trayecto:	PEV / CARTAGENA
BOORING NR	10071256
VESSEL	HEINRICH SIBUM
VOYAGE	376B
ETD PEV	05/27
ETA CTG	06/02 Aprox.

Agradecemos por favor hacernos llegar el día de hoy los documentos solicitados tanto para la Creacion como Clientes en nuestra base de datos como los requeridos para el proceso de Validación y Aduana de Exportación de la maquina, de forma tal que logremos realizar la documentación necesaria para que la carga pueda salir de acuerdo a lo programado. La demora en la documentación puede
Ocasionar que se retrase el proceso y se deba reprogramar la salida desde Port Everglades.

Quedo atenta a sus importantes comentarios. Para cualquier inquietud quedo a su disposición. Slds!

****

Jennyffer Ellaine Angel
United Logistics Services S.A.
Cra 9 # 80-15 Ofc. 805
Tel: (57) (1) 6050200
Fax: (57) (1) 6050200 Ext 740 ó 4864740
E-mail: [redacted]

732

De: Jennyffer Angel
Enviado el: Jueves, 19 de Mayo de 2011 05:20 p.m.
Para: 'NLeon@bancodeoccidente.com.co'
CC: 'VICON S.A - Yolanda Bohórquez'; Alba Del Rio
Asunto: RE: ULS/ Coordinacion Embarque Maquina Pavimentadora/Pev - Ctg/ Roadtec - [redacted]A// MQ-279 CTO. 18073099 VICON S.A.

CamScanner

INVOICE

ROADTEC, INC.

BILL TO	Banco De Occidente Nit 890.300.27-4 Carrera 13 # 26-45 Piso 12	SHIP TO	Vicon, S.A. Nit 860.030.917.7 Colombia	Invoice #	R11-126
				Invoice Date	March 31, 2011

DATE	SALES REP.	F.O.B.	TERMS
03/31/11	Lavaud	Miami Port	Pmt. In Full Prior To Shipment

QTY	DESCRIPTION	UNIT PRICE	TOTAL
1	Used 2006 Roadtec RP190 Rubber Tire Paver, Serial Number 207 with Eagle 10 Screed, Serial Number 116	$113,700.00	$113,700.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		Subtotal	$113,700.00
		Tax	0.00
		Shipping	0.00
		BALANCE DUE	$113,700.00

Wire Instructions:
Roadtec, Inc.
Wachovia Bank, N.A.
230 4th Avenue North
Nashville, TN 37219
Account # - 2000031376196
ABA #: 111025013 (Wire Transfer)
ABA# 062000080 (ACH Payments)
SWIFT: PNBPUS33CHA

Billing Questions:
Regina Moffitt
(423) 622-9202


Remit Payment To:
Roadtec, Inc.
2909 Riverside Drive
Chattanooga, TN 37406

Roadtec, Inc.
2909 Riverside Dr.
Chattanooga, Tn 37406

PHONE (423) 622-9202
FAX (423) 622-7318

CamScanner

Una compañía de Astec

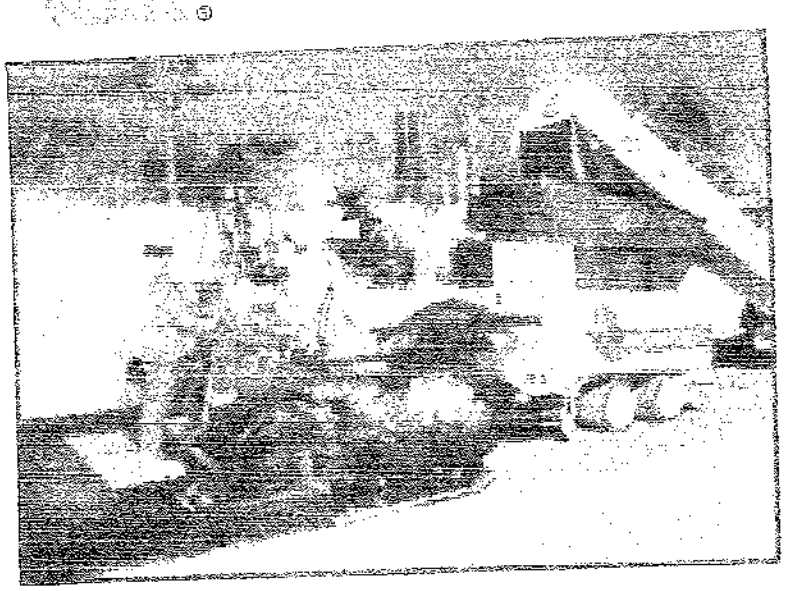

La RP-190 es una pavimentadora de 200 hp con neumáticos de caucho que cuenta con puestos dobles para el operador, un mando hidrostático directo, un sistema de extracción de gases estándar, sinfines de elevación e inclinación hidráulica, control de alimentación, transportadores anchos con placas de piso de aleación de acero y control de gradiente y pendiente automático o mecánico. La RP-190 viene equipada con un reglón vibratorio estándar de 10 pies (3.0 m) o un reglón vibratorio extensible hidráulicamente que puede pavimentar a una anchura de hasta 24 pies (7,3 m) con extensiones.

ESPECIFICACIONES DE LA RP-190

MOTOR:
[illegible] Tier II de 3,4 L, 415 pulg³ (6,8 l), 6 cilindros, 200 hp a 2400 rpm

SISTEMA DE PROPULSIÓN:
Bomba hidrostática de desplazamiento variable y motor de pistones axiales de velocidad variable con control electrónico. La velocidad de pavimentación puede ser de 0 a 250 pies/min (0-76 m/min). La velocidad de traslado es de 0-12 mph (0-19,3 km/h).

SISTEMA ELÉCTRICO:
Sistema de arranque de 12 V con alternador de 12 V, 90 A. Todas las funciones eléctricas de 12 V están protegidas por disyuntores.

SINFINES:
Sinfines de alimentación de [illegible] pulg (305 mm) x 3/8 pulg (9,5 mm) de grosor. Los sinfines de alimentación están impulsados por motores hidráulicos de velocidad variable para proporcionar una distribución uniforme del material.

LIMITADOR DE ALIMENTACIÓN:
Permite ajustar la altura de la [illegible] para controlar la cantidad de material que pasa por debajo.

NEUMÁTICOS:
Motrices de caucho de baja presión y alto par de 10,00 x 20 pulg (25,4 mm x 508 mm). Estándar de 11 pulg de ancho x 24 pulg de diámetro (279 mm x 610 mm).

REGLÓN:
Regulación [illegible] pulg (457 mm) para pavimentar [illegible] pulg (3 mm) de espesor. Longitud estándar de 10 pies (3,0 m) de [illegible] pies 3 pulg (12,7 mm) de grosor. Compensación de [illegible] de 3,5% por [illegible] 4,5% por [illegible].

SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE GASES:
Dos [illegible] de [illegible] pulg de diámetro (equivalente de 16 pulg) (406 mm).

CAPACIDAD DE SERVICIO:
[illegible] 50 gal (189,5 l)
Sistema de [illegible] 5 gal (18,9 l)
Tolva [illegible] 13 [illegible] (11,8 [illegible])

PESO DE TRANSPORTE*: 49 [illegible] lb (17 463 kg)
*Peso [illegible]

OPCIONES:
EXTENSIONES DE REGLÓN:
El regulación [illegible] pies 6 pulg (2,13 m) a 24 pies (7,3 m) [illegible] de 42 pulg (1,07 m) [illegible] de 8 pies 6 pulg (2,59 m) a 12 pies (3,65 m), 14 pies (4,26 m) y 16 pies (4,87 m) de 38 pulg (914 mm) [illegible] de 24 pies (7,3 m) con [illegible].

EXTENSIONES DE TÚNEL Y SINFÍN:
[illegible] de [illegible] pulg (914 mm) [illegible] pulg (1,07 m) [illegible] para pavimentar [illegible] pulg (406 mm).

EXTENSIONES DE EXTRACTOR HIDRÁULICO:
[illegible] de [illegible] pies 6 pulg (2,13 m) a 24 pies (7,3 m) [illegible] de 42 pulg (1,07 m) [illegible] de 8 pies 6 pulg (2,59 m) a 12 pies (3,65 m), 14 pies (4,26 m) y 16 pies (4,87 m) de 38 pulg (914 mm) [illegible] de 24 pies (7,3 m) con [illegible].

OPCIONES (cont.):
CONTROL AUTOMÁTICO DE GRADIENTE:
[illegible] de [illegible] pies 6 pulg (2,13 m) a 24 pies (7,3 m) [illegible] de 42 pulg (1,07 m) [illegible] de 8 pies 6 pulg (2,59 m) a 12 pies (3,65 m), 14 pies (4,26 m) y 16 pies (4,87 m) de 38 pulg (914 mm) [illegible] de 24 pies (7,3 m) con [illegible].

CONTROL AUTOMÁTICO DE PENDIENTE:
[illegible] de [illegible] pies 6 pulg (2,13 m) a 24 pies (7,3 m) [illegible] de 42 pulg (1,07 m) [illegible] de 8 pies 6 pulg (2,59 m) a 12 pies (3,65 m), 14 pies (4,26 m) y 16 pies (4,87 m) de 38 pulg (914 mm) [illegible] de 24 pies (7,3 m) con [illegible].

TRANSPORTADORA ACANALADA HIDRÁULICA:
[illegible] de [illegible] pies 6 pulg (2,13 m) a 24 pies (7,3 m) [illegible] de 42 pulg (1,07 m) [illegible] de 8 pies 6 pulg (2,59 m) a 12 pies (3,65 m), 14 pies (4,26 m) y 16 pies (4,87 m) de 38 pulg (914 mm) [illegible] de 24 pies (7,3 m) con [illegible].

ENGANCHE PARA REMOLQUE:
[illegible] de [illegible] pies 6 pulg (2,13 m) a 24 pies (7,3 m) [illegible] de 42 pulg (1,07 m) [illegible] de 8 pies 6 pulg (2,59 m) a 12 pies (3,65 m), 14 pies (4,26 m) y 16 pies (4,87 m) de 38 pulg (914 mm) [illegible] de 24 pies (7,3 m) con [illegible].

ESPINA PROTECTORA:
[illegible] de [illegible] pies 6 pulg (2,13 m) a 24 pies (7,3 m) [illegible] de 42 pulg (1,07 m) [illegible] de 8 pies 6 pulg (2,59 m) a 12 pies (3,65 m), 14 pies (4,26 m) y 16 pies (4,87 m) de 38 pulg (914 mm) [illegible] de 24 pies (7,3 m) con [illegible].

ZAPATAS DE CORTE:
[illegible] de [illegible] pies 6 pulg (2,13 m) a 24 pies (7,3 m) [illegible] de 42 pulg (1,07 m) [illegible] de 8 pies 6 pulg (2,59 m) a 12 pies (3,65 m), 14 pies (4,26 m) y 16 pies (4,87 m) de 38 pulg (914 mm) [illegible] de 24 pies (7,3 m) con [illegible].

ELEVADOR DE TOLVA PARA EL CAMBIO DE TRANSPORTE UTILIZA CONTROLES SÍNCRONOS DE GRADIENTE Y PENDIENTE

800 MANUFACTURERS ROAD • CHATTANOOGA, TN 37405 EE.UU. • TELÉFONO 423-265-0600 • FAX 423-267-7104

[illegible] Productos [illegible] sujetos a cambios sin previo aviso.

CamScanner

CamScanner

SECTION 01153

CHANGES IN THE WORK

PART 1 – GENERAL

1.1 DESCRIPTION

A. Work included: Contractor shall make changes in the Work and in the Contract Sum or Contract Time, or both, after execution of the Contract, without invalidating the Contract, by means of a Designer's Field Order, Proposal Request or Change Order, in accordance with the Contract Documents.

B. Related Work:
1. Documents affecting the Work of this Section include, but are not necessarily limited to, General Conditions, Supplementary Conditions and all Sections of these Specifications.
2. Changes in the Work are described in Agreement Between Owner and Contractor.

1.2 QUALITY ASSURANCE

A. Contractor shall include within the Contractor's quality assurance program such measures as are needed to assure familiarity of the Contractor's staff and employees with these procedures for processing Change Order data.

1.3 SUBMITTALS

A. Contractor shall comply with pertinent provisions of Section 01340 of these Specifications.

PART 2 – PRODUCTS

2.1 REGISTER

A. Contractor shall maintain a "Register of Designer's Field Orders, Proposal Requests and Change Orders" at the Site, accurately reflecting current status of all pertinent data.

B. Contractor shall make the register available to the Owner and Designer for review at their request.

PART 3 - EXECUTION

3.1 PROCESSING DESIGNER'S FIELD ORDERS

A. From time to time during progress of the Work the Designer shall issue a "Designer's Field Order" which interprets the Contract Documents or orders minor changes in the Work without change in Contract Sum or Contract Time.

B. Designer's Field Orders shall be dated and shall be numbered in sequence.


C. Should the Contractor consider that the Designer's Field Order requires a change in Contract Sum or Contract Time, or both, he shall immediately notify the Project Manager. If the Project Manager believes that the Contractor's notification is valid, he shall issue the Contractor a Proposal Request, as outlined in Paragraph 3.2 of this Section.


3.2 PROCESSING PROPOSAL REQUESTS

A. From time to time during progress of the Work the Designer may issue a Proposal Request to the Contractor for an itemized quotation for a change in Contract Sum or Contract Time, or both, incidental to a proposed change in the Work. Reasons for issuing a Proposal Request include the following:
1. When the Owner contemplates making a change in the Work;
2. When the Contractor notifies the Designer as described in Paragraph 3.1 of this Section; and
3. When the Contractor discovers a discrepancy among the Contract Documents, encounters a concealed or unknown condition or has other cause for suggesting a change in the Work and in the Contract Sum or Contract Time, or both.

B. Proposal Requests shall be dated and shall be numbered in sequence.

C. Contractor shall make written reply to the Designer in response to each Proposal Request:
1. Stating proposed change in the Contract Sum, if any;
2. Stating proposed change in the Contract Time, if any;
3. Describing changes in other items of Work, if any; and
4. Including full backup data, such as costs associated with materials, labor and equipment as required by the Designer.

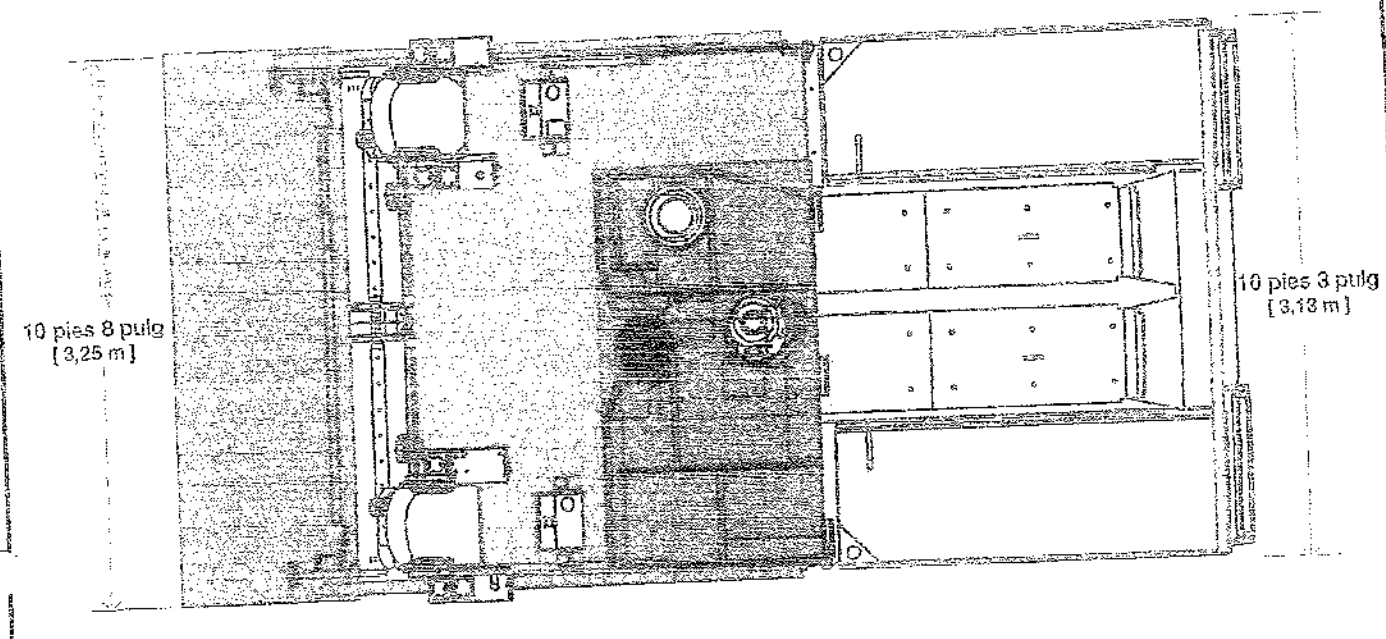

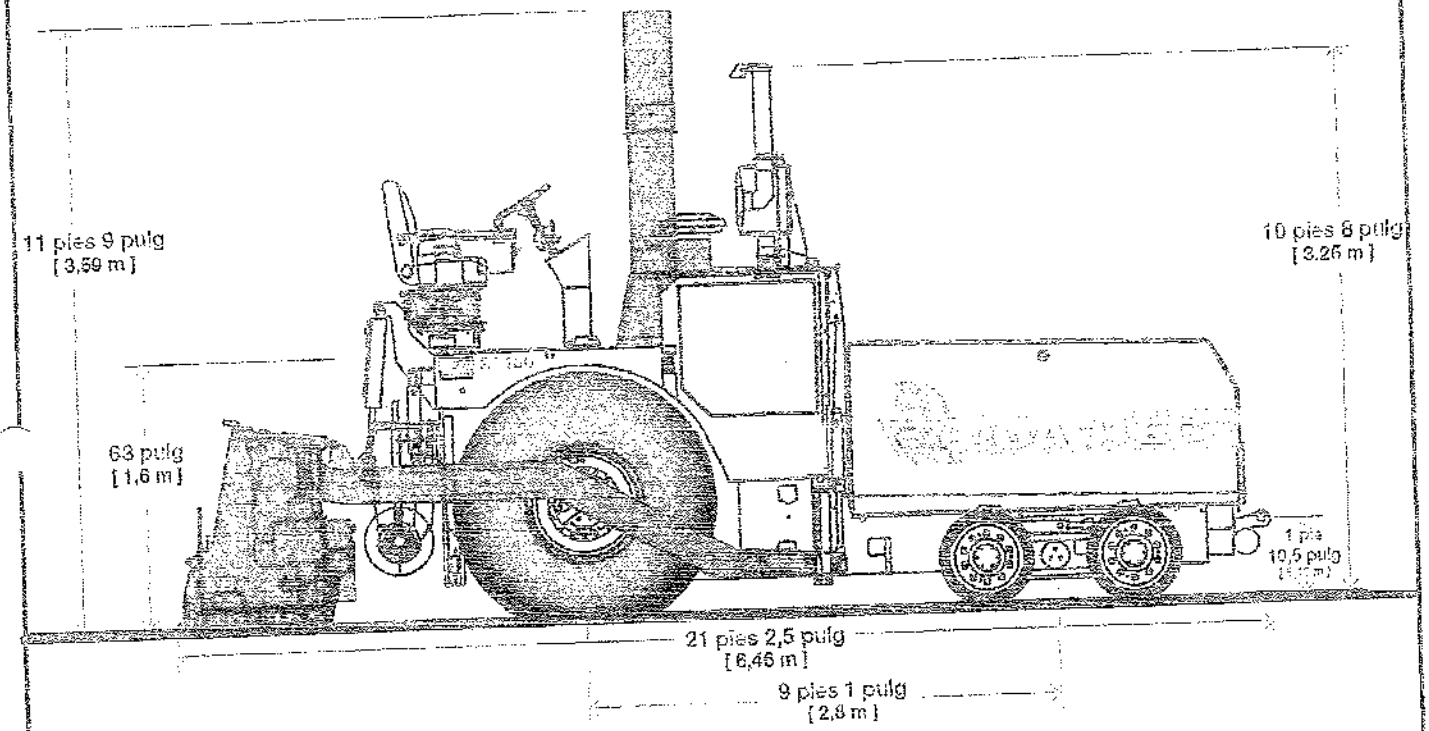

PESO DE TRANSPORTE* 49 [illegible] lb (17 225 kg)

* [illegible]

ANCHO DE TRANSPORTE Y DE FUNCIONAMIENTO ... 12 [illegible] pulg (3,6 m)

[illegible]

CamScanner

CamScanner

SECTION 01200

PROJECT MEETINGS

PART 1 – GENERAL

1.1 DESCRIPTION

A. Work included: To enable an orderly review during the completion of the Work and to provide for systematic discussion of issues, the Owner will conduct project meetings throughout the Contract Time.

B. Related Work:
1. Documents affecting the Work of this Section include, but are not necessarily limited to, General Conditions, Supplementary Conditions and all Sections of these Specifications.
2. The Contractor's relations with his employees, subcontractors and suppliers, and discussions relative thereto, are the Contractor's responsibility and normally are not a part of project meeting's content.

1.2 QUALITY ASSURANCE

A. For those persons designated by the Contractor to attend and participate in project meetings, Contractor shall provide required authority to commit the Contractor to solutions agreed upon in the project meetings.

1.3 SUBMITTALS

A. Agenda items: To the maximum extent practicable, Contractor shall advise the Owner and Designer at lease forty-eight (48) hours in advance of project meetings regarding items to be contained in the agenda.

PART 2 – PRODUCTS

2.1 MINUTES

A. The Owner shall compile minutes of each project meeting and will furnish copies to the Contractor and Designer.

B. Recipients of copies may make and distribute copies as they wish.

PART 3 – EXECUTION

3.1 MEETING SCHEDULE

A. Project meetings will be held weekly.

B. Owner shall coordinate as necessary with the Designer and Contractor to establish a mutually acceptable schedule for project meetings.

3.2 MEETING LOCATION

A. The Owner will establish the project meeting location. To the maximum extent practicable, project meetings will be held at the Site.

3.3 PRECONSTRUCTION CONFERENCE

A. Contractor shall comply with provisions of Section 01201 of these Specifications.

3.4 PROJECT MEETINGS

A. Attendance:
1. To the maximum extent practicable, Contractor shall assign the same person or persons to represent the Contractor at project meetings throughout completion of the Work.
2. Contractor's employees, subcontractors and suppliers, and others may be invited to attend those project meetings in which their aspect of the Work is involved.

B. Minimum agenda:
1. Review any unresolved issues from the minutes of the previous project meetings during the "old business" portion of the project meeting.

REGISTRO DE INGRESO O RETIRO DE MERCANCÍA

EIR

VIGILADO SUPERTRANSPORTE


INGRESO		CLASE DE VEHICULO:
RETIRO		


AUTORIZACION No.

DATOS DE ENTRADA DEL VEHICULO

DATOS DE SALIDA DEL VEHICULO


CONTENEDOR / CONTAINER





INTERIOR

ROOF TECHO



REAR DOORS
LADO ATRAS / PUERTAS

CONTENEDOR No.		LLENO	
		VACIO	
ISOCODE		SELLO 1	
TARA		SELLO 2	
IMO		SELLO 3	

Grupo / Group		Código de Daños/Damage Codes	
ALI	Alimentos	DT	Abollado / Dent.
CAF	Café	CO	Oxidado / Corroded
POL	Polímeros	CU	Corte / Cut
FEN	Perro Níquel	CT	Contaminado / Contaminated
GEN	General	MS	Faltante / Missing
REP	Repuestero	BR	Roto / Broked
		HO	Hoyo / Hole
		DY	Sucio / Dirty
Observa. Sellos / Seal Remark		BT	Doblado / Bent
	Sin sello/Unseal	BW	Arqueado / Browed
	Abierto/Open		
	Roto/Broken		

Descripción de daños / Damage description

Lugar/Place	Elemento/Element	Daño/Damage

Contecar
RODRIGO TINOCO
Auxiliar de Operaciones en Bodega

DESTINO / DESTINATION

TOTAL CANTIDAD TARJADA

OBSERVACIONES - Daños Autorizaciones / NOTES - Additional Damages

Inspector / Tajador: Contecar RICARDO DE LA ESPRIELLA AUX. DE OPERACIONES EN ENTRENAMIENTO

Autorizado: mundi transportes s.a. Nit. 900092673-5

Firma

Firma

RESERVADO CONTECAR PLAN DE CONTINGENCIA

Contenedor	Num Maquina	Fecha	Hora	Sello 1	Sello 2	Sello 3	Ubicación Final

OP_FMT2011_2008-03-05

CansCanner



CamScanner

VICON S.A - Yolanda Bohórquez

De: Nancy Leon Moreno (ROLDAN) [NLeon@bancodeoccidente.com.co]
Enviado el: martes, 10 de mayo de 2011 16:49
Para: administracion@vicon-sa.com
CC: Nubia Clemencia Martinez Rocha; Juan C Ferrans; Alvaro Edgar Montoya Beltran; Consuelo Burgos Hurtado (ROLDAN)
Asunto: MQ-279 CTO. 18073099 VICON SA
Datos adjuntos: REPORTE PARTIDA ARANCELARIA (4).doc; FORMATO ACEPTACION PARTIDA ARANCELARIA (5).DOC

Buena tarde

Adjunto el reporte de partida arancelaria sobre el bien a importar, (PAVIMENTADORA ROADTEC MODELO RP190).

Subpartida: 8479100000
Arancel: 10%
IVA: 16%
Requiere Licencia por ser usada
Requiere No. de serial
Es bien de capital

Agradezco me confirme por escrito si esta conforme con la partida arancelaria asignada, así como el conocimiento de los porcentajes a liquidar tributos aduaneros en el momento de la nacionalización, dicha confirmación es prerrequisito para continuar con la operación por parte de Banco de Occidente. (Ver adjunto aceptación partida arancelaria).

Cordialmente,

Nancy León Moreno
ROLDAN LOGISTICA
Inhouse Banco de Occidente
Cra. 13 No. 26-45 Piso 4
Bogotá - Colombia
Phone. (571) 4882000 Ext. 1230
Fax : 571-3520413 / 17
Celular. 315-7712986

evaluenuestroservicio@roldanlogistica.com

Este mensaje de correo electrónico y los archivos adjuntos están dirigidos exclusivamente a los destinatarios especificados. Puede contener información confidencial o legalmente protegida. Si usted no es el destinatario, por favor le solicitamos que lo elimine. Se le informa que directa o indirectamente, usar, revelar, distribuir, imprimir o copiar alguna de las partes de este mensaje está prohibido. Para fines de soporte legal los mensajes de correo electrónico están contemplados en la Ley 527 de 1999, en la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos por medios electrónicos

Aviso Legal: Este mensaje (Incluyendo sus anexos) está destinado únicamente para el uso del individuo o entidad a la cual está direccionado y puede contener información que no es de caracter público, de uso privilegiado o confidencial. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Si usted ha recibido esta comunicación por error, notifiquenos inmediatamente y elimine este mensaje. Este mensaje y sus anexos han sido revisados con software antivirus, para evitar que contenga código malicioso que pueda afectar sistemas de cómputo, sin embargo es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su recepción. Gracias.

CamScanner

2.2.5 Pulimiento

Cuando la mezcla se vaya a emplear como capa de rodadura, el coeficiente de pulimiento acelerado del agregado deberá ser, como mínimo, cuarenta centésimas (0.40).

2.2.6 Adhesividad

Se considerará que la adhesividad es suficiente, cuando el porcentaje de agregado totalmente envuelto después del ensayo de inmersión en agua (stripping) sea superior a noventa y cinco por ciento (95%).

Si la adhesividad es menor, el agregado no podrá emplearse, salvo que se incorporen aditivos mejoradores de adherencia de efectividad comprobada o se emplee una emulsión que de lugar a una adhesividad satisfactoria.

2.3 ARENA PARA SELLO

La arena por aplicar sobre la capa compactada para evitar la adhesión de las llantas de los vehículos será natural, proveniente de trituración o una mezcla de ambas; estará exenta de arcilla, materia orgánica u otras sustancias deletéreas y presentará un equivalente de arena superior a cuarenta y cinco por ciento (45%).

3. EQUIPO

El equipo para la ejecución de los trabajos deberá ser el necesario y suficiente para cumplir las exigencias de calidad previstas y asegurar un rendimiento mínimo que permita cumplir los plazos establecidos en el plan de trabajo.

Todos los elementos del equipo que se vaya a emplear deberán tener aprobación previa del Interventor y deberán encontrarse en condiciones satisfactorias hasta la terminación de los trabajos. Si durante el transcurso de éstos se observaren deficiencias o mal funcionamiento del equipo utilizado, el Interventor podrá ordenar su retiro o reemplazo.

Básicamente el equipo necesario estará constituido por los elementos que se describen a continuación:

3.1 EQUIPO PARA LA ELABORACION DE AGREGADOS TRITURADOS

La planta de trituración estará provista de una trituradora primaria y una trituradora secundaria;

CamScanner

Bogotá D.C., 10 de mayo de 2011

Señor: ALFONSO VEJARANO GALLO
Ciudad

Asunto: **REPORTE PARTIDA ARANCELARIA**
Contrato: **180-73099 VICON S.A.**

Cordial saludo,

AGENCIA DE ADUANA ROLDAN S.A Nivel 1 quien hace parte de "ROLDAN LOGÍSTICA" Operador Logístico y en su calidad de Intermediario Aduanero de BANCO DE OCCIDENTE ha asignado la siguiente subpartida arancelaria para el equipo descrito en la factura R11-126 con fecha de 31 DE MARZO DE 2011.

FACTURA/ O.C. NUMERO	REFERENCIA	SUBPARTIDA	DESCRIPCION SUBPARTIDA	NOMBRE COMERCIAL	OBSERVACIONES ARMADO REGISTRO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
R11-126	RP190	8479100000	MAQUINAS Y APARATOS MECANICOS CON FUNCION PROPIA, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO. MAQUINAS Y APARATOS PARA OBRAS PUBLICAS, LA CONSTRUCCION O TRABAJOS ANALOGOS	PAVIMENTADORA	LISTAR LICENCIA POR MQ USADA.	1	110000

CamScanner

ITEM	DESCRIPCION	UNO.	COEF.	VALOR UNITARIO BASICO TOPE CON IVA			VALOR UNITARIO TOTAL TOPE (INCLUIDO IVA)		98.2000%	PRECIO UNITARIO TOPE INCLUIDO A.I.U.
1	DIAGNOSTICO									
1.1	Diagnóstico en MVL con MDR en Rígido y Flexible	Segmento Calzada	30.00%	$ 86,936		$ 26,681	$ 88,938	OK	98.2000%	$ 90,568
1.2	Diagnóstico en MVL en pavimento Flexible	Segmento Calzada	40.00%	$ 128,194		$ 51,278	$ 128,194	OK	98.2000%	$ 130,544
1.3	Diagnóstico en MVL en pavimento Rígido	Segmento Calzada	15.00%	$ 128,194		$ 19,229	$ 128,194	OK	98.2000%	$ 130,544
1.4	Diagnóstico en MVL en Afirmado	Segmento Calzada	15.00%	$ 46,249		$ 6,937	$ 46,249	OK	98.2000%	$ 47,093
	VALOR OFICIAL DEL INDICE REPRESENTATIVO		100.00%	$ 104,125			$ 104,125	OK	98.200058%	$ 106,034.00

ITEM	DESCRIPCION	UND.	COEF.	PRECIO UNITARIO TOPE (INCLUYE A.I.U)	VALOR PARCIAL		98.2000%	PRECIO UNITARIO TOPE INCLUIDO A.I.U.	
2	MANTENIMIENTO RUTINARIO PREVENTIVO								
2,1	MANTENIMIENTO RUTINARIO EN PAVIMENTO FLEXIBLE								
2.1.1	Sello de fisuras con polilfex con equipo especial	ML	10.00%	$ 5,073	$ 507	OK	98.2000%	$ 5,166	93
2.1.2	Limpieza de sumideros Convencionales	UN	15.00%	$ 6,743	$ 1,011	OK	98.2000%	$ 6,867	124
2.1.3	Limpieza de sumideros Tipo SL	UN	10.00%	$ 9,035	$ 904	OK	98.2000%	$ 9,201	166
2.1.4	Limpieza de sumideros Tipo ST	UN	5.00%	$ 9,838	$ 492	OK	98.2000%	$ 10,018	180
2.1.5	Limpieza de pozos	UN	10.00%	$ 9,838	$ 984	OK	98.2000%	$ 10,018	180
2,2	MANTENIMIENTO RUTINARIO PREVENTIVO EN PAVIMENTO RIGIDO					OK	98.2000%		0
2.2.1	Sello de fisuras por inyección	ML	5.00%	$ 8,040	$ 402	OK	98.2000%	$ 8,187	147
2.2.2	Limpieza y Sello de Juntas	ML	5.00%	$ 6,472	$ 324	OK	98.2000%	$ 6,591	119
2.2.3	Limpieza de sumideros Convencionales	UN	15.00%	$ 6,743	$ 1,011	OK	98.2000%	$ 6,867	124
2.2.4	Limpieza de sumideros tipo SL	UN	10.00%	$ 9,035	$ 904	OK	98.2000%	$ 9,201	157
2.2.5	Limpieza de sumideros Tipo ST	UN	5.00%	$ 9,838	$ 492	OK	98.2000%	$ 10,018	169
2.2.6	Limpieza de pozos	UN	10.00%	$ 9,838	$ 984	OK	98.2000%	$ 10,018	180
VALOR OFICIAL INDICE REPRESENTATIVO MANTENIMIENTO RUTINARIO - PREVENTIVO			100.00%	$ 8,015	$ 8,015.00	OK	98.198971%	8,162	147
3	MANTENIMIENTO PERIODICO - CORRECTIVO								
3,1	ITEMS GENERALES Y COMUNES PARA MANTENIMIENTO FLEXIBLE Y RIGIDO Y VIAS EN AFIRMADO								
3.1.1	Excavación manual (incluye retiro y disposición final del material)	M3	2.00%	$ 37,966	$ 759	OK	98.2000%	$ 38,662	696
3.1.2	Excavación mecanica (incluye retiro y disposición final del material).	M3	2.00%	$ 23,207	$ 464	OK	98.2000%	$ 23,632	425
3.1.3	Suministro de cemento apto para estabilización	KG	0.20%	$ 432	$ 1	OK	98.2000%	$ 440	8
3.1.4	Suministro de Cal	KG	0.20%	$ 626	$ 1	OK	98.2000%	$ 640	12
3.1.5	Suministro de estabilizador electroquimico de arcillas	LITRO	0.20%	$ 76,296	$ 153	OK	98.2000%	$ 77,695	1,399

CamScanner

Subpartida: 8479100000
Arancel: 10%
IVA: 16%
Requiere Licencia por ser usada
Requiere No. de serial
Es bien de capital

NOTA: Si por alguna circunstancia especifica se convierte en obligatoria la presentación del registro o que corresponda al régimen de licencia previa (importación no reembolsable, solicitud de exención de derechos de aduana, importación de mercancías imperfectas, usadas o saldos) se hará necesario la presentación de dicho documento.

Agradecemos confirmar por escrito si esta conforme con la partida arancelaria asignada, así como el conocimiento de los porcentajes a liquidar tributos aduaneros en el momento de la nacionalización, dicha confirmación es prerrequisito para continuar con la operación por parte de Leasing de Occidente (giro al proveedor, apertura de L/C, presentación de registro o licencia de importación en caso de requerirse)

Atento Saludo,

Nancy León Moreno
Departamento de Importaciones
ROLDAN LOGISTICA

CamScanner

CamScanner

pavimentad[illegible]endrán dispositivos mecánicos compensadores para obtener una superficie pareja y formar los bordes de la capa sin uso de formaletas. Serán ajustables para lograr con el espesor de diseño la sección transversal especificada u ordenada por el Interventor.

Si se determina que el equipo deja huellas en la superficie de la capa, áreas defectuosas u otras irregularidades objetables que no sean fácilmente corregibles durante la construcción, el Interventor exigirá su reparación o cambio.

Cuando la mezcla se elabore en una planta caminera, la misma planta realizará su extensión sobre la superficie.

3.4 EQUIPO DE COMPACTACION

Se deberán utilizar compactadores autopropulsados de cilindros metálicos, estáticos o vibratorios tándem, de neumáticos o mixtos. El equipo de compactación será aprobado por el Interventor, a la vista de los resultados obtenidos en la fase de experimentación.

Todos los compactadores estarán dotados de dispositivos para la limpieza de los rodillos o neumáticos durante la compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario.

Los compactadores de rodillos no deberán presentar surcos ni irregularidades en los mismos. Los compactadores vibratorios dispondrán de dispositivos para eliminar la vibración al invertir la marcha, siendo aconsejable que el dispositivo sea automático. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y disposición tales, que permitan el traslapo de las huellas delanteras y traseras.

Las presiones lineales, estáticas o dinámicas, y las presiones de contacto de los diversos tipo de compactadores, serán las necesarias para conseguir la compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, pero sin producir roturas del agregado.

3.5 EQUIPO ACCESORIO

Para el sello protector de arena que requiere la mezcla durante su compactación, se necesita un esparcidor mecánico o una volqueta desde la cual se pueda esparcir manualmente la arena con ayuda de palas.

En caso de que la mezcla se elabore en plantas camineras, deberá disponerse de vehículos adecuados para el suministro permanente de agregados y emulsión a dichas plantas.

Se requieren, además, elementos para limpieza, preferiblemente barredora o sopladora

INVOICE

ROADTEC, INC.

BILL TO	Banco De Occidente Nit 890.300.27-4 Carrera 13 # 26-45 Piso 12	SHIP TO	Vicon, S.A. Nit 860.030.917.7 Colombia

Invoice #	R11-126
Invoice Date	March 31, 2011

DATE	SALES REP.	F.O.B.	TERMS
03/31/11	Lavaud	Miami Port	Pmt. In Full Prior To Shipment

QTY	DESCRIPTION	UNIT PRICE	TOTAL
1	Used 2006 Roadtec RP190 Rubber Tire Paver, Serial Number 207 with Eagle 10 Screed, Serial Number 116	$110,000.00	$110,000.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		Subtotal	$110,000.00
		Tax	0.00
		Shipping	$3,700.00
		BALANCE DUE	$113,700.00

Wire Instructions:
Roadtec, Inc.
Wachovia Bank, N.A.
230 4th Avenue North
Nashville, TN 37219
Account # - 2000031376196
ABA #: 111025013 (Wire Transfer)
ABA# 062000080 (ACH Payments)
SWIFT: PNBPUS33CHA

Billing Questions:
Regina Moffitt
(423) 622-9202

Remit Payment To:
Roadtec, Inc.
2909 Riverside Drive
Chattanooga, TN 37406

Roadtec, Inc.
2909 Riverside Dr.
Chattanooga, Tn 37406

PHONE (423) 622-9202
FAX (423) 622-7318

CamScanner

2909 Riverside Drive
Chattanooga, Tn. 37406

ROADTEC, INC.

423-622-9202 Phone
423-622-7318 Fax

VICON S.A. (Vias Y Construcciones S.A)

NIT 860.030.917-7

Proposal #: R11-126

Sales Manager:

Date: March 07, 2011

COLOMBIA

Attn:

Product Description:

ONE USED 2006 ROADTEC RP-190, 10' (3M) WIDE RUBBER-TIRED PAVER, SERIAL NUMBER 207 WITH APPROXIMATELY 4,804 HOURS, EAGLE SCREED 116, AND THE FOLLOWING FEATURES $113,700.00

* CAT C7 ACERT< 6 Cyl., 225 HP Tier III. Diesel Engine
* 3/4" (19 mm) Thick Continuous Side Sheet Frame Construction
* 2" (50 mm) Thick Front Cross Frame Member
* Oscillating Push Rollers
* Direct Hydraulic Planetary Drive
* Three Brake System; Hydrodynamic, Disc Calipers, Parking
* 12 Ton (11.9 mt) Capacity / 226 Cubic Feet Self Dumping Hopper
* Electric Flow Gates
* Independently Driven Variable Speed Feeder Conveyors with 1/2" (12.5 mm) 500 BHN Liners
  Conveyor By-Pass - Operate Augers Independent of Feeders
* Sonic Feeder Control System
* 16" (406 mm) Cast Ni-hard Augers
* Hydraulically Raise, Lower and Tilting Auger Assembly
* 18:00 x 25" Hydroflated High Flotation Sand Rib Drive Tires
* Dual 14" x 22" Front Bogies
* Two (2) Comfort Drive Operators Stations with Tilt Steering Wheel and Finger Tip Paver Control
* Foot Per Minute Meter
* Steering Assist Provides Inside Turning Radius of 4' - 6"
* 12 Volt Starting System with Master Disconnect Switches
* 115 Amp Alternator
* Clearview FXS Fume Extraction System
* Hydraulic Hood Raise with Manual Back Up
* Amber Beacon with Back Up Alarm
* Retractable Wash-Down System with 30' Hose Length
* 120 Gallon Fuel Tank Capacity
* MOBA Controls

WARRANTY: None

RCHASE PRICE AND PAYMENTS, F.O.B. Chattanooga, Tennessee (U.S.$113,700.00) plus any tax, excise duty or penalty which we are required by law to pay or collect; payable in United States current funds at par.

TERMS: Payment Prior To Shipment - Subject To Prior Sale

Payments not made when due shall bear interest until paid at the rate of one and one-half per cent (1.5%) per month, or highest lawful rate of interest, whichever rate is less.

Submitted In Our Name By:

William S. Hunt III

.....

Accepted by Roadtec, Inc.
Chattanooga, TN.

Dated This.....Day of

....., 20....

By.....

Title.....

You May Agree to Purchase By Signing Here:

X .....

Purchaser's Name

Dated This.....Day of

....., 20....

By.....

Title.....

CamScanner

ANEXO 10. INSPECCION PREOPERACIONAL

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901780282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 19 - JULIO - 2025		Operador: Yhon M. M.	
Código Equipo: EXCAVADORA	Marca y Serie: KP - 190	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A	SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A	MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Chasis y Estructura				Estado de muelles	X			Correas y poleas	X		
Elementos de desgaste				Estado de llantas	X			Ventilador	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas				Presiones de Inflado	X			Soportes del motor	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X			Pernos de ruedas y rines	X			Mangueras radiador	X		
Indicador Temperatura Motor	X			Eje muerto y bujes	X			Radiador	X		
Indicador Temperatura Servo	X			Balancines y pasadores	X			Ductos de admisiòn	X		
Indicador de presiòn aire			X	Amortiguadores			X	Exhosto y tubería de escape	X		
Indicador Nivel Combustible			X	Silletas muelles y sujeciòn			X	**SISTEMA HIDRAULICO**	**B**	**M**	**N/A**
Horòmetro o contador de kms.	X			Freno de servico			X	Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X			Freno de parqueo	X			Bujes y pasadores	X		
Palancas y perillas	X			**UNION CARDANICA**	**B**	**M**	**N/A**	Mangueras y conexiones	X		
Cinturon de Seguridad			X	Cardàn ,yugos y crucetas			X	Bomba Hidraulica	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**	**DIRECCION**	**B**	**M**	**N/A**	**NIVELES Y FUGAS FLUIDOS**	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X			Barra principal de direcciòn	X			Aceite Motor	X		
Pito	X			Barra transversal	X			Aceite Hidràulico	X		
Alarma de Reversa	X			Terminales	X			Aceite transmisiòn o caja	X		
Luces Direccionales			X	**TREN DE RODAJE**	**B**	**M**	**N/A**	Aceite diferenciales	X		
Luces de Parqueo			X	Cadenas de las oruga			X	Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Licuadora			X	(zapatas, bujes y pasadores			X	Refrigerante	X		
Cableado			X	Carriles superiores e inferiores			X	Liquido de frenos	X		
Conectores			X	Ruedas Tensoras			X	Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
EQUIPO Extintor y botiquin		X		Sprocket			X	Fuga Aceite Hidraulicas			
EQUIPO Silla de la cabina	X			Motores de Traslacion			X	Fuga Aceite Motor			
EQUIPO Escaleras y apoyo de acceso	X			Cadenas de las Traslacion			X	Fuga Aceite Transmisiones			

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

La cadena del Tunel de Inyección de Mezcla. Falta bujes Lado derecho.

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evítese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

JPN TELLO

NIT. 901786262 -7

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 27 - JULIO - 2025		**Operador:** Jhon M. M.	
Código Equipo: FINISHER	**Marca y Serie:** BOMAG BF 190 EP	**Horometro Inicial:**	**Horometro Final:**

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura			X
Elementos de desgaste			X
Vidrios, Espejos,Plumillas			X
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presión aire			X
Indicador Nivel Combustible			X
Horòmetro o contador de kms.	X		
Silla del operador y Tapicería	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X		
Pito	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Cableado			X
Conectores			X
EQUIPO Extintor y botiquin		X	
EQUIPO Silla de la cabina	X		
EQUIPO Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeciòn			X
Freno de servico			X
Freno de parqueo	X		
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardàn ,yugos y crucetas			X
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga			X
(zapatas, bujes y pasadores			X
Carriles superiores e inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisión	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**	**N/A**
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**	**N/A**
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja	X		
Aceite diferenciales	X		
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante	X		
Liquido de frenos	X		
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas	X		
Fuga Aceite Motor	X		
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evítese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901705282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 3 - Junio - 2025		Operador: Javier De Hoyos.	
Código Equipo: MOD-730	Marca y Serie: Champion.	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A	SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A	MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Chasis y Estructura	✓			Estado de muelles	✓			Correas y poleas	✓		
Elementos de desgaste		✓		Estado de llantas	✓			Ventilador	✓		
Vidrios, Espejos,Plumillas	✓			Presiones de inflado	✓			Soportes del motor	✓		
Indicador Presion Aceite Motor	✓			Pernos de ruedas y rines	✓			Mangueras radiador	✓		
Indicador Temperatura Motor	✓			Eje muerto y bujes	✓			Radiador	✓		
Indicador Temperatura Servo	✓			Balancines y pasadores	✓			Ductos de admisiòn	✓		
Indicador de presiòn aire	✓			Amortiguadores	✓			Exhosto y tuberia de escape	✓		
Indicador Nivel Combustible	✓			Sillelas muelles y sujeciòn	✓			SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Horòmetro o contador de kms.	✓			Freno de servico	✓			Cilindros hcos. y vàstagos	✓		
Sillin del operador y Tapicerìa	✓			Freno de parqueo	✓			Bujes y pasadores	✓		
Palancas y perillas	✓			UNION CARDANICA	B	M	N/A	Mangueras y conexiones	✓		
Cinturon de Seguridad	✓			Cardàn ,yugos y crucetas	✓			Bomba Hidraulica	✓		
SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A	DIRECCION	B	M	N/A	NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Luces de trabajo			✓	Barra principal de direcciòn	✓			Aceite Motor	✓		
Pito	✓			Barra transversal		✓		Aceite Hidràulico	✓		
Alarma de Reversa			✓	Terminales	✓			Aceite transmisiòn o caja	✓		
Luces Direccionales	✓			TREN DE RODAJE	B	M	N/A	Aceite diferenciales	✓		
Luces de Pasqueo	✓			Cadenas de las oruga			✓	Aceite de mandos finales o Catalinas	✓		
Licuadora	✓			Zapatas, bujes y pasadores			✓	Refrigerante	✓		
Cableado	✓			Carriles superiores e inferiores			✓	Liquido de frenos	✓		
Conectores	✓			Ruedas Tensoras			✓	Aceite Caja Direccion Hidraulica	✓		
EQUIPO BASICO: Extintor y botiquin	✓			Sprocket			✓	Fuga Aceite Hidraulicas	✓		
EQUIPO BASICO: Silla de la cabina	✓			Motores de Traslacion			✓	Fuga Aceite Motor	✓		
EQUIPO BASICO: Escaleras y apoyo de acceso	✓			Cadenas de las Traslacion			✓	Fuga Aceite Transmisiones	✓		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 4-06-2025.		Operador: Javier Deluque.	
Código Equipo: Mono 310	Marca y Serie: Champions.	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	✓		
Elementos de desgaste		✓	
Vidrios, Espejos,Plumillas	✓		
Indicador Presion Aceite Motor	✓		
Indicador Temperatura Motor	✓		
Indicador Temperatura Servo	✓		
Indicador de presiòn aire	✓		
Indicador Nivel Combustible	✓		
Horòmetro o contador de kms.	✓		
Silfin del operador y Tapiceria	✓		
Palancas y perillas	✓		
Cinturon de Seguridad	✓		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo		✓	
Pito	✓		
Alarma de Reversa			✓
Luces Direccionales	✓		
Luces de Parqueo	✓		
Licuadora	✓		
Cableado	✓		
Conectores	✓		
EQUIPOS Extintor y botiquin	✓		
EQUIPOS Silla de la cabina	✓		
EQUIPOS Escaleras y apoyo de acceso	✓		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	✓		
Estado de llantas	✓		
Presiones de inflado	✓		
Pernos de ruedas y rines	✓		
Eje muerto y bujes	✓		
Balancines y pasadores	✓		
Amortiguadores		✓	
Silletas muelles y sujeciòn	✓		
Freno de servico	✓		
Freno de parqueo	✓		
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardàn ,yugos y crucetas	✓		
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de direcciòn	✓		
Barra transversal	✓		
Terminales	✓		
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga			✓
(zapatas, bujes y pasadores			✓
Camles superiores e inferiores			✓
Ruedas Tensoras			✓
Sprocket			✓
Motores de Traslacion			✓
Cadenas de las Traslacion			✓

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	✓		
Ventilador	✓		
Soportes del motor	✓		
Mangueras radiador	✓		
Radiador	✓		
Ductos de admisiòn	✓		
Exhosto y tuberia de escape	✓		
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**	**N/A**
Cilindros hcos. y vàstagos			
Bujes y pasadores	✓		
Mangueras y conexiones	✓		
Bomba Hidraulica	✓		
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**	**N/A**
Aceite Motor	✓		
Aceite Hidràulico	✓		
Aceite transmisiòn o caja	✓		
Aceite diferenciales	✓		
Aceite de mandos finales o Catalinas	✓		
Refrigerante	✓		
Liquido de frenos	✓		
Aceite Caja Direccion Hidraulica	✓		
Fuga Aceite Hidraulicas	✓		
Fuga Aceite Motor	✓		
Fuga Aceite Transmisiones	✓		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 5 - 06 - 2025		Operador: Javier Deluque	
Código Equipo: Moto 710	Marca y Serie: Champions	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A	SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A	MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Chasis y Estructura	/		/	Estado de muelles	/			Correas y poleas		/	
Elementos de desgaste		/		Estado de llantas	/			Ventilador		/	
Vidrios, Espejos, Plumillas	/			Presiones de inflado	/			Soportes del motor		/	
Indicador Presion Aceite Motor	/			Pernos de ruedas y rines	/			Mangueras radiador		/	
Indicador Temperatura Motor	/			Eje muerto y bujes	/			Radiador		/	
Indicador Temperatura Servo	/			Balancines y pasadores	/			Ductos de admisión		/	
Indicador de presión aire	/			Amortiguadores	/			Exhosto y tuberia de escape			
Indicador Nivel Combustible	/			Silletas muelles y sujeción	/			SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Horómetro o contador de kms.	/			Freno de servico	/			Cilindros hcos. y vástagos		/	
Silfin del operador y Tapiceria	/			Freno de parqueo	/			Bujes y pasadores		/	
Palancas y perillas	/			UNION CARDANICA	B	M	N/A	Mangueras y conexiones		/	
Cinturon de Seguridad	/			Cardán ,yugos y crucetas	/			Bomba Hidraulica		/	
SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A	DIRECCION	B	M	N/A	NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Luces de trabajo		/		Barra principal de dirección	/			Aceite Motor		/	
Pito	/			Barra transversal	/			Aceite Hidráulico		/	
Alarma de Reversa			/	Terminales				Aceite transmisión o caja		/	
Luces Direccionales		/		TREN DE RODAJE	B	M	N/A	Aceite diferenciales		/	
Luces de Parqueo		/		Cadenas de las oruga			/	Aceite de mandos finales o Catalinas		/	
Licuadora		/		Izapatas, bujes y pasadores			/	Refrigerante		/	
Cableado		/		Carriles superiores e inferiores			/	Liquido de frenos		/	
Conectores		/		Ruedas Tensoras			/	Aceite Caja Direccion Hidraulica		/	
EQUIPOS DE SEGURIDAD: Extintor y botiquin		/		Sprocket			/	Fuga Aceite Hidraulicas		/	
EQUIPOS DE SEGURIDAD: Silla de la cabina	/			Motores de Traslacion			/	Fuga Aceite Motor		/	
EQUIPOS DE SEGURIDAD: Escaleras y apoyo de acceso	/			Cadenas de las Traslacion			/	Fuga Aceite Transmisiones		/	

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

120

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 6 - 06 - 2025		Operador: Javier Peluzue	
Código Equipo: MOTO 310	Marca y Serie: Champions	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	✓		
Elementos de desgaste		✓	
Vidrios, Espejos,Plumillas	✓		
Indicador Presion Aceite Motor	✓		
Indicador Temperatura Motor	✓		
Indicador Temperatura Servo	✓		
Indicador de presiòn aire	✓		
Indicador Nivel Combustible	✓		
Horómetro o contador de kms.	✓		
Sillìn del operador y Tapiceria	✓		
Palancas y pedlas	✓		
Cinturon de Seguridad	✓		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo		✓	
Pito	✓		
Alarma de Reversa		✓	
Luces Direccionales	✓		
Luces de Parqueo	✓		
Licuadora	✓		
Cableado	✓		
Conectores	✓		
EQUIPO DE SEGURIDAD: Extintor y botiquin	✓		
EQUIPO DE SEGURIDAD: Silla de la cabina	✓		
EQUIPO DE SEGURIDAD: Escaleras y apoyo de acceso	✓		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	✓		
Estado de llantas	✓		
Presiones de inflado	✓		
Pernos de ruedas y rines	✓		
Eje muerto y bujes	✓		
Balancines y pasadores	✓		
Amortiguadores	✓		
Silletas muelles y sujeciòn	✓		
Freno de servicio	✓		
Freno de parqueo	✓		
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardàn ,yugos y crucetas	✓		
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de direcciòn	✓	✓	
Barra transversal		✓	
Terminales		✓	
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga			✓
(zapatas, bujes y pasadores			✓
Carriles superiores e inferiores			✓
Ruedas Tensoras			✓
Sprocket			✓
Motores de Traslacion			✓
Cadenas de las Traslacion			✓

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	✓		
Ventilador	✓		
Soportes del motor	✓		
Mangueras radiador	✓		
Radiador	✓		
Ductos de admisiòn	✓		
Exhosto y tuberia de escape	✓		
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**	**N/A**
Cilindros hcos. y vàstagos	✓		
Bujes y pasadores	✓		
Mangueras y conexiones	✓		
Bomba Hidraulica	✓		
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**	**N/A**
Aceite Motor	✓	✓	
Aceite Hidràulico	✓	✓	
Aceite transmisiòn o caja	✓		
Aceite diferenciales	✓		
Aceite de mandos finales o Catalinas	✓	✓	
Refrigerante	✓	✓	
Liquido de frenos	✓		
Aceite Caja Direccion Hidraulica	✓		
Fuga Aceite Hidraulicas	✓		
Fuga Aceite Motor	✓		
Fuga Aceite Transmisiones	✓		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 1-06-2025.		Operador: Javier Deluque.	
Código Equipo: MOTO 710	Marca y Serie: Champion	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste		X	
Vidrios, Espejos,Plumillas	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presiòn aire	X		
Indicador Nivel Combustible	X		
Horómetro o contador de kms.	X		
Silln del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo		X	
Pito	X		
Alarma de Reversa		X	
Luces Direccionales	X		
Luces de Parqueo	X		
Licuadora	X		
Cableado	X		
Conectores	X		
SEGURIDAD: Extintor y botiquin	X		
SEGURIDAD: Silla de la cabina	X		
SEGURIDAD: Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeciòn	X		
Freno de servico	X		
Freno de parqueo	X		
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardàn ,yugos y crucetas	X		
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga			X
(zapatas, bujes y pasadores			X
Carriles superiores e inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**	**N/A**
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**	**N/A**
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja	X		
Aceite diferenciales	X		
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante	X		
Liquido de frenos	X		
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas	X		
Fuga Aceite Motor	X		
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento claro y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese anotaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901705202 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 9 - 06 - 2025		Operador: Javier Bohorquez	
Código Equipo: MOTO 710	Marca y Serie: Champion	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste		X	
Vidrios, Espejos,Plumillas	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presión aire	X		
Indicador Nivel Combustible	X		
Horómetro o contador de kms.	X		
Silla del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		

SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A
Luces de frenado		X	
Pito	X		
Alarma de Reversa		X	
Luces Direccionales	X		
Luces de Parqueo	X		
Limpiadora	X		
Cableado	X		
Conectores	X		
EQUIPO Extintor y botiquin	X		
EQUIPO Silla de la cabina	X		
EQUIPO Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeción	X		
Freno de servicio	X		
Freno de parqueo	X		

UNION CARDANICA	B	M	N/A
Cardán ,yugos y crucetas	X		

DIRECCION	B	M	N/A
Barra principal de dirección	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		

TREN DE RODAJE	B	M	N/A
Cadenas de las oruga			X
Tizapatas, bujes y pasadores			X
Carriles superiores e inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisión	X		
Exhosto y tubería de escape	X		

SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Cilindros hcos. y vástagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		

NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Aceite Motor	X		
Aceite Hidráulico	X		
Aceite transmisión o caja	X		
Aceite diferenciales	X		
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante	X		
Liquido de frenos	X		
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas	X		
Fuga Aceite Motor	X		
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL SST RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785262 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 10 - 06 - 2025		Operador: Jhon Deluque	
Código Equipo: MOV 710	Marca y Serie: Champions	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A	SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A	MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X			Estado de muelles	X			Correas y poleas	X		
Elementos de desgaste		X		Estado de llantas	X			Ventilador	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas	X			Presiones de inflado	X			Soportes del motor	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X			Pernos de ruedas y rines	X			Mangueras radiador	X		
Indicador Temperatura Motor	X			Eje muerto y bujes	X			Radiador	X		
Indicador Temperatura Servo	X			Balancines y pasadores	X			Ductos de admisiòn	X		
Indicador de presión aire	X			Amortiguadores	X			Exhosto y tubena de escape	X		
Indicador Nivel Combustible	X			Silletas muelles y sujeciòn	X			SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Horómetro o contador de kms.	X			Freno de servicio	X			Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Silla del operador y Tapicería	X			Freno de parqueo	X			Bujes y pasadores	X		
Palancas y pedales	X			UNION CARDANICA	B	M	N/A	Mangueras y conexiones	X		
Cinturon de Seguridad	X			Cardàn ,yugos y cruceta s	X			Bomba Hidraulica	X		
SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A	DIRECCION	B	M	N/A	NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Luces de traslado		X		Barra principal de direcciòn	X			Aceite Motor	X		
Pito	X			Barra transversal	X			Aceite Hidràulico	X		
Alarma de Reversa		X		Terminales	X			Aceite transmisiòn o caja	X		
Luces Direccionales	X			TREN DE RODAJE	B	M	N/A	Aceite diferenciales	X		
Luces de Parqueo	X			Cadenas de las oruga			X	Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Limpiadores	X			Zapatas, bujes y pasadores			X	Refrigerante	X		
Cableado	X			Camles superiores e inferiores			X	Liquido de frenos	X		
Conectores	X			Ruedas Tensoras			X	Aceite Caja Direccion Hidrautica	X		
SEGURIDAD: Extintor y botiquin	X			Sprocket			X	Fuga Aceite Hidraulicas	X		
SEGURIDAD: Silla de la cabina	X			Motores de Traslacion			X	Fuga Aceite Motor	X		
SEGURIDAD: Escaleras y apoyo de acceso	X			Cadenas de las Traslacion			X	Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

FIRMA DEL OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL RTE. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901765282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 11 - 06 - 2025		Operador: Javier Delgado	
Código Equipo: MON 310	Marca y Serie: Champions	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A	SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A	MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X			Estado de muelles	X			Correas y poleas	X		
Elementos de desgaste		X		Estado de llantas	X			Ventilador	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas	X			Presiones de inflado	X			Soportes del motor	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X			Pernos de ruedas y rines	X			Mangueras radiador	X		
Indicador Temperatura Motor	X			Eje muerto y bujes	X			Radiador	X		
Indicador Temperatura Servo	X			Balancines y pasadores	X			Ductos de admisiòn	X		
Indicador de presiòn aire	X			Amortiguadores	X			Exhosto y tubena de escape	X		
Indicador Nivel Combustible	X			Silletas muelles y sujeciòn	X			SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Horòmetro o contador de kms.	X			Freno de servicio	X			Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X			Freno de parqueo	X			Bujes y pasadores	X		
Palancas y perillas	X			UNION CARDANICA	B	M	N/A	Mangueras y conexiones	X		
Cinturon de Seguridad	X			Cardàn ,yugos y crucetas	X			Bomba Hidraulica	X		
SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A	DIRECCION	B	M	N/A	NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Luces de trabajo		X		Barra principal de direcciòn	X			Aceite Motor	X		
Pito	X			Barra transversal	X			Aceite Hidràulico	X		
Alarma de Reversa		X		Terminales	X			Aceite transmisiòn o caja	X		
Luces Direccionales	X			TREN DE RODAJE	B	M	N/A	Aceite diferenciales	X		
Luces de Parqueo	X			Cadenas de las oruga			X	Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Direccionales	X			Zapatas, bujes y pasadores			X	Refrigerante	X		
Cableado	X			Carriles superiores e inferiores			X	Liquido de frenos	X		
Conectores	X			Ruedas Tensoras			X	Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
EQUIPAMIENTO: Extintor y botiquin	X			Sprocket			X	Fuga Aceite Hidraulicas	X		
EQUIPAMIENTO: Silla de la cabina	X			Motores de Traslacion			X	Fuga Aceite Motor	X		
EQUIPAMIENTO: Escaleras y apoyo de acceso	X			Cadenas de las Traslacion			X	Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

FIRMA DEL OPERADOR	HOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL RVA. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

225

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901705202 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 12 - 06 - 2025 | Operador: Fabian Delgado

Código Equipo: M0770 | Marca y Serie: Chompitos | Horometro Inicial: | Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste		X	
Vidrios, Espejos, Plumillas	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presion aire	X		
Indicador Nivel Combustible	X		
Horómetro o contador de kms.	X		
Silla del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		

SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A
Luces de trabajo		X	
Pito	X		
Alarma de Reversa		X	
Luces Direccionales	X		
Luces de Parqueo	X		
Limpiadora	X		
Cableado	X		
Conectores	X		
EQUIPADO: Extintor y botiquin	X		
EQUIPADO: Silla de la cabina	X		
EQUIPADO: Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeción	X		
Freno de servicio	X		
Freno de parqueo	X		

UNION CARDANICA	B	M	N/A
Cardàn ,yugos y crucetas	X		

DIRECCION	B	M	N/A
Barra principal de dirección	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		

TREN DE RODAJE	B	M	N/A
Cadenas de las oruga			X
Zapatas, bujes y pasadores			X
Camiles superiores e inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisión	X		
Exhosto y tubería de escape	X		

SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Cilindros hcos. y vástagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		

NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja	X		
Aceite diferenciales	X		
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante	X		
Liquido de frenos	X		
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas	X		
Fuga Aceite Motor	X		
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

FIRMA DEL OPERADOR	NOMBRE FIRMA EQUIPAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

JPN TELLO

NIT. 901785282 -1

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 13 - 06 - 2025 | Operador: Javier Arteaga

Código Equipo: Rodo 710 | Marca y Serie: Champion | Horometro Inicial: | Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste		X	
Vidrios, Espejos,Plumillas	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presiòn aire	X		
Indicador Nivel Combustible	X		
Horómetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo		X	
Pito	X		
Alarma de Reversa		X	
Luces Direccionales	X		
Luces de Parqueo	X		
Licuadora	X		
Cableado	X		
Conectores	X		
Extintor y botiquin	X		
Silla de la cabina	X		
Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeción	X		
Freno de servicio	X		
Freno de parqueo	X		
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardàn ,yugos y crucetas	X		
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de dirección	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga			X
(zapatas, bujes y pasadores			X
Carriles superiores e inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**	**N/A**
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**	**N/A**
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja	X		
Aceite diferenciales	X		
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante	X		
Liquido de frenos	X		
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas	X		
Fuga Aceite Motor	X		
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evítese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

224

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 16 - 06 - 2025. | Operador: Javier Deluque

Código Equipo: H070 710 | Marca y Serie: Champion | Horometro Inicial: | Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste		X	
Vidrios, Espejos,Plumillas	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presiòn aire	X		
Indicador Nivel Combustible	X		
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo		X	
Pito	X		
Alarma de Reversa		X	
Luces Direccionales	X		
Luces de Parqueo	X		
Licuadora	X		
Cableado	X		
Conectores	X		
EQUIPO BASICO: Extintor y boliquin	X		
EQUIPO BASICO: Silla de la cabina	X		
EQUIPO BASICO: Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeciòn	X		
Freno de servico	X		
Freno de parqueo	X		
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardàn ,yugos y crucetas	X		
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de dirección	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga			X
(zapatas, bujes y pasadores			X
Carriles superiores e inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**	**N/A**
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**	**N/A**
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja	X		
Aceite diferenciales	X		
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante	X		
Liquido de frenos	X		
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas	X		
Fuga Aceite Motor	X		
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 17 -06 -2025 | Operador: Javier Deluque

Código Equipo: MOP-710 | Marca y Serie: Champion | Horometro Inicial: | Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste		X	
Vidrios, Espejos,Plumillas	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presiòn aire	X		
Indicador Nivel Combustible	X		
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		

SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A
Luces de trabajo		X	
Pito	X		
Alarma de Reversa		X	
Luces Direccionales	X		
Luces de Parqueo	X		
Licuadora	X		
Cableado	X		
Conectores	X		
COMPLEMENTARIO: Extintor y botiquin	X		
COMPLEMENTARIO: Silla de la cabina	X		
COMPLEMENTARIO: Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeciòn	X		
Freno de servicio	X		
Freno de parqueo	X		

UNION CARDANICA	B	M	N/A
Cardàn ,yugos y crucetas	X		

DIRECCION	B	M	N/A
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		

TREN DE RODAJE	B	M	N/A
Cadenas de las oruga			X
(zapatas, bujes y pasadores			X
Carriles superiores e inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		

SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		

NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja	X		
Aceite diferenciales	X		
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante	X		
Liquido de frenos	X		
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas	X		
Fuga Aceite Motor	X		
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evítese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 18 - Junio 2023		Operador: Javier Pelaez	
Código Equipo: Moto 710	Marca y Serie: Champion	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste		X	
Vidrios, Espejos,Plumillas	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presiòn aire	X		
Indicador Nivel Combustible	X		
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo		X	
Pito	X		
Alarma de Reversa			X
Luces Direccionales	X		
Luces de Parqueo	X		
Licuadora	X		
Cableado	X		
Conectores	X		
Extintor y botiquin	X		
Silla de la cabina	X		
Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeción	X		
Freno de servico	X		
Freno de parqueo	X		
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardàn ,yugos y crucetas	X		
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga			X
(zapatas, bujes y pasadores			X
Carriles superiores e inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**	**N/A**
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**	**N/A**
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja	X		
Aceite diferenciales	X		
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante	X		
Liquido de frenos	X		
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas	X		
Fuga Aceite Motor	X		
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evítese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

230

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 19 - Junio - 2020 | Operador: Javier de Leon

Código Equipo: RODILLO | Marca y Serie: Champion | Horometro Inicial: | Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elememos de desgaste		X	
Vidrios, Espejos,Plumillas	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presion aire	X		
Indicador Nivel Combustible	X		
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		

SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A
Luces de trabajo		X	
Pito	X		
Alarma de Reversa			X
Luces Direccionales	X		
Luces de Parqueo	X		
Licuadora	X		
Cableado	X		
Conectores	X		

EQUIPO				
	Extintor y botiquin	X		
	Silla de la cabina	X		
	Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Bielancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeción	X		
Freno de servico	X		
Freno de parqueo	X		

UNION CARDANICA	B	M	N/A
Cardán ,yugos y crucetas	X		

DIRECCION	B	M	N/A
Barra principal de dirección	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		

TREN DE RODAJE	B	M	N/A
Cadenas de las oruga			X
(zapatas, bujes y pasadores			X
Carriles superiores e inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		

SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		

NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Aceite Motor	X		
Aceite Hidráulico	X		
Aceite transmisiòn o caja	X		
Aceite diferenciales	X		
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante	X		
Liquido de frenos	X		
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas	X		
Fuga Aceite Motor	X		
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 26 - JUNIO - 2025.		Operador: Javier Deluque.	
Código Equipo: MOTO 310	Marca y Serie: Champions	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A	SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A	MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X			Estado de muelles	X			Correas y poleas	X		
Elementos de desgaste		X		Estado de llantas	X			Ventilador	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas	X			Presiones de inflado	X			Soportes del motor	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X			Pernos de ruedas y rines	X			Mangueras radiador	X		
Indicador Temperatura Servo	X			Balancines y pasadores	X			Ductos de admisiòn	X		
Indicador de presiòn aire	X			Amortiguadores	X			Exhosto y tuberia de escape	X		
Indicador Nivel Combustible	X			Silletas muelles y sujeciòn	X			SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Horòmetro o contador de kms.	X			Freno de servico	X			Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Palancas y perillas	X			UNION CARDANICA	B	M	N/A	Mangueras y conexiones	X		
Cinturon de Seguridad	X			Cardàn ,yugos y cruceta s	X			Bomba Hidraulica	X		
SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A	DIRECCION	B	M	N/A	NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Luces de trabajo		X		Barra principal de direcciòn	X			Aceite Motor	X		
Alarma de Reversa		X		Terminales	X			Aceite transmisiòn o caja	X		
Luces Direccionales	X			TREN DE RODAJE	B	M	N/A	Aceite diferenciales	X		
Luces de Parqueo	X			Cadenas de las oruga			X	Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Licuadora	X			(zapatas, bujes y pasadores			X	Refrigerante	X		
Conectores	X			Ruedas Tensoras			X	Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
EQUIPO DE SEGURIDAD: Extintor y botiquin	X			Sprocket			X	Fuga Aceite Hidraulicas	X		
EQUIPO DE SEGURIDAD: Silla de la cabina	X			Motores de Traslacion			X	Fuga Aceite Motor	X		
EQUIPO DE SEGURIDAD: Escalera y sistema de acceso	X			Cadenas de las Traslacion			X	Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

X NO tiene alarma de reversa.

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de

235

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 9 - JUNIO - 2025.		Operador: Jesus Diaz	
Código Equipo: Lado	Marca y Serie: 320 CL.	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste		X	
Vidrios, Espejos,Plumillas		X	
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo			X
Indicador de presiòn aire			X
Indicador Nivel Combustible	X		
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria		X	
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		

SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A
Luces de trabajo		X	
Pito	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Cableado	X		
Conectores	X		
Extintor y botiquin		X	
Silla de la cabina		X	
Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles			X
Estado de llantas			X
Presiones de inflado			X
Pernos de ruedas y tines			X
Eje muerto y bujes			X
Balancines y pasadores			X
Amortiguadores			X
Silletas muelles y sujeciòn			X
Freno de servico			X
Freno de parqueo			X

UNION CARDANICA	B	M	N/A
Cardán ,yugos y crucetas			X

DIRECCION	B	M	N/A
Barra principal de direcciòn			X
Barra transversal			X
Terminales			X

TREN DE RODAJE	B	M	N/A
Cadenas de las oruga		X	
Zapatas, bujes y pasadores		X	
Carriles superiores e inferiores		X	
Ruedas Tensoras	X		
Sprocket			X
Motores de Traslacion	X		
Cadenas de las Traslacion		X	

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas		X	
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		

SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Cilindros hcos. y vàstagos		X	
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		

NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Aceite Motor	X		
Aceite Hidráulico	X		
Aceite transmisiòn o caja	X		
Aceite diferenciales			X
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante			X
Liquido de frenos			X
Aceite Caja Direccion Hidraulica			X
Fuga Aceite Hidraulicas			X
Fuga Aceite Motor		X	
Fuga Aceite Transmisiones			X

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

- Bombillos fundidos.
- No tiene botiquin
- Gato en mal estado.

JESUS DAVID DIAZ GONZALEZ		
NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

JPN TELLO

NIT. 901785202 -7

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 10 - Junio - 2025.		Operador: Jesus Diaz	
Código Equipo: Retro.	Marca y Serie: 320 CL.	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste		X	
Vidrios, Espejos,Plumillas		X	
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo			X
Indicador de presión aire			X
Indicador Nivel Combustible	X		
Horómetro o contador de kms.	X		
Silla del operador y Tapicería		X	
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		

SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A
Luces de trabajo		X	
Pito	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Limpiabrisas			X
Cableado	X		
Conectores	X		
EQUIPADO: Extintor y botiquin		X	
EQUIPADO: Silla de la cabina		X	
EQUIPADO: Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles			X
Estado de llantas			X
Presiones de inflado			X
Pernos de ruedas y rines			X
Eje muerto y bujes			X
Balancines y pasadores			X
Amortiguadores			X
Silletas muelles y sujeción			X
Freno de servico			X
Freno de parqueo			X

UNION CARDANICA	B	M	N/A
Cardàn ,yugos y crucetas			X

DIRECCION	B	M	N/A
Barra principal de dirección			X
Barra transversal			X
Terminales			X

TREN DE RODAJE	B	M	N/A
Cadenas de las oruga		X	
Trapetas, bujes y pasadores		X	
Carriles superiores e inferiores		X	
Ruedas Tensoras	X		
Sprocket			X
Motores de Traslacion	X		
Cadenas de las Traslacion		X	

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas		X	
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape			

SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Cilindros hcos. y vàstagos		X	
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		

NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Aceite Motor	X		
Aceite Hidráulico	X		
Aceite transmisiòn o caja	X		
Aceite diferenciales			X
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante			X
Liquido de frenos			X
Aceite Caja Direccion Hidraulica			X
Fuga Aceite Hidraulicas			X
Fuga Aceite Motor		X	
Fuga Aceite Transmisiones			X

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

- Bombillos Fundidos
- No tiene luz trasera
- Gata hidraulica en mal estado

Jesus David Diaz Coronel		727
NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evítese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901765282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 11 - Junio - 2025 | Operador: Jesus Diaz

Código Equipo: Retro | Marca y Serie: 320 CL | Horometro Inicial: | Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste		X	
Vidrios, Espejos,Plumillas		X	
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo			X
Indicador de presión aire			X
Indicador Nivel Combustible	X		
Horómetro o contador de kms.	X		
Silla del operador y Tapicería		X	
Palancas y pedilas	X		
Cinturon de Seguridad	X		

SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A
Luces de trabajo		X	
Pito	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Limpiadora			X
Cableado	X		
Conectores	X		

EQUIPOS				
	Extintor y botiquin		X	
	Silla de la cabina		X	
	Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles			X
Estado de llantas			X
Presiones de inflado			X
Pernos de ruedas y rines			X
Eje muerto y bujes			X
Balancines y pasadores			X
Amortiguadores			X
Silletas muelles y sujeción			X
Freno de servicio			X
Freno de parqueo			X

UNION CARDANICA	B	M	N/A
Cardán ,yugos y crucetas			X

DIRECCION	B	M	N/A
Barra principal de dirección			X
Barra transversal			X
Terminales			X

TREN DE RODAJE	B	M	N/A
Cadenas de las oruga		X	
Zapatas, bujes y pasadores		X	
Carriles superiores e inferiores		X	
Ruedas Tensoras	X		
Sprocket			X
Motores de Traslacion	X		
Cadenas de las Traslacion		X	

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas		X	
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisión	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		

SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Cilindros hcos. y vástagos		X	
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones			
Bomba Hidraulica	X		

NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Aceite Motor	X		
Aceite Hidráulico	X		
Aceite transmisión o caja	X		
Aceite diferenciales			X
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante			X
Liquido de frenos			X
Aceite Caja Direccion Hidraulica			X
Fuga Aceite Hidraulicas			X
Fuga Aceite Motor		X	
Fuga Aceite Transmisiones			X

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

Bombillos fundidos
No tiene botiquin

Jesus David Diaz Gonzalez
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE PROFESIONAL SST

FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785202 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 12 - Junio - 2025		Operador: Jesus David.	
Código Equipo: Retro	Marca y Serie:	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste		X	
Vidrios, Espejos,Plumillas		X	
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo			X
Indicador de presión aire			X
Indicador Nivel Combustible	X		
Horòmetro o contador de kms.	X		
Silla del operador y Tapiceria		X	
Palancas y pedlas	X		
Cinturon de Seguridad	X		

SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A
Luces de trabajo		X	
Pito	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Limpiador			X
Cableado	X		
Conectores	X		

SEÑALIZACION				
	Extintor y botiquin		X	
	Silla de la cabina		X	
	Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles			X
Estado de llantas			X
Presiones de inflado			X
Pernos de ruedas y rines			X
Eje muerto y bujes			X
Balancines y pasadores			X
Amortiguadores			X
Silletas muelles y sujeciòn			X
Freno de servico			X
Freno de parqueo			X

UNION CARDANICA	B	M	N/A
Cardàn ,yugos y crucetas			X

DIRECCION	B	M	N/A
Barra principal de direcciòn			X
Barra transversal			X
Terminales			X

TREN DE RODAJE	B	M	N/A
Cadenas de las oruga		X	
Zapatas, bujes y pasadores		X	
Carriles superiores e inferiores		X	
Ruedas Tensoras	X		
Sprocket			X
Motores de Traslacion	X		
Cadenas de las Traslacion		X	

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas		X	
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		

SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Cilindros hoos y vàstagos		X	
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		

NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja	X		
Aceite diferenciales			X
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante			X
Liquido de frenos			X
Aceite Caja Direccion Hidraulica			X
Fuga Aceite Hidraulicas			X
Fuga Aceite Motor		X	
Fuga Aceite Transmisiones		X	

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

- Bombillas Finalador.
- No tiene botiquin

Jesus David Diaz Gonzalez
NOMBRE OPERADOR

INGENIERO PROFESIONAL SST

FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

239

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 13 - Junio - 2025.	Operador: Jesus David.		
Código Equipo: Retro.	Marca y Serie:	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste		X	
Vidrios, Espejos, Plumillas		X	
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo			X
Indicador de presión aire			X
Indicador Nivel Combustible	X		
Horómetro o contador de kms	X		
Silla del operador y Tapiceria		X	
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		

SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A
Luces de trabajo		X	
Pito	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Tacometro			X
Cableado	X		
Conectores	X		
SEGURIDAD: Extintor y botiquin		X	
SEGURIDAD: Silla de la cabina		X	
SEGURIDAD: Escaleras y apoyo de acceso		X	

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles			X
Estado de llantas			X
Presiones de inflado			X
Pernos de ruedas y rines			X
Eje muerto y bujes			X
Balancines y pasadores			X
Amortiguadores			X
Silletas muelles y sujeción			X
Freno de servicio			X
Freno de parqueo			X

UNION CARDANICA	B	M	N/A
Cardán ,yugos y crucetas			X

DIRECCION	B	M	N/A
Barra principal de dirección			X
Barra transversal			X
Terminales			X

TREN DE RODAJE	B	M	N/A
Cadenas de las oruga		X	
Zapatas, bujes y pasadores		X	
Carriles superiores e inferiores		X	
Ruedas Tensoras	X		
Sprocket			X
Motores de Traslacion	X		
Cadenas de las Traslacion		X	

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas		X	
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisión	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		

SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Cilindros hcos. y vástagos		X	
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		

NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Aceite Motor	X		
Aceite Hidráulico	X		
Aceite transmisión o caja	X		
Aceite diferenciales			X
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante			X
Liquido de frenos			X
Aceite Caja Direccion Hidraulica			X
Fuga Aceite Hidraulicas			X
Fuga Aceite Motor		X	
Fuga Aceite Transmisiones		X	

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

Jesús David Diaz Cantillo		
NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

2 4 0

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 14 - Junio - 2025. Operador: Jesus Diaz

Codigo Equipo: Retro Marca y Serie: Horometro Inicial: Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste		X	
Vidrios, Espejos,Plumillas		X	
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo			X
Indicador de presión aire			X
Indicador Nivel Combustible	X		
Horómetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria		X	
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		

SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A
Luces de trabajo		X	
Pito	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Cableado	X		
Conectores	X		

SEGURIDAD				
	Extintor y botiquin		X	
	Silla de la cabina		X	
	Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles			X
Estado de llantas			X
Presiones de inflado			X
Pernos de ruedas y rines			X
Eje muerto y bujes			X
Balancines y pasadores			X
Amortiguadores			X
Silletas muelles y sujeción			X
Freno de servicio			X
Freno de parqueo			X

UNION CARDANICA	B	M	N/A
Cardan ,yugos y crucetas			X

DIRECCION	B	M	N/A
Barra principal de dirección			X
Barra transversal			X
Terminales			X

TREN DE RODAJE	B	M	N/A
Cadenas de las oruga		X	
Zapatas, bujes y pasadores		X	
Carriles superiores e inferiores		X	
Ruedas Tensoras	X		
Sprocket			X
Motores de Traslacion	X		
Cadenas de las Traslacion		X	

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas		X	
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisión	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		

SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Cilindros hcos. y vástagos		X	
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		

NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Aceite Motor	X		
Aceite Hidraulico	X		
Aceite transmisión o caja	X		
Aceite diferenciales			X
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante			X
Liquido de frenos			X
Aceite Caja Direccion Hidraulica			X
Fuga Aceite Hidraulicas			X
Fuga Aceite Motor		X	
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

Jesus David Diaz Gonzalez
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE PROFESIONAL SST

FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evítese amonestaciones

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

247

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO — JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 16 - Junio - 2025 | Operador: Jesus Diaz

Código Equipo: Retro | Marca y Serie: | Horometro Inicial: | Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste		X	
Vidrios, Espejos,Plumillas		X	
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo			X
Indicador de presión aire			X
Indicador Nivel Combustible	X		
Horómetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria		X	
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		

SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A
Luces de trabajo		X	
Pito	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Cableado	X		
Conectores	X		
SEGURIDAD: Extintor y botiquin		X	
SEGURIDAD: Silla de la cabina		X	
SEGURIDAD: Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles			X
Estado de llantas			X
Presiones de inflado			X
Pernos de ruedas y rines			X
Eje muerto y bujes			X
Balancines y pasadores			X
Amortiguadores			X
Silletas muelles y sujeción			X
Freno de servico			X
Freno de parqueo			X

UNION CARDANICA	B	M	N/A
Cardàn ,yugos y crucetas			X

DIRECCION	B	M	N/A
Barra principal de dirección			X
Barra transversal			X
Terminales			X

TREN DE RODAJE	B	M	N/A
Cadenas de las oruga		X	
(zapatas, bujes y pasadores		X	
Carriles superiores e inferiores		X	
Ruedas Tensoras	X		
Sprocket			X
Motores de Traslacion	X		
Cadenas de las Traslacion		X	

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas		X	
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Escape y tuberia de escape	X		

SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Cilindros hcos. y vàstagos		X	
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		

NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisión o caja	X		
Aceite diferenciales			X
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante			X
Liquido de frenos			X
Aceite Caja Direccion Hidraulica			X
Fuga Aceite Hidraulicas			X
Fuga Aceite Motor		X	
Fuga Aceite Transmisiones		X	

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

Jesús David Diaz Gonzalez		
NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

1 de 2

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 13 - Junio - 2025 | Operador: Jesus Diaz

Código Equipo: Retro. | Marca y Serie: | Horometro Inicial: | Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste		X	
Vidrios, Espejos, Plumillas		X	
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo			X
Indicador de presión aire			X
Indicador Nivel Combustible	X		
Horómetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria		X	
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		

SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A
Luces de trabajo		X	
Pito	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Cableado	X		
Conectores	X		

EQUIPO DE SEGURIDAD				
	Extintor y botiquin		X	
	Silla de la cabina		X	
	Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles			X
Estado de llantas			X
Presiones de inflado			X
Pernos de ruedas y rines			X
Eje muñon y bujes			X
Balancines y pasadores			X
Amortiguadores			X
Silletas muelles y sujeción			X
Freno de servico			X
Freno de parqueo			X

UNION CARDANICA	B	M	N/A
Cardán ,yugos y crucetas			X

DIRECCION	B	M	N/A
Barra principal de dirección			X
Barra transversal			X
Terminales			X

TREN DE RODAJE	B	M	N/A
Cadenas de las oruga		X	
(zapatas, bujes y pasadores		X	
Carriles superiores e inferiores		X	
Ruedas Tensoras	X		
Sprocket			X
Motores de Traslacion	X		
Cadenas de las Traslacion		X	

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas		X	
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisión	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		

SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Cilindros hcos. y vàstagos		X	
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		

NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisión o caja	X		
Aceite diferenciales			X
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante			X
Liquido de frenos			X
Aceite Caja Direccion Hidraulica			X
Fuga Aceite Hidraulicas			X
Fuga Aceite Motor		X	
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

Jesús David Díaz Gonzalez
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE PROFESIONAL SST

FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evítese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor d
Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 18 - Junio - 2025 | Operador: Jesus Diaz

Código Equipo: Retro | Marca y Serie: | Horometro Inicial: | Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste		X	
Vidrios, Espejos,Plumillas		X	
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo			X
Indicador de presión aire			X
Indicador Nivel Combustible	X		
Horómetro o contador de kms.	X		
Silllin del operador y Tapiceria		X	
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		

SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A
Luces de trabajo		X	
Pito	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Cableado	X		
Conectores	X		

EQUIPO SEGURIDAD				
	Extintor y botiquin		X	
	Silla de la cabina		X	
	Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles			X
Estado de llantas			X
Presiones de inflado			X
Pernos de ruedas y rines			X
Eje muerto y bujes			X
Balancines y pasadores			X
Amortiguadores			X
Silletas muelles y sujeción			X
Freno de servico			X
Freno de parqueo			X

UNION CARDANICA	B	M	N/A
Cardán ,yugos y crucetas			X

DIRECCION	B	M	N/A
Barra principal de dirección			X
Barra transversal			X
Terminales			X

TREN DE RODAJE	B	M	N/A
Cadenas de las oruga		X	
Zapatas, bujes y pasadores		X	
Carriles superiores e inferiores		X	
Ruedas Tensoras	X		
Sprocket			X
Motores de Traslacion	X		
Cadenas de las Traslacion		X	

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas		X	
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisión	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		

SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Cilindros hcos. y vàstagos		X	
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		

NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Aceite Motor	X	/	
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisión o caja	X		
Aceite diferenciales			X
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante	/		X
Liquido de frenos			X
Aceite Caja Direccion Hidraulica			X
Fuga Aceite Hidraulicas			X
Fuga Aceite Motor		X	
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

Jesus David Diaz Gonzalez		
NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evítese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

249

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 19 - Junio - 2025.		Operador: Jean Diaz	
Código Equipo: Retro	Marca y Serie:	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A	SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A	MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X			Estado de muelles			X	Correas y poleas		X	
Elementos de desgaste		X		Estado de llantas			X	Ventilador	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas		X		Presiones de inflado			X	Soportes del motor	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X			Pernos de ruedas y rines			X	Mangueras radiador	X		
Indicador Temperatura Motor	X			Eje muerto y bujes			X	Radiador	X		
Indicador Temperatura Servo			X	Balancines y pasadores			X	Ductos de admisión	X		
Indicador de presión aire			X	Amortiguadores			X	Exhosto y tuberia de escape	X		
Indicador Nivel Combustible	X			Silletas muelles y sujeción			X	**SISTEMA HIDRAULICO**	B	M	N/A
Horòmetro o contador de kms.	X			Freno de servico			X	Cilindros hcos. y vàstagos		X	
Sillin del operador y Tapiceria		X		Freno de parqueo			X	Bujes y pasadores	X		
Palancas y perillas	X			**UNION CARDANICA**	B	M	N/A	Mangueras y conexiones	X		
Cinturon de Seguridad	X			Cardán ,yugos y crucetas			X	Bomba Hidraulica	X		
SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A	**DIRECCION**	B	M	N/A	**NIVELES Y FUGAS FLUIDOS**	B	M	N/A
Luces de trabajo		X		Barra principal de dirección			X	Aceite Motor	X		
Pito	X			Barra transversal			X	Aceite Hidràulico	X		
Alarma de Reversa	X			Terminales			X	Aceite transmisión o caja	X		
Luces Direccionales			X	**TREN DE RODAJE**	B	M	N/A	Aceite diferenciales			X
Luces de Parqueo			X	Cadenas de las oruga		X		Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Licuadora			X	(zapatas, bujes y pasadores		X		Refrigerante			X
Cableado	X			Carriles superiores e inferiores		X		Liquido de frenos			X
Conectores	X			Ruedas Tensoras	X			Aceite Caja Direccion Hidraulica			X
SEGURIDAD Extintor y botiquin		X		Sprocket			X	Fuga Aceite Hidraulicas			X
SEGURIDAD Silla de la cabina		X		Motores de Traslacion	X			Fuga Aceite Motor		X	
SEGURIDAD Escaleras y apoyo de acceso	X			Cadenas de las Traslacion		X		Fuga Aceite Transmisiones		X	

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

Jesús David Diaz Gonzalez		
NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

345

Powered by CamScanner

CONSORCIO RURAL ESTRUCTURA JAVIL TELLO

NIT. 901785782 - 7

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 20 - JUNIO - 2025 | Operador: JESUS DIAZ | Horometro Inicial: | Horometro Final:

Codigo Equipo: Retro | Marca y Serie:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Parachoques de empuje		X	
Motor, Espejos, Plumillas		X	
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo			X
Indicador de presión aire			X
Indicador Nivel Combustible	X		
Horómetro o contador de kms.	X		
Silla del operador y Tapiceria		X	
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo		X	
Pito	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Cableado	X		
Conectores	X		
Extintor y botiquin		X	
Silla de la cabina		X	
Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles			X
Estado de llantas			X
Presiones de inflado			X
Pernos de ruedas y rines			X
Eje muerto y bujes			X
Balancines y pasadores			X
Amortiguadores			X
Silletas muelles y sujeción			X
Freno de servicio			X
Freno de parqueo			X
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardán ,yugos y crucetas			X
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de dirección			X
Barra transversal			X
Terminales			X
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga		X	
(zapatas, bujes y pasadores		X	
Carriles superiores e inferiores		X	
Ruedas Tensoras	X		
Sprocket			X
Motores de Traslacion	X		
Cadenas de las Traslacion		X	

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas		X	
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisión	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**	**N/A**
Cilindros hcos. y vástagos		X	
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**	**N/A**
Aceite Motor	X		
Aceite Hidráulico	X		
Aceite transmisión o caja	X		
Aceite diferenciales			X
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante			X
Liquido de frenos			X
Aceite Caja Dirección Hidraulica			X
Fuga Aceite Hidraulicas			X
Fuga Aceite Motor		X	
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

Jesús David Diaz Gonzalez		
NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN IELLO

NIT. 901705262 1

JPNIELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 25 - JUNIO - 2025		Operador: Jesus Diaz	
Código Equipo: Retro	Marca y Serie:	Horometro Inicial:	Horometro Final

INSPECCION PREOPERACIONAL

	B	M	N/A		B	M	N/A		B	M	N/A
Chasis y Carroceria				Suspension y Frenos				Motor Diesel			
Chasis y Estructura	X			Estado de muelles			X	Correas y poleas		Y	
Elementos de desgaste		X		Estado de llantas			X	Ventilador	Y		
Vidrios, Espejos,Plumillas		X		Presiones de inflado			Y	Soportes del motor	Y		
Indicador Presion Aceite Motor	X			Pernos de ruedas y rines			Y	Mangueras radiador	Y		
[illegible]	X			[illegible]			Y	[illegible]	Y		
Indicador Temperatura Servo			X	Balancines y pasadores			Y	Ductos de admisión	Y		
Indicador de presión aire			Y	Amortiguadores			Y	Exhosto y tubería de escape	Y		
Indicador Nivel Combustible	X			Silletas muelles y sujeción			Y	SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Horómetro o contador de kms	X			Freno de servicio			Y	Cilindros hcos y vástagos		Y	
[illegible]		X		[illegible]			X	[illegible]			
Palancas y perillas	X			UNION CARDANICA	B	M	N/A	Mangueras y conexiones	Y		
Cinturon de Seguridad	X			Cardán ,yugos y crucetas			X	Bomba Hidraulica	Y		
SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A	DIRECCION	B	M	N/A	NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Luces de trabajo		X		Barra principal de dirección			X	Aceite Motor	X		
[illegible]	X			[illegible]			X	[illegible]	Y		
Alarma de Reversa	X			Terminales			X	Aceite transmisión o caja	Y		
Luces Direccionales			X	TREN DE RODAJE	B	M	N/A	Aceite diferenciales			Y
Luces de Parqueo			X	Cadenas de las oruga		X		Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Licuadora			X	(zapatas, bujes y pasadores		X		Refrigerante			X
[illegible]	X			[illegible]		X		[illegible]			X
Conectores	X			Ruedas Tensoras	X			Aceite Caja Direccion Hidraulica			X
Extintor y botiquin		Y		Sprocket			X	Fuga Aceite Hidraulicas			X
Silla de la cabina		X		Motores de Traslacion	X			Fuga Aceite Motor		X	
Escaleras y acceso de acceso	X			Cadenas de las Traslacion		X		Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

Jesús David Diaz Gonzalez		
NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: *El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador.* **Evitese amonestaciones.**

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de [illegible]

247

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 03 - JUNIO - 2025.		Operador: Luis Ospina	
Código Equipo: VIBRO PINDRAK.	Marca y Serie: CA - 152 D.	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A	SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A	MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Chasis y Estructura	✓			Estado de muelles	✓			Correas y poleas	✓		
Elementos de desgaste	✓			Estado de llantas	✓			Ventilador	✓		
Vidrios, Espejos,Plumillas			✓	Presiones de inflado	✓			Soportes del motor	✓		
Indicador Presion Aceite Motor	✓			Pernos de ruedas y rines	✓			Mangueras radiador	✓		
Indicador Temperatura Motor	✓			Eje trasero y bujes	✓			Radiador	✓		
Indicador Temperatura Servo			✓	Balancines y pasadores	✓			Ductos de admisiòn		✓	
Indicador de presiòn aire	✓			Amortiguadores	✓			Exhosto y tuberia de escape	✓		
Indicador Nivel Combustible	✓			Silletas muelles y sujeciòn	✓			SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Horòmetro o contador de kms.	✓			Freno de servico	✓			Cilindros hcos. y vàstagos	✓		
Silla del operador y Tapiceria	✓			Freno de parqueo				Bujes y pasadores	✓		
Palancas y perillas		✓		UNION CARDANICA	B	M	N/A	Mangueras y conexiones	✓		
Cinturon de Seguridad	✓			Cardàn ,yugos y crucetas			✓	Bomba Hidraulica	✓		
SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A	DIRECCION	B	M	N/A	NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Luces de trabajo	✓			Barra principal de direcciòn	✓	✓		Aceite Motor	✓		
Pito			✓	Barra transversal	✓	✓		Aceite Hidràulico	✓		
Alarma de Reversa			✓	Terminales	✓			Aceite transmisiòn o caja	✓		✓
Luces Direccionales			✓	TREN DE RODAJE	B	M	N/A	Aceite diferenciales			✓
Luces de Parqueo			✓	Cadenas de las oruga			✓	Aceite de mandos finales o Catalinas		✓	✓
Licuadora	✓			Zapatas, bujes y pasadores			✓	Refrigerante	✓		
Cableado	✓			Carriles superiores e inferiores			✓	Liquido de frenos			✓
Conectores			✓	Ruedas Tensoras			✓	Aceite Caja Direccion Hidraulica		✓	
EQUIPO BASICO: Extintor y botiquin	✓	✓		Sprocket			✓	Fuga Aceite Hidraulicas	✓		
EQUIPO BASICO: Silla de la cabina	✓	✓		Motores de Traslacion			✓	Fuga Aceite Motor	✓		
EQUIPO BASICO: Escaleras y apoyo de acceso	✓			Cadenas de las Traslacion			✓	Fuga Aceite Transmisiones	✓		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

HOMBRE OPERADOR	HOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evítese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que este tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785202 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 04 de Junio 2023		Operador: Luis Ospina.	
Código Equipo: Volco Dumper	Marca y Serie: CA 1520	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A	SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A	MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X			Estado de muelles	X			Correas y poleas	X		
Elementos de desgaste	X			Estado de llantas	X			Ventilador	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas			X	Presiones de inflado	X			Soportes del motor	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X			Pernos de ruedas y rines	X			Mangueras radiador	X		
Indicador Temperatura Motor	X			Eje muerto y bujes	X			Radiador	X		
Indicador Temperatura Servo			X	Balancines y pasadores	X			Ductos de admisión	X		
Indicador de presión aire	X			Amortiguadores	X			Exhosto y tubería de escape	X		
Indicador Nivel Combustible	X			Silletas muelles y sujeción	X			**SISTEMA HIDRAULICO**	**B**	**M**	**N/A**
Horómetro o contador de kms.	X			Freno de servico	X			Cilindros hcos. y vástagos	X		
Silfin del operador y Tapiceria	X			Freno de parqueo	X			Bujes y pasadores	X		
Palancas y perillas	X			**UNION CARDANICA**	**B**	**M**	**N/A**	Mangueras y conexiones	X		
Cinturon de Seguridad	X			Cardán ,yugos y crucetas			X	Bomba Hidraulica	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**	**DIRECCION**	**B**	**M**	**N/A**	**NIVELES Y FUGAS FLUIDOS**	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X			Barra principal de direcciòn	X			Aceite Motor	X		
Pito			X	Barra transversal	X			Aceite Hidráulico	X		
Alarma de Reversa			X	Terminales	X			Aceite transmisión o caja			X
Luces Direccionales			X	**TREN DE RODAJE**	**B**	**M**	**N/A**	Aceite diferenciales			X
Luces de Parqueo			X	Cadenas de las oruga			X	Aceite de mandos finales o Catalinas			X
Licuadora	X			(zapatas, bujes y pasadores			X	Refrigerante	X		
Cableado	X			Carriles superiores e inferiores			X	Liquido de frenos			X
Conectores		X		Ruedas Tensoras			X	Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
SEGURIDAD Extintor y botiquin	X			Sprocket			X	Fuga Aceite Hidraulicas	X		
Silla de la cabina	X			Motores de Traslacion			X	Fuga Aceite Motor	X		
Escaleras y apoyo de acceso	X			Cadenas de las Traslacion			X	Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

* No tiene botiquin, ni extintor

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evítese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

249

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785202 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 5 Junio 2025		Operador: Luis Ospina	
Código Equipo: VIBROMAK	Marca y Serie: CA. 152D.	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A	SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A	MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X			Estado de muelles	X			Correas y poleas	X		
Elementos de desgaste	X			Estado de llantas	X			Ventilador	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas			X	Presiones de inflado	X			Soportes del motor	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X			Pernos de ruedas y rines	X			Mangueras radiador	X		
Indicador Temperatura Motor	X			Eje muerto y bujes	X			Radiador	X		
Indicador Temperatura Servo			X	Balancines y pasadores	X			Ductos de admisiòn	X		
Indicador de presiòn aire	X			Amortiguadores	X			Exhosto y tuberia de escape	X		
Indicador Nivel Combustible	X			Silletas muelles y sujeciòn	X			SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Horòmetro o contador de kms.	X			Freno de servico	X			Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X			Freno de parqueo	X			Bujes y pasadores	X		
Palancas y perillas	X			UNION CARDANICA	B	M	N/A	Mangueras y conexiones	X		
Cinturon de Seguridad	X			Cardàn ,yugos y crucetas			X	Bomba Hidraulica	X		
SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A	DIRECCION	B	M	N/A	NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Luces de trabajo	X			Barra principal de direcciòn	X			Aceite Motor	X		
Pito			X	Barra transversal	X			Aceite Hidràulico	X		
Alarma de Reversa			X	Terminales	X			Aceite transmisiòn o caja			X
Luces Direccionales			X	TREN DE RODAJE	B	M	N/A	Aceite diferenciales			X
Luces de Parqueo			X	Cadenas de las oruga			X	Aceite de mandos finales o Catalinas			X
Licuadora	X			(zapatas, bujes y pasadores			X	Refrigerante	X		
Cableado	X			Camiles superiores e inferiores			X	Liquido de frenos			X
Conectores		X		Ruedas Tensoras			X	Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
SEGURIDAD: Extintor y botiquin	X			Sprocket			X	Fuga Aceite Hidraulicas	X		
SEGURIDAD: Silla de la cabina	X			Motores de Traslacion			X	Fuga Aceite Motor	X		
SEGURIDAD: Escaleras y apoyo de acceso	X			Cadenas de las Traslacion			X	Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

- No tiene Botiquin ,ni extintor

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE
Luis Pablo Osp		

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

230

Powered by CamScanner
