AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Principio de Procedencia: 3612

ACTA PARCIAL N° 1

NÚMERO DE CONTRATO	22001020 H4 DE 2022
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	ICONS – INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S
OBJETO	23600C1165 MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVCENCIO.
VALOR	$372.110.089,72
PLAZO	TRES (3) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
CDP SIIF	12122 DEL 28/03/2022
RP SIIF	26222 DE 08/06/2022
FECHA LEGALIZACION	09 de JUNIO 2022
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	LUZ MYRIAM SANTIAGO

En la ciudad de Villavicencio, a los (1) de Agosto de 2022, se reunieron en las instalaciones de la Administración del Aeropuerto Vanguardia **JORGE LUIS GONZALEZ**, identificado con al cedula de ciudadanía no. 1.085.036.478, actuando como Representante Legal de la empresa ICONS-INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S., identificado con Numero de Nit 901389503-1, obrando en calidad de contratista; y la doctora LUZ MYRIAM SANTIAGO RODRIGUEZ, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 40.393.810 de Villavicencio, supervisor designada por la entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **Principio de Procedencia: 3612**	**ACTA PARCIAL N° 1**

INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

INICIACION CONTRACTUAL	14 DE JUNIO DE 2022
TERMINACION CONTRACTUAL	TRES (3) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
PAGO PARCIAL DE LA FACTURA	CIENTO CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 105.867.515.33)

EJECUCIÓN TOTAL

No.	FACTURA	VALOR
1	ICS-4	$105.867.515,33

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR INCIAL	$372.110.089,72
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1	$105.867.515,33
VALOR SALDO	$266.242.574,39

Adicionalmente el supervisor verifico que el contratista se encuentre a paz y salvo con sus obligaciones con los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales. No siendo otro el objeto de la presente diligencia, esta se da por terminada y en constancia firma quienes en la misma intervinieron.

JORGE LUIS GONZALES REYES
Contratista

LUZ MYRIAM SANTIAGO RODRIGUEZ
Supervisora

ICONS
INGENIERÍA & CONTRATOS S.A.S
NIT.901.389.503-1

282

EL BANCO, MAGDALENA, 09 de septiembre de

Señora: Luz Myriam Santiago.
SUPERVISOR
AERONAUTICA CIVIL COLOMBIANA
Villavicencio

Referencia: SOLICITUD PRORROGA DE TIEMPO DEL CONTRATO No. 22001020 H4 DE 2022.

Saludo cordial,

Mediante el presente queremos informar a la entidad de situaciones que se vienen presentando en la ejecución de las obras:

Acorde con el desarrollo del contrato y los diferentes comités, y teniendo en cuenta que, para el contrato de la referencia en el proceso de ejecución del mismo, se han presentado situaciones que ameritan por la importancia que ocupan dentro del desarrollo del contrato ampliar los tiempos, todo con el objetivo que se ha venido desarrollado y es hacer una obra duradera en el tiempo, a continuación.
Mediante lo presente queremos informar a la entidad las situaciones que se vienen presentando en la ejecución de las obras:

Dentro de la ejecución de las obras se han presentado una serie de dificultades que ha atrasado de manera considerable la ejecución de las actividades en cada uno de los frentes de trabajos:

1. El Incremento del invierno en el mes de agosto y comienzo de septiembre, la actividad de la instalación de cerramiento y tubos metálicos no se logró en los tiempos deseados ya que dicha actividad se ejecuta con soldadura eléctrica y anclaje de tubos para su instalación. Motivo por el cual el armado de las mallas no se ha podido adelantar como esta en la programación. Situación que ha retrasado en dos semanas.

2. Como es sabido por la crisis mundial del Acero en el mundo los altos costos del metal los despacho y entregas de Mallas y tubos metálicos para la ejecución del último tramo están retrasado en su entrega en 20 días, y 10 días que demora la instalación de esta actividad serian 30 días que se necesitaran para culminar en la ejecución de esta obra, motivo por el cual pedimos de manera especial sea tenida en cuenta esta petición de otorgarnos una prórroga, al contrato 22001020 H4 de 2022

ICONS
INGENIERÍA & CONTRATOS S.A.S
NIT.901.389.503-1

REPROGRAMACION:

Teniendo en cuenta el desarrollo y alcance del contrato y con las situaciones informadas, se hace necesario solicitar una prorroga hasta el día 14 de octubre del presente años anexo a esta solicitud la programación para culminar a feliz término las obras que contempla este contrato.
Se informa a la entidad que esta prórroga no genera ningún tipo de adición y se mantiene el equilibrio económico.
Cordialmente.

JORGE LUIS GONZALEZ REYES
C.C. NO. 1.085.036.478 DE EL BANCO, MAGDALENA
REPRESENTANTE LEGAL GENERAL
ICONS INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S
NIT. 901389503 - 1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

3612. -
Villavicencio, 12 de septiembre de 2022

Ingeniero
DIEGO MIGUEL RODRIGUEZ HUEPA
Director Regional Oriente
AEROPUERTO VANGUARDIA
VILLAVICENCIO

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA EN TIEMPO CONTRATO 22001020 H4 DE 2022

Comedidamente y en mi calidad de Supervisora del Contrato No. 22001020 H4 de 2022, cuyo objeto es Mantener edificaciones de archivo, casa fiscal, centro de control y áreas administrativas de la regional meta y aeropuerto Vanguardia", y de acuerdo a lo establecido en la Ley 80/93 art.40, y por solicitud realizada por parte del contratista me permito solicitar prorroga al presente contrato en 30 días más, para que ellos puedan llevar a feliz término la ejecución total del contrato; lo anterior debido a que se han presentado retrasos por las lluvias en cuanto al cerramiento y la cimentación de instalación en el predio de la casa fiscal, igualmente faltan unos metros de malla, la cual no la entregado el proveedor de la misma.

Quedando atenta.

Cordialmente,

LUZ MYRIAM SANTIAGO RODRIGUEZ
Gerente Aeroportuario II

Proyectó: Luz Myriam Santiago Rodriguez
Revisó: Luz Myriam Santiago Rodriguez
Ruta electrónica: \\bog7\ADI\Externo\2022032239

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial



284

ACTA DE PRORROGA

CONTRATO DE OBRA No. 22001020 H4 DE 2022

DIEGO MIGUEL RODRIGUEZ HUEPA, identificado con la cédula de ciudadanía número 74.754.790 EXPEDIDA EN AGUAZUL (CASANARE), en calidad de DIRECTOR REGIONAL de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL- REGIONAL ORIENTE], según Resolución de No. 00688 del [12] de [03] de [2020], actuando en nombre y representación de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL- REGIONAL , debidamente facultado según Resolución 00108 del 21 de enero de 2022, Ing. **ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S** NIT 901389503-1, representada legalmente por JORGE LUIS GONZALEZ REYES C.C 1.85.036.478 De El Banco en adelante el "contratista", hemos acordado prorrogar el CONTRATO DE OBRA No. 22001020 H4 DE 2022 cuyo objeto es : 23600C1165 MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO.

La presente acta de prorroga No. 22001020 H4 DE 2022, se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y de Comercio, las demás normas legales aplicables a la materia, y las siguientes consideraciones:

Que el día siete (07) de junio de 2022 se firmó el contrato de obra No. **22001020** H4 DE 2022.

Que el día catorce (14) de junio de 2022 se dio inicio a la ejecución de la obra.

Que el Legislador ha dotado al contrato estatal de una serie de prerrogativas y ritualidades que deben observarse para que el mismo exista, se perfeccione y pueda iniciar su ejecución. En este sentido se hace necesario precisar que el contrato estatal es un acto de carácter solemne, razón por la cual este debe constar por escrito. Así las cosas, de conformidad con lo anterior, y lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 80 de 1993 los contratos estatales así como sus modificaciones deben constar por escrito.

Por otra parte, es importante señalar que el objeto de los contratos que celebran las Entidades Públicas, es cumplir con los fines estatales, satisfacer el interés general, dar una continua y eficiente prestación de los servicios públicos y procurar la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, lo cual debe estar presente durante la ejecución del contrato. Es así, que en ocasiones es necesario hacer modificaciones al contrato para la consecución de dichos fines. De esta manera surge el principio de mutabilidad permitiendo que el contrato estatal pueda modificarse, con la finalidad de cumplir con los cometidos para los cuales fue previsto, siempre y cuando no se altere el objeto del contrato. Esta modificación puede ser por un acuerdo bilateral o por acto

unilateral de la entidad contratante, el cual deberá ser motivado tal como lo dispone el artículo 16 de la Ley 80 de 1993.

Así las cosas, es claro que la solemnidad del contrato estatal es un requisito que no puede ser desconocido, y en este sentido la jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Tercera. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Radicado 25000-23-26-000-1997-04390-01 (18080) en fallo proferido por la Dra. Ruth Stella Correa Palacio señaló que cualquier modificación adicional o autorización de mayores cantidades deberá constar por escrito.

Frente a este asunto, ha precisado la Honorable Corte Constitucional, mediante Sentencia C–300 de 2012, que:

[...] Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato, (sentencia C-932 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra). Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, los cuales facultan a la entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos – como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal. (sentencia C-068 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo), Vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009, según el cual:

[...] La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo.

Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado (Consejo de Estado. Rad. 1952. M.P. Enrique Arboleda Perdomo. 13 de agosto de 2009).

En atención a la justificación enviada por el contratista al supervisor del contrato el día 9 de septiembre de 2022, donde señala inconvenientes con el retraso de material y las constantes lluvias registradas en el mes de agosto, razón por la cual solicita prorroga por un termino de 30 días, el supervisor considero viable otorgar dicha prorroga mediante oficio radicado el día 12 de septiembre de 2022, documentos que hacen parte integral de la presente prorroga.

Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto:

RESUELVE

CLAUSULA PRIMERA: Prorrogar el contrato No. 22001020 DE 2022 cuyo objeto es: 23600C1165 MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO, por 30 días adicionales a partir de la finalización del plazo de ejecución actual, que contempla como fecha de terminación el día 14 de septiembre de 2022, es decir que la presente prorroga va hasta el 14 de octubre de 2022.
CLAUSULA SEGUNDA: Las pólizas deberán ampliarse conforme a la respectiva prorroga.
CLAUSULA TERCERA Las demás clausulas permanecen incólumes.

En constancia se firma en Villavicencio, a los trece (13) días del mes de septiembre de 2022.

DIEGO MIGUEL RODRIGUEZ HUEPA
DIRECTOR REGIONAL ORIENTE

JORGE LUIS GONZALEZ REYES
R/L. ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S

Proyectó
FRANCY MATEUS
Abog contratista

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101384830	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	09	2022	14	06	2022	00:00	14	10	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ICONS-INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S	NIT: 901.389.503-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 9 NRO. 4 - 47	EL BANCO, MAGDALENA	3017551067

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT: 899.999.059-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4251000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN LA EJECUCION CONTRATO 22001020 H4 DE 2022 CUYO OBJETO ES 23600C1165 MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/06/2022	14/02/2023	$74,420,018.00	$74,420,018.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14/06/2022	14/10/2025	$74,420,018.00	$74,420,018.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$74,420,018.00	$74,420,018.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE ACUERDO CON EL ACTA DE PRORROGA DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN MODIFICACION.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******22,387.00	$ *******8,000.00	$ *******5,773.00	$ **********36,160.00	$ ******223,260,054.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DIANA MARCELA ALFONSO DUARTE	184323	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101384830

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101384830	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	09	2022	14	06	2022	00:00	14	10	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
ICONS-INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S			NIT: 901.389.503-1
DIRECCIÓN: CL 9 NRO. 4 - 47	**CIUDAD:** EL BANCO, MAGDALENA	**TELÉFONO:**	3017551067

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL			NIT: 899.999.059-3
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	4251000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101384830

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

283

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

21-44-101384830

Número de anexo:

3

Fecha de expedición:

lunes, 19 de septiembre de 2022

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

Tomador:

ICONS-INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S

Inicio de vigencia:

martes, 14 de junio de 2022

Fin vigencia:

jueves, 14 de octubre de 2027

Valor total asegurado:

$ 223.260.054

Consultar de nuevo

289

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101189399	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	09	2022	14	06	2022	00:00	14	10	2022	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ICONS-INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S	NIT: 901.389.503-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 9 NRO. 4 - 47	EL BANCO, MAGDALENA	3017551067

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT: 899.999.059-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4251000

BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A RRDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSAVBILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE SE GENERA POR RECLAMACION DE TERCEROS COMO CONSECUENCIA DE ACTOS, HECHO U OMISIONES DEL CONTRATISTA DERIVADOS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO No 22001020 H4 DE 2022 CUYO OBEJTO ES 23600C1165 MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	14/06/2022	14/10/2022	$200,000,000.00	$200,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	14/06/2022	14/10/2022	$200,000,000.00	$200,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	14/06/2022	14/10/2022	$200,000,000.00	$200,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE ACLARAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE ACUERDO CON EL ACTA DE PRORROGA DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN MODIFICACION.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******41,095.00	$ *******3,000.00	$ ******8,378.00	$ **********52,474.00	$ ******200,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DIANA MARCELA ALFONSO DUARTE	184323	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101189399

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

290

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101189399	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	09	2022	14	06	2022	00:00	14	10	2022	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ICONS-INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S	NIT: 901.389.503-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 9 NRO. 4 - 47	EL BANCO, MAGDALENA	3017551067

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT: 899.999.059-3

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4251000

BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	14/06/2022	14/10/2022	$200,000,000.00	$200,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	14/06/2022	14/10/2022	$200,000,000.00	$200,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-017963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101189399

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF184223A

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101189399	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	09	2022	14	06	2022	00:00	14	10	2022	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
ICONS-INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S			NIT: 901.389.503-1
DIRECCIÓN: CL 9 NRO. 4 - 47	**CIUDAD:** EL BANCO, MAGDALENA	**TELÉFONO:**	3017551067

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL			NIT: 899.999.059-3
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	4251000

BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101189399

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

292

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

21-40-101189399

Número de anexo:

3

Fecha de expedición:

lunes, 19 de septiembre de 2022

Ramo:

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPL

Asegurado:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

Tomador:

ICONS-INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S

Inicio de vigencia:

martes, 14 de junio de 2022

Fin vigencia:

viernes, 14 de octubre de 2022

Valor total asegurado:

$ 200.000.000

Consultar de nuevo

293

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 58 ACTO DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS			
Principio de procedencia: 3601.092	**Clave: GCON-1.0-12-048**	**Versión:2**	**Fecha: 04/Oct/2019**	**Página: 1 de 1**

Conforme a lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y teniendo en cuenta lo siguiente:

NÚMERO DE CONTRATO	22001020 H4 DE 2022							
CONTRATISTA	INCONS – INGENIERIA Y CONTRATOS SAS NIT 901389503-1							
OBJETO	23600C1165 MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO.							
VALOR INICIAL	$372.100.090							
PLAZO INICIAL	(03) MESES							
PRORROGA	14/10/2022							
CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA**	**NÚMERO** 21-44-101384830		**CERTIFICADO MODIFICATORIO**		**NÚMERO** -		
ASEGURADOR	SEGUROS DEL ESTADO. NIT 860.009.578-6							
AMPAROS	**VIGENCIAS**							
	DESDE			**HASTA**				
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**	
CUMPLIMIENTO	14	06	2022	14	02	2023	$74.420.018	
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14	06	2022	14	10	2025	$74.420.018	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VIGENCIA 5 AÑOS						$74.420.018	
CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**	**NÚMERO** 21-40-101189399		**CERTIFICADO MODIFICATORIO**		**NÚMERO**		
ASEGURADOR	SEGUROS DEL ESTADO. NIT 860.009.578-6							
AMPAROS	**VIGENCIAS**							
	DESDE			**HASTA**				
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**	
Responsabilidad Civil Extracontractual	14	06	2022	14	10	2022	$200.000.000	

Reunidos los requisitos de vigencia y valor exigidos en el Contrato 22001020 H4 de 2022, se aprueba la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidades Estatales, Calidad del Servicio y Pago de Salarios, Prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.

NOTA: EL SUPERVISOR del contrato deberá solicitar el ajuste de las garantías una vez suscritas el acta de inicio y las post-contractuales a que haya lugar, una vez reciba a satisfacción el objeto contractual.

Dada en Villavicencio, el 22 de Septiembre de 2022

JHON FREDY CANIZALES VALLEJO
Coordinador Grupo Administrativo y Financiero

Elaboró: Lidy P.
Revisó: Francy Mateus

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

Radicado: 2022024629
Fecha: 12/09/2022 15:07:47.0
Asunto: CUENTAS POR PAGAR
Destino:DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA META- Destinatario: Yenifer Gribeth Torres Cubillos

Villavicencio, 2 de Septiembre de 2022

PARA: **CUENTAS POR PAGAR**
GRUPO REGIONAL META

DE: **LUZ MYRIAM SANTIAGO RODRIGUEZ**
Supervisora de Contrato.

Asunto: Pago Parcial 2. contrato No. 22001020 H4 de 2022, ICONS-INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S..

ASUNTO: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL ACTA PARCIAL No.2

Por medio del presente se notifica la entrega de la documentación correspondiente al acta parcial de obra N° 2 del contrato de obra No. 22001020 H4 con objeto "MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADTIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO",

ITEM	DESCRIPCION
1	OFICIO REMISORIO
2	ACTA PARCIAL No. 2
3	SABANA ACTA PARCIAL No. 2
4	CERTIFICADOS DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
5	FACTURA
6	DOCUMENTACIÓN CONTADOR CEDULA DE CIUDADANIA
7	TARJETA PROFESIONAL CONTADOR
8	CERTIFICADO PARAFISCALES
9	CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN
10	INFORME DE SUPERVISION

Cordial Saludo,

LUZ MYRIAM SANTIAGO RODRIGUEZ.
Supervisora de contrato

Anexo: Documentos

Responder | Responder a todos | Reenviar | Archivar | Eliminar | ...

Hemos Recibido el Documento enviado por usted

factura.electronica@olimpiait.com <factura.electronica@olimpiait.com>
11:19 a. m.

Para: facturacion@rsago.com; icons.sas@hotmail.com

Factura Electrónica
by OLIMPIA IT

olimpia Centro Digital

Bogotá, 9/3/2022 11:19:37 AM

ICONS - INGENIERÍA Y CONTRATOS S.A.S., reciba un cordial saludo.

El Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del aliado estratégico, portal de Factura Electrónica de Olimpia IT ha recibido la Factura **ICS5** generada por usted

Nota: La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

29634566

31°C Nublado | ESP | 11:20 a. m. 3/09/2022

295

296

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

3612
Villavicencio, 2 de Septiembre 2022

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO NUMERO 220001020 H4 DE 2022 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA AERONÁUTICA CIVIL REGIONAL META

CERTIFICA

Que **INCONS-INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S.**, identificado con el NIT.901389503-1, cumplió a satisfacción la ejecución del contrato en un 83.49% según Acta de Recibo Parcial No. 2, cuyo objeto es: 23600C1165 MANTENER EDIFICACIONES DE ARCHIVO,CASA FISCAL,CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADMINSITRTIVAS DE LA REGIONAL Y DEL AEROPUERTO VANGUARDIA, Por lo tanto, informo a la Aerocivil el Primer Pago Parcial del contrato que se le adeuda según factura:

FACTURA	VALOR
ICS-5	$204.801.813.15

Por un valor total de **DOSCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON QUINCE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($204.801.813.15)**

Igualmente certifico que se verifico y el contratista cumplió a entera satisfacción el objeto del contrato presentado y anexa los pagos de parafiscales cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones parafiscales.

Cordialmente,

LUZ MYRIAM SANTIAGO RODRIGUEZ
Supervisor del Contrato

Proyectó : Luz Myriam Santiago Rodríguez
Revisó: Luz Myriam Santiago Rodríguez
Ruta electrónica: \\bog7\ADI\Externo\

297

ICONS - INGENIERÍA Y CONTRATOS S.A.S.
NIT 901.389.503-1
CL 9 N° 4 - 47
Tel: (605) 0
El Banco - Colombia
icons.sas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. ICS-5

				Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL AEROCIVIL				
NIT	899.999.059-3	**Teléfono**	(601) 2963138	2022-09-01	2022-09-01
Dirección	AVENIDA EL DORADO # 103-15	**Ciudad**	Bogotá - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ACTA DE COSTOS No. 02. CONTRATO 22001020 H4 DE 2022. MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO	1.00	162,605,647.60	162,605,647.60
2	ADMINISTRACION	1.00	30,895,073.04	30,895,073.04
3	IMPREVISTO	1.00	1,626,056.48	1,626,056.48
4	UTILIDAD	1.00	8,130,282.38	8,130,282.38
5	IVA SOBRE UTILIDAD 19%	1.00	1,544,753.65	1,544,753.65

Elaborado por Siigo S.A.S NIT: 830.045.145-9

Total Items: 5

Total Bruto	204,801,813.15
Total a Pagar	204,801,813.15

Valor en Letras:
Doscientos cuatro millones ochocientos un mil ochocientos trece pesos m/cte con quince cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-09-01 por $ 204,801,813.15

Observaciones:
#$24-12-00-700;22001020H4DE2022;luz.santiago@aerocivil.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008) Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor Número Autorización 18764029907001 aprobado en 26220608 prefijo ICS desde el número 1 al 188 Vigencia: 12 Meses
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa

299

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Principio de Procedencia: 3612

ACTA PARCIAL N° 2

NÚMERO DE CONTRATO	22001020 H4 DE 2022
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	ICONS – INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S
OBJETO	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADTIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVCENCIO.
VALOR	$372.110.089,72
PLAZO	TRES (3) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
CDP SIIF	12122 DEL 28/03/2022
RP SIIF	26222 DE 08/06/2022
FECHA LEGALIZACION	09 de JUNIO 2022
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	LUZ MYRIAM SANTIAGO

En la ciudad de Villavicencio, a los DOS (02) días del mes de SEPTIEMBRE de 2022, se reunieron en las instalaciones de la Administración del Aeropuerto Vanguardia JORGE LUIS GONZALEZ REYES , actuando como Representante Legal de la empresa ICONS – INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S, identificada con Numero de Nit 901389503-1, obrando en calidad de contratista; y la doctora LUZ MYRIAM SANTIAGO RODRIGUEZ, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 40.393.810 de Villavicencio, supervisor del contrato para recibir parcialmente las obras de ejecución el presente contrato, correspondiente a la segunda acta parcial.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **Principio de Procedencia: 3612**	**ACTA PARCIAL N° 2**

INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

INICIACION CONTRACTUAL	14 DE JUNIO DE 2022
TERMINACION CONTRACTUAL	TRES (3) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
PAGO PARCIAL DE LA FACTURA	Doscientos cuatro millones ochocientos un mil ochocientos trece pesos y quince centavos ($ 204.801.813,15)

EJECUCIÓN TOTAL

No.	FACTURA	VALOR
1	ICS-4	$105.867.515.33
2	ICS-5	$204.801.813,15

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR INCIAL	$372.110.089,72
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1	$105.867.515,33
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 2	$ 204.801.813,15
VALOR SALDO	$61.440.750,24

Adicionalmente el supervisor verifico que el contratista se encuentre a paz y salvo con sus obligaciones con los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales. No siendo otro el objeto de la presente diligencia, esta se da por terminada y en constancia firma quienes en la misma intervinieron.

JORGE LUIS GONZALES REYES

LUZ MYRIAM SANTIAGO RODRIGUEZ

229

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5969706699C95F90

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **KÁTERINE BARROS PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1082894582 de SANTA MARTA (MAGDALENA) Y Tarjeta Profesional No 173266-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.


NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


KATERINE BARROS PEREZ

CONTADOR PÚBLICO









Katerine Barros Pérez
Contador Público
T.P. 173266-T

Cll 8 No. 2-99 Ofic 302 Edificio Ciclo Gomez
Cel: 300 634 4675 – e-mail: k_barros01@hotmail.com
El Banco Magdalena

301

ICONS
INGENIERIA & CONTRATOS S.A.S
NIT 901.389 503-1

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA

REFERENCIA: PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 CONTRATO DE OBRA No. 22000876 H3 DE 2022

Objeto: MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADTIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVCENCIO.

Yo, KATERINE BARROS PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía No 1.082.894.582 de Santa Marta, magdalena portadora de la Tarjeta Profesional No. T.P. 173266-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contador de ICONS INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S identificada con NIT. 901389503-1, manifiesto bajo la gravedad del juramento que el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Santa marta, a los 2 días del mes de septiembre de 2022.

KATERINE BARROS PEREZ
CONTADORA
T.P. 173266-T

icons.sas@hotmail.com
301 755 1067
Calle 9 #4 - 47 El Banco Magdalena

aportes

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901389503	1	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 9 NO 4 - 47	EL BANCO-MAGDALENA	4292025	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1633021881	9439673129	E	2022/09/02	2022/09/02	BANCO DE BOGOTA	0	$928,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: AREONAUTICA (5 Afiliados)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$208,800		$0	$0
Centro de Trabajo: TRABAJOS VILLAVICENCIO (5 Afiliados)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$208,800		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (5 Afiliados)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$208,800		$0	$0
1	CC	1151466745	CAUSADO CONTRERAS JOSE ANDRES	230301	15	$500,000	$80,000	EPS002	15	$500,000	$20,000	CCF34	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	$34,800	15	$0	$0
2	CC	19603763	GUZMAN CANTILLO JOSE DAVID	230301	15	$500,000	$80,000	EPS002	15	$500,000	$20,000	CCF34	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	$34,800	15	$0	$0
3	CC	1122413979	JIMENEZ DAZA LUIS MIGUEL	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
4	CC	1122404746	LOPERENA CHIMUQUERO JOSE JACINTO	230301	15	$500,000	$80,000	EPSIC1	15	$500,000	$20,000	CCF34	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	$34,800	15	$0	$0
5	CC	1048324147	PEÑALOZA ZAPATA CRISTHIAN ANDRES	230301	15	$500,000	$80,000	ESSC24	15	$500,000	$20,000	CCF34	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	$34,800	15	$0	$0
Total	**Afiliados(5)**					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$208,800		$0	$0

307

aportes

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901389503	1	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 9 NO 4 - 47	EL BANCO-MAGDALENA	4292025	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	16330218B1	9439673129	E	2022/09/02	2022/09/02	BANCO DE BOGOTA	0	$928,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$480,000	$0	$0	$480,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$208,800	$0	$0	$208,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$208,800	$0	$0	$208,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$120,000	$0	$0	$120,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	5	$120,000	$0	$0	$120,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$120,000	$0	$0	$120,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$20,000	$0	$0	$20,000
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	$20,000	$0	$0	$20,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$40,000	$0	$0	$40,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$40,000	$0	$0	$40,000
TOTAL				5	$928,800	$0	$0	$928,800

2022/09/02 10:18 AM

303

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CANTIDADES DE ACTA PARCIAL DE OBRA

CONTRATO No :	22001020 H4 de 2022	AEROPUERTO:	VANGUARDIA
OBJETO:	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CONTRO DE CONTROL Y AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO	CIUDAD:	VILLAVICENCIO
		TIEMPO DE EJECUCIÓN:	3 MESES
			FECHAS
CONTRATISTA:	ICONS INGENIERIA Y CONTRATOS SAS	DE INICIO:	
INTERVENTOR :	N/A	DE TERMINACION:	
SUPERVISORA:	LUZ MIRYAM SANTIAGO RODRIGUEZ	PRORROGA	N/A

VALOR INICIAL:	$	372.110.089,72
VALOR FINAL X MODIFICACIÓN:	$	372.109.976,87
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD:	$	112,85

FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2022
PORCENTAJE DE AVANCE:	83,49%
VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA:	$ 204.801.813,15

ITEM	DESCRIPCION	UNID	VALOR UNITARIO	CANTIDADES ACTUALIZADAS CANTIDAD	CANTIDADES ACTUALIZADAS VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3 CANTIDAD	PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3 VALOR TOTAL ACTUALIZADO	ACTA PARCIAL No. 2 CANTIDAD	ACTA PARCIAL No. 2 VALOR TOTAL ACTUALIZADO	CANTIDADES ACUMULADAS CANTIDAD	CANTIDADES ACUMULADAS VALOR TOTAL ACTUALIZADO	PENDIENTES POR EJECUTAR CANTIDAD	PENDIENTES POR EJECUTAR VALOR TOTAL ACTUALIZADO
	1. MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ARCHIVO												
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA PERFIL TRAPEZOIDAL COLOR, NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	$ 64.359,83	91,00	$ 5.856.745,00		$ -	91,00	$ 5.856.744,73	91,00	$ 5.856.745,00	0,00	$ -
1.2	LIMPIEZA DE CUBIERTA	M2	$ 8.604,00	120,00	$ 1.032.480,00		$ -	120,00	$ 1.032.480,00	120,00	$ 1.032.480,00	0,00	$ -
1.3	INSTALACION DE CANAL, INCLUYE ADECUACIÓN, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	M2	$ 57.426,92	12,00	$ 689.123,00		$ -		$ -	0,00	$ -	12,00	$ 689.123,00
1.4	DESMONTE DE CANAL Y/O BAJANTE EXISTENTE	M2	$ 23.517,60	12,00	$ 282.211,00		$ -	12,00	$ 282.211,20	12,00	$ 282.211,00	0,00	$ -
1.5	IMPERMEABILIZACION FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 485	M2	$ 35.549,97	132,00	$ 4.697.876,00		$ -	132,00	$ 4.697.875,78	132,00	$ 4.697.876,00	0,00	$ -
1.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO T, CORAZA EXTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS, INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES	M2	$ 37.790,68	252,00	$ 9.523.251,00		$ -	252,00	$ 9.523.251,36	252,00	$ 9.523.251,00	0,00	$ -
1.7	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA, PERCHAS EN CONCRETO, TUBERIA DE 2" CAL.14 Y LAMINA DE SOPORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA PARA TUBERIA, INCLUYE PUERTA 2M DE LONGITUD	M2	$ 150.187,03	40,00	$ 6.007.481,00		$ -	40,00	$ 6.007.481,06	40,00	$ 6.007.481,00	0,00	$ -
1.8	PARETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	$ 84.148,32	264,00	$ 9.015.156,00	133,00	$ 4.541.727,00	131,00	$ 4.473.428,92	264,00	$ 9.015.157,00	0,00	$ -1,00
1.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO T, CORAZA INTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS, INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES	M2	$ 33.746,80	264,00	$ 8.909.155,00		$ -	264,00	$ 8.909.155,20	264,00	$ 8.909.155,00	0,00	$ -
1.10	LIMPIEZA GENERAL	M2	$ 1.195,00	120,00	$ 143.400,00		$ -	120,00	$ 143.400,00	120,00	$ 143.400,00	0,00	$ -
1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FABRICIMIENTO P3 N°6 Y REPARACION DE ESTRUCTURA DEFECTUOSA (INCLUYE RETIRO A BOTADERO DE TEJAS Y ESTRUCTURA EN MAL ESTADO	M2	$ 83.611,76	20,00	$ 1.672.235,00		$ -	20,00	$ 1.672.235,20	20,00	$ 1.672.235,00	0,00	$ -
				SUBTOTAL	$ 47.829.113,00	SUBTOTAL	$ 4.541.727,00	SUBTOTAL	$ 42.586.264,42	SUBTOTAL	$ 47.129.991,00	SUBTOTAL	$ 699.122,00
	2. MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CASA FISCAL												
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO NUEVO EN MALLA ESLABONADA DE 2" X 2" CALIBRE 10 RECUBRETA EN PVC, TIPO REFINAL, TUBO 2" GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS SEGÚN ESPECIFICACIÓN	M	$ 241.805,86	488,15	$ 118.061.711,00	160,00	$ 38.688.938,00	200,00	$ 48.361.172,00	360,00	$ 87.050.110,00	128,25	$ 31.011.601,00
2.2	DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE	ML	$ 5.010,27	800,00	$ 4.008.213,00	200,00	$ 1.002.053,00	300,00	$ 1.503.078,91	500,00	$ 2.505.131,00	300,00	$ 1.503.080,00
2.3	MORTERO PARA FIJACIÓN DE MALLA ESLABONADA 1:4, incluye suministro y colocación	M	$ 17.214,69	800,00	$ 13.771.756,00		$ -	860,00	$ 14.797.293,12	500,00	$ 8.197.295,00	440,00	$ 7.574.465,00
2.4	ALAMBRE DE PUA CALIBRE 12,5 incluye suministro y colocación	ML	$ 1.463,64	2.400,00	$ 3.512.736,00		$ -	1080,00	$ 1.580.726,88	1080,00	$ 1.580.727,00	1320,00	$ 1.931.999,00
2.5	IMPERMEABILIZACION Y ACHADAS, MUROS MASTERSEAL 485	M2	$ 35.549,97	252,00	$ 8.968.672,00		$ -	252,00	$ 8.968.671,84	252,00	$ 8.968.672,00	0,00	$ -
2.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO T, CORAZA EXTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS, INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES	M2	$ 37.790,68	422,63	$ 15.971.475,00	426,64	$ 16.122.961,00		$ -	426,64	$ 16.122.961,00	-4,01	$ 151.486,00
2.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO T, CORAZA INTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS, INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES	M2	$ 33.742,98	403,70	$ 13.605.168,00	408,20	$ 13.605.168,42		$ -	403,70	$ 13.605.168,42	0,00	$ -
2.8	LIMPIEZA DE CUBIERTA	M2	$ 8.604,00	170,00	$ 1.462.680,00	170,00	$ 1.462.680,00		$ -	170,00	$ 1.462.680,00	0,00	$ -
2.9	DESMONTE DE CANAL Y/O BAJANTE EXISTENTE	M	$ 23.517,60	25,00	$ 587.940,00	25,00	$ 587.940,00		$ -	25,00	$ 587.940,00	0,00	$ -
2.10	INSTALACION DE CANAL, INCLUYE ADECUACIÓN, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	M	$ 57.426,92	25,00	$ 1.435.673,00		$ -		$ -	0,00	$ -	25,00	$ 1.435.673,00
2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL INFORMATIVO CASA FISCAL + PARQUEADEROS	UNO	$ 239.000,00	6,00	$ 1.434.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	6,00	$ 1.434.000,00
2.12	PEDESTAL EN CONCRETO 3000PSI PARA COLUMPIAS 40x 40x 80	M3	$ 590.706,66	1,20	$ 708.848,00	1,20	$ 708.848,00		$ -	1,20	$ 708.848,00	0,00	$ -
2.13	ACERO DE REFUERZO 8 RADIO 80	KG	$ 4.932,96	215,63	$ 1.063.670,00	215,63	$ 1.063.697,58		$ -	215,63	$ 1.063.697,58	0,00	$ 28,00
2.14	ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ASTM-500 GRADO C (INCLUYE SUMINISTRO - FABRICACION - PINTURA - MONTAJE) PARA COLUMPIAS 280x280x 5mm - ACCESO A CASA Y PARQUEADERO	KG	$ 18.458,45	202,50	$ 3.737.836,00	202,50	$ 3.737.836,00		$ -	202,50	$ 3.737.836,00	0,00	$ -
	ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ASTM-500 GRADO C (INCLUYE SUMINISTRO - FABRICACION - PINTURA - MONTAJE) PARA VIGAS DE CUBIERTA 120x180x2,5mm	KG	$ 18.458,45	1.009,34	$ 18.630.850,00	450,00	$ 8.306.302,00	559,34	$ 10.324.548,30	1009,34	$ 18.630.850,00	0,00	$ -
	ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ASTM-500 GRADO C (INCLUYE SUMINISTRO - FABRICACION - PINTURA - MONTAJE) PARA CORREAS 80x40x2,5mm	KG	$ 18.458,45	342,00	$ 6.312.789,00	230,00	$ 3.878.274,00	112,00	$ 2.434.515,14	342,00	$ 6.312.789,00	0,00	$ -
	PLATINERIA PARA CONEXIÓN DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO	KG	$ 18.459,40	127,63	$ 2.340.475,00	72,63	$ 1.431.004,00	60,00	$ 1.107.564,24	127,63	$ 2.540.568,00	0,00	$ 93,00
2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA PERFIL TRAPEZOIDAL COLOR, NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	$ 84.357,92	60,00	$ 3.861.475,00		$ -		$ -	0,00	$ -	60,00	$ 3.861.475,00
				SUBTOTAL	$ 228.675.855,00	SUBTOTAL	$ 90.595.702,00	SUBTOTAL	$ 80.479.587,58	SUBTOTAL	$ 171.075.289,00	SUBTOTAL	$ 48.820.886,00
	3. MANTENIMIENTO DE TORRE DE CONTROL ANTIGUA - CHICHINA IDEAM												
3.1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	M2	$ 6.351,66	150,00	$ 952.750,00		$ -	150,00	$ 952.749,60	150,00	$ 952.750,00	0,00	$ -
3.2	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	$ 8.346,84	89,00	$ 742.868,00		$ -	89,00	$ 742.868,40	89,00	$ 742.868,00	0,00	$ -
3.3	PARETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	$ 84.148,32	150,00	$ 5.122.248,00		$ -	150,00	$ 5.122.248,00	150,00	$ 5.122.248,00	0,00	$ -
3.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO T, CORAZA EXTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS, INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES	M2	$ 37.790,68	150,00	$ 5.668.602,00		$ -	150,00	$ 5.668.602,00	150,00	$ 5.668.602,00	0,00	$ -
3.5	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILO T, CORAZA INTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS, INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES	M2	$ 33.746,80	449,18	$ 15.157.713,00		$ -	449,18	$ 15.157.712,69	449,18	$ 15.157.713,00	0,00	$ -
3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 6 MM INC PINTURA	M2	$ 105.305,31	6,50	$ 684.485,00		$ -	6,50	$ 684.484,53	6,50	$ 684.485,00	0,00	$ -
3.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS (INCLUYE GRIFERIA)	UND	$ 525.800,00	8,00	$ 4.206.400,00		$ -		$ -	0,00	$ -	8,00	$ 4.206.400,00
3.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERIA)	UND	$ 334.600,00	8,00	$ 2.676.800,00		$ -		$ -	0,00	$ -	8,00	$ 2.676.800,00
				SUBTOTAL	$ 35.213.886,00	SUBTOTAL	$ -	SUBTOTAL	$ 28.329.685,22	SUBTOTAL	$ 28.329.686,00	SUBTOTAL	$ 6.883.200,00
	4. MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AREAS ADMINISTRATIVAS												
4.1	PARETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	$ 84.148,32	325,00	$ 11.098.704,00		$ -	325,00	$ 11.098.704,00	325,00	$ 11.098.704,00	0,00	$ -
4.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO T, CORAZA EXTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS, INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES	M2	$ 37.790,68	294,17	$ 11.116.884,00		$ -	294,17	$ 11.116.884,34	294,17	$ 11.116.884,00	0,00	$ -
4.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO T, CORAZA INTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS, INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES	M2	$ 33.746,80	404,00	$ 13.633.707,00		$ -	404,00	$ 13.633.707,20	404,00	$ 13.633.707,00	0,00	$ -
4.4	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M	$ 4.508,43	200,00	$ 901.686,00		$ -	200,00	$ 901.686,79	200,00	$ 901.686,00	0,00	$ -
4.5	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LINEAL INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	$ 6.019,93	30,00	$ 180.598,00		$ -	30,00	$ 180.597,86	30,00	$ 180.598,00	0,00	$ -
4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 6 MM INC PINTURA	M2	$ 105.305,31	30,00	$ 3.159.159,00		$ -	30,00	$ 3.159.159,36	30,00	$ 3.159.159,00	0,00	$ -
				SUBTOTAL	$ 40.090.238,00	SUBTOTAL	$ -	SUBTOTAL	$ 40.090.238,25	SUBTOTAL	$ 40.090.238,00	SUBTOTAL	$ -
	5. MANTENIMIENTO MANO DE OBRA Y EQUIPOS												
5.1	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES ELECTRICAS	HORA	$ 14.033,11	120,00	$ 1.683.975,00		$ -	120,00	$ 1.683.974,88	120,00	$ 1.683.975,00	0,00	$ -
5.2	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	HORA	$ 17.273,01	120,00	$ 1.072.761,00		$ -		$ -	0,00	$ -	120,00	$ 2.072.761,00
5.3	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	HORA	$ 34.043,16	120,00	$ 4.085.179,00		$ -	120,00	$ 4.085.179,20	120,00	$ 4.085.179,00	0,00	$ -
				SUBTOTAL	$ 7.841.915,00	SUBTOTAL	$ -	SUBTOTAL	$ 5.788.154,08	SUBTOTAL	$ 5.788.154,00	SUBTOTAL	$ 2.072.761,00
	6. ITEMS NO PREVISTOS												
NP 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS METALICAS, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE ACABADO 2910x90cm	UNO	$ 906.945,00	1,00	$ 906.945,00	1,00	$ 906.945,00		$ -	1,00	$ 906.945,00	0,00	$ -
NP 2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS METALICAS, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE ACABADO 205 x80 cm	UNO	$ 713.535,00	1,00	$ 713.535,00	1,00	$ 713.535,00		$ -	1,00	$ 713.535,00	0,00	$ -
NP 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS METALICAS, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE ACABADO 205 x80cm	UNO	$ 895.395,00	1,00	$ 895.395,00	1,00	$ 895.395,00		$ -	1,00	$ 895.395,00	0,00	$ -
NP 4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO, INCLUYE MARCO Y CERRADURA 290 x80cm	UNO	$ 240.282,00	1,00	$ 240.282,00	1,00	$ 240.282,00		$ -	1,00	$ 240.282,00	0,00	$ -

MP 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METALICA, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE ACABADO	UND	$	225.169,00	11,00	$	2.476.859,00	10,00	$	2.251.690,00	1,00	$	225.169,00	11,00	$	2.476.859,00	0,00	$	-
MP 6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA 100x100 EN ALUMINIO Y VIDRIO EN 4mm	UND	$	217.217,00	1,00	$	217.217,00	1,00	$	217.217,00		$	-	1,00	$	217.217,00	0,00	$	-
MP 7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU A 220 (INCLUYE RETIRO)	UND	$	4.319.000,00	1,00	$	4.319.000,00	1,00	$	4.319.000,00		$	-	1,00	$	4.319.000,00	0,00	$	-
MP 8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA TIPO GRES DE 30x30cm (INCLUYE CORTE, FIGURADO Y DESMONTE DE BALDOSAS EN MAL ESTADO E INTALACIÓN DE GRANITO)	M2	$	70.859,00	25,00	$	1.771.475,00		$	-		$	-	0,00	$	-	25,00	$	1.771.475,00
MP 9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO No. 8 PERFIL 7	M2	$	64.583,00	6,00	$	387.498,00	6,00	$	387.498,00		$	-	6,00	$	387.498,00	0,00	$	-
MP 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO PARA PLACAS DE CUBIERTAS Y VIGAS DE CANALES	M2	$	48.050,00	140,00	$	6.727.000,00		$	-	120,00	$	5.766.000,00	120,00	$	5.766.000,00	20,00	$	961.000,00
					SUBTOTAL	$	18.655.304,00	SUBTOTAL	$	8.991.580,00	SUBTOTAL	$	5.991.169,00	SUBTOTAL	$	15.972.731,00	SUBTOTAL	$	2.732.475,00
					SUB TOTAL OBRAS	$	368.304.293,00		$	105.068.991,00		$	203.257.059,50		$	308.326.049,00		$	60.978.244,00

SUBTOTAL OBRAS INCLUYE AIU (A:13% - I:1% - U:5%)	$	368.304.293,00		$	105.068.991,00	$	203.257.059,50	$	308.326.049,00	$	60.978.244,00
IVA 19% SOBRE UTILIDAD	$	2.806.712,63		$	798.524,33	$	1.544.753,65	$	2.343.277,97	$	463.434,65
VALOR TOTAL	$	372.111.005,63	28,45%	$	105.867.515,33	$	204.801.813,15	$	310.669.326,98	$	61.441.678,65

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN LA PRESENTE ACTA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, EN VILLAVICENCIO A LOS DOS (2) DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA SUPERVISOR

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

SOPORTE DEL ACTA N° :	2		FECHA DE MEMORIAS:	2/09/2022	
OBJETO:	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADITIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO				
CONTRATO DE OBRA N°:	22001020 H4 DE 2022		INTERVENTOR:	N.A	
CONTRATISTA:	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S		SUPERVISOR:	LUZ MYRIAM SANTIAGO	
ITEM:	1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA PERFIL TRAPEZOIDAL COLOR. NO INCLUYE ESTRUCTURA.	UNIDAD:	M2	

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES

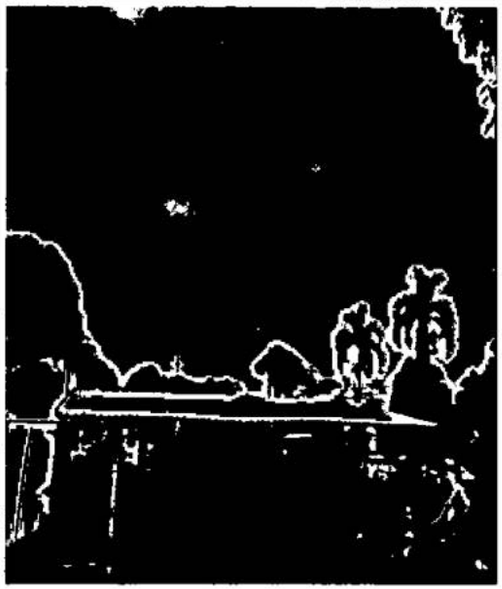

Localizacion			Dimensiones ANCHO	Dimensiones LARGO		Unidad	Total
ARCHIVO			15,17	6,00		91,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
Observaciones			Total			91,00	

		Cantidad Contractual	91,00
Acumulado Anterior	0,00	Cantidad Ejecutada	91,00
Acumulado nuevo	91,00	Cantidad por Ejecutar	0,00

REALIZO

Firma:

Nombre: ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA

Cargo: Residente de Obra

ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

SOPORTE DEL ACTA N° :	2		FECHA DE MEMORIAS:	2/09/2022
OBJETO:	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADTIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO			
CONTRATO DE OBRA N°:	22001020 H4 DE 2022		INTERVENTOR:	N.A
CONTRATISTA:	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S		SUPERVISOR:	LUZ MYRIAM SANTIAGO
ITEM:	1.2	LIMPIEZA DE CUBIERTA	UNIDAD:	M2

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES



Localizacion			Dimensiones ANCHO	Dimensiones LARGO		Unidad	Total
ARCHIVO			10,00	12,00		120,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
Observaciones			Total			120,00	

		Cantidad Contractual	120,00
Acumulado Anterior	0,00	Cantidad Ejecutada	120,00
Acumulado nuevo	120,00	Cantidad por Ejecutar	0,00

REALIZO

Firma:

Nombre: ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA

Cargo: Residente de Obra

ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

SOPORTE DEL ACTA N° :	2		**FECHA DE MEMORIAS:**	2/09/2022	
OBJETO:	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADTIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO				
CONTRATO DE OBRA N°:	22001020 H4 DE 2022		**INTERVENTOR:**	N.A	
CONTRATISTA:	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S		**SUPERVISOR:**	LUZ MYRIAM SANTIAGO	
ITEM:	1.4	DESMONTE DE CANAL Y/O BAJANTE EXISTENTE		**UNIDAD:**	M

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES



Localizacion			**Dimensiones**			**Unidad**	**Total**
			ANCHO	**LARGO**			
ARCHIVO				12,00		12,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
Observaciones			**Total**			12,00	

		Cantidad Contractual	12,00
Acumulado Anterior	0,00	**Cantidad Ejecutada**	12,00
Acumulado nuevo	12,00	**Cantidad por Ejecutar**	0,00

REALIZO

Firma:

Nombre: ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA

Cargo: Residente de Obra

ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

SOPORTE DEL ACTA N° :	2		**FECHA DE MEMORIAS:**	2/09/2022
OBJETO:	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADTIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO			
CONTRATO DE OBRA N°:	22001020 H4 DE 2022		**INTERVENTOR:**	N.A
CONTRATISTA:	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S		**SUPERVISOR:**	LUZ MYRIAM SANTIAGO
ITEM:	1.5	IMPERMEABILIZACION FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 485	**UNIDAD:**	M2

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES



Localizacion			**Dimensiones**			**Unidad**	**Total**
			ALTO	**LARGO**			
ARCHIVO			3,33	11,03		36,74	
			4,33	11,00		47,63	
			4,33	11,00		47,63	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
Observaciones			**Total**			132,00	

		Cantidad Contractual	132,00
Acumulado Anterior	0,00	**Cantidad Ejecutada**	132,00
Acumulado nuevo	132,00	**Cantidad por Ejecutar**	0,00

REALIZO

Firma:

Nombre: **ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA**


Cargo: Residente de Obra

ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

SOPORTE DEL ACTA N° :	2		**FECHA DE MEMORIAS:**	2/09/2022
OBJETO:	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADYIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO			
CONTRATO DE OBRA N°:	22001020 H4 DE 2022		**INTERVENTOR:**	N.A
CONTRATISTA:	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S		**SUPERVISOR:**	LUZ MYRIAM SANTIAGO
ITEM:	1.6	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS, INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y	**UNIDAD:**	M2

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES

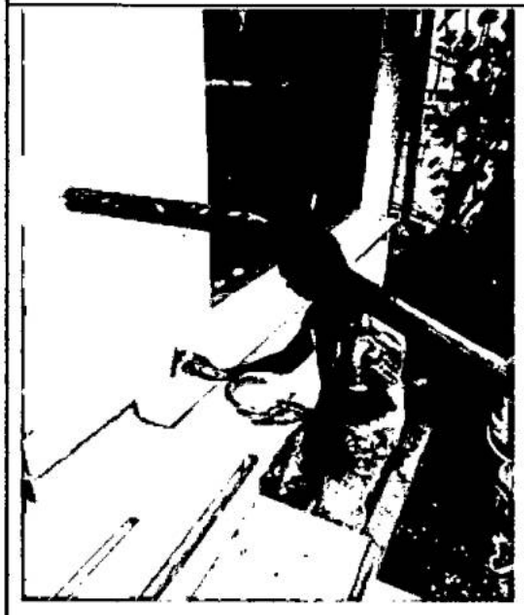

Localizacion			**Dimensiones**			**Unidad**	**Total**
			ALTO	**LARGO**			
ARCHIVO			3,33	11,03		36,74	
			4,33	11,00		47,63	
			4,33	11,00		47,63	
		CUBIERTA	10,0	12,00		120,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
Observaciones			**Total**			252,00	

		Cantidad Contractual	252,00
Acumulado Anterior	0,00	**Cantidad Ejecutada**	252,00
Acumulado nuevo	252,00	**Cantidad por Ejecutar**	0,00

REALIZO

Firma:

Nombre: ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA

Cargo: Residente de Obra

ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

SOPORTE DEL ACTA N° :	2	FECHA DE MEMORIAS:	2/09/2022
OBJETO:	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADITIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATO DE OBRA N°:	22001020 H4 DE 2022	INTERVENTOR:	N.A
CONTRATISTA:	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S	SUPERVISOR:	LUZ MYRIAM SANTIAGO
ITEM:	1.7 CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA, PEDESTALES EN CONCRETO, TUBERIA DE 2" CAL.14 Y LAMINA DE SOPORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA PARA	UNIDAD:	M2

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES



Localizacion			Dimensiones ANCHO	Dimensiones LARGO		Unidad	Total
ARCHIVO			4,00	10,00		40,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
Observaciones				Total		40,00	

		Cantidad Contractual	40,00
Acumulado Anterior	0,00	Cantidad Ejecutada	40,00
Acumulado nuevo	40,00	Cantidad por Ejecutar	0,00

REALIZO

Firma:

Nombre: ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA


Cargo: Residente de Obra

ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

SOPORTE DEL ACTA N° :	2		FECHA DE MEMORIAS:	2/09/2022
OBJETO:	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADTIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVCENCIO.			
CONTRATO DE OBRA N°:	22001020 H4 DE 2022		INTERVENTOR:	N.A
CONTRATISTA:	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S		SUPERVISOR:	LUZ MYRIAM SANTIAGO
ITEM:	1.8	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	UNIDAD:	M2

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES

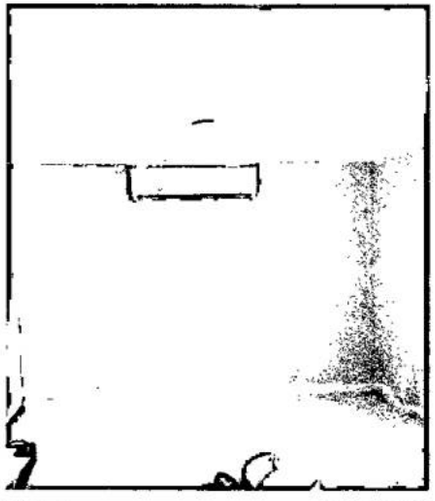

Localizacion			Dimensiones			Unidad	Total
ARCHIVO				ANCHO	LARGO		
				3,33	9,60	31,97	
				4,33	9,00	38,97	
				4,33	11,10	48,06	
Observaciones			Total			119,00	

		Cantidad Contractual	252,00
Acumulado Anterior	133,00	Cantidad Ejecutada	119,00
Acumulado nuevo	252,00	Cantidad por Ejecutar	0,00

REALIZO

Firma:
Nombre: ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA
Cargo: Residente de Obra
ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

SOPORTE DEL ACTA N° :	2		**FECHA DE MEMORIAS:**	2/09/2022
OBJETO:	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADITIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO			
CONTRATO DE OBRA N°:	22001020 H4 DE 2022		**INTERVENTOR:**	NA
CONTRATISTA:	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S		**SUPERVISOR:**	LUZ MYRIAM SANTIAGO
ITEM:	1.9	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILO T. CORAZA INTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS, INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y	**UNIDAD:**	M2

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES



Localizacion			Dimensiones			Unidad	Total
	ANCHO	LARGO	TOTAL	ANCHO	LARGO		
ARCHIVO	4,16	2,24	9,32				
	1,87	2,24	4,19	5,65	2,05	11,58	
	1,87	2,08	3,89	4,85	2,28	11,06	
	5,1	2,00	10,18	5,60	2,05	11,48	
	4,8	2,00	9,50	4,00	2,28	9,12	
	2,8	2,08	5,78	2,20	2,28	5,02	
	2,7	2,00	5,40	5,10	2,08	10,61	
	3,6	2,00	7,24	5,65	2,28	12,88	
	2,4	2,00	4,74	5,10	2,08	10,61	
	5,6	2,05	11,48	4,60	2,28	10,49	
	4,4	1,00	4,40	1,50	2,28	3,42	
	2,6	2,05	5,41	2,50	2,08	5,20	
	2,29	2,05	4,69	2,50	2,08	5,20	
	2,57	2,05	5,27	2,60	2,28	5,93	
	4,40	1,00	4,40	2,61	2,28	6,41	
	3,60	2,25	8,10			0,00	
	5,65	2,28	12,88			0,00	
	4,85	2,28	11,06			0,00	
	2,22	2,28	5,07				
Observaciones			Total			252,00	

		Cantidad Contractual	252,00
Acumulado Anterior		Cantidad Ejecutada	252,00
Acumulado nuevo	252,00	Cantidad por Ejecutar	0,00

REALIZO

Firma:

Nombre: ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA

Cargo: Residente de Obra

ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

SOPORTE DEL ACTA N° :	2		FECHA DE MEMORIAS:	2/09/2022
OBJETO:	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADTIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO			
CONTRATO DE OBRA N°:	22001020 H4 DE 2022		INTERVENTOR:	N.A
CONTRATISTA:	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S		SUPERVISOR:	LUZ MYRIAM SANTIAGO
ITEM:	1.10	LIMPIEZA GENERAL	UNIDAD:	M2

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES



Localizacion			Dimensiones			Unidad	Total
ARCHIVO				ANCHO	LARGO		
				10,00	12	120,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
Observaciones			Total			120,00	

		Cantidad Contractual	120,00
Acumulado Anterior		Cantidad Ejecutada	120,00
Acumulado nuevo	120,00	Cantidad por Ejecutar	0,00

REALIZO

Firma:

Nombre: ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA


Cargo: Residente de Obra

ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

SOPORTE DEL ACTA N° :	2		FECHA DE MEMORIAS:	2/09/2022
OBJETO:	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADTIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO			
CONTRATO DE OBRA N°:	22001020 H4 DE 2022		INTERVENTOR:	N.A
CONTRATISTA:	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S		SUPERVISOR:	LUZ MYRIAM SANTIAGO
ITEM:	1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA FIBROCEMENTO PT N°6 Y REPARACION DE ESTRUCTURA DEFECTUOSA (INCLUYE RETIRO A BOTADERO DE TEJAS Y ESTRUCTURA EN MAL ESTADO)	UNIDAD:	M2

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES

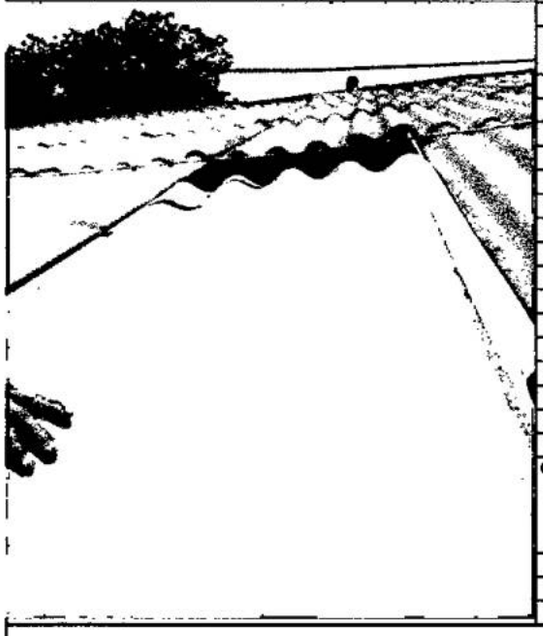

Localizacion			Dimensiones			Unidad	Total
ARCHIVO				ANCHO	LARGO		
				1,00	1,83	1,83	
				1,00	1,83	1,83	
				1,00	1,83	1,83	
				1,00	1,83	1,83	
				1,00	1,83	1,83	
				1,00	1,83	1,83	
				1,00	1,83	1,83	
				1,00	1,83	1,83	
				1,00	1,83	1,83	
				1,00	1,83	1,83	
				1,00	1,7	1,70	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
Observaciones			Total			20,00	

		Cantidad Contractual	20,00
Acumulado Anterior		Cantidad Ejecutada	20,00
Acumulado nuevo	20,00	Cantidad por Ejecutar	0,00

REALIZO

Firma:
Nombre: ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA
Cargo: Residente de Obra
ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

SOPORTE DEL ACTA N° :	2		**FECHA DE MEMORIAS:**	2/09/2022
OBJETO:	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADTIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVCENCIO.			
CONTRATO DE OBRA N°:	22001020 H4 DE 2022		**INTERVENTOR:**	N.A
CONTRATISTA:	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S		**SUPERVISOR:**	LUZ MYRIAM SANTIAGO
ITEM:	2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO NUEVO EN MALLA ESLABONADA DE 2 X 2 CALIBRE 10 RECUBIERTA EN PVC, TIPO BEZINAL, TUBO 2" GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS SEGÚN ESPECIFICACIÓN	**UNIDAD:**	M

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES



Localizacion			**Dimensiones**			**Unidad**	**Total**
			ANCHO	**LARGO**			
CASA FISCAL				200,00		200,00	
Observaciones				**Total**		200,00	

		Cantidad Contractual	488,00
Acumulado Anterior	160,00	**Cantidad Ejecutada**	200,00
Acumulado nuevo	360,00	**Cantidad por Ejecutar**	128,00

REALIZO

Firma:

Nombre: **ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA**

Cargo: Residente de Obra

ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

SOPORTE DEL ACTA N° :	2		**FECHA DE MEMORIAS:**	2/09/2022
OBJETO:	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADITIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO			
CONTRATO DE OBRA N°:	22001020 H4 DE 2022		**INTERVENTOR:**	N.A
CONTRATISTA:	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S		**SUPERVISOR:**	LUZ MYRIAM SANTIAGO
ITEM:	2.2	DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE	**UNIDAD:**	M

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES



Localizacion			**Dimensiones**			**Unidad**	**Total**
			ANCHO	**LARGO**			
CASA FISCAL				300,00		300,00	
Observaciones				**Total**		300,00	

		Cantidad Contractual	800,00
Acumulado Anterior	200,00	**Cantidad Ejecutada**	300,00
Acumulado nuevo	500,00	**Cantidad por Ejecutar**	300,00

REALIZO

Firma:

Nombre: **ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA**

Cargo: Residente de Obra

ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

SOPORTE DEL ACTA N° :	2		**FECHA DE MEMORIAS:**	2/09/2022
OBJETO:	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADTIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO			
CONTRATO DE OBRA N°:	22001020 H4 DE 2022		**INTERVENTOR:**	N.A
CONTRATISTA:	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S		**SUPERVISOR:**	LUZ MYRIAM SANTIAGO
ITEM:	2.3	MORTERO PARA FIJACIÓN DE MALLA ESLABONADA 1:4, incluye suministro y colocación	**UNIDAD:**	M



Localizacion			**Dimensiones** ANCHO	LARGO		**Unidad**	**Total**
CASA FISCAL				360,00		360,00	
Observaciones				**Total**		360,00	

		Cantidad Contractual	800,00
Acumulado Anterior		**Cantidad Ejecutada**	360,00
Acumulado nuevo	360,00	**Cantidad por Ejecutar**	440,00

REALIZO

Firma:

Nombre: **ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA**

Cargo: Residente de Obra

ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

137

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

SOPORTE DEL ACTA N° :	2		**FECHA DE MEMORIAS:**	2/09/2022
OBJETO:	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADITIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO			
CONTRATO DE OBRA N°:	22001020 H4 DE 2022		**INTERVENTOR:**	N.A
CONTRATISTA:	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S		**SUPERVISOR:**	LUZ MYRIAM SANTIAGO
ITEM:	3.4	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS. INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y	**UNIDAD:**	M2

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES



Localizacion			**Dimensiones**			**Unidad**	**Total**
			ANCHO	**ALTO**			
IDEAM			1,0	3,87		3,87	
			9,0	3,87		34,83	
			4,7	3,00		13,95	
			4,1	3,00		12,15	
			4,1	3,00		12,15	
			4,1	3,00		12,15	
			4,1	3,00		12,15	
			4,6	3,0		13,65	
			4,6	3,0		13,65	
			4,6	3,0		13,65	
			2,6	3,0		7,80	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
Observaciones			**Total**			150,00	

		Cantidad Contractual	150,00
Acumulado Anterior		**Cantidad Ejecutada**	150,00
Acumulado nuevo	150,00	**Cantidad por Ejecutar**	0,00

REALIZO

Firma:

Nombre: **ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA**

Cargo: Residente de Obra

ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

SOPORTE DEL ACTA N° :	2		**FECHA DE MEMORIAS:**	2/09/2022
OBJETO:	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADITIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO			
CONTRATO DE OBRA N°:	22001020 H4 DE 2022		**INTERVENTOR:**	N.A
CONTRATISTA:	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S		**SUPERVISOR:**	LUZ MYRIAM SANTIAGO
ITEM:	3.5	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILO T1, CORAZA INTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS, INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y	**UNIDAD:**	M2

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES



Localizacion	ANCHO	ALTO	Dimensiones TOTAL	Dimensiones ANCHO	Dimensiones ALTO	Unidad	Total
IDEAM	9,7	2,8	26,5	3,30	2,8	9,08	
	2,5	2,8	7,0	3,30	2,8	9,08	
	2,6	2,8	7,0	2,00	2,8	5,50	
	1,8	2,8	4,8	2,00	2,8	5,50	
	3,0	2,8	8,1	2,00	2,8	5,50	
	3,9	2,8	10,8	2,33	2,8	6,41	
	3,9	2,8	10,8	3,33	2,8	9,16	
	3,0	2,8	8,3	3,3	2,8	9,16	
	1,5	2,8	4,1	16,0	1,5	24,00	
	2,8	2,8	7,8	4,0	1,5	6,00	
	3,4	2,8	9,4	4,0	1,2	4,80	
	2,3	2,8	6,3	5,3	2,93	15,38	
	3,5	2,8	9,7	5,3	3	15,75	
	3,5	2,8	9,7	3,6	3	10,89	
	2,9	3,8	11,2	5,3	3	15,75	
	2,9	3,8	11,2	3,6	3	10,89	
	4,9	3,8	18,5	5,25	3	15,75	
	4,9	3,8	18,5	3,63	3	10,89	
	2,0	1,5	3,0	9,65	6,3	60,80	
	1,0	4,0	4,0	2,19	1	2,19	
Observaciones			**Total**			449,16	

		Cantidad Contractual	449,16
Acumulado Anterior		**Cantidad Ejecutada**	449,16
Acumulado nuevo	449,16	**Cantidad por Ejecutar**	0,00

REALIZO

Firma:

Nombre: **ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA**

Cargo: Residente de Obra

ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

SOPORTE DEL ACTA N° :	2		**FECHA DE MEMORIAS:**	2/09/2022
OBJETO:	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADITIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO			
CONTRATO DE OBRA N°:	22001020 H4 DE 2022		**INTERVENTOR:**	N.A
CONTRATISTA:	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S		**SUPERVISOR:**	LUZ MYRIAM SANTIAGO
ITEM:	3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 6 MM INC PINTURA	**UNIDAD:**	M2

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES



Localizacion			**Dimensiones**			**Unidad**	**Total**
			ANCHO	**LARGO**			
IDEAM			1,6	4,00		6,50	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
Observaciones			**Total**			6,50	

		Cantidad Contractual	6,50
Acumulado Anterior		**Cantidad Ejecutada**	6,50
Acumulado nuevo	6,50	**Cantidad por Ejecutar**	0,00

REALIZO

Firma:

Nombre: **ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA**

Cargo: Residente de Obra

ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

372

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

SOPORTE DEL ACTA N° :	2		FECHA DE MEMORIAS:	2/09/2022
OBJETO:	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADITIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO			
CONTRATO DE OBRA N°:	22001020 H4 DE 2022		INTERVENTOR:	N.A
CONTRATISTA:	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S		SUPERVISOR:	LUZ MYRIAM SANTIAGO
ITEM:	4.1	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	UNIDAD:	M2

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES



Localizacion	Dimensiones ANCHO	ALTO	TOTAL	ANCHO	LARGO	Unidad	Total
AREA ADMINISTRATIVA	20,0	1,0	20,0	ANCHO	LARGO		
	16,7	1,0	16,7	1,67	3	5,01	
	5,7	1,0	5,7	3,60	2,55	9,18	
	20,0	1,0	20,0	2,11	2,55	5,38	
	2,6	1,0	2,6	4,44	2,55	11,32	
	3,0	2,1	6,4	2,59	2,55	6,60	
	3,0	2,1	6,4	3,63	2,55	9,26	
	2,8	2,1	5,9	2,9	2,55	7,37	
	2,8	2,1	5,9	2,6	2,55	6,60	
	6,4	3,0	19,1	3,7	2,55	9,31	
	5,4	3,0	16,3	2,9	2,55	7,37	
	3,2	3,0	9,5	3,0	2,55	7,65	
	1,2	3,0	3,6	3,0	2,55	7,65	
	3,1	3,0	9,2	4,5	2,55	11,48	
	2,8	3,0	8,5	4,0	2,55	10,20	
	1,2	3,0	3,5	2,4	2,55	8,42	
	3,6	3,0	10,8	0,8	2,55	9,11	
	1,3	3,0	4,0			0,00	
	2,7	3,0	8,2			0,00	
	3,7	3,0	11,0			0,00	
Observaciones			Total			325,00	

		Cantidad Contractual	325,00
Acumulado Anterior		Cantidad Ejecutada	325,00
Acumulado nuevo	325,00	Cantidad por Ejecutar	0,00

REALIZO

Firma:

Nombre: ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA

Cargo: Residente de Obra


ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

223

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

SOPORTE DEL ACTA N° :	2		**FECHA DE MEMORIAS:**	2/09/2022
OBJETO:	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADITIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO			
CONTRATO DE OBRA N°:	22001020 H4 DE 2022		**INTERVENTOR:**	N.A
CONTRATISTA:	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S		**SUPERVISOR:**	LUZ MYRIAM SANTIAGO
ITEM:	2.4	ALAMBRE DE PÚA CALIBRE 12,5 incluye suministro y colocación	**UNIDAD:**	M

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES

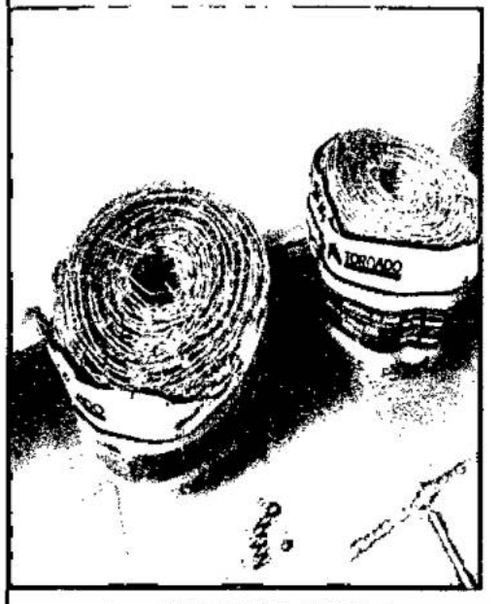

Localizacion			**Dimensiones**			**Unidad**	**Total**
			ANCHO	**LARGO**			
CASA FISCAL				1080,00		1.080,00	
Observaciones			**Total**			1.080,00	

Acumulado Anterior		**Cantidad Contractual**	800,00
Acumulado nuevo	1.080,00	**Cantidad Ejecutada**	1.080,00
		Cantidad por Ejecutar	-280,00

REALIZO

Firma:

Nombre: **ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA**

Cargo: Residente de Obra

ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

SOPORTE DEL ACTA N° :	2		**FECHA DE MEMORIAS:**	2/09/2022
OBJETO:	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADITIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO			
CONTRATO DE OBRA N°:	22001020 H4 DE 2022		**INTERVENTOR:**	N.A
CONTRATISTA:	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S		**SUPERVISOR:**	LUZ MYRIAM SANTIAGO
ITEM:	2.5	IMPERMEABILIZACION FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 485	**UNIDAD:**	M2

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES



Localizacion			**Dimensiones**			**Unidad**	**Total**
			ANCHO	**LARGO**			
CASA FISCAL			10,7	3,20		34,21	
			13,0	3,50		45,50	
			1,8	2,60		4,68	
			2,0	3,30		6,60	
			2,0	3,30		6,60	
			3,5	2,60		9,10	
			2,0	0,60		1,20	
			4,0	4,2		16,80	
			2,3	4,2		9,83	
			1,5	2,9		4,35	
			2,7	2,8		7,48	
			4,7	2,4		11,28	
			13,5	4,5		60,75	
			4,4	1,8		7,92	
			2,3	3,2		7,36	
			3,7	2,9		10,73	
			4	1,73		7,61	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
Observaciones			**Total**			252,00	

		Cantidad Contractual	252,00
Acumulado Anterior		**Cantidad Ejecutada**	252,00
Acumulado nuevo	252,00	**Cantidad por Ejecutar**	0,00

REALIZO

Firma:

Nombre: **ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA**

Cargo: Residente de Obra


ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

325

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

SOPORTE DEL ACTA N° :	2		**FECHA DE MEMORIAS:**	2/09/2022
OBJETO:	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADITIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO			
CONTRATO DE OBRA N°:	22001020 H4 DE 2022		**INTERVENTOR:**	N.A
CONTRATISTA:	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S		**SUPERVISOR:**	LUZ MYRIAM SANTIAGO
ITEM:	2.14	ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ASTM-500 GRADO C (INCLUYE SUMINISTRO - FABRICACION - PINTURA - MONTAJE) PARA COLUMNAS 100x100x3mm - ACCESO A CASA Y - ESTRUCTURA METALICA	**UNIDAD:**	kg

FOTOS O PLANO DE LOCALIZACION DE LAS ACTIVIDADES

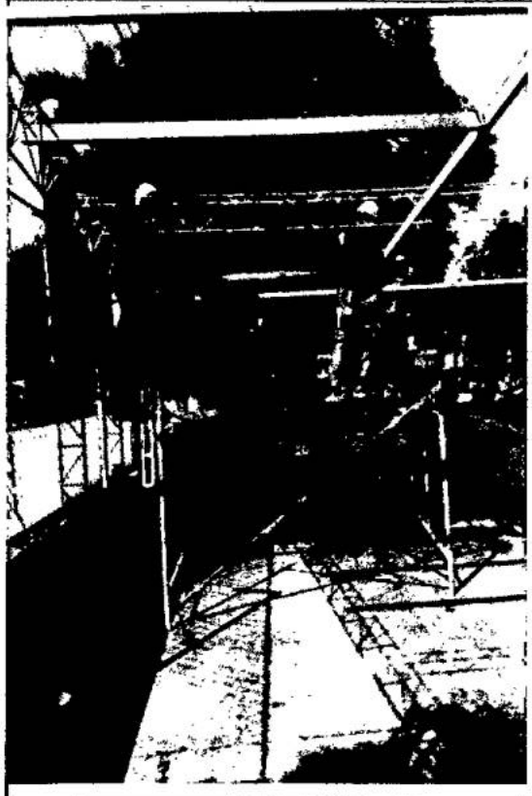

Localizacion							**Total**
CASA FISCAL							
	vigas						
	material	**peso Kg**	**cantidad**	**cantidad**			
	tuberia rectangular de 3mm de espesor galvanizado	82,02	6,8	559,34			
	Platinas						
	material	**peso**	**cantidad**	**cantidad**			
	LAMINA DE ACERO 4'	59,72	1,0	60,00			
	correas						
	material	**peso KG**	**cantidad**	**cantidad**			
	tuberia rectangular de 3mm de espesor galvanizado	82,02	1,6	132,00			
Observaciones			**Total**				

		Cantidad Contractual	0,00
Acumulado Anterior	0,00	**Cantidad Ejecutada**	0,00
Acumulado nuevo	0,00	**Cantidad por Ejecutar**	0,00

REALIZO

Firma:

Nombre: ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA

Cargo: Residente de Obra

ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

326

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

SOPORTE DEL ACTA N° :	2		**FECHA DE MEMORIAS:**	2/09/2022
OBJETO:	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADTIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO			
CONTRATO DE OBRA N°:	22001020 H4 DE 2022		**INTERVENTOR:**	N.A
CONTRATISTA:	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S		**SUPERVISOR:**	LUZ MYRIAM SANTIAGO
ITEM:	3.1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	**UNIDAD:**	M2

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES



Localizacion			**Dimensiones**			**Unidad**	**Total**
			ANCHO	**ALTO**			
IDEAM			1,0	3,87		3,87	
			9,0	3,87		34,83	
			4,7	3,00		13,95	
			4,1	3,00		12,15	
			4,1	3,00		12,15	
			4,1	3,00		12,15	
			4,1	3,00		12,15	
			4,6	3,0		13,65	
			4,6	3,0		13,65	
			4,6	3,0		13,65	
			2,6	3,0		7,80	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
Observaciones			**Total**			150,00	

		Cantidad Contractual	150,00
Acumulado Anterior		**Cantidad Ejecutada**	150,00
Acumulado nuevo	150,00	**Cantidad por Ejecutar**	0,00

REALIZO

Firma:

Nombre: **ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA**

Cargo: Residente de Obra

ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

525

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA N° :	2	FECHA DE MEMORIAS:	2/09/2022
OBJETO:	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADITIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATO DE OBRA N°:	22001020 H4 DE 2022	INTERVENTOR:	N.A
CONTRATISTA:	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S	SUPERVISOR:	LUZ MYRIAM SANTIAGO
ITEM:	3.2 LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	UNIDAD:	M2

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES



Localizacion			Dimensiones ANCHO	Dimensiones LARGO		Unidad	Total
IDEAM			6,8	6,60		44,60	
			6,0	3,00		18,00	
			7,4	1,00		7,40	
			7,4	1,00		7,40	
			5,8	1,00		5,80	
			5,8	1,00		5,80	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
Observaciones			Total			89,00	

		Cantidad Contractual	89,00
Acumulado Anterior		Cantidad Ejecutada	89,00
Acumulado nuevo	89,00	Cantidad por Ejecutar	0,00

REALIZO

Firma:

Nombre: ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA

Cargo: Residente de Obra

ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

228

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

SOPORTE DEL ACTA N° :	2		**FECHA DE MEMORIAS:**	2/09/2022	
OBJETO:	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO				
CONTRATO DE OBRA N°:	22001020 H4 DE 2022		**INTERVENTOR:**	N.A	
CONTRATISTA:	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S		**SUPERVISOR:**	LUZ MYRIAM SANTIAGO	
ITEM:	3.3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)		**UNIDAD:**	M2

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES



Localizacion			**Dimensiones**			**Unidad**	**Total**
			ANCHO	**ALTO**			
IDEAM			1,0	3,87		3,87	
			9,0	3,87		34,83	
			4,7	3,00		13,95	
			4,1	3,00		12,15	
			4,1	3,00		12,15	
			4,1	3,00		12,15	
			4,1	3,00		12,15	
			4,6	3,0		13,65	
			4,6	3,0		13,65	
			4,6	3,0		13,65	
			2,6	3,0		7,80	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
Observaciones			**Total**			150,00	

		Cantidad Contractual	150,00
Acumulado Anterior		**Cantidad Ejecutada**	150,00
Acumulado nuevo	150,00	**Cantidad por Ejecutar**	0,00

REALIZO

Firma:

Nombre: ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA

Cargo: Residente de Obra

ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

SOPORTE DEL ACTA N° :	2		**FECHA DE MEMORIAS:**	2/09/2022
OBJETO:	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADITIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO			
CONTRATO DE OBRA N°:	22001020 H4 DE 2022		**INTERVENTOR:**	N.A
CONTRATISTA:	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S		**SUPERVISOR:**	LUZ MYRIAM SANTIAGO
ITEM:	4.2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS, INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y	**UNIDAD:**	M2

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES



Localizacion			**Dimensiones**			**Unidad**	**Total**
AREA ADMINISTRATIVA				**ANCHO**	**LARGO**		
				20,0	1,0	20,00	
				16,7	1,0	16,74	
				5,7	1,0	5,65	
				20,0	1,0	20,00	
				2,6	1,0	2,58	
				3,0	2,1	6,38	
				3,0	2,1	6,38	
				2,8	2,1	5,88	
				2,8	2,1	5,88	
				2,0	4,2	8,40	
				4,9	4,2	20,62	
				5,3	4,2	22,34	
				1,4	4,2	5,88	
				2,0	4,2	8,57	
				2,6	4,2	10,84	
				2,3	4,2	9,45	
Observaciones			**Total**			175,60	

		Cantidad Contractual	294,17
Acumulado Anterior		**Cantidad Ejecutada**	175,60
Acumulado nuevo	175,60	**Cantidad por Ejecutar**	118,57

REALIZO

Firma:

Nombre: **ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA**

Cargo: Residente de Obra


ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

330

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

SOPORTE DEL ACTA N° :	2		**FECHA DE MEMORIAS:**	2/09/2022
OBJETO:	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADYIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO			
CONTRATO DE OBRA N°:	22001020 H4 DE 2022		**INTERVENTOR:**	N.A
CONTRATISTA:	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S		**SUPERVISOR:**	LUZ MYRIAM SANTIAGO
ITEM:	4.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILO T. CORAZA INTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS, INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y	**UNIDAD:**	M2

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES

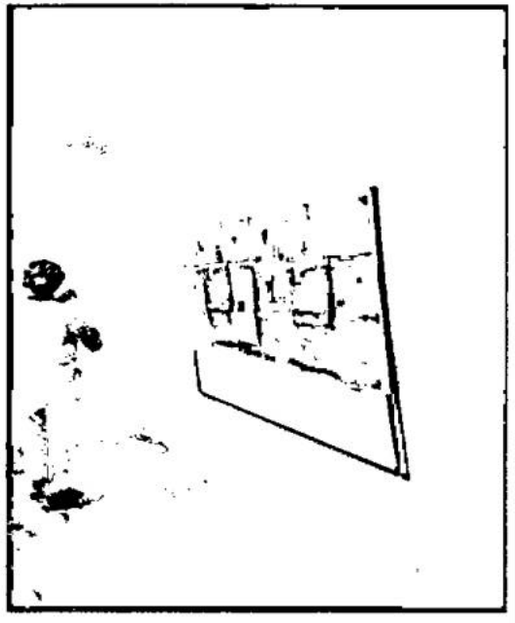

Localizacion	LARGO	ALTO	Dimensiones TOTAL	LARGO	ALTO	Unidad	Total
AREA ADMINISTRATIVA	4,5	2,6	11,5	LARGO	ALTO		
	1,5	2,6	3,8	3,7	3,0	11,10	
	1,5	2,6	3,8	1,2	3,0	3,63	
	4,1	2,6	10,4	3,1	3,0	9,15	
	2,0	2,6	5,1	3,8	3,0	11,49	
	4,0	2,6	10,2	1,9	3,0	5,70	
	2,7	2,6	6,9	3,6	3,0	10,83	
	3,6	2,6	9,2	1,8	3,0	5,40	
	2,1	2,6	5,4	2,7	3,0	8,16	
	4,4	2,6	11,3	3,1	3,0	9,15	
	3,0	2,6	7,7	1,7	3	5,01	
	3,6	2,6	9,3	11,6	4	46,24	
	2,9	2,6	7,4	11,6	4	46,24	
	2,6	2,6	6,6	7,0	4	28,00	
	3,7	2,6	9,3	7,0	4	28,00	
	2,9	2,6	7,4			0,00	
	3,0	2,6	7,7			0,00	
	3,0	2,6	7,7				
	6,4	3,0	19,1				
	5,4	3,0	16,3				
Observaciones			Total			404,00	

		Cantidad Contractual	404,00
Acumulado Anterior		Cantidad Ejecutada	404,00
Acumulado nuevo	404,00	Cantidad por Ejecutar	0,00

REALIZO

Firma:

Nombre: ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA


Cargo: Residente de Obra

ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

SOPORTE DEL ACTA N° :	2		**FECHA DE MEMORIAS:**	2/09/2022	
OBJETO:	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADITIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO				
CONTRATO DE OBRA N°:	22001020 H4 DE 2022		**INTERVENTOR:**	N.A	
CONTRATISTA:	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S		**SUPERVISOR:**	LUZ MYRIAM SANTIAGO	
ITEM:	4.4	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES		**UNIDAD:**	M

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES

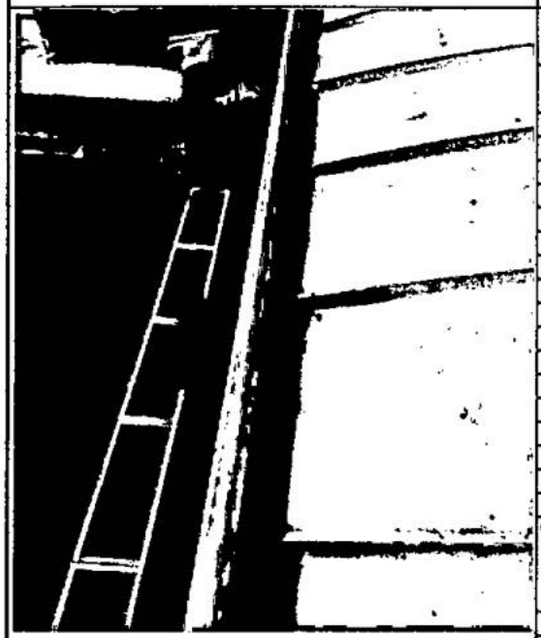

Localizacion			**Dimensiones**			**Unidad**	**Total**
			ANCHO	**LARGO**			
AREA ADMINISTRATIVA				200,00		200,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
Observaciones			**Total**			200,00	

		Cantidad Contractual	200,00
Acumulado Anterior		**Cantidad Ejecutada**	200,00
Acumulado nuevo	200,00	**Cantidad por Ejecutar**	0,00

REALIZO

Firma:


Nombre: ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA

Cargo: Residente de Obra

ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

SOPORTE DEL ACTA N° :	2	**FECHA DE MEMORIAS:**	2/09/2022
OBJETO:	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADTIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATO DE OBRA N°:	22001020 H4 DE 2022	**INTERVENTOR:**	N.A
CONTRATISTA:	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S	**SUPERVISOR:**	LUZ MYRIAM SANTIAGO
ITEM:	4.5 DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	**UNIDAD:**	M2

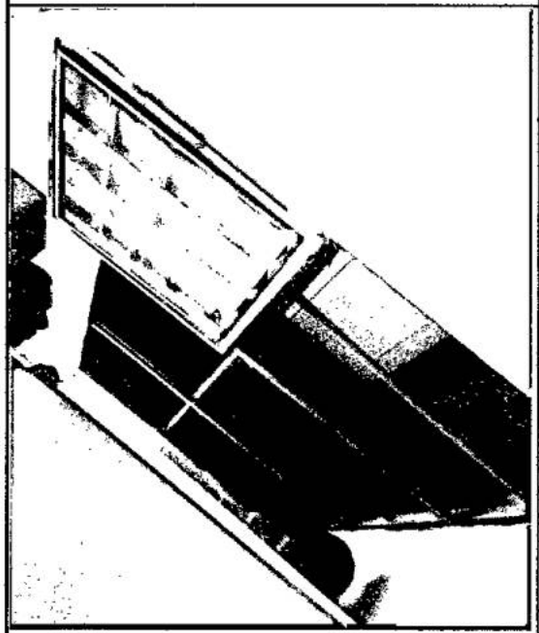FOTOS DE LAS ACTIVIDADES	**Localizacion**			**Dimensiones**			**Unidad**	**Total**
				ANCHO	**LARGO**			
	AREA ADMINISTRATIVA			3,2	3,57		11,39	
				3,2	3,57		11,39	
				1,6	4,50		7,22	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
	Observaciones			**Total**			30,00	

		Cantidad Contractual	30,00
Acumulado Anterior		**Cantidad Ejecutada**	30,00
Acumulado nuevo	30,00	**Cantidad por Ejecutar**	0,00

REALIZO

Firma:

Nombre: **ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA**

Cargo: Residente de Obra

ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

SOPORTE DEL ACTA N° :	2		**FECHA DE MEMORIAS:**	2/09/2022
OBJETO:	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCANO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADITIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO			
CONTRATO DE OBRA N°:	22001020 H4 DE 2022		**INTERVENTOR:**	N.A
CONTRATISTA:	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S		**SUPERVISOR:**	LUZ MYRIAM SANTIAGO
ITEM:	4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 6 MM INC PINTURA	**UNIDAD:**	M2

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES



Localizacion			**Dimensiones**			**Unidad**	**Total**
			ANCHO	**LARGO**			
AREA ADMINISTRATIVA			3,2	3,57		11,39	
			3,2	3,57		11,39	
			1,6	4,50		7,22	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
Observaciones			**Total**			30,00	

		Cantidad Contractual	30,00
Acumulado Anterior		**Cantidad Ejecutada**	30,00
Acumulado nuevo	30,00	**Cantidad por Ejecutar**	0,00

REALIZO

Firma:

Nombre: **ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA**

Cargo: Residente de Obra

ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

234

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

SOPORTE DEL ACTA N° :	2		FECHA DE MEMORIAS:	2/09/2022
OBJETO:	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADITVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO			
CONTRATO DE OBRA N°:	22001020 H4 DE 2022		INTERVENTOR:	N.A
CONTRATISTA:	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S		SUPERVISOR:	LUZ MYRIAM SANTIAGO
ITEM:	5.1	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES ELECTRICAS	UNIDAD:	HORAS

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES	Localizacion			Dimensiones			Unidad	Total
						HORAS		
	IDEAM, ARCHIVO, AREA ADMINISTRATIVA.					120	120,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
	Observaciones			Total			120,00	

		Cantidad Contractual	120,00
Acumulado Anterior		Cantidad Ejecutada	120,00
Acumulado nuevo	120,00	Cantidad por Ejecutar	0,00

REALIZO

Firma:

Nombre: ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA


Cargo: Residente de Obra

ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

SOPORTE DEL ACTA N° :	2		**FECHA DE MEMORIAS:**	2/09/2022
OBJETO:	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADITIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO			
CONTRATO DE OBRA N°:	22001020 H4 DE 2022		**INTERVENTOR:**	N.A
CONTRATISTA:	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S		**SUPERVISOR:**	LUZ MYRIAM SANTIAGO
ITEM:	5.3	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	**UNIDAD:**	HORAS

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES

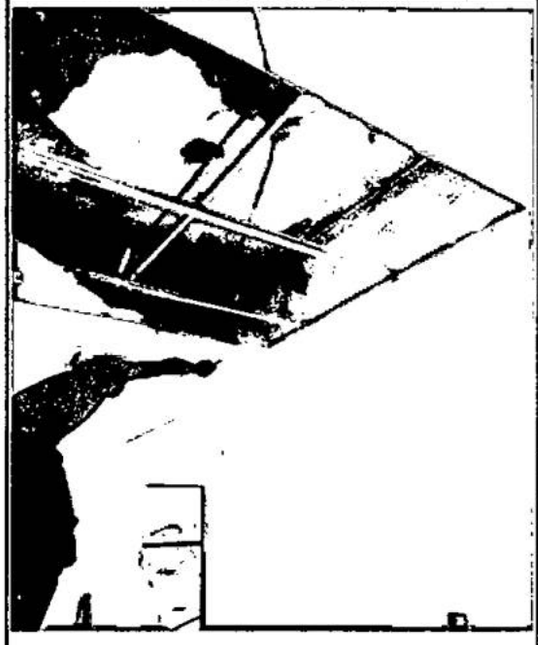

Localizacion			**Dimensiones**			**Unidad**	**Total**
					HORAS		
IDEAM, ARCHIVO, AREA ADMINISTRATIVA.					120	120,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
Observaciones			**Total**			120,00	

		Cantidad Contractual	120,00
Acumulado Anterior		**Cantidad Ejecutada**	120,00
Acumulado nuevo	120,00	**Cantidad por Ejecutar**	0,00

REALIZO

Firma:

Nombre: ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA


Cargo: Residente de Obra

ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

SOPORTE DEL ACTA N° :	2		**FECHA DE MEMORIAS:**	2/09/2022
OBJETO:	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADITIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO			
CONTRATO DE OBRA N°:	22001020 H4 DE 2022		**INTERVENTOR:**	N.A
CONTRATISTA:	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S		**SUPERVISOR:**	LUZ MYRIAM SANTIAGO
ITEM:	NP5	Suministro e instalación de reja en estilo banco, con pintura anticorrosiva	**UNIDAD:**	UND

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES

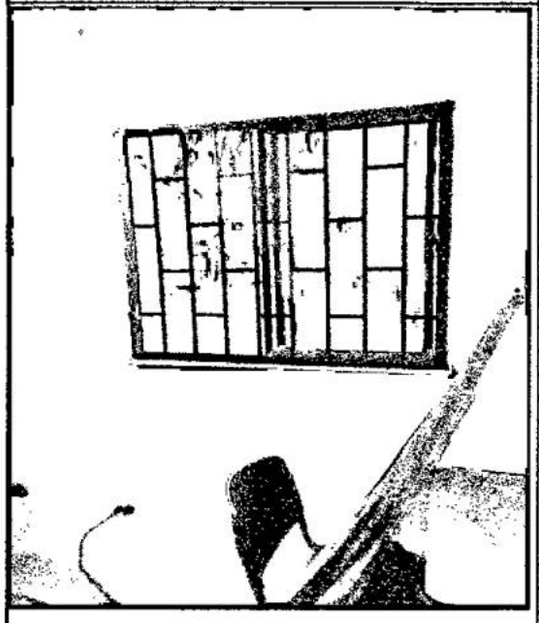

Localizacion			**Dimensiones**			**Unidad**	**Total**
			ANCHO	**LARGO**			
CASA FISCAL						1,00	
Observaciones			**Total**			1,00	

		Cantidad Contractual	11,00
Acumulado Anterior	10,00	**Cantidad Ejecutada**	1,00
Acumulado nuevo	11,00	**Cantidad por Ejecutar**	0,00

REALIZO

Firma:

Nombre: **ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA**


Cargo: Residente de Obra

ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

SOPORTE DEL ACTA N° :	2		**FECHA DE MEMORIAS:**	2/09/2022
OBJETO:	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADITVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO			
CONTRATO DE OBRA N°:	22001020 H4 DE 2022		**INTERVENTOR:**	N.A
CONTRATISTA:	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S		**SUPERVISOR:**	LUZ MYRIAM SANTIAGO
ITEM:	NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO PARA PLACAS DE CUBIERTAS Y VIGAS DE CANALES	**UNIDAD:**	UND

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES

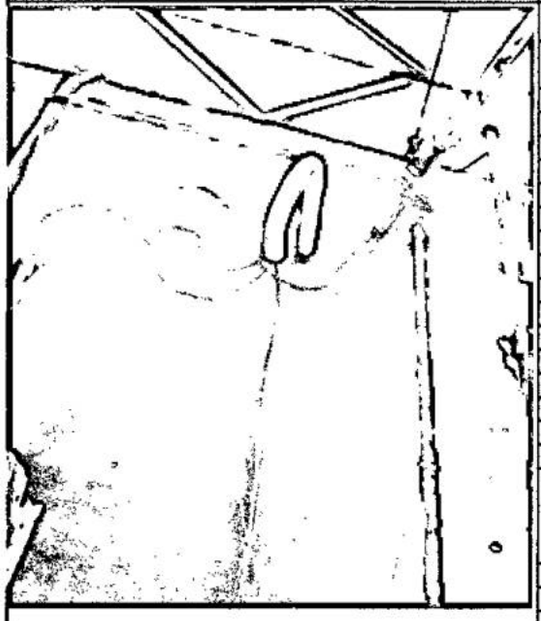

Localizacion			**Dimensiones**			**Unidad**	**Total**
			ANCHO	**LARGO**			
CASA FISCAL			6,3	6,60		41,58	
			6,0	3,00		18,00	
			7,4	1,00		7,40	
			7,4	1,00		7,40	
			5,8	1,00		5,80	
			5,8	1,00		5,80	
			5	1,50		7,50	
			7	2,00		14,00	
			2	2,50		5,00	
			4	2,00		7,52	
Observaciones			**Total**			120,00	

		Cantidad Contractual	140,00
Acumulado Anterior		**Cantidad Ejecutada**	120,00
Acumulado nuevo	120,00	**Cantidad por Ejecutar**	20,00

REALIZO

Firma:

Nombre: **ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA**

Cargo: Residente de Obra

ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 1605.092	**Clave: GCON-1.0-12-046**	**Versión: 02**	**Fecha: 04/oct/2019**	**Página: 1 de 28**

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	**22001020 H4 DE 2022**
Nombre del Contratista:	**ICONS – INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S**
Periodo informe:	**DEL 03 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE 2022**
Nombre de Supervisor:	**LUZ MYRIAM SANTIAGO RODRIGUEZ**
Nombre del Interventor:	**N/A**
Área perteneciente:	**AEROPUERTO VANGUARDIA-VILLAVICENCIO**

2. OBJETO DEL CONTRATO

MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADTIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVCENCIO.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

ITEM	FECHA	DETALLES
CASA FISCAL		
1	29/08	DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE.
2	27/08	INSTALACIÓN DE 200 DE MALLA ESLABONADA.
3	15/08	ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ASTM-500 GRADO C (INCLUYE SUMINISTRO - FABRICACION - PINTURA - MONTAJE) PARA VIGAS DE CUBIERTA 120x60x2,5mm
4	15/08	ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ASTM-500 GRADO C (INCLUYE SUMINISTRO - FABRICACION - PINTURA - MONTAJE) PARA CORREAS 60x40x2mm
5	15/08	PLATINERIA PARA CONEXIÓN DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO
6	2/08	Suministro e instalación de reja en estilo banco, con pintura anticorrosiva
7	22/08	MORTERO PARA FIJACIÓN DE MALLA ESLABONADA 1:4, incluye suministro y colocación MORTERO PARA FIJACIÓN DE MALLA ESLABONADA 1:4, incluye suministro y colocación
8		ALAMBRE DE PÚA CALIBRE 12,5 incluye suministro y colocación ALAMBRE DE PÚA CALIBRE 12,5 incluye suministro y colocación
AREA DE ARCHIVO		
1	6/08	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)
2	16/08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA PERFIL TRAPEZOIDAL COLOR. NO INCLUYE ESTRUCTURA. LIMPIEZA DE CUBIERTA
4	28/08	DESMONTE DE CANAL Y/O BAJANTE EXISTENTE
5	08/08	IMPERMEABILIZACION FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 485

6	13/08	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS. INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES
7	25/08	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA. PEDESTALES EN COCRETO, TUBERIA DE 2" CAL.14 Y LAMINA DE SOPORTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA PARA TUBERIA. INCLUYE PUERTA 2M DE LONGITUD
8	09/08	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO T. CORAZA INTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS. INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES
9	29/08	LIMPIEZA GENERAL
10	23/08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO P7 N°6 Y REPARACION DE ESTRUCTURA DEFECTUOSA (INCLUYE RETIRO A BOTADERO DE TEJAS Y ESTRUCTURA EN MAL ESTADO)
IDEAM		
1	03/08	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS
2	03/08	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA
3	05/08	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)
4	19/08	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS. INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES
5	10/08	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO T. CORAZA INTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS. INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES
AREA ADMINISTRATIVA		
1	25/08	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)
2	12/08	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS. INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES
3	27/08	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO T. CORAZA INTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS. INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES
4	29/08	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES
5	26/08	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.
6	27/08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 6 MM INC PINTURA

3.1.1 Actividades:

- Se procede a realizar el desmonte del cerramiento ubicado en los predios de la casa fiscal, se hizo el desmonte de postes en concreto y también los 4 hilos de alambre de púas que se encontraron.
- Se realizaron actividades pertinentes para hacer la instalación de 200m de malla eslabonada, incluyendo la tubería, ángulos y platinas correspondientes para su correcto funcionamiento.
- Se armo la estructura metálica para las vigas que lleva la estructura del parqueadero en el are de archivo con tubería en acero inoxidable.


- En el armado estructural en el parqueadero del área de archivo también fueron colocados elementos estructurales correspondientes a las correas de dicha estructura
- Se procedió a anclar la estructura metálica usando platinas de acero y su respectiva tornillería para su correcto funcionamiento.
- Fue colocada la reja en acero y pintura anticorrosiva en la ventana faltante dentro de la casa fiscal.
- Se procedió a instalar alambre de púas calibre 12,5 en la parte superior de la malla eslabonada instalada, para asegurarnos de tener una mayor seguridad en el predio.
- Fue instalado pedestal en concreto para fijar la malla eslabonada instalada anteriormente, para que esta quedara debidamente templada y asegurada.
- Dentro del área de archivos se continuaron con las actividades correspondientes a la aplicación de pañetes impermeabilizados en la parte exterior de este recinto.
- En el área de archivo se procedió a instalar teja termo acústica en color azul en el área de parqueaderos que se encontraba sin la cubierta correspondiente.
- También se procedió a instalar un área donde guardar materiales en malla eslabonada correspondiente a 40 m2.
- Se procedió al desmonte de canales y bajantes ubicados en la parte frontal del área de archivo.
- Luego de impermeabilizar con pañete y muro masterseal se dio inicio al proceso de pintado con pintura tipo coraza empleando un total de 3 manos.
- Se inicio con el proceso de pintado en la parte interior del área de archivo.
- Se procedió a realizar el cambio de las tejas en mal estado que se encontraron en la cubierta del área de archivo.
- Después de terminadas las actividades se inicio el proceso de limpieza general para hacer la entrega de espacios.
- Se inicio la limpieza general de la fachada del área de IDEAM.
- Con sumo cuidado se realizo la limpieza de la cubierta del edificio de ideam, teniendo sumo cuidado con los elementos que se encontraban en esta.
- Luego de realizar la impermeabilización de los muros con pañete, se procedio aplicar pintura tanto en la parte interior como en la exterior del edificio de IDEAM.
- Se realizaron las actividades de pañete imperbealizadado en las áreas indicadas en la parte administrativa.
- Luego se inicio con el proceso de pintar con pintura tipo coraza en la parte interior y exterior del establecimiento.
- También se realizo el desmonte de lamina pesada, para la respectiva instalación de láminas en superboard.

a. REGISTRO FOTOGRÁFICO:




No.	CASA FISCAL
1	Desmonte de cerramiento


No.	CASA FISCAL
2	Instalación de malla eslabonada

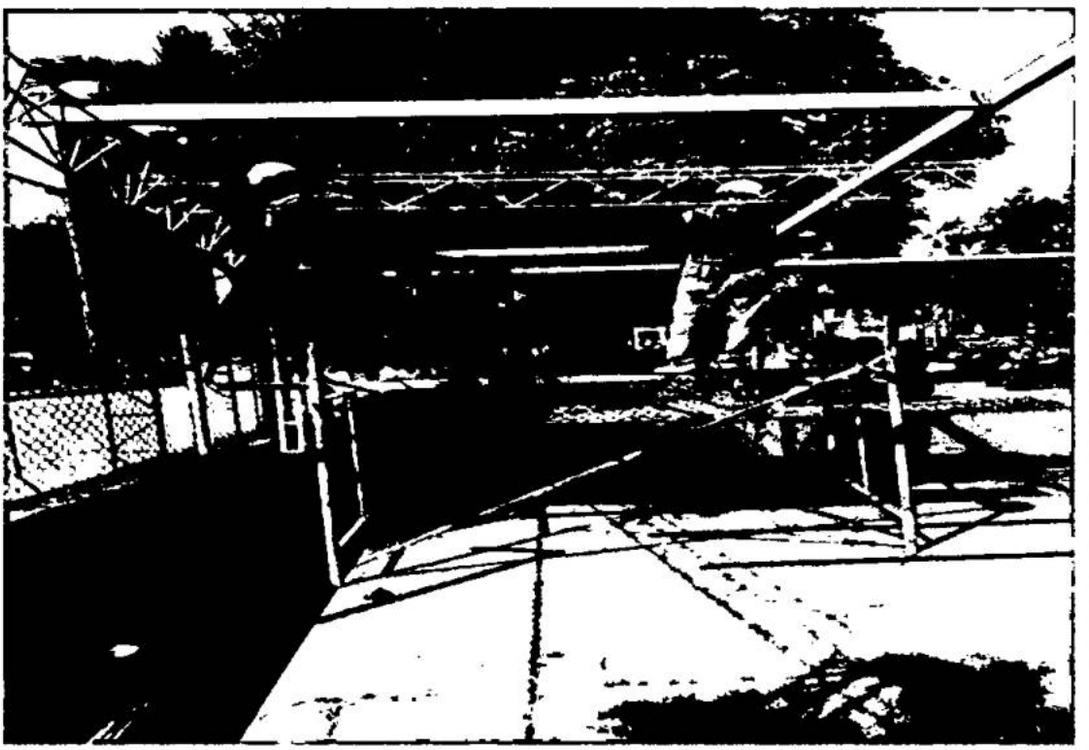


No.	ARCHIVO
3	Estructura metálica Anexo: al no estar a una altura superior a 1.5m, no es necesario la utilización de arneses o líneas de vida.

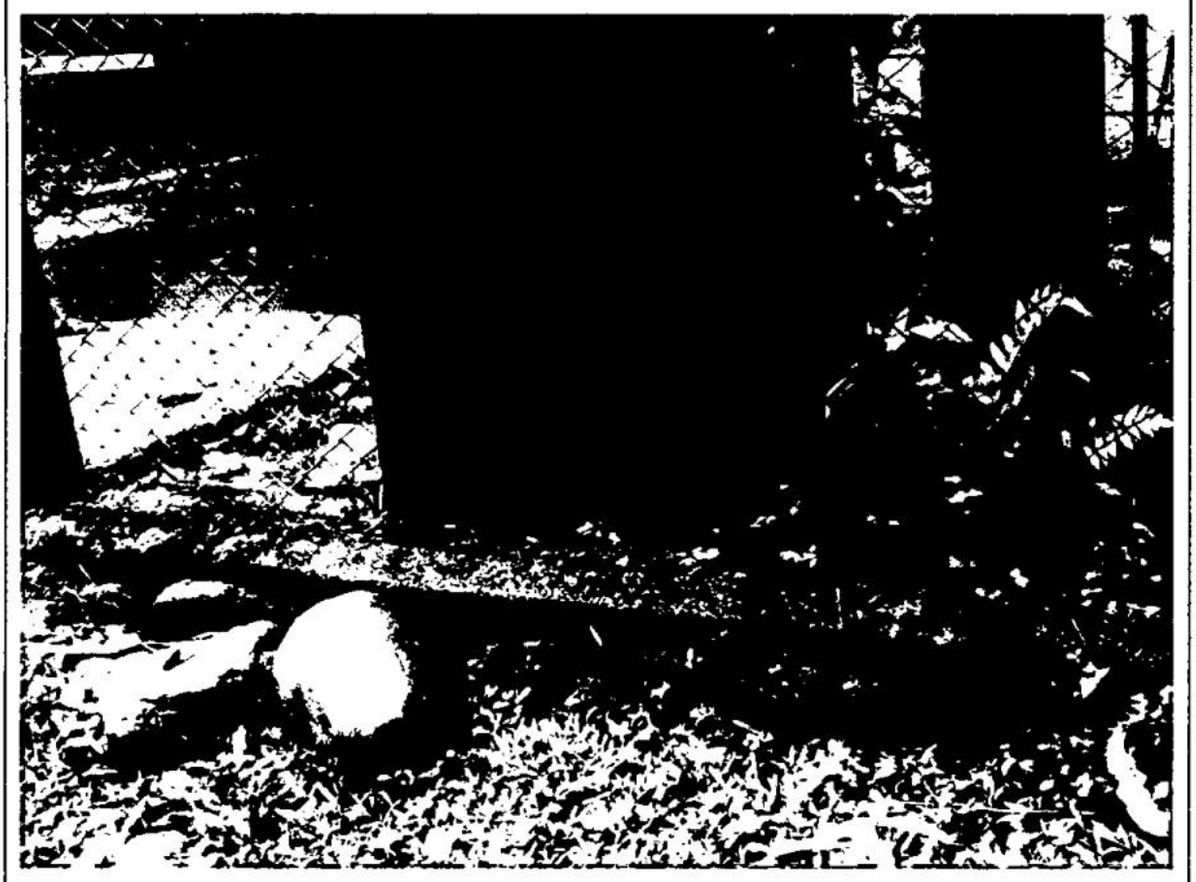

No.	CASA FISCAL
4	Mortero para fijar malla eslabonada.

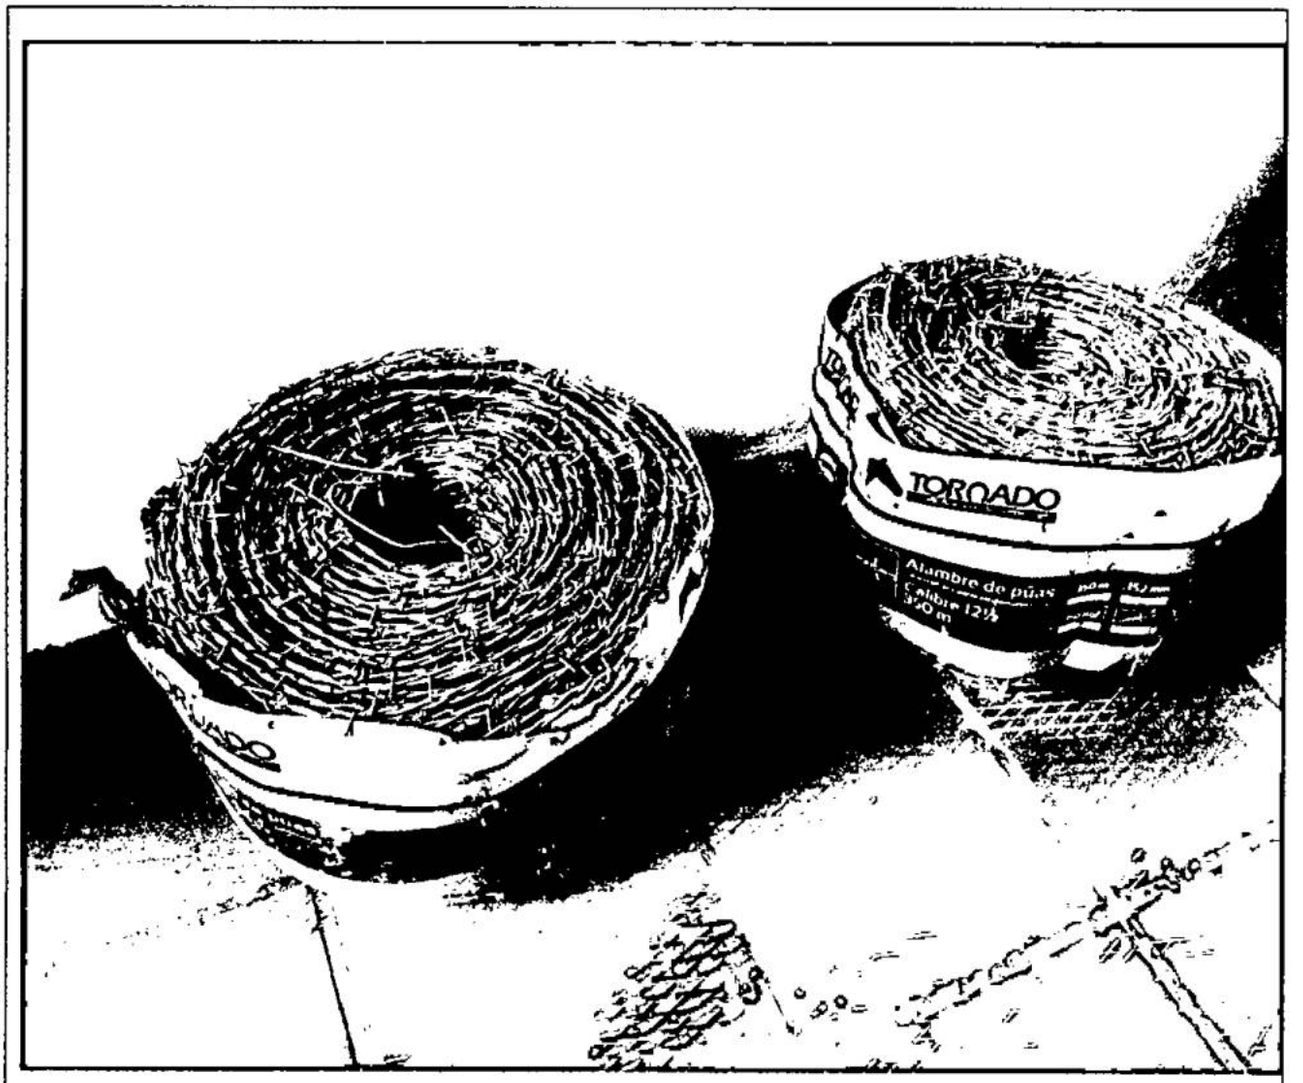

No.	CASA FISCAL
5	Instalación de Alambre de Púa.

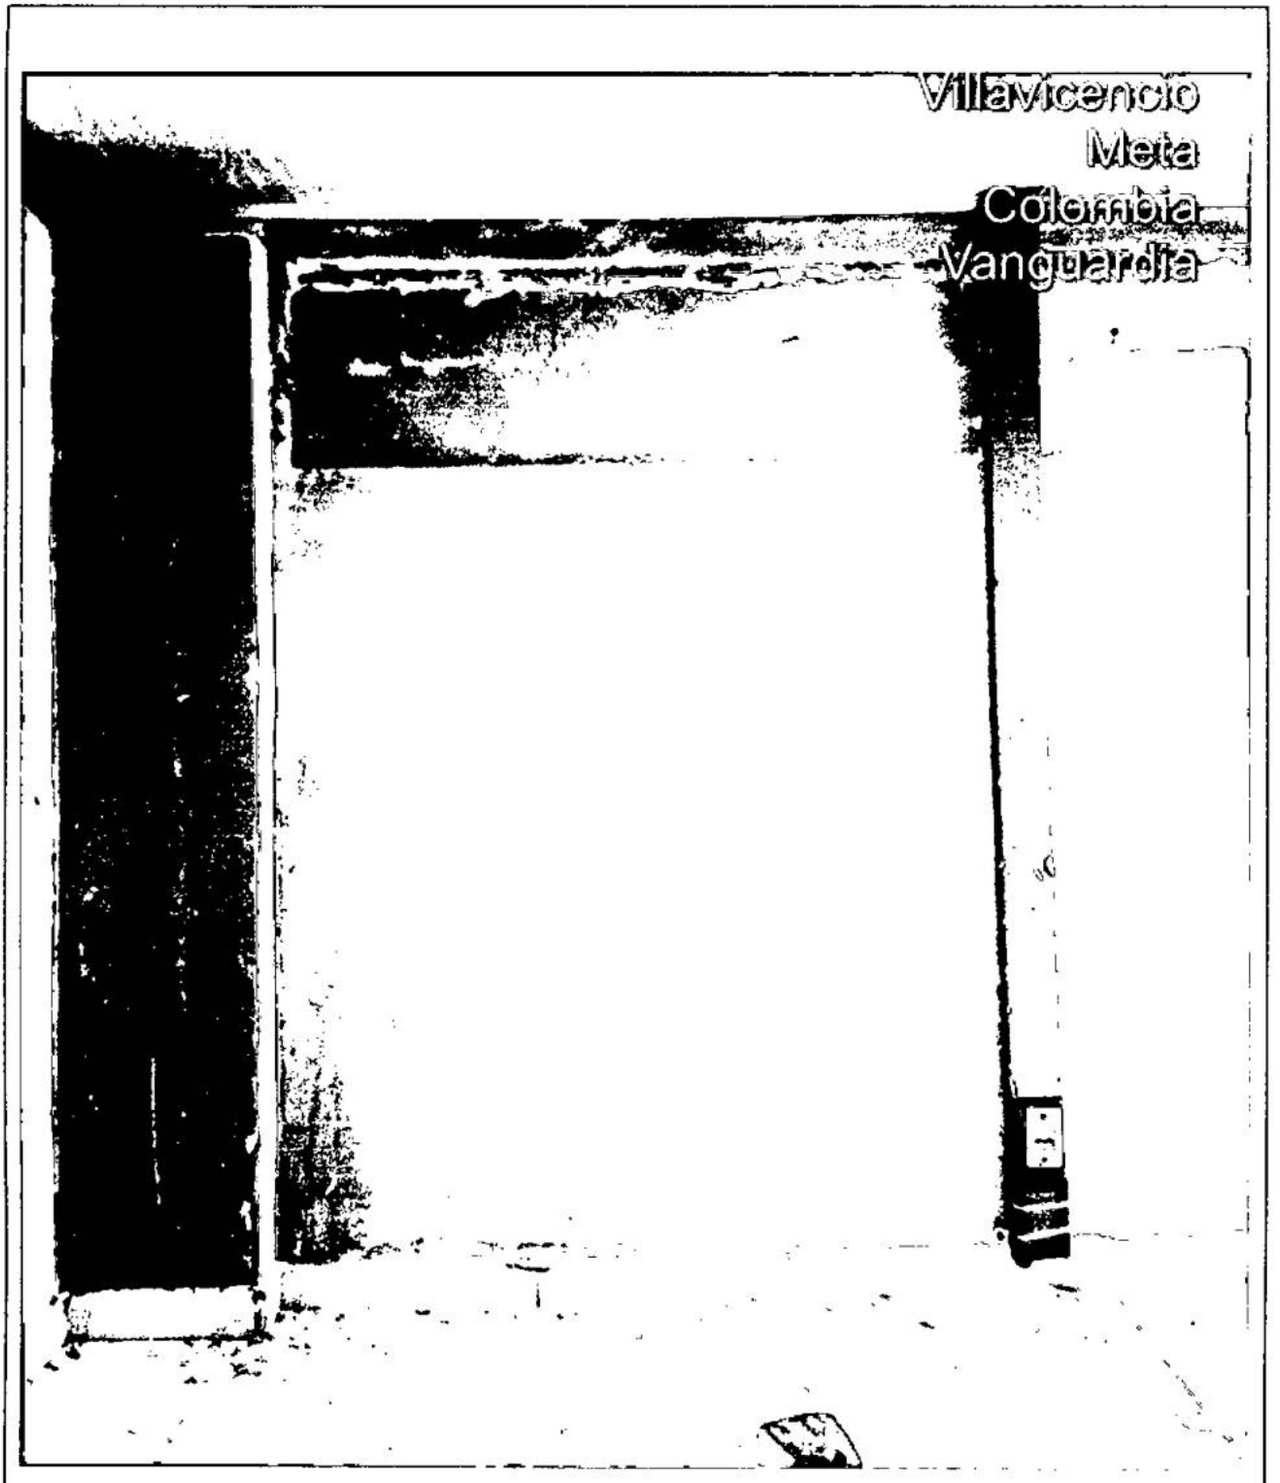


No.	ARCHIVO
6	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)



No.	ARCHIVO
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA PERFIL TRAPEZOIDAL COLOR. NO INCLUYE ESTRUCTURA. LIMPIEZA DE CUBIERTA




No.	ARCHIVO
8	DESMONTE DE CANAL Y/O BAJANTE EXISTENTE

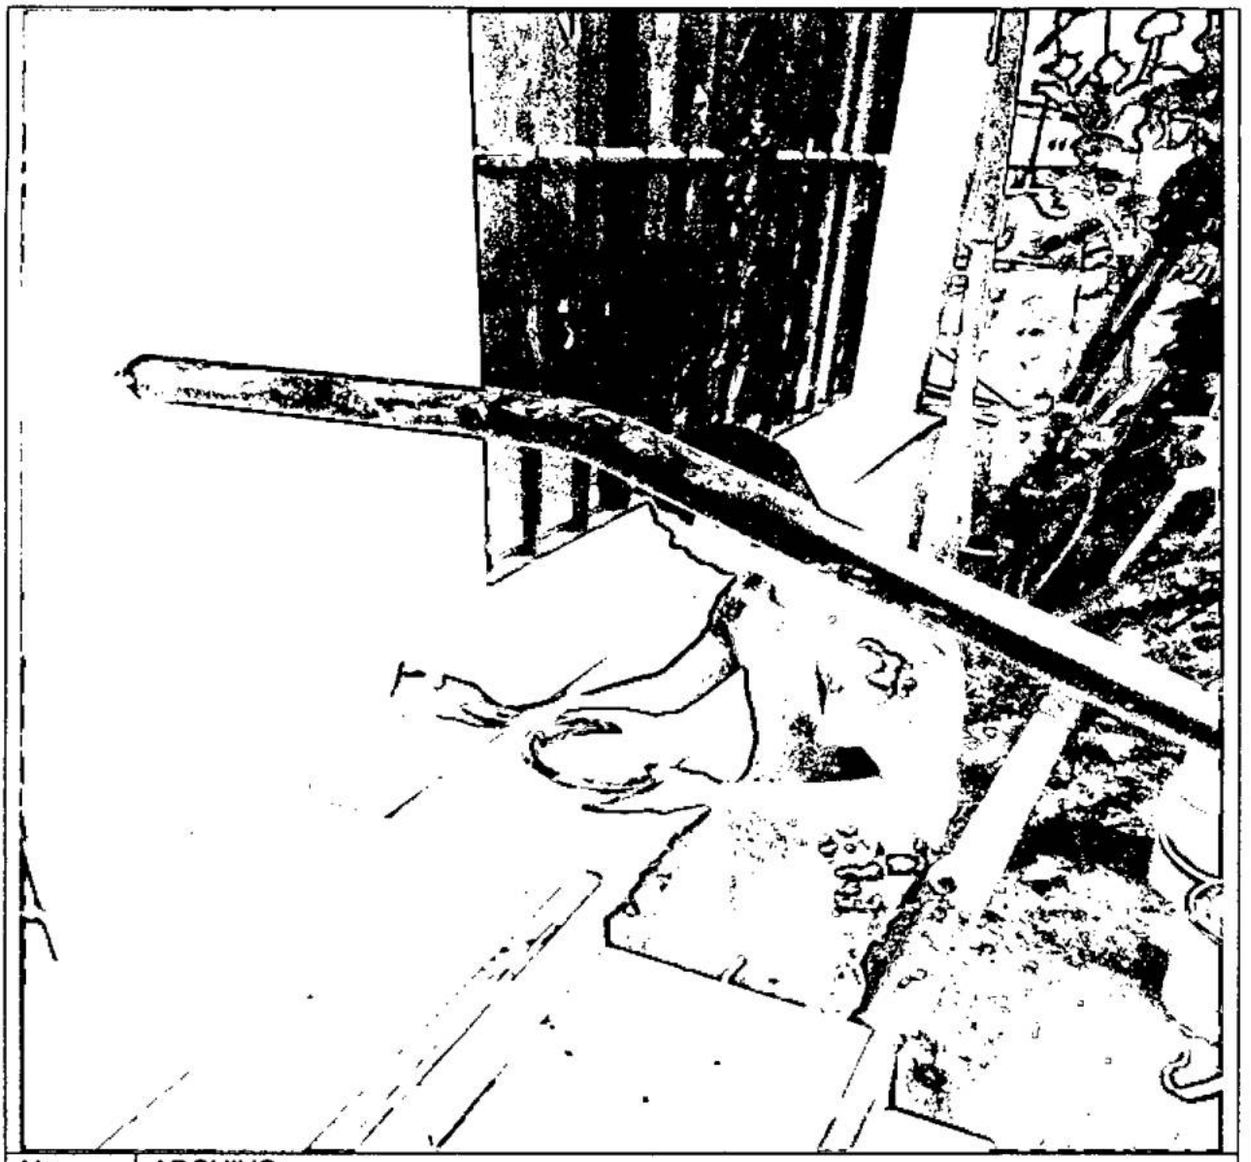

No.	ARCHIVO
9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS. INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES.



No.	ARCHIVO
10	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA. PEDESTALES EN COCRETO, TUBERIA DE 2" CAL.14 Y LAMINA DE SOPORTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA PARA TUBERIA. INCLUYE PUERTA 2M DE LONGITUD

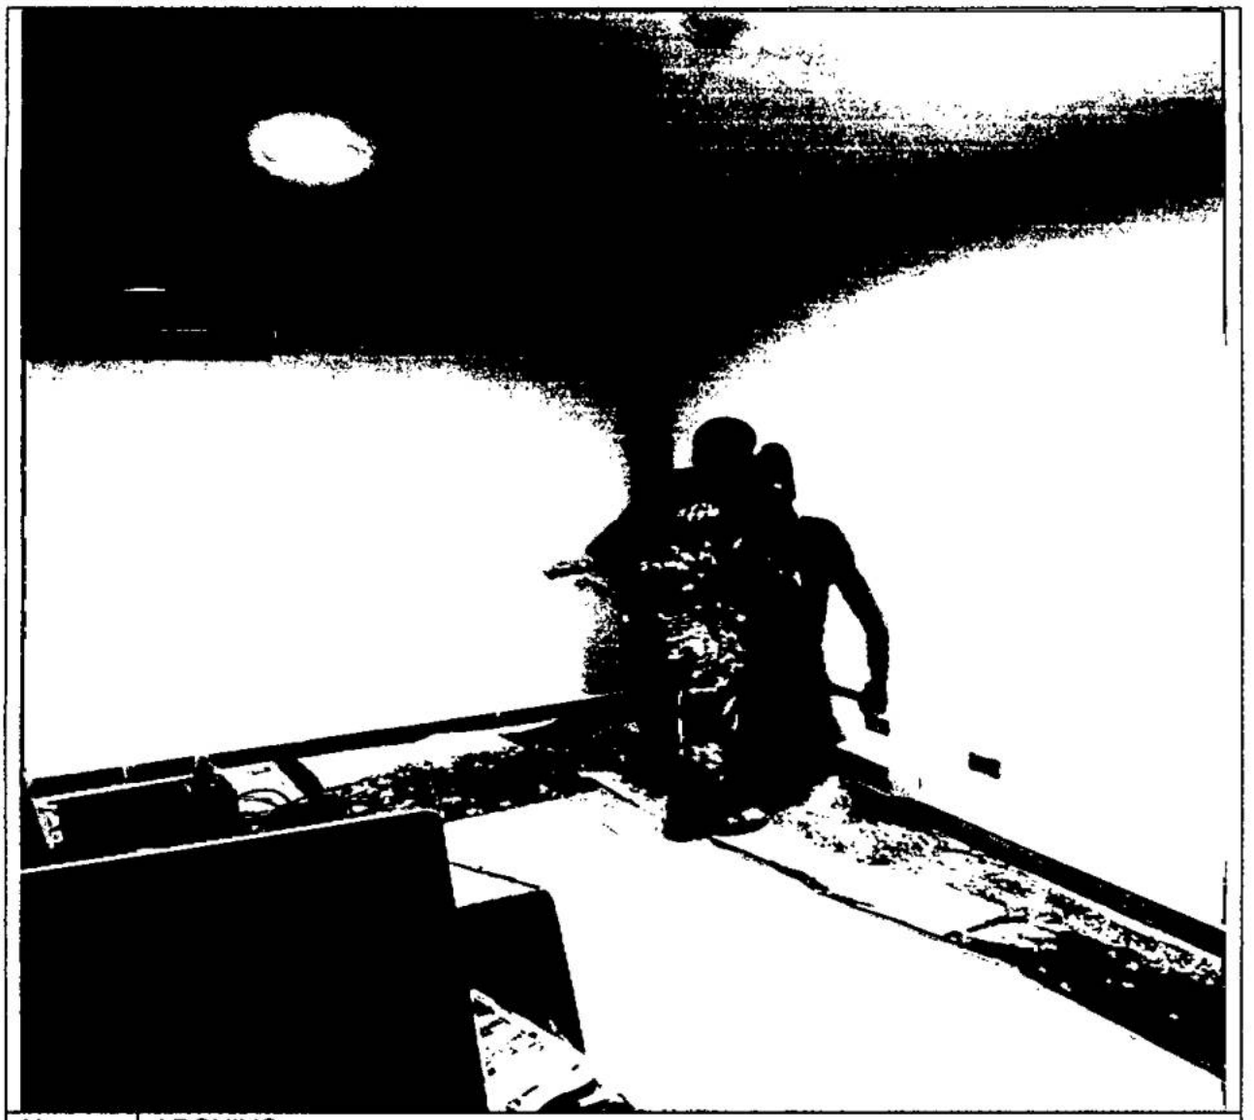

No.	ARCHIVO
11	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO T. CORAZA INTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS. INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES



No.	ARCHIVO
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO P7 N°6 Y REPARACION DE ESTRUCTURA DEFECTUOSA (INCLUYE RETIRO A BOTADERO DE TEJAS Y ESTRUCTURA EN MAL ESTADO)




No.	ARCHIVO
13	LIMPIEZA GENERAL



No.	IDEAM
14	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS




No.	IDEAM
15	Limpieza de Cubierta incluye estructura metálica

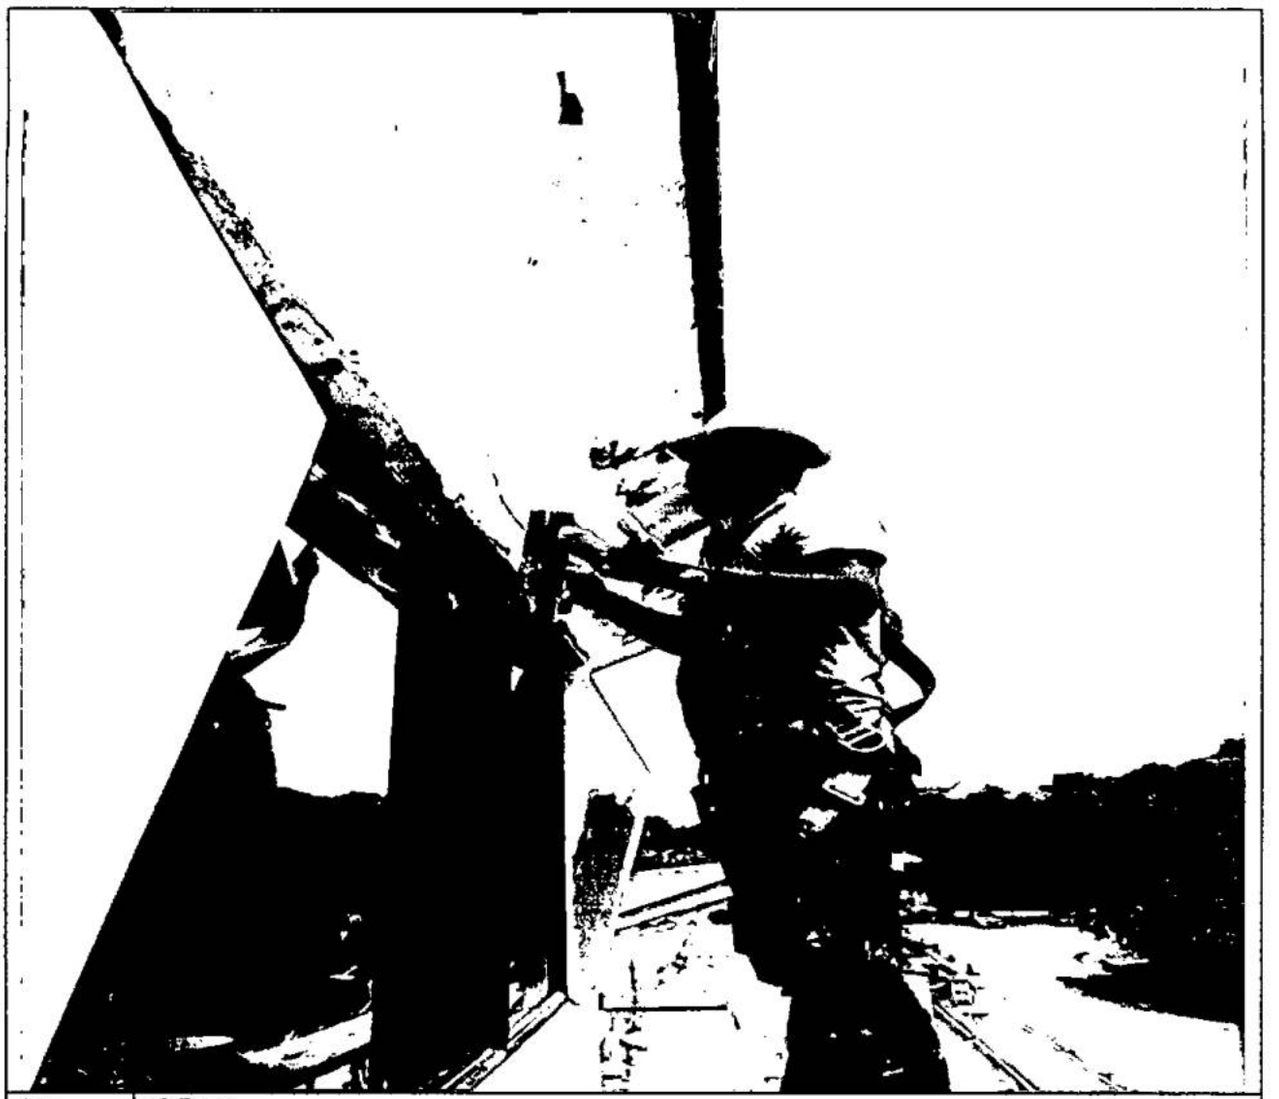

No.	IDEAM
16	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)




No.	IDEAM
16	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS. INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES

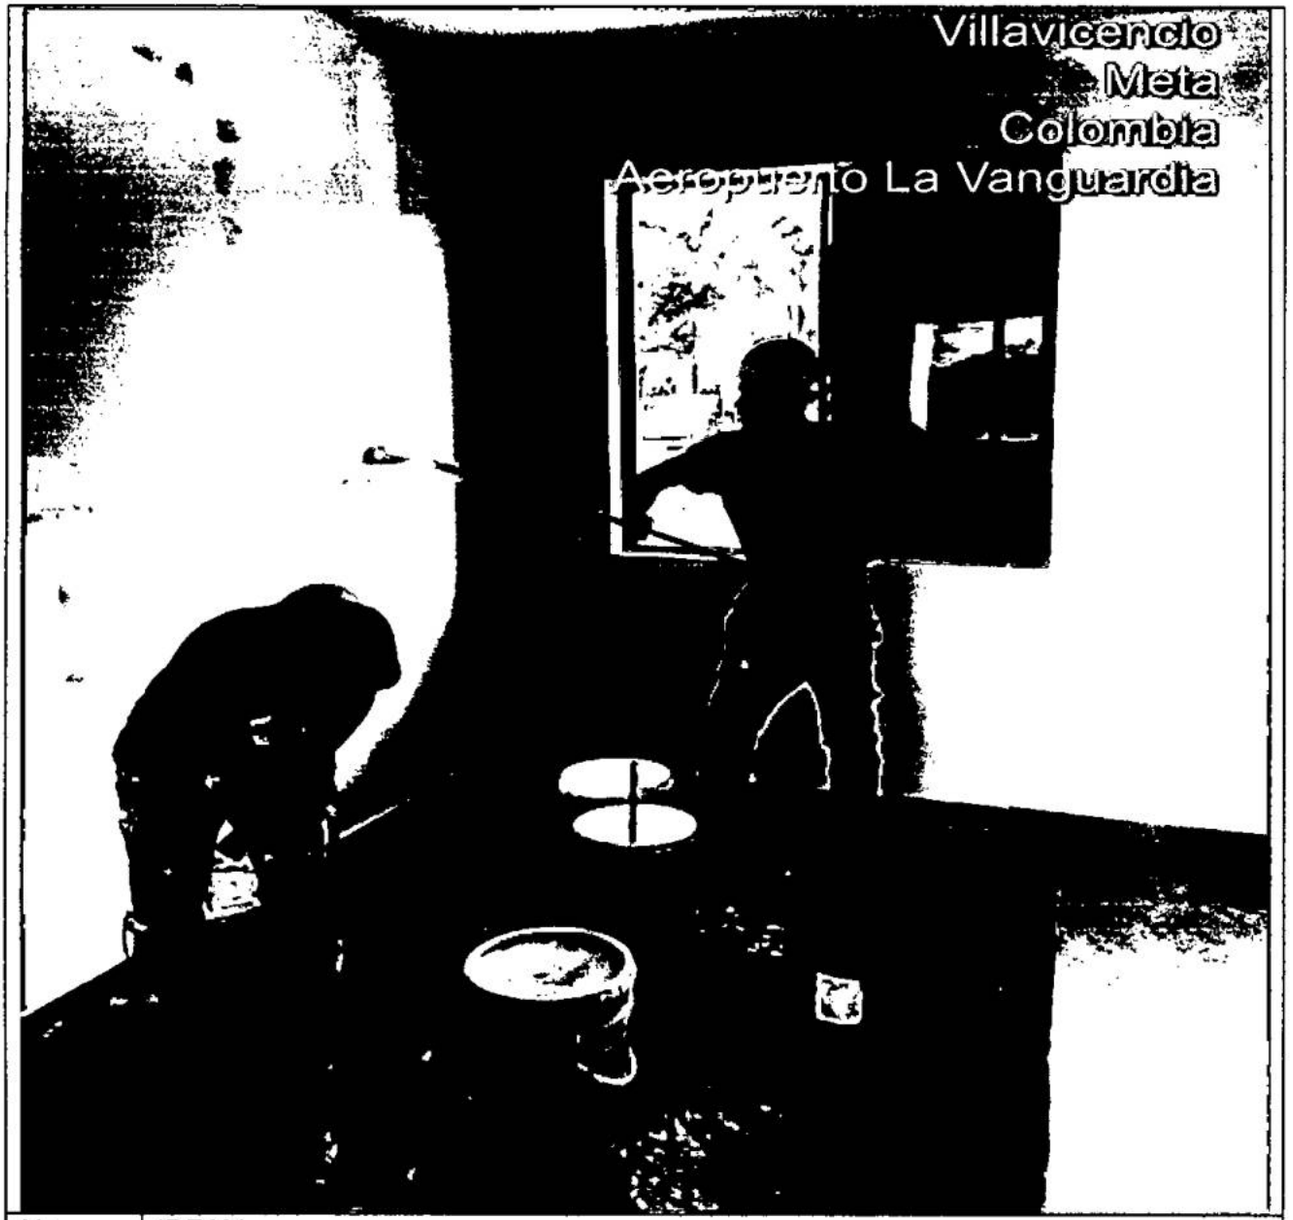


No.	IDEAM
17	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO T. CORAZA INTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS. INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES



No.	AREA ADMINISTRATIVA
18	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)

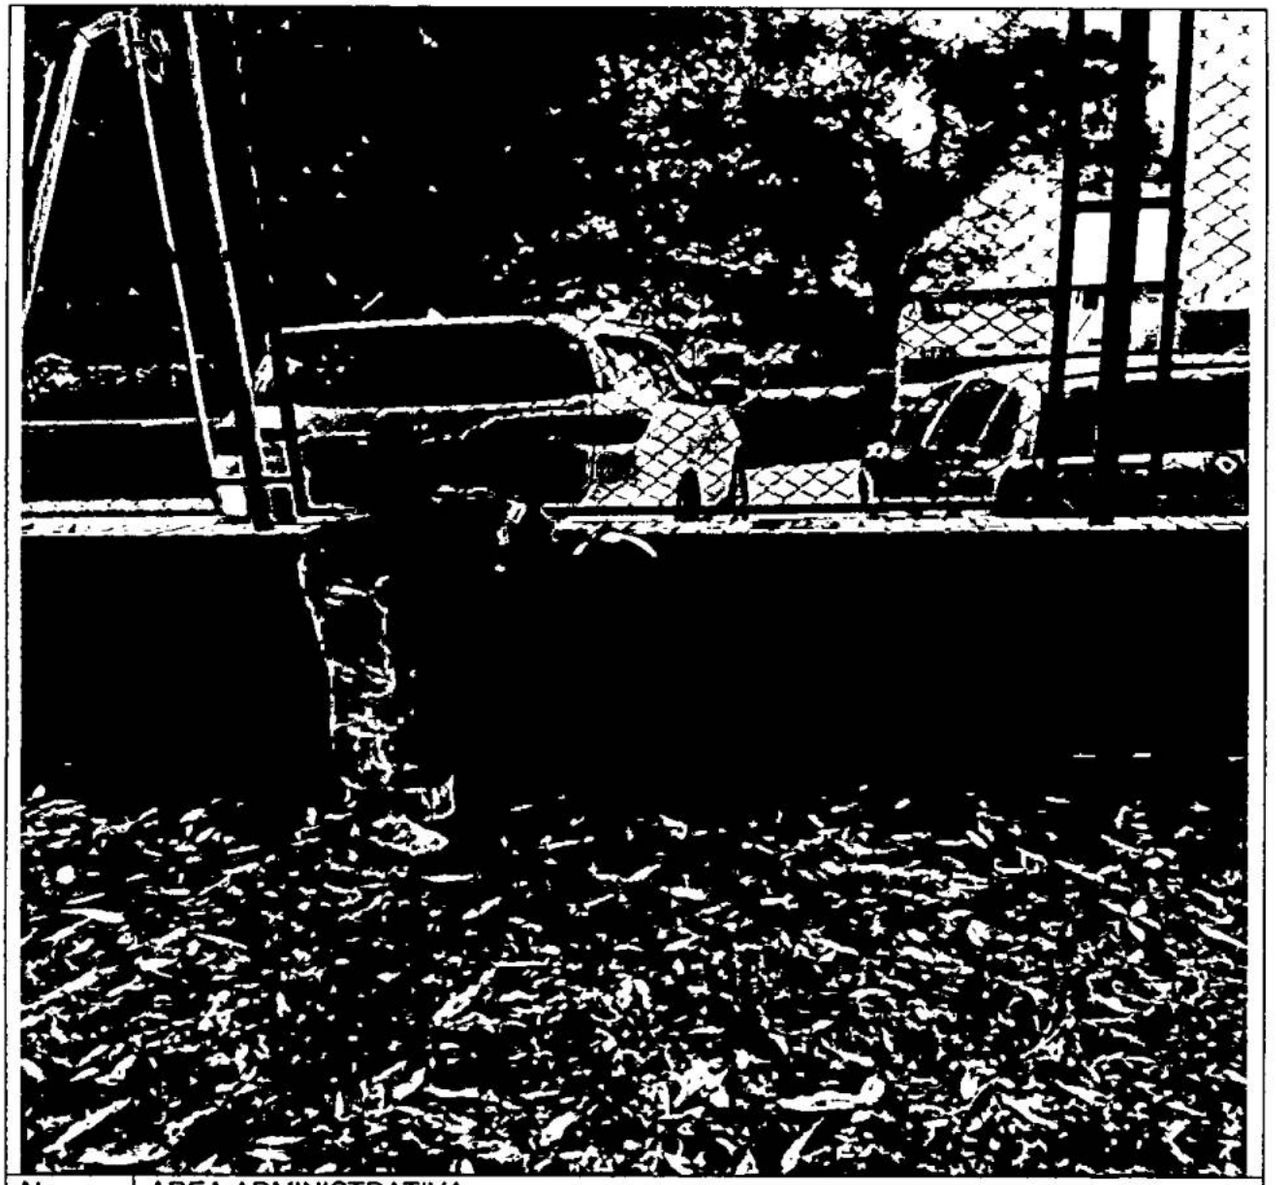


No.	AREA ADMINISTRATIVA
19	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS. INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES

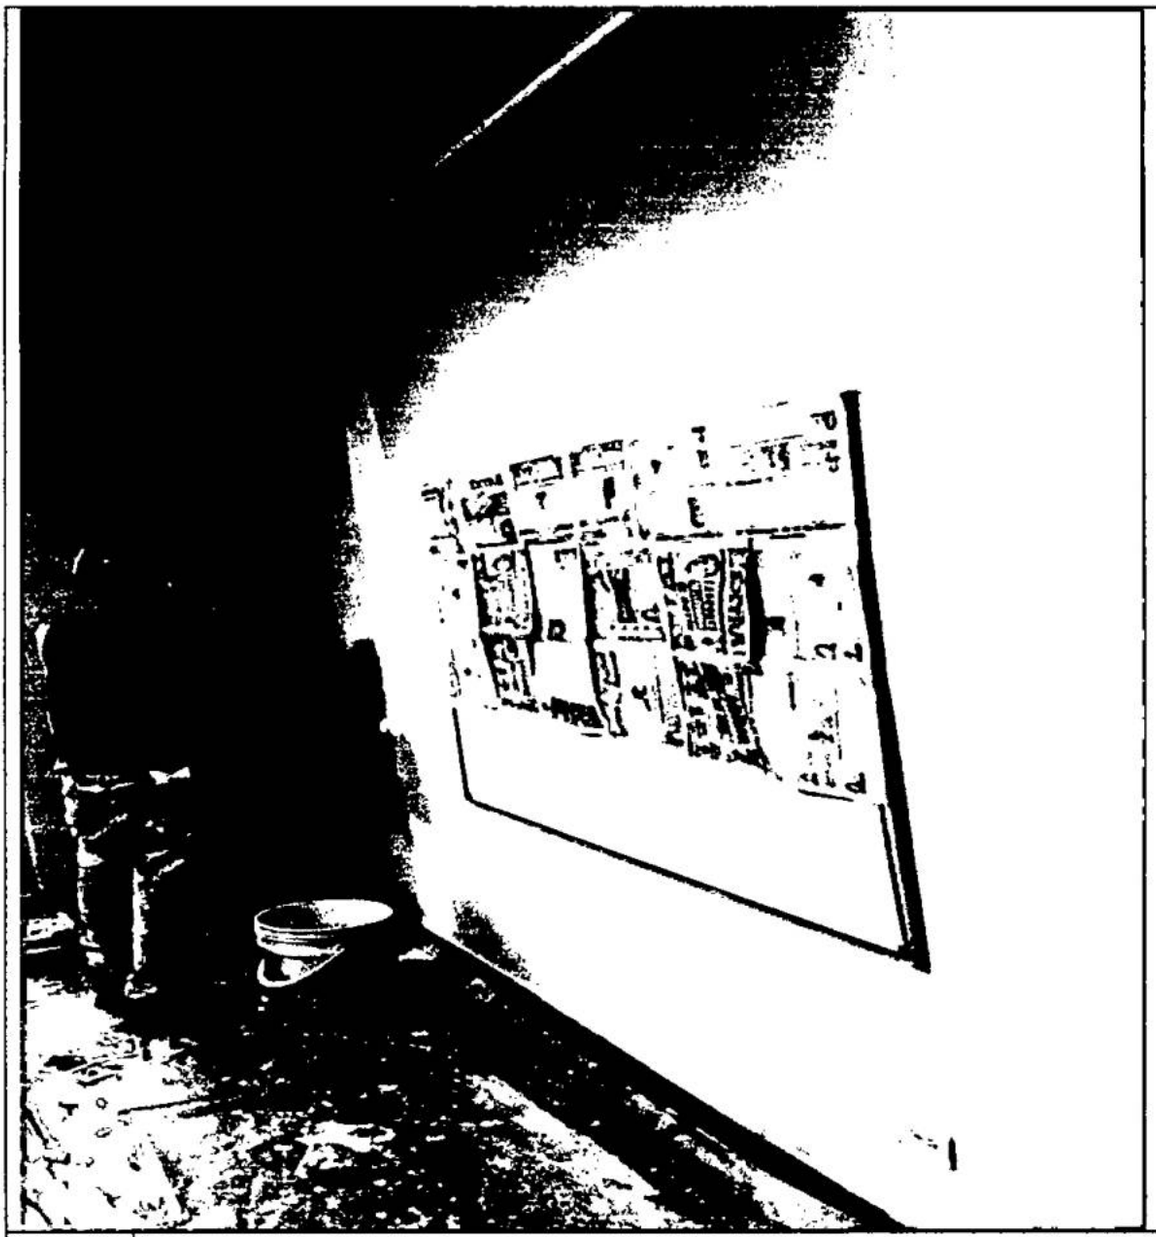


No.	AREA ADMINISTRATIVA
20	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO T. CORAZA INTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS. INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 1605.092	**Clave: GCON-1.0-12-046**	**Versión: 02**	**Fecha: 04/oct/2019**	**Página: 24 de 28**

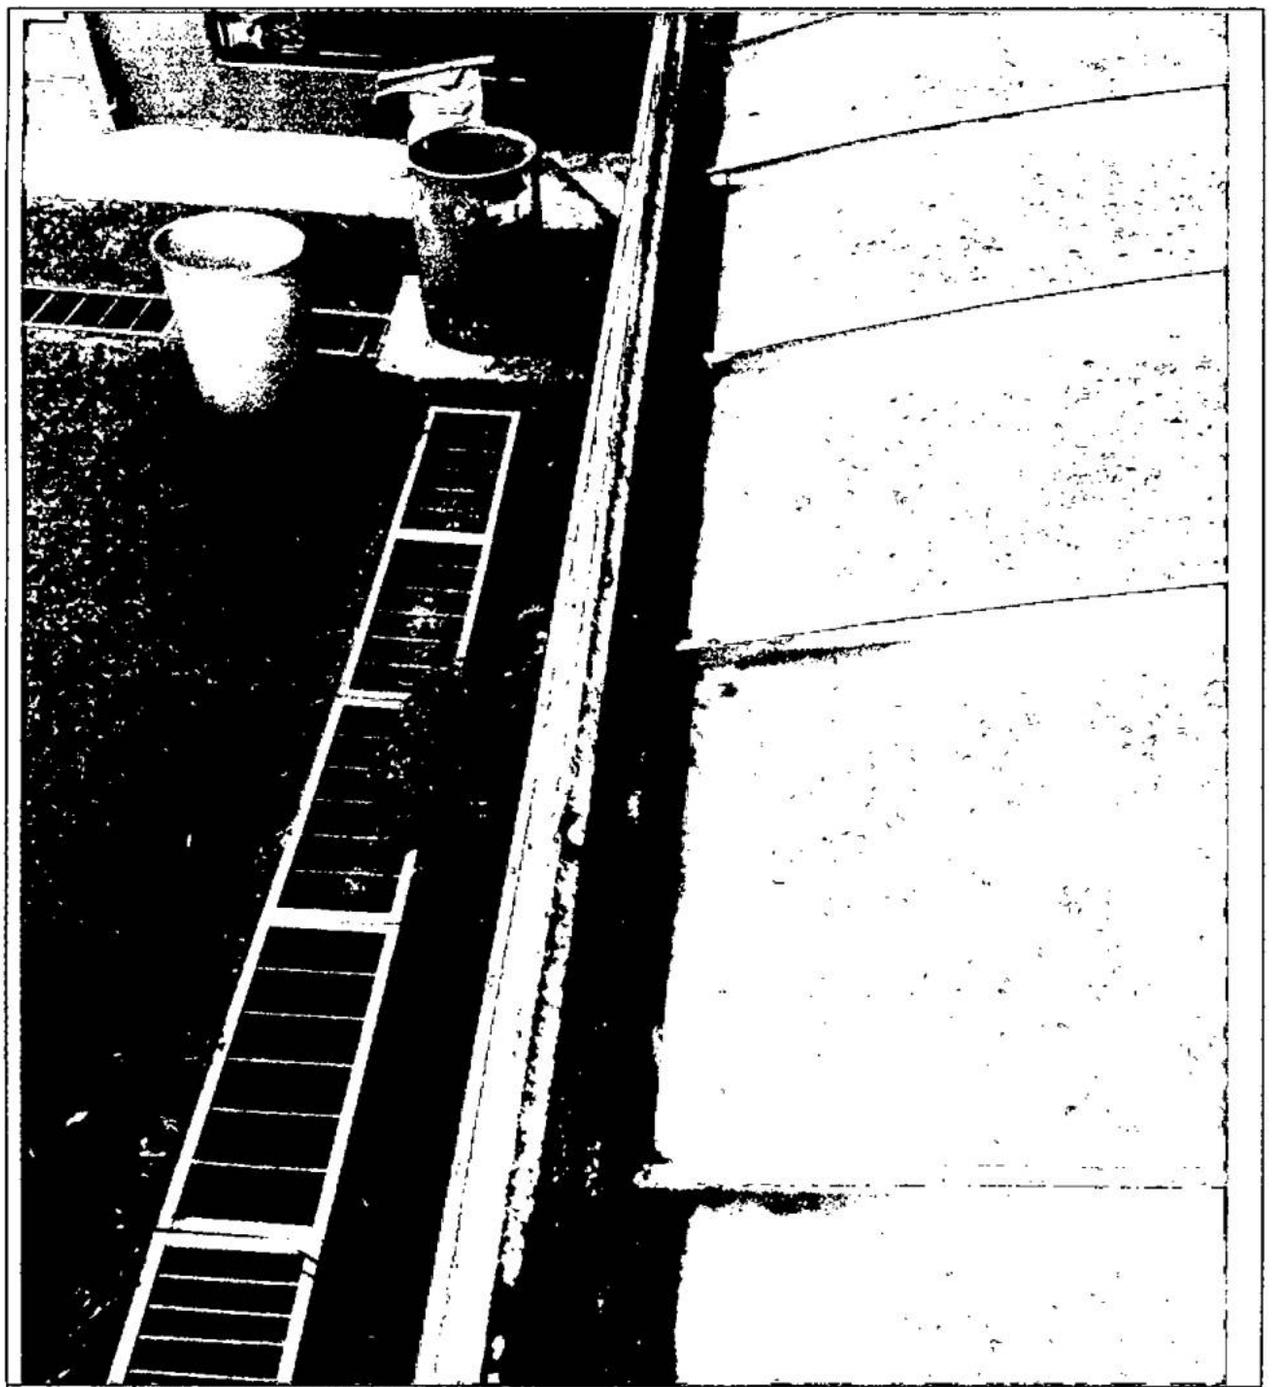

No.	AREA ADMINISTRATIVA
21	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES

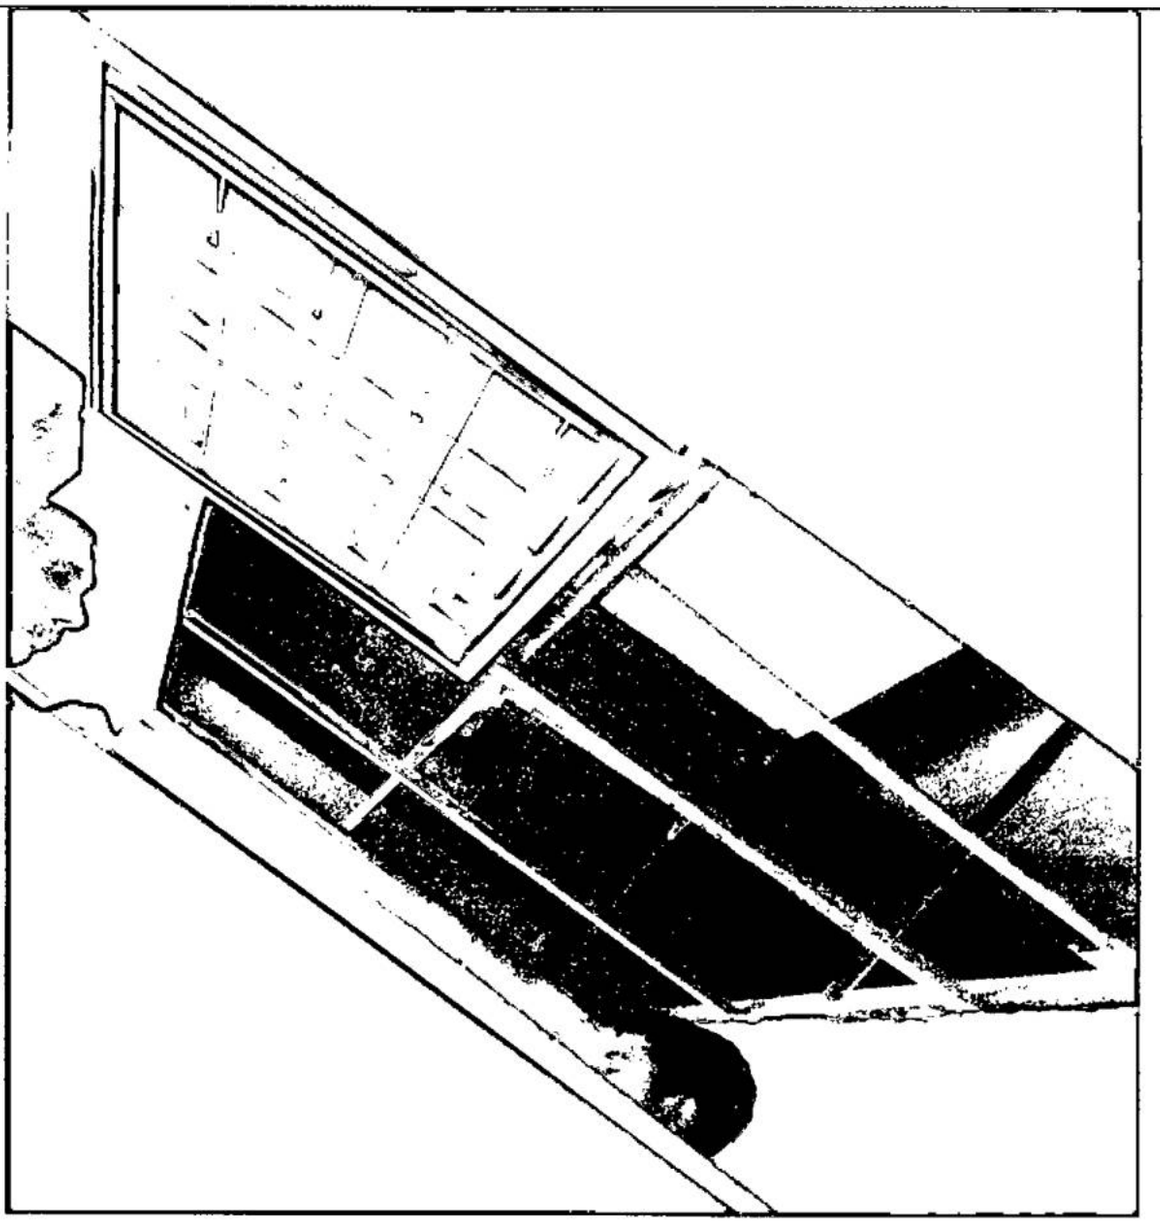

No.	AREA ADMINISTRATIVA
22	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

NA

4.1. VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES FRENTE AL SGSST

4.1.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	NO
X	
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	NO
X	

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN
02/7/2022	02/07/2023

5. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

5.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

VALOR CONTRATO	FACTURA	ACTA RECIBO PARCIAL No. 2	SALDO POR EJECUTAR
$372.110.089,72	ICS-5	$204.801.813,15	$61.441.678,65

5.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

VALOR CONTRATO	FACTURA	ACTA RECIBO PARCIAL No.2	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
$372.110.089,72	ICS-5	$204.801.813,15	$61.441.678,65	83,49

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN
CONTRACTUAL

LUZ MYRIAM [illegible] ROJAS
Supervisora

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

3612. - 2022
Villavicencio, 15 de Septiembre de 2022

Ingeniero
DIEGO MIGUEL RODRIGUEZ HUEPA
Director Regional Oriente
Villavicencio

Asunto: SOLICITUD ADICION CONTRATO No.22001020 H4 DE2022

Comedidamente me permito solicitar adición al contrato de la referencia, para terminar de realizar el cerramiento total del predio casa fiscal y atender el hallazgo evidenciado por la Supertransporte en el área de salida de las máquinas de Bomberos.

1. **DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN**

   Por visita de inspección realizada por la Supertransporte al aeropuerto Vanguardia, evidenciaron que la salida de las máquinas de Bomberos es muy reducida, para maniobrar los vehículos en caso de atender una emergencia, la supertransporte reporta esta novedad en el informe de visita por lo que se requiere la ampliación de la vía, y subsanar el presente hallazgo.

   Por lo anterior, es fundamental ejecutar los Items, no contemplados contractualmente para cumplir con los fines estatales; en este caso, para cumplir con el objeto contractual " MANTENER EDIFICACIONES DE ARCHIVO,CASA FISCAÑL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADMINSITRATIVAS DE LA REGIONAL META Y AEROPUERTO VANGUARDIA".

2. En cuanto al predio Casa Fiscal, propiedad de la aeronáutica civil, se requiere la terminación total del cerramiento que es equivalente a una (1) hectárea y media aproximadamente, lo anterior para salvaguardar el bien de futuras invasiones.

De acuerdo a la necesidad de realizar la adición al contrato de la referencia; se contemplan las siguientes descripciones, cantidades y presupuesto no contemplados inicialmente contractualmente así:

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL

23600C1169 ADECUAR EL PARQUEADERO DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A I U resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.


Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO DE REFERENCIA DE LA ENTIDAD	VALOR UNITARIO OFRECIDO SIN AIU OFRECIDO	VALOR UNITARIO OFRECIDO + AIU OFRECIDO	VALOR TOTAL
				1. OBRAS DE PARQUEADERO						
1				RETIRO DE CERRAMIENTO DE MALLA ESLABONADA Y ALAMBRE DE PUAS 3 HILOS	M2	74 00		$ 17.800 00	$ 22 250 00	$ 1 646 500 00
2				TALA Y RETIRO DE ARBOLES INCLUYE CARQUE	UN	6 00		$ 1 200 000 00	$ 1 500 000 00	$ 9 000 000,00
3				TRASLADO DE POSTE ELECTRICO CONCRETO	GL	1,00		$ 3 850 000,00	$ 4 812 500 00	$ 4 812 500 00
4				DEMOLICIÓN MECANICA BORDILLO CONCRETO REFORZADO PARA CUNETAS INC RETIRO	M3	8 00		$ 86 000 00	$ 122 500 00	$ 980 000,00
5				LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	114 80		$ 4 880,00	$ 6 112,50	$ 701 715 00
6				DESCAPOTE MECANICO H 0 20 M INCLUYE RETIRO	M3	22,95		$ 185 000 00	$ 206 250 00	$ 4 735 500 00
7				EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	29 50		$ 97 800 00	$ 122 000 00	$ 3 599 000 00
8				CAMBIO TUBERÍA 2" PVCP	M	3 00		$ 210 000 00	$ 262 500 00	$ 787 500 00
9				RELLENO EN MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN	M3	5 00		$ 76 000 00	$ 95 000 00	$ 475 000 00
10				RELLENO EN SUB BASE GRANULAR SBG COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	M3	22 90		$ 196 400 00	$ 248 000 00	$ 5 684 920 00
11				BASE GRANULAR TIPO BG-1	M3	11 48		$ 205 000 00	$ 256 250 00	$ 2 941 750 00
12				CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE INCLUYE ESCARIFICAR, PERFILAR, CONFORMAR, RIEGO Y COMPACTACIÓN	M2	114 80		$ 165 000 00	$ 206 250 00	$ 23 677 500,00
13				RIEGO DE IMPRIMACION CON ASFALTO LIQUIDO	M2	344 40		$ 27 800 00	$ 34 750 00	$ 11 967 800 00
14				CARPETA ASFALTICA (MEZCLA DENSA EN CALIENTE, INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN) E 10CM	M3	15 48		$ 1 450 000 00	$ 1 812 500 00	$ 28 057 500 00
15				SARDINEL TIPO A-10 (SUMINISTRO E INSTALACION INCLUYE 3cm DE MORTERO 1 5)	M	32 80		$ 242 000 00	$ 302 500 00	$ 9 922 000,00
16				SUMINISTRO E ISNTALACIÓN DE PORTÓN PIVOTANTE 2 HOJAS EN PERFILES COLL ROLLED TIPO PERSIANA INCLUYE SOPORTES Y ORIENTACIÓN	M2	21,00		$ 1 058 823,00	$ 1 321 029 75	$ 27 741 803,75
17				SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CERRAMIENTO NUEVO EN MALLA ESLABONADA DE 2X2 CALIBRE 10 RECUBIERTA EN PVC, TIPO RESINAL, TUBO 2" GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO ANGULOS PLATINAS	M	185,6			$ 241 605,80	$ 44 827 525,79
18				MORTERO PARA FIJACIÓN DE MALLA ESLABONADA 1 4 INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M	32 8			$ 17 214 88	$ 564 641 80
19				ALAMBRE DE PÚA CALIBRE 12,5 INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M	99 4			$ 1 453 84	$ 144 021,76
Subtotal										$ 182.378.241,22
							SUBTOTAL OBRAS			$82.378.241,22

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)			$ 183.762.300,85
	372110000	180000045	
VALOR TOTAL			$ 183.762.301

	DESCRIPCION				PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A I U					
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACION	Ao	19%		[Determinar por la Entidad]
NOTA 3: El A I U y su discriminación deben estar en porcentaje (%)	IMPREVISTO	Io	1%		[Determinar por la Entidad]
	UTILIDAD	Uo	5%		[Determinar por la Entidad]
	TOTAL A I U	A I U =	25%		[Determinar por la Entidad]

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

AREA A INTERVENIR AMPLIACION VIA

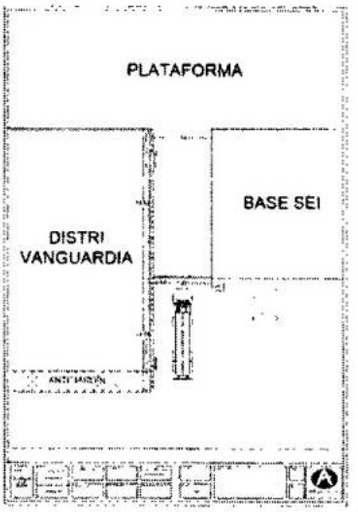

1. ASPECTO JURÍDICO:

En virtud de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, artículo 40, inciso segundo, "Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales", se considera viable la solicitud de adición, máxime cuando la Corte Constitucional, con fundamento en concepto elaborado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en 2009, **estableció que además del valor máximo establecido por el inciso segundo del parágrafo del artículo 40 para adicionar a un contrato, es necesario cumplir con otra serie de requisitos** y respetar algunas restricciones. Al respecto, manifiesta el Alto Tribunal: "Ahora bien, como se indicó en ese concepto, el que la mutabilidad de los contratos estatales sea posible no significa que pueda llevarse a cabo por la mera voluntad de las partes o de la entidad contratante; por el contrario, la modificación del contrato debe ser excepcional en virtud de los principios de planeación y seguridad jurídica. Por ello la Corte concuerda con la Sala de Consulta y Servicio Civil en que la modificación **debe obedecer a una causa real y cierta autorizada en la ley, sustentada y probada**, y acorde con los fines estatales a los que sirve la contratación estatal. (Esvástica y Negrilla fuera del texto).

Respecto a la adición de contratos estatales, la Ley 80 de 1993, en su artículo 40, indica que **"las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades**

estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración". (Esvástica y Negrilla fuera del texto).

Así mismo, Sobre la prórroga del plazo de los contratos, en la Sentencia C-949 de 2011, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos —como especie de modificación— puede ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal. Las estipulaciones contenidas en el contrato y en los demás documentos contractuales no serán modificados expresamente mediante el otro sí o acta que se suscriba, por el contrario, continuaran vigentes y sufrirán los efectos legales y contractuales que de ella se deriven.

2. ASPECTO TÉCNICO Y FINANCIERO:

EJECUCIÓN TOTAL

No.	FACTURA	VALOR
1	ICS-4	$105.867.515.33
2	ICS-5	$204.801.813,15

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR INCIAL	$372.110.089,72
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1	$105.867.515,33
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 2	$ 204.801.813,15
VALOR SALDO	$61.440.750,24

El contrato de la referencia a la fecha presenta una ejecución financiera del 83.49%, correspondiente a la suma cancelada de $310.669.328.48.

Por lo expuesto anteriormente, se solicita la adición correspondiente por la suma de **CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS**

MIL TRECIENTOS UN MIL PESOS ($183.762.301.00) M/CTE, incluido IVA. El valor que se propone adicionar no supera el límite establecido en la ley, toda vez que el mismo corresponde a una suma que no supera el 50% del valor inicial del contrato.

Consecuentemente, se solicita prorroga correspondiente por un término de UN **(01) MESES**, contados a partir de la fecha de terminación del contrato de la referencia.

El anterior solicitud de adición de servicios cuenta con un costo total de **$183.762.301.00.**

Cordialmente,

LUZ MYRIAM SANTIAGO RODRIGUEZ
Gerente Aeroportuario II

Proyectó: Luz Myriam Santiago Rodriguez
Revisó: Luz Myriam Santiago Rodriguez
Ruta electrónica: \\bog7\ADI\Externo\2022022700
