INFORME FINAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA - SDSCJ

CONTRATO

No. SCJ- 1932 -2022

Tabla de Contenido

1. Introducción 3
2. Información general del contrato 3
3. Orden de Inicio 3
4. Glosario 3
5. Descripción del Proyecto 7
   5.1. Características técnicas del proyecto 8
6. Obligaciones Contractuales 13
7. Balance de servicios prestados. 40
8. Balance económico. 42
9. Equipos atendidos en el laboratorio de Seguritech 44
10. Cámaras reparadas en los centros de servicio 44
11. Garantía de cámaras 55
12. Certificados de importación y declaración de andina 70
13. Relación equipos instalados en los servicios de mantenimiento. 70
    13.1. Detalle de materiales y equipos instalados 72
14. Hoja de vida contrato SCJ 1932-2022 72
15. Novedades en los servicios de mantenimiento. 72
16. Escalamientos a terceros 93
17. Comportamiento del estado del sistema 96
    17.1. Estado del subsistema CAI 97
    17.2. Estado del subsistema colegios 99
    17.3. Estado del subsistema estaciones de policía 101
    17.4. Estado del subsistema Transmilenio 102
    17.5. Estado de los subsistemas CTP y estadio 104
    17.6. Estado del subsistema domos ciudadanos.Chart 105
18. Ponderación de calidad 106
19. Siniestros 107
20. Descuentos por ANS 108
21. Gestión de las comunicaciones 108
22. Novedades en las facturas 182
23. Cumplimiento de aspectos SST 183
24. Conclusiones y recomendaciones 184
25. Histórico de cambios 185
26. Cuadro de aprobación 185

1. Introducción

Se detallan las actividades ejecutadas y novedades presentadas durante la ejecución del contrato No. SCJ-1932-2022, proceso de selección por Licitación Pública No. SCJ-SIF-LP-003-2022.

2. Información general del contrato

NÚMERO DE PROCESO SECOP II	SCJ-SIF-LP-003-2022
NÚMERO DE CONTRATO	SCJ-1932-2022
CONTRATANTE	SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
NIT. No.	899.999.061-9
ORDENADOR DEL GASTO	OSCAR GÓMEZ HEREDIA
CONTRATISTA	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S.
NIT	901.202.687-5
REPRESENTANTE LEGAL	RUBEN GUILLERMO GARDUÑO FUENTES
C.E No.	803026
RÉGIMEN TRIBUTARIO	NO RESPONSABLE DE IVA ( ) RESPONSABLE DE IVA (X)

Tabla 1. Información general de la empresa.

3. Orden de Inicio

El acta de inicio, fue suscrita y firmada por el supervisor del contrato, jefe de la oficina Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo - C4 Edgar Alejandro Reyes Lozano, el 05 de octubre de 2022 en la ciudad de Bogotá D.C, con el fin de dar inicio a la ejecución de las actividades contenidas en el contrato No SCJ-1932-2022.

4. Glosario

Término	Definición
AC	Corriente Alterna.
AGENT VI	Comprehensive Video Analytics Range.
AI	Auto iris - Función del objetivo que permite regular automáticamente la cantidad de luz que entra en el sensor CCD / CMOS simulando el funcionamiento del iris en el ojo humano.
Ampere	Un ampere, o amperio, es la unidad de intensidad de corriente o la densidad eléctrica que corre por un punto de circuito en un momento dado.
Arcgis	Es el nombre de un conjunto de productos de software en el campo de los Sistemas de Información Geográfica o SIG.
Atenuación	Término usado para describir y medir (dB) la disminución de señal de video cuando se transmite de un punto a otro.

Término	Definición
Autofocus	El objetivo es garantizar la imagen más nítida posible gracias a la regulación automática continua del enfoque.
Balun	Se denomina balun (del inglés balanced-unbalanced lines transformed) a un dispositivo adaptador de impedancias que convierte líneas de transmisión simétricas en asimétricas.
Bit	Dígito binario, es el más pequeño elemento de información de un sistema binario (base 2) su valor puede ser “1” o “0”.
Blc	Compensación de Luz de Fondo (Back Light Compensation) - Función de algunas cámaras de seguridad con la que el dispositivo analiza digitalmente la escena y ajusta automáticamente el brillo y contraste de la imagen para que se vean con más claridad las áreas oscuras.
Bnc	Sistema de interconexión utilizado en video profesional.
Bps	Abreviatura de "bits por segundo". Generalmente se escribe con minúsculas: “bps”.
Byte	Conjunto de 8 bits.
Cad	Centro Administrativo Distrital.
Caí	Centro de Atención Inmediata.
Cámara Ptz	Son aquellas cámaras de seguridad motorizadas que tienen funcionalidad de movimiento horizontal (Pan), vertical (Tilt) y capacidad de hacer aumento sobre la imágen (Zoom).
Cable Coaxial	Cable que contiene un conductor central sólido recubierto de material aislante, una malla, y un forro o protector exterior. Muy usado para transportar señales de vídeo análogas.
Cif	Significa Common Intermediate Format y se refiere al tamaño o resolución de una imagen en el ámbito analógico.
Cctv	Circuito Cerrado de Televisión - Sistema de vigilancia utilizado para ver imágenes / videos en privado y no para uso público.
Cmos	Complementary Metal Oxide Semiconductor): Los dispositivos son semiconductores comúnmente usados, construidos de circuitos positivos y negativos.
C4	Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo.
Codificación	En la terminología del multiplexor indica que una grabación de video tiene una marca en el fotograma que impide su manipulación.

Término	Definición
Dc	Corriente Continua.
D/N (Day And Night)	Las cámaras de seguridad que tienen esta especificación poseen una sensibilidad a la luz lo que las hace efectivas para monitoreo en lugares con muy poca iluminación.
Definición	Capacidad de una cámara, monitor, videograbador, de reproducir fielmente las imágenes capturadas.
Dirección Ip (Ip Address)	Se trata de una dirección numérica que se traduce después en un nombre de dominio (Domain Name Server).
Dvr	Grabador de video analógico.
Error Conocido O Fuera Del Alcance	Problema de los cuales ya se conoce su causa raíz y de los cuales se busca el planteamiento de la solución definitiva o la cual está en análisis la viabilidad para su implementación.
Ethernet	El método de acceder a una red LAN (Local Área Network) más usado.
Frame (Cuadro)	Una imagen de Video completa. 1 frame está compuesto de 2 field en el video análogo, y en el digital es como una foto estática. En el estándar de CCTV análogo o televisión el video tiene 30 frames por segundo (NTSC).
Frames Per Second (Fps)	Se refiere al número de cuadros por segundo al cual se muestra o graba el video. Las transmisiones de TV convencionales son a 30 fps, ya que esta tasa es considerada como video en tiempo real.
Hz	Hertzios - Ciclos por segundo: medida de la frecuencia.
Iluminación con Infrarrojos	Iluminación de una zona oscura por medio de emisores de luz en el espectro infrarrojo para permitir que se vean las imágenes aun en ausencia de luces visibles en la escena.
Imagen Comprimida	Una imagen reducida en tamaño que permite almacenar más imágenes que en una imagen normal de video original.
Impedancia	Medida en ohmios, se refiere a la combinación entre la resistencia y la reactancia en un circuito eléctrico.
Incidentes	Eventos que afectan la operación de los sistemas cubiertos y que requieren ser gestionados pasando por las etapas de respuesta, atención, hasta encontrar su solución o workaround.
MCC	Monitoring & Control Center.
Iris	Mecanismo interno del lente para regular la cantidad de luz que pasa a través de él y llega al sensor CCD /CMOS.

Término	Definición
ISP	Internet Service Provider.
ISS	Intelligent Security Systems.
LAN	Local Área Network – Nombre dado a las Redes de Datos locales relativas a una Edificación. Usualmente con velocidad de 10Mbps a 1000 Mbps.
LED	Diodo de Emisor de Luz.
LUX	Unidad de medida de intensidad de luz.
Megapíxel	Un megapíxel o megapixel (Mpx) es una unidad que equivale a 1 millón de píxeles (px).
MOS	Metal Óxido Semiconductor - Forma de chip usado en algunas cámaras de CCTV.
MUX	Analogía o contracción de Multiplexor.
NTSC	National Television Standards Committee - Señal de vídeo en color, estándar de la televisión en Norteamérica y Japón - 525 líneas, 60 Hz.
NVR	Grabador de vídeo en red.
PAL	(Phase Alternative Line) Señal estándar de vídeo en color en Europa, Australia y Medio Oriente.
Pívot	Es una tecnología que permite procesar y analizar información compleja en poco tiempo, con poco esfuerzo y con poco hardware.
Píxel	Un punto en una imagen digital. El punto simple sensible de un sensor CCD / CMOS o el más pequeño punto luminoso de un monitor LCD / LED.
Pixelamiento	Aplica a la visualización de pequeños cuadros en la constitución o forma de la imagen, manifestándose también en distorsión de la visualización.
Preset	Posición memorizada de las coordenadas horizontal, vertical y zoom, de una cámara robótica (speed dome) generalmente usada para ser activada a voluntad de un operador o automáticamente con alguna función programada como un recorrido o una alarma.
Problemas	Incidentes que a pesar del análisis técnico y funcional o de la fábrica, se desconoce la causa raíz; también están en esta categoría el análisis de incidentes reportados como repetitivos, de los cuales se tiene un proceso de solución alterna no definitiva (workaround) para dar continuidad a la operación.
Protocolo	Lenguaje de comunicación entre dispositivos que ha sido estandarizado.
PSU	Power Supply Unit – Unidad / Fuente de alimentación.

Término	Definición
Red San	(Storage Área Network, red de área de almacenamiento) es una red de almacenamiento integral.
Resolución	Medida del más pequeño detalle que se puede visualizar en una imagen.
Robotización	Aplica cuando las imágenes por segundo de la Cámara no son constantes o no son enviadas en relación con lo configurado en los fps (frames per seconds), es decir una transmisión de imágenes por segundo 30 fps, no debe estar variando a valores menores porque se observan imágenes cuadro por cuadro.
Ruido	Efecto en pantalla que muestra elementos que no son parte de la imagen útil, como puntos, llovizna, nieve, ondas y rayas.
Savvi	Video Analytics Software Solution.
Señal Digital	Una señal que ha sido convertida en “datos” y la conforma información binaria, es decir “1” y “0”.
Shutter	Circuito electrónico presente en muchos sensores CCD / CMOS de las cámaras que permite la regulación de la sensibilidad luminosa simulando una cortina que se abre y se cierra, así el sensor recibe el promedio de luz que “se deja pasar”.
Sincronización	Dos o más impulsos eléctricos que se ejecutan con los mismos intervalos de tiempo para evitar la distorsión de imagen y el ruido.
Teamviewer	Es un software informático “privado” de fácil acceso, que permite conectarse remotamente a otro equipo.
TVL	Televisión Lines – (Líneas de Televisión) Describe la resolución de una cámara o un monitor análogos.
Varifocal	Tipo de objetivo / lente que permite la regulación manual entre dos puntos focales para obtener el campo de visión deseado. Permite ajustar entre tomas más cercanas o lejanas.
VPN	Virtual Private Network (VPN), es una tecnología de red de computadoras que Permite una extensión segura de la red de área local (LAN) sobre una red pública o no controlada como Internet.

Tabla 2. Glosario.

5. Descripción del Proyecto

Desarrollar el proyecto para bienes y servicios de videovigilancia ciudadana que consiste en la ejecución de las labores relacionadas con *"Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo, soporte y gestión al sistema de videovigilancia ciudadana de Bogotá D.C., con disponibilidad de bolsa de repuestos".*

Ítem	Subsistema de Video Vigilancia	Cantidad de ubicaciones	Cantidad de puntos de cámara	Visualizadas en Centros de Monitoreo	Visualizadas localmente
1	Vigilancia Ciudadana	4451	4451	4451	0
2	Instituciones Educativas Distritales	98	235	235	0
3	Transmilenio	7	164	164	0
4	Centro de Atención Inmediata (CAI)	157	510	0	510
5	Estadio El Campín	1	58	0	58
6	CTP	1	104	0	104
7	Estaciones de Policía	24	302	0	302
Total		**4739**	**5824**	**4850**	**974**

Tabla 3. Descripción del proyecto.

5.1. Características técnicas del proyecto

A continuación, se presentan los esquemas de conexión del Sistema de Videovigilancia y subsistemas de la solución tecnológica requerida por la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia.

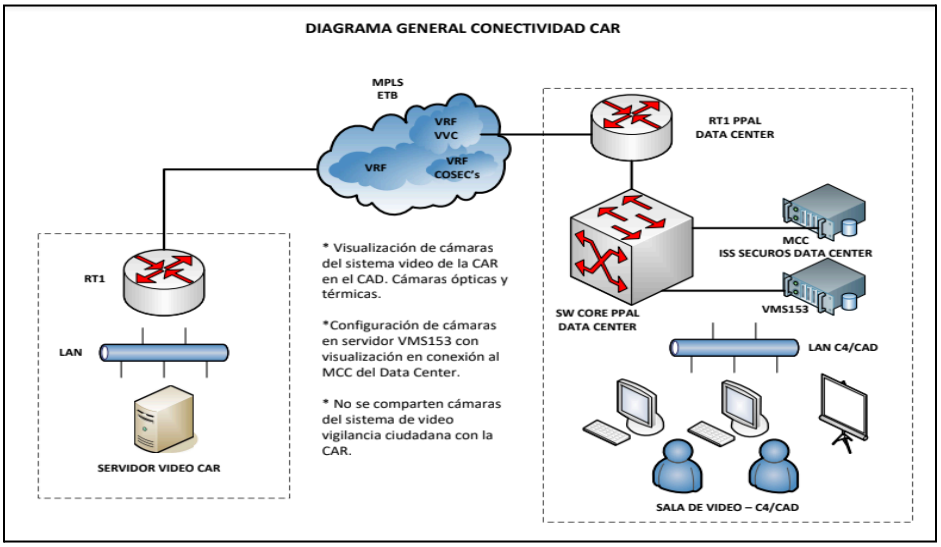


Imagen 1. Esquema de conexión CAR.

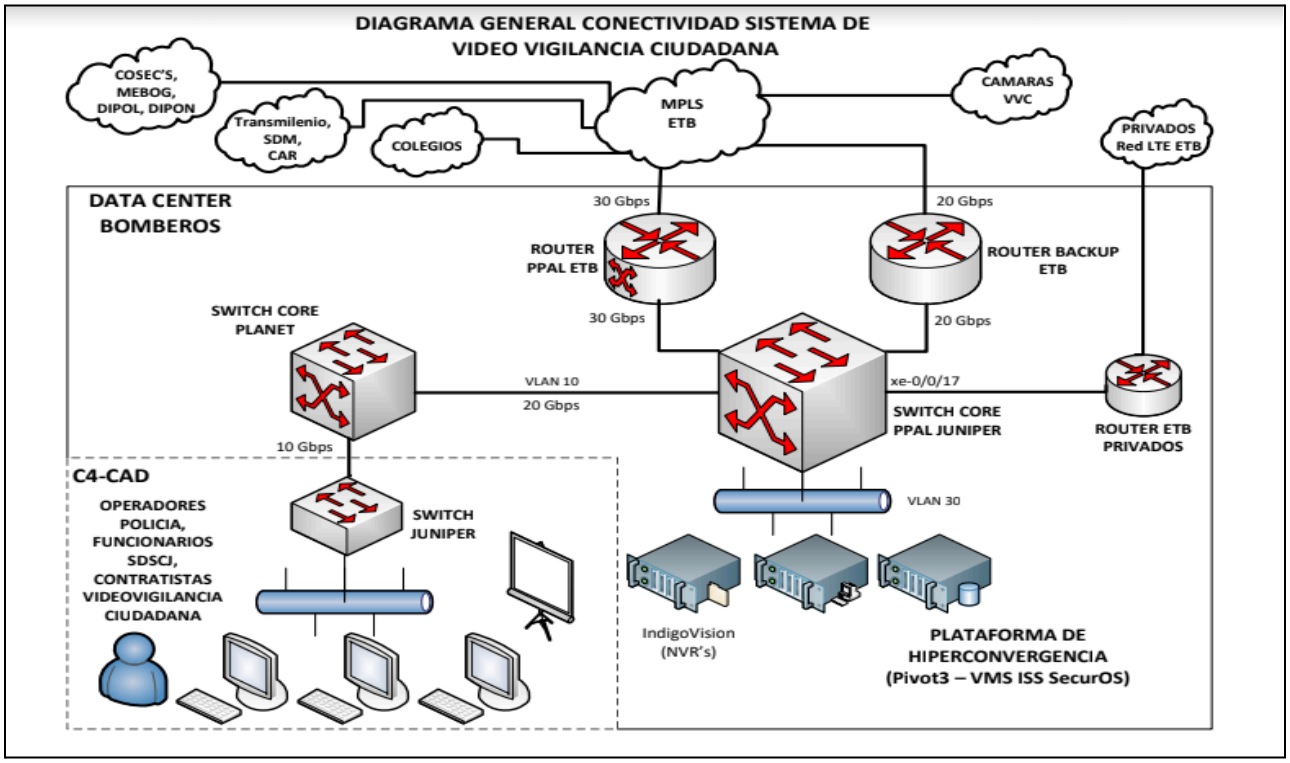


Imagen 2. Esquema de conexión conectividad SVV.

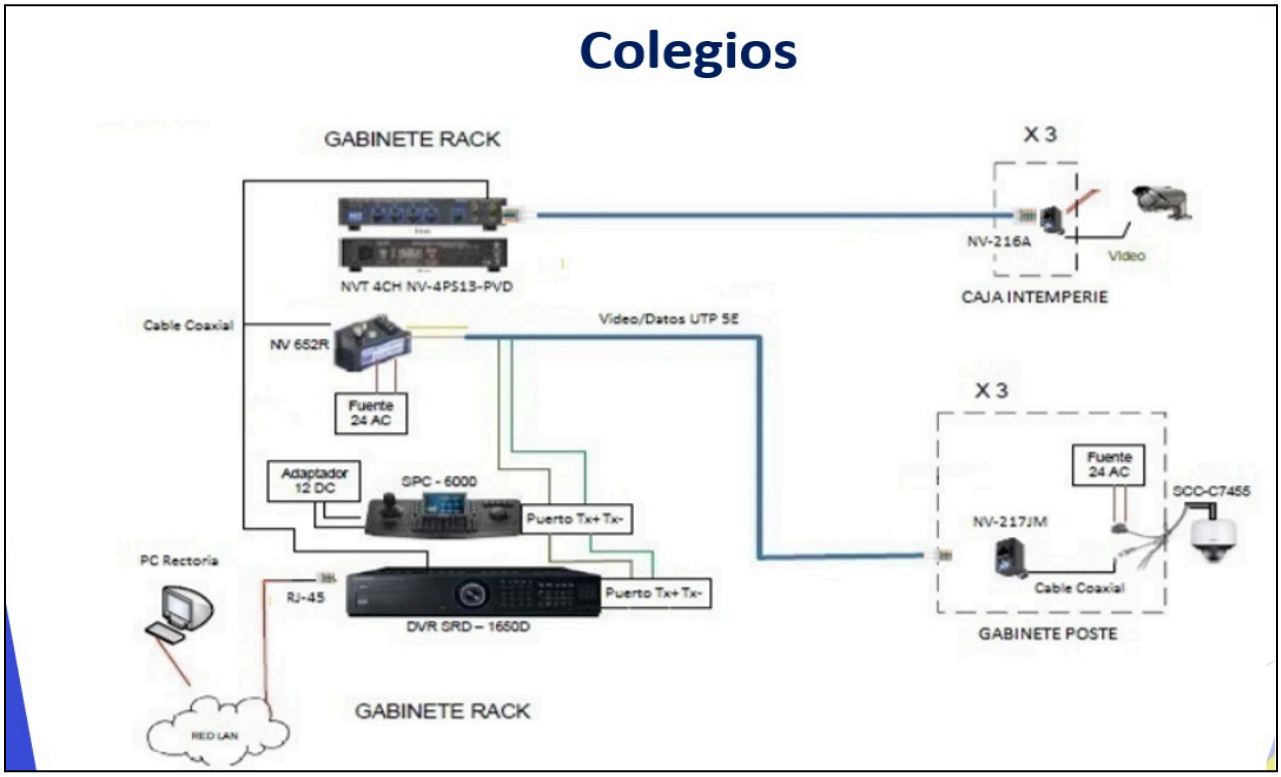


Imagen 3. Esquema de conexión colegios.

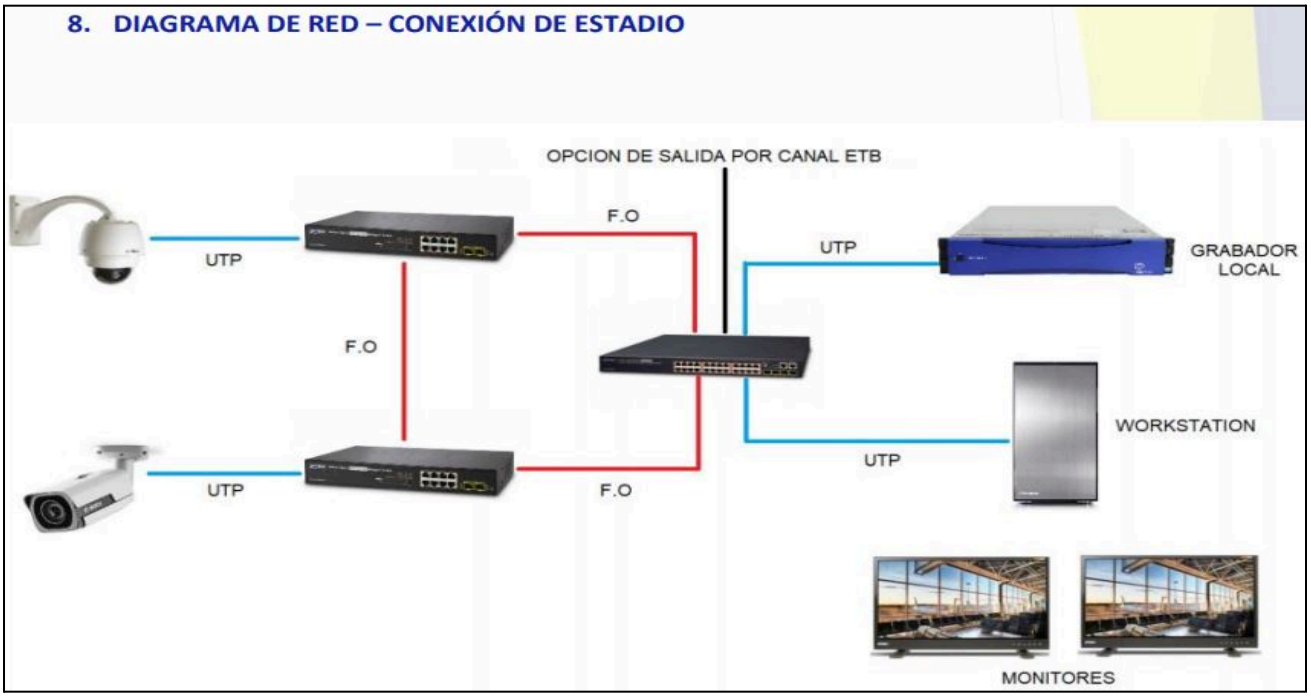


Imagen 4. Esquema de conexión estadio el campín.

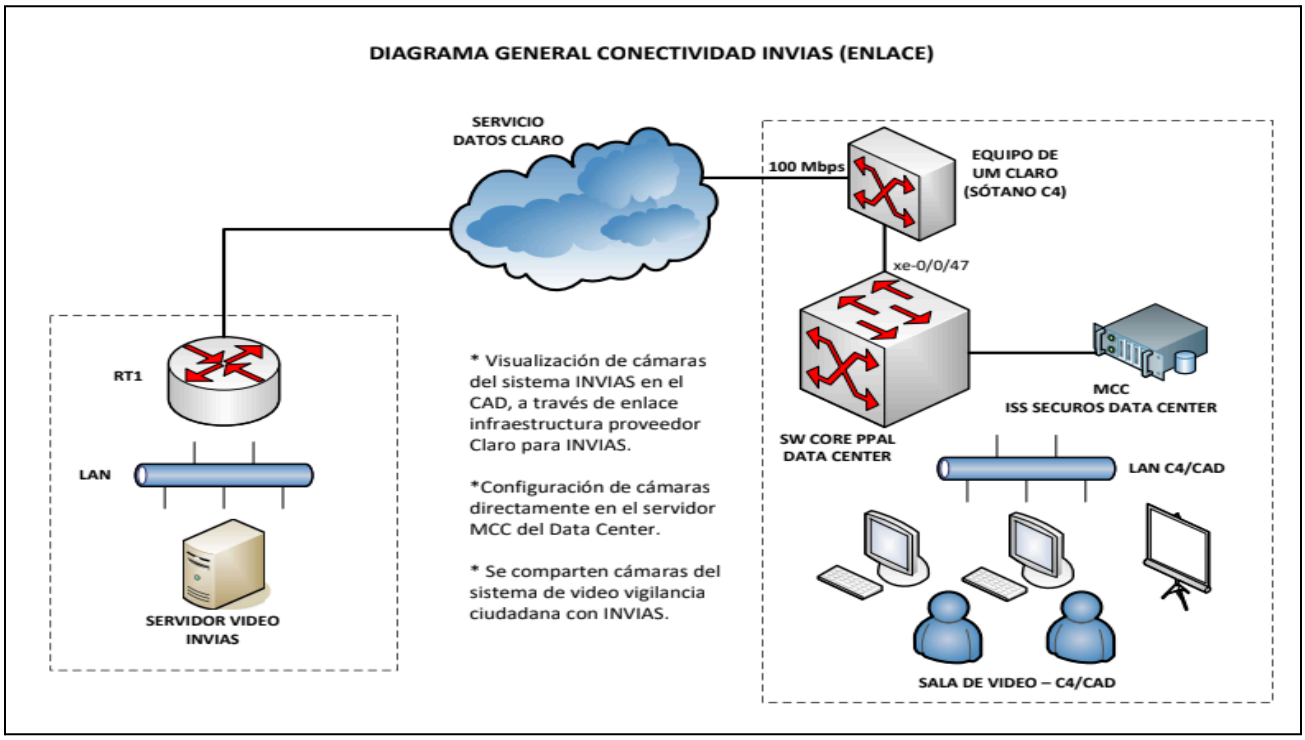


Imagen 5. Esquema de conexión invias - enlace.

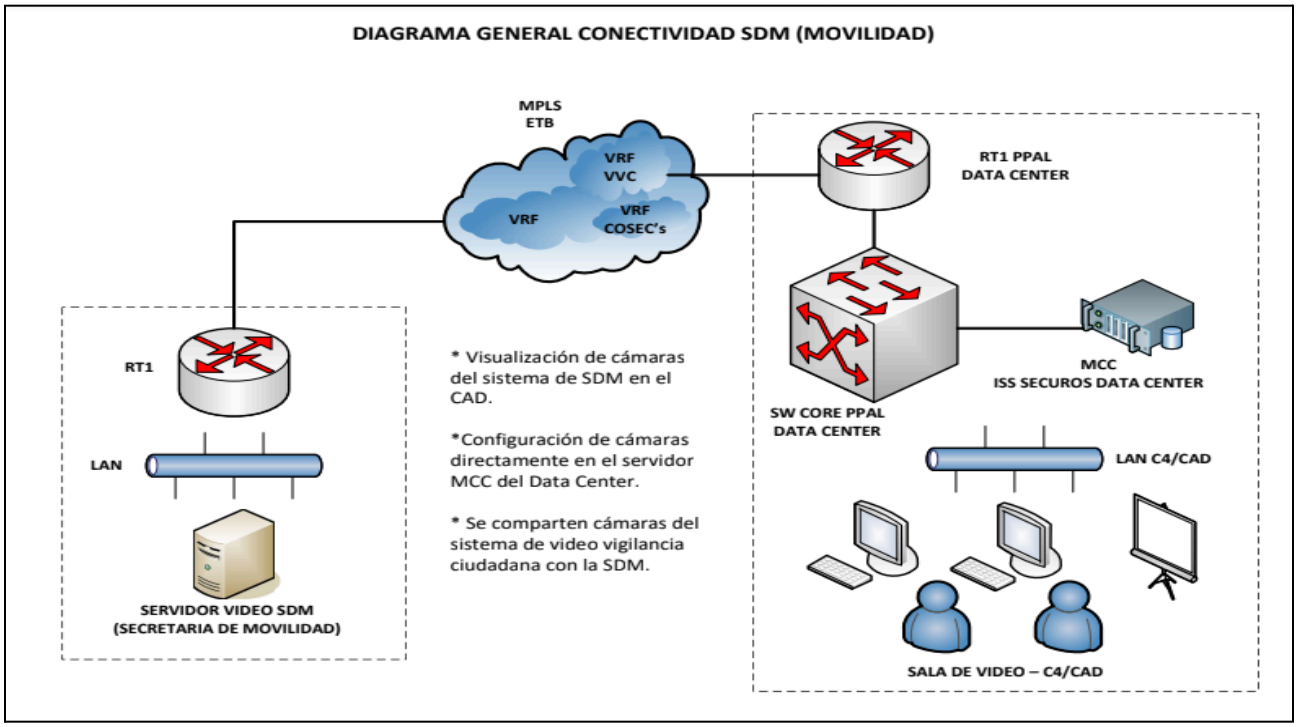


Imagen 6. Esquema de conexión SDM - movilidad.

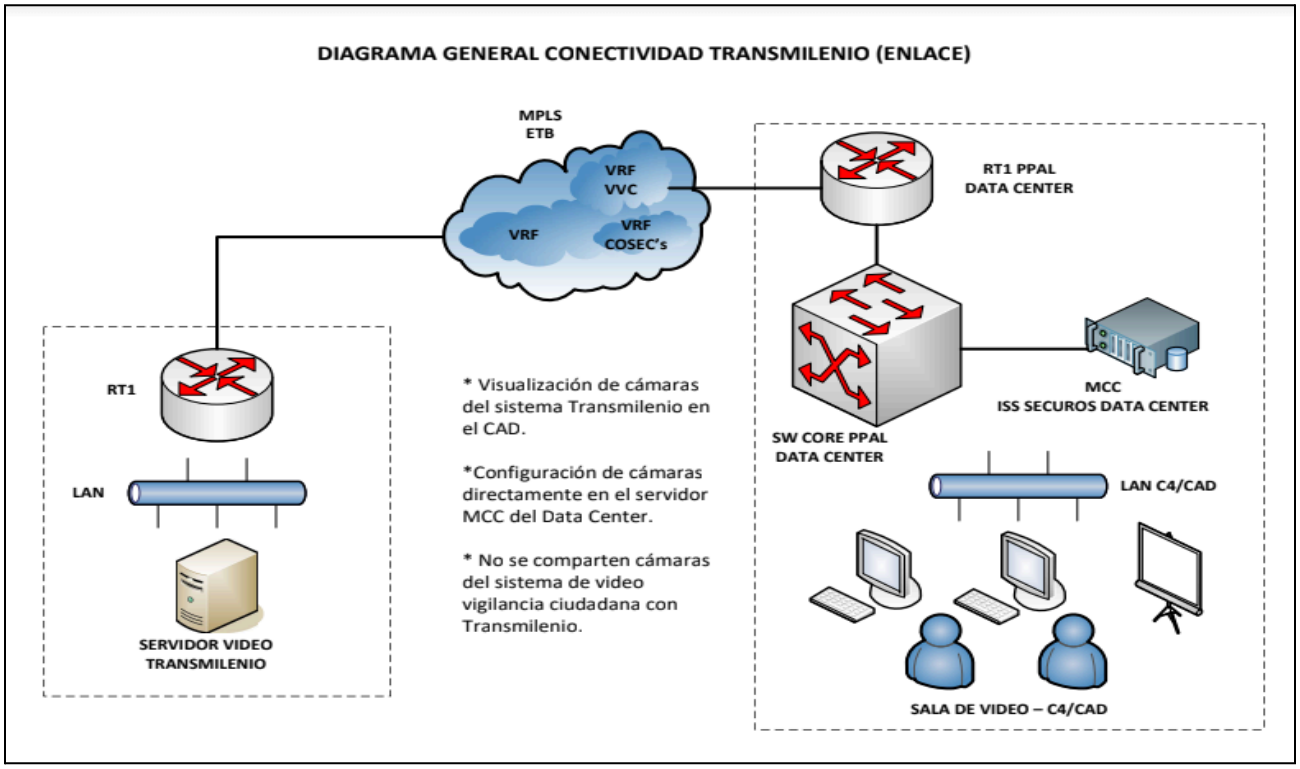


Imagen 7. Esquema de conexión transmilenio - enlace.

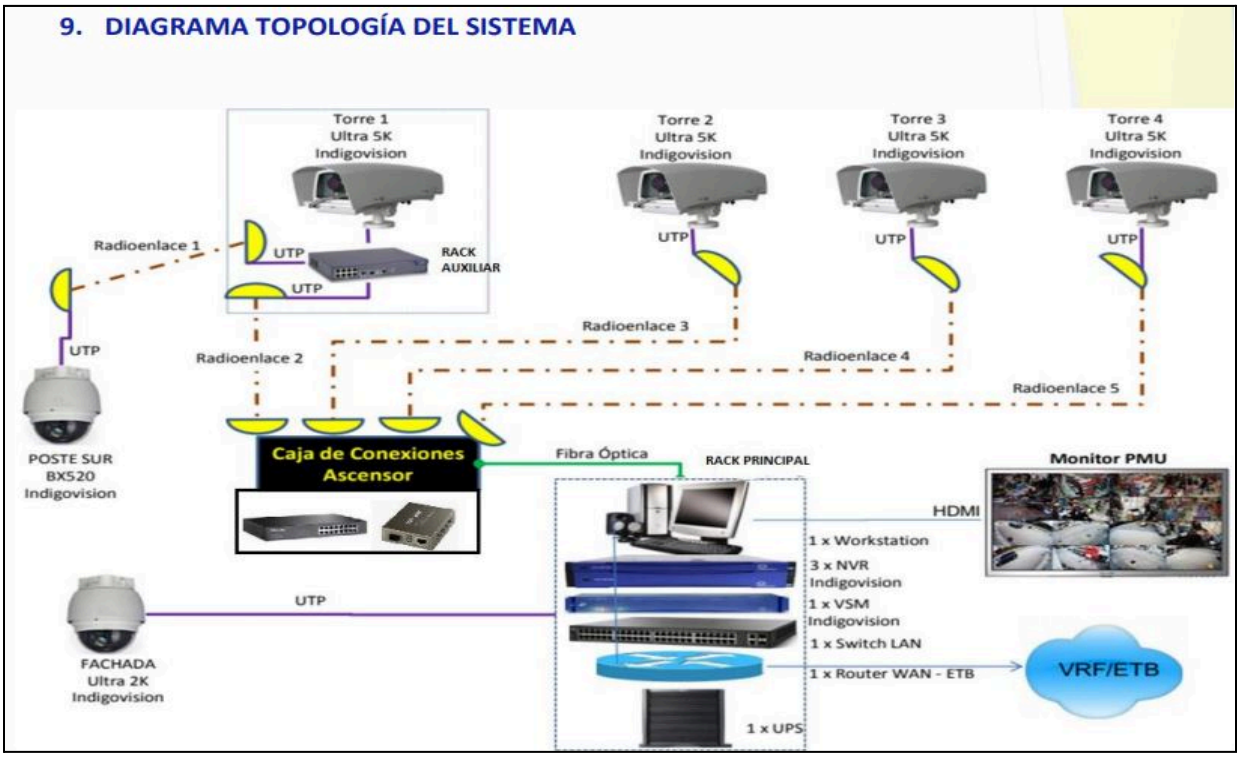


Imagen 8. Topología sistema estadio el campín.

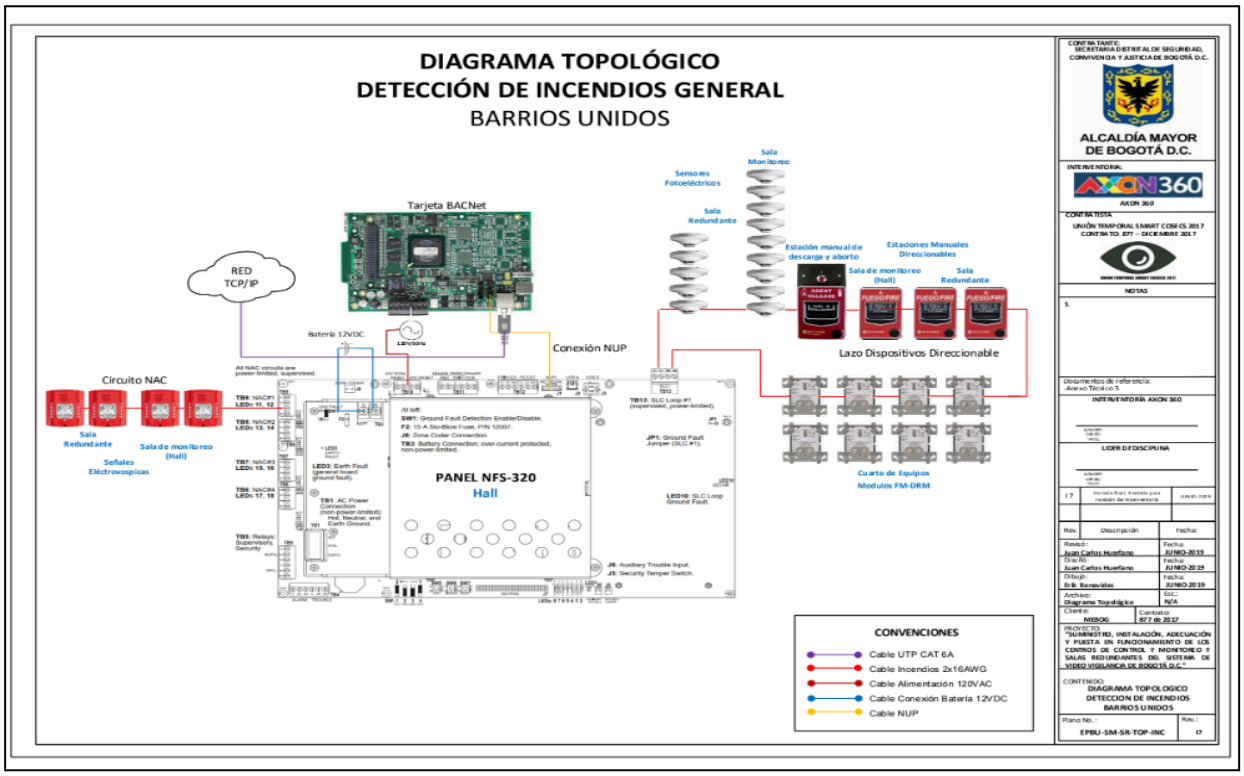


Imagen 9. Diagrama topología incendio barrios unidos.

6. Obligaciones Contractuales

Item	Obligación	Periodicidad	Cumplió / No Cumplió	Observaciones	Responsable
Obligaciones Generales					
1	Acatar la Constitución, la Ley, las normas legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y Distrital, y demás disposiciones pertinentes.	Permanente	Cumplió	Seguritech ha cumplido, acatando la constitución, la ley, las normas legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y Distrital y demás disposiciones pertinentes. Seguritech no tiene conocimiento de ningún requerimiento o solicitud que vaya en contravía de esta obligación.	Coordinador del proyecto

Item	Obligación	Periodicidad	Cumplió / No Cumplió	Observaciones	Responsable
2	Cumplir con lo previsto en las disposiciones de las especificaciones esenciales, así como en la propuesta presentada.	Permanente	Cumplió	Seguritech ha cumplido con lo previsto en las disposiciones de las especificaciones esenciales, así como en la propuesta presentada. Seguritech no tiene conocimiento de ningún requerimiento o solicitud que vaya en contravía de esta obligación.	Coordinador del Proyecto
3	Dar cumplimiento a las obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social, Salud, pensión, aportes parafiscales, cuando haya lugar, riesgos laborales y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, la Ley 1562 de 2012, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 del 5 de marzo de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen. Complementen o modifiquen.	Mensual	Cumplió	Seguritech ha cumplido las obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social, Salud, pensión, aportes parafiscales y riesgos laborales. Los soportes se encuentran en la carpeta de la obligación general No 03.	Coordinador del Proyecto
4	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en la que se entregue la copia del contrato, deberá constituir las garantías pactadas en el mismo.	Única vez	Cumplió	Seguritech ha cumplido con las garantías pactadas en el contrato 1932 de 2022. Los soportes se encuentran en la carpeta de la obligación general No 04.	Coordinador del Proyecto

Item	Obligación	Periodicidad	Cumplió / No Cumplió	Observaciones	Responsable
5	Garantizar la calidad de los bienes y servicios contratados y responder por ello.	Mensual	Cumplió	Seguritech ha cumplido, garantizando la calidad de los bienes y servicios contratados y responde por ellos. Seguritech no tiene conocimiento de ningún requerimiento o solicitud que vaya en contravía de esta obligación. En todo caso, los bienes y servicios contratados se encuentran amparados por la póliza de cumplimiento Poliza_10_NB-100225270_6 y Poliza_24_NB-100051961_8 que se encuentra en la carpeta de la obligación general No 05.	Coordinador del Proyecto
6	Colaborar con la entidad para que el objeto contratado cumpla y que este sea el de mejor calidad.	Permanente	Cumplió	Seguritech ha colaborado con la SDSCJ, desarrollando de forma óptima el objeto contratado, garantizando los mejores estándares de calidad en el servicio, durante la ejecución contractual. Seguritech no tiene conocimiento de ningún requerimiento o solicitud que vaya en contravía de esta obligación, tal como se evidencia en las actas del servicio ejecutadas a la fecha, que se encuentra en la carpeta de la obligación general No 06.	Coordinador del Proyecto

Item	Obligación	Periodicidad	Cumplió / No Cumplió	Observaciones	Responsable
7	Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta, y de manera general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse.	Permanente	Cumplió	Seguritech ha cumplido acatando las órdenes que durante el desarrollo del contrato la entidad le ha impartido, y de manera general, ha obrado con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse. Seguritech no tiene conocimiento de ningún requerimiento o solicitud que vaya en contravía de esta obligación.	Coordinador del Proyecto y Coordinador Mesa de Servicios
8	Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, a la INTERVENTORÍA o SUPERVISIÓN del contrato.	Cuando aplique	Cumplió	Seguritech ha cumplido, reportando cualquier novedad o anomalía a la supervisión, durante la ejecución del contrato. Los soportes se encuentran en la carpeta de la obligación general No 8, en el mes reportado.	Coordinador Mesa de Servicios
9	Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada.	Permanente	Cumplió	Seguritech ha cumplido, guardando total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de nuestras actividades obtenga. Seguritech no tiene conocimiento de ningún requerimiento o solicitud que vaya en contravía de esta obligación. Se anexan acuerdos de confidencialidad, en la carpeta de la obligación general No 09.	Coordinador del Proyecto y Coordinador Mesa de Servicios

Item	Obligación	Periodicidad	Cumplió / No Cumplió	Observaciones	Responsable
10	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta la SDSCJ por conducto de la INTERVENTORÍA o SUPERVISIÓN del contrato.	Permanente	Cumplió	Seguritech ha cumplido, acatando las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparte la SDSCJ por conducto de la INTERVENTORÍA o SUPERVISIÓN del contrato. Seguritech no tiene conocimiento de ningún requerimiento o solicitud que vaya en contravía de esta obligación.	Coordinador del Proyecto y Coordinador Mesa de Servicios
11	En cumplimiento de la Directiva Distrital No. 003 del 2012, el contratista se obliga: a). Velar por el respeto de los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores que utilice para la ejecución del contrato, para lo cual, eliminará formas de contratación lesivas para los derechos laborales de los trabajadores. b). Velar por el respeto de la legislación laboral vigente e incentivar la mejor oferta laboral y prestacional que garantice el acceso a mejores oportunidades de trabajo. El incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas en el presente numeral ocasionará el inicio de procesos sancionatorios, conforme con la normatividad vigente, esto es, la imposición de	Mensual	Cumplió	Seguritech en cumplimiento de la Directiva Distrital No. 003 del 2012, ha velado por el respeto de los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores que participan en la ejecución del contrato y no tiene formas de contratación lesivas para los derechos laborales de los trabajadores. Además, ha velado por el respeto de la legislación laboral vigente e incentivar la mejor oferta laboral y prestacional que garantice el acceso a mejores oportunidades de trabajo. Seguritech no tiene conocimiento de ningún requerimiento o solicitud que vaya en contravía de esta obligación.	Coordinador del Proyecto

Item	Obligación	Periodicidad	Cumplió / No Cumplió	Observaciones	Responsable
	multas o la declaratoria de incumplimiento haciendo efectiva la cláusula penal pecuniaria, si es el caso.				
12	Dar cumplimiento a los dispuesto en la Circular No. 1 de 2011 expedida por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., en el sentido de no contratar a menores de edad, en cumplimiento de los pactos, convenios y convenciones internacionales ratificados por Colombia, según lo establece la Constitución Política de 1991 y demás normas vigentes sobre la materia, en particular aquellas que consagran los derechos de los niños.	Mensual	Cumplió	Seguritech ha cumplido, con lo dispuesto en la Circular No. 1 de 2011 expedida por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., en el sentido de no contratar a menores de edad, en cumplimiento de los pactos, convenios y convenciones internacionales ratificados por Colombia, según lo establece la Constitución Política de 1991 y demás normas vigentes sobre la materia. Seguritech no tiene conocimiento de ningún requerimiento o solicitud que vaya en contravía de esta obligación.	Coordinador de Proyecto
13	Aportar la documentación requerida para suscribir oportunamente el Acta de Inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente con la INTERVENTORÍA o SUPERVISIÓN del mismo, cuando corresponda.	Cuando aplique	Cumplió	Seguritech ha cumplido aportando la documentación requerida para suscribir oportunamente el Acta de Inicio del contrato, conjuntamente con la INTERVENTORÍA o SUPERVISIÓN. Los soportes se encuentran en la carpeta de la obligación general No 13.	Coordinador del Proyecto

Item	Obligación	Periodicidad	Cumplió / No Cumplió	Observaciones	Responsable
14	Cumplir con lo previsto en las disposiciones de las especificaciones esenciales, así como en la propuesta presentada.	Permanente	Cumplió	Seguritech ha cumplido con lo previsto en las disposiciones de las especificaciones esenciales, así como en la propuesta presentada. En las conciliaciones financieras se revisan los precios de acuerdo a la propuesta presentada y estos son validados por la supervisión. Seguritech no tiene conocimiento de ningún requerimiento o solicitud que vaya en contravía de esta obligación.	Coordinador del Proyecto y Coordinador Mesa de Servicios
15	Cumplir con las normas sanitarias y de bioseguridad dispuestas por el Gobierno Nacional y Gobierno Distrital con relación a la pandemia global del COVID-19	Permanente	Cumplió	Seguritech ha cumplido con las normas sanitarias y de bioseguridad dispuestas por el Gobierno Nacional y Gobierno Distrital con relación a la pandemia global del COVID-19, mediante oficio SGT-SDSCJ-412-23, donde se encuentra el Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. El protocolo de bioseguridad, se encuentra en la carpeta de la obligación general No 15.	Coordinador del Proyecto, Coordinador Mesa de Servicios y Profesional de SSTA

Item	Obligación	Periodicidad	Cumplió / No Cumplió	Observaciones	Responsable
16	Acatar la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, mediante los cuales se desarrolla el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, suprimir, actualizar y rectificar todo tipo de datos personales recolectados, almacenados o que hayan sido objeto de tratamiento en bases de datos en las entidades públicas y privadas.	Cuando aplique	Cumplió	Seguritech cuenta con una política de tratamiento de datos, acorde a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, tal como se puede evidenciar en su página WEB https://seguritech.com/aviso-privacidad. Seguritech no tiene conocimiento de ningún requerimiento o solicitud que vaya en contravía de esta obligación.	Coordinador del Proyecto, Coordinador Mesa de Servicios y Profesional de SSTA
17	Dar cumplimiento al Decreto 332 de 2020, garantizando la vinculación de mujeres para la ejecución del objeto contractual en un porcentaje mínimo de 43,5% teniendo en cuenta factores que acentúan su vulnerabilidad, como la condición de víctima del conflicto armado, las discapacidades, ser mujer jefa de hogar, entre otras. Esta vinculación será verificada a través de la interventoría o supervisión en los porcentajes establecidos en la citada norma.	Permanente	Cumplió	Seguritech da cumplimiento al decreto 332 de 2020, garantizando la vinculación de mujeres para la ejecución del objeto contractual en el porcentaje mínimo de 43,5% teniendo en cuenta factores que acentúan su vulnerabilidad, como la condición de víctima del conflicto armado, las discapacidades, ser mujer jefe de hogar, entre otras. Los soportes se encuentran en la carpeta de la obligación general No 17,	Coordinador del Proyecto
Obligación específica					
1	Ejecutar el contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas	Mensual	Cumplió	Se cumple con lo dispuesto en la obligación específica No. 1, teniendo en cuenta que se	Coordinador del Proyecto, Coordinador

Item	Obligación	Periodicidad	Cumplió / No Cumplió	Observaciones	Responsable
	descritas en los anexos del pliego de condiciones que hacen parte de este documentos así: el ANEXO 1 – Especificaciones Técnicas y el ANEXO 2 – Bolsa de Repuestos, ANEXO No 3 Especificaciones técnicas mesa de servicio, ANEXO No 4 especificaciones laboratorio, ANEXO No 5 Matriz de riesgo, ANEXO No 6 ANS, ANEXO No 7 inventario de cámaras por garantía y Anexo 8 Análisis del sector y estudio del mercado y demás documentos que lo componen.			ha dado cumplimiento a todos los anexos del contrato, mediante la correcta aplicación de mantenimientos preventivos, correctivos, limpieza de acrílicos y la utilización de bolsa de repuestos acorde a los diagnósticos efectuados. Así mismo, la Mesa de Servicio estuvo disponible 24*7, en la cual se realizó seguimiento y control mediante la aplicación Citronella, a los servicios prestados, actualización de inventario y registro permanente de hoja de vida de los puntos de video vigilancia. De igual forma se generaron los respectivos conceptos técnicos por parte del laboratorio y trámite de RMA requeridos.	Mesa de Servicios y Profesional de SSTA
2	Disponer del personal mínimo requerido desde el momento de inicio del contrato para realizar el empalme de actividades del contrato anterior y garantizar el correcto recibo y ejecución del objeto contractual.	Mensual	Cumplió	Seguritech ha cumplido con el personal mínimo requerido desde el momento de inicio del contrato y garantiza la correcta ejecución del objeto contractual, se adjuntan oficios SGT-SDSCJ-204-22, SGT-SDSCJ-213-22, SGT-SDSCJ-351-23, SGT-SDSCJ-547-23 y SGT-SDSCJ-561-23 donde se evidencian el personal con sus respectivos soportes y HV del personal mínimo requerido actualizado. Los soportes se encuentran en la carpeta de la obligación específica No 02.	Coordinador del Proyecto

Item	Obligación	Periodicidad	Cumplió / No Cumplió	Observaciones	Responsable
3	Cumplir con los Acuerdos de Niveles de Servicio.	Mensual	Cumplió	Seguritech ha acatado los acuerdos de niveles de servicio con sus respectivas penalidades, mediante los documentos de conciliación técnica y financiera. Los soportes se encuentran en la carpeta de la obligación específica No 03, de cada mes.	Coordinador Mesa de Servicios
4	Presentar, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, para aprobación de la INTERVENTORÍA o SUPERVISIÓN, informes técnicos mensuales sobre la ejecución de las actividades.	Mensual	Cumplió	Seguritech ha cumplido con la presentación de los informes técnicos mensuales, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes, para aprobación de la INTERVENTORÍA o SUPERVISIÓN. Los soportes se encuentran en la carpeta de la obligación específica No 04 de cada mes.	Coordinador Mesa de Servicios
5	Presentar informe final (al finalizar el contrato, previa validación de la INTERVENTORÍA o SUPERVISIÓN) sobre las actividades realizadas durante la ejecución del contrato, entregando los respectivos soportes y documentación de la ejecución y cierre del contrato. Esto se hará con 8 días calendario al vencimiento del plazo de ejecución del contrato, para permitir la revisión y visto bueno por parte de la INTERVENTORÍA o SUPERVISIÓN. En caso de que se presente algún evento durante este	Cuando aplique	Cumplió	Seguritech ha cumplido, entregando el informe final con el oficio SGT-SDSCJ-829-23 al cual se le dió alcance mediante el oficio SGT-SDSCJ-866-23. Adicionalmente en mesas de trabajo se revisaron los archivos que consolidan la información de ejecución acorde al numeral 13 y 29 de la cláusula octava. “OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA”.	Coordinador Mesa de Servicios

Item	Obligación	Periodicidad	Cumplió / No Cumplió	Observaciones	Responsable
	tiempo y hasta el día de finalización del contrato, se adjuntará su descripción y soportes (según si se trata de visitas, uso de la bolsa de repuestos, adición de repuestos a esta y demás actividades que son parte del objeto contractual) como una adenda a dicho informe.				
6	Disponer de una línea de atención telefónica y correo electrónico para la recepción de peticiones, quejas y reclamos durante el plazo de ejecución del contrato, operando las 24 horas de forma ininterrumpida. El tiempo máximo entre la atención, diagnóstico y solución total de los incidentes o fallas del sistema instalado será de máximo seis (6) horas. Tanto la línea telefónica como el correo electrónico deben estar en pleno funcionamiento a partir del día de suscripción del acta de inicio del contrato, junto a especificaciones de la mesa de servicio descritos en el anexo 3.	Permanente	Cumplió	Seguritech ha cumplido con la disposición de la línea telefónica 310 2333847 y correo electrónico mesa.ayudac4@seguritech.com, disponible las 24 horas, cumpliendo con los tiempos de atención. Los soportes se encuentran en la obligación específica No 06. Seguritech no tiene conocimiento de ningún requerimiento o solicitud que vaya en contravía de esta obligación.	Coordinador Mesa de Servicios
7	Presentar, para aprobación de la INTERVENTORÍA o SUPERVISIÓN, dentro de los diez (10) primeros	Única vez	Cumplió	Seguritech ha cumplido con la presentación para aprobación de la INTERVENTORÍA o SUPERVISIÓN, dentro de los diez (10) primeros días	Coordinador del Proyecto

Item	Obligación	Periodicidad	Cumplió / No Cumplió	Observaciones	Responsable
	días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, el “Plan de Gestión” del Contrato el cual deberá contener como mínimo; a) Plan de adquisiciones, b) EDT (Estructura de Descomposición de Trabajo), c) Cronograma, d) Plan de Gestión de Calidad, e) Plan de Comunicaciones, f) Plan de Gestión de Riesgos g) Plan de Capacitación, h) Plan de Mantenimiento, i) Plan de Manejo de Tráfico, j) Plan de Manejo Ambiental k) Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. l) El contratista, dentro del Plan de Gestión del Proyecto, deberá presentar para aprobación de la INTERVENTORÍA o SUPERVISIÓN, todos los informes, formularios, formatos y en general (Anexo 1 – Especificaciones Técnicas), todos los reportes a los que les será aplicable la medición del ANS. m) Plan de Operación de la mesa de servicio.			hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, con el “Plan de Gestión” del contrato, mediante oficio SGT-SDSCJ-025-22, estos planes fueron actualizados y subsanados con los oficios SGT-SDSCJ-310-23, SGT-SDSCJ-313-23, SGT-SDSCJ-412-23, SGT-SDSCJ-478-23, SGT-SDSCJ-609-23 y SGT-SDSCJ-680-23. Los soportes se encuentran en la carpeta de la obligación específica No 07.	

Item	Obligación	Periodicidad	Cumplió / No Cumplió	Observaciones	Responsable
8	Acatar las medidas y protocolos pertinentes, dando cumplimiento a la legislación vigente relacionada con la Emergencia Nacional por COVID-19. En todo caso, los protocolos y su cumplimiento será objeto de aprobación y seguimiento por parte de la Interventoría del contrato.	Permanente	Cumplió	Seguritech ha cumplido con las medidas y protocolos pertinentes, dando cumplimiento a la legislación vigente relacionada con la emergencia nacional por COVID-19, mediante oficio SGT-SDSCJ-025-22, el cual fue actualizado y subsanado mediante el oficio SGT-SDSCJ-310-23, SGT-SDSCJ-313-23, SGT-SDSCJ-412-23, SGT-SDSCJ-478-23, SGT-SDSCJ-609-23 y SGT-SDSCJ-680-23. El protocolo de bioseguridad actualizado, se encuentra en la carpeta de la obligación específica No 08.	Profesional de SSTA
9	Entregar las hojas de vida, documentos y/o certificados que acrediten el perfil del personal descrito en el Anexo 1. Anexo Técnico, para la suscripción del acta de inicio.	Cuando aplique	Cumplió	Seguritech ha cumplido, entregando las hojas de vida y/o certificados que garantizan el perfil del personal descrito en el Anexo 1 para la suscripción del acta de inicio, mediante los oficios SGT-SDSCJ-001-22, SGT-SDSCJ-204-22, SGT-SDSCJ-213-22, SGT-SDSCJ-351-23, SGT-SDSCJ-547-23 y SGT-SDSCJ-561-23 donde se evidencia el personal con sus respectivos soportes y HV del personal mínimo requerido actualizado. Los soportes se encuentran en la carpeta obligación específica No 09.	Coordinador del Proyecto

Item	Obligación	Periodicidad	Cumplió / No Cumplió	Observaciones	Responsable
10	Garantizar que cada miembro del personal designado por el contratista cuente permanentemente con los elementos necesarios para la ejecución del contrato (EPP, insumos, identificativos y herramientas). El personal debe acatar las medidas y protocolos pertinentes, dando cumplimiento a la legislación vigente relacionada con la Emergencia Nacional por COVID-19. En todo caso, los protocolos y su cumplimiento será objeto de aprobación y seguimiento por parte de la Interventoría o supervisión del contrato).	Permanente	Cumplió	Seguritech ha cumplido garantizando que el personal designado para la ejecución del contrato cuente permanentemente con los elementos necesarios para la ejecución del contrato (EPP, insumos, identificativos y herramientas), acatando las medidas y protocolos pertinentes, dando cumplimiento a la legislación vigente relacionada con la Emergencia Nacional por COVID-19, mediante oficio SGT-SDSCJ-025-22, el cual fue actualizado y subsanado mediante el oficio SGT-SDSCJ-310-23, SGT-SDSCJ-313-23, SGT-SDSCJ-412-23, SGT-SDSCJ-478-23, SGT-SDSCJ-609-23 y SGT-SDSCJ-680-23. El protocolo de bioseguridad, se encuentra en la carpeta de la obligación específica No 10 y se hace el seguimiento respectivo en el ítem 14 de este informe.	Profesional de SSTA
11	Adelantar todos los trámites y solicitudes pertinentes ante las entidades públicas y/o terceros que intervengan o se requieran para el adecuado funcionamiento y servicio del sistema de video vigilancia.	Cuando aplique	Cumplió	Seguritech ha cumplido, adelantando trámites y solicitudes pertinentes ante las entidades públicas y/o terceros que intervengan o se requieran para el adecuado funcionamiento y servicio del sistema de videovigilancia durante la ejecución de contrato. Los soportes se encuentran en la carpeta de la obligación específica No 11 de cada mes.	Coordinador Mesa de Servicios

Item	Obligación	Periodicidad	Cumplió / No Cumplió	Observaciones	Responsable
12	Garantizar que las actividades de mantenimiento aseguren la operación y funcionamiento de la solución suministrada conforme se especifica en los anexos que hacen parte integral del proceso.	Permanente	Cumplió	Seguritech ha cumplido, garantizando que las actividades de mantenimiento aseguren la operación y funcionamiento de la solución suministrada conforme se especifica en los anexos que hacen parte integral del proceso, tal como se soporta mediante los documentos de conciliación técnica y las actas de los servicios. Los soportes se encuentran en la carpeta de la obligación específica, No 12 de cada mes.	Coordinador Mesa de Servicios
13	Entregar documentación completa (fotografías, actas, manuales y catálogos etc. con las fechas y parámetros indicados en el Anexo 1 – Especificaciones Técnicas de manera impresa y digital, de las actividades de mantenimiento realizadas.	Permanente	Cumplió	Seguritech ha cumplido, entregando la documentación completa, de acuerdo con las especificaciones técnicas del Anexo 1, de las actividades de mantenimientos correctivos, mediante los documentos de conciliación técnica, conciliación financiera, actas de servicio y manuales de equipos. Los soportes se encuentran en la carpeta de la obligación específica No 13 de cada mes.	Coordinador Mesa de Servicios
14	Atender las sugerencias que, para el mejor y óptimo desarrollo del contrato, le formule quien ejerce la INTERVENTORÍA o SUPERVISIÓN del mismo.	Permanente	Cumplió	Seguritech ha cumplido, atendiendo las sugerencias que, para el mejor y óptimo desarrollo del contrato, formuló supervisión. Los soportes se encuentran en la carpeta obligación específica No 14 de cada informe mensual.	Coordinador del Proyecto

Item	Obligación	Periodicidad	Cumplió / No Cumplió	Observaciones	Responsable
15	Una vez instalado el equipo y/o elemento, el contratista deberá demostrar su correcta operatividad, elaborar un informe de entrega y recibo a satisfacción firmada por el personal designado por el usuario final, el contratista y la INTERVENTORÍA o SUPERVISIÓN. El término para la entrega de dicho informe es de máximo 5 días hábiles una vez culminada la actividad. Dicho informe debe contener la totalidad de los elementos suministrados con su nombre, marca, modelo, número de serie y valor unitario.	Cuando aplique	Cumplió	Seguritech ha cumplido, entregando las actas de mantenimiento donde se evidencia la operatividad de los equipos, una vez finalizada la prestación del servicio, mediante las actas de servicio y oficios de evidencia de la operatividad de los equipos. Los soportes se encuentran en la carpeta obligación específica N° 15 de cada mes.	Coordinador Mesa de Servicios
16	Verificar y diagnosticar las instalaciones eléctricas y lógicas necesarias para la conexión de la solución o equipo, siguiendo las mejores prácticas.	Cuando aplique	Cumplió	Seguritech ha cumplido, verificando y diagnosticando las instalaciones eléctricas y lógicas necesarias para la conexión de la solución o equipo, siguiendo las mejores prácticas y enviando los soportes a la SDSCJ. La información se encuentra en la carpeta de la obligación específica No 16 de cada mes.	Coordinador del Proyecto

Item	Obligación	Periodicidad	Cumplió / No Cumplió	Observaciones	Responsable
17	Mantener actualizado en línea y en tiempo real la información como el estado de visualización de las cámaras y los tickets en el aplicativo web o sistema de información que indique la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.	Permanente	Cumplió	Seguritech ha cumplido, actualizando en línea y en tiempo real la información sobre el estado de visualización de las cámaras y los tickets en el aplicativo web Citronella. El estado de visualización de cámaras y estado de los tickets se registraron en el tablero de control del proyecto y en el repositorio se adjuntaron los soportes de cada mes.	Coordinador Mesa de Servicios.
18	Realizar de común acuerdo con la INTERVENTORÍA o SUPERVISIÓN del contrato, reuniones de seguimiento al contrato atendiendo las observaciones presentadas por la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, para tomar las acciones que se deriven de la ejecución del contrato.	Semanal	Cumplió	Seguritech ha cumplido realizando las reuniones de seguimiento al contrato en conjunto con la supervisión, atendiendo las observaciones presentadas por la SDSCJ y tomando las acciones requeridas. Los soportes se encuentran en la carpeta de la obligación específica No 18 de cada mes	Coordinador del Proyecto
19	Suministrar a la INTERVENTORÍA o SUPERVISIÓN del contrato la información y documentación que éste requiera, sin ningún tipo de restricción o condición por parte del CONTRATISTA.	Cuando aplique	Cumplió	Seguritech ha cumplido suministrando a la supervisión del contrato la información y documentación que se requirió, sin ningún tipo de restricción o condición. Seguritech no tiene conocimiento de ningún requerimiento o solicitud que vaya en contravía de esta obligación.	Coordinador Mesa de Servicios
20	Concertar junto con la INTERVENTORÍA o	Mensual	Cumplió	Seguritech ha cumplido concertando con la	Coordinador del Proyecto

Item	Obligación	Periodicidad	Cumplió / No Cumplió	Observaciones	Responsable
	SUPERVISIÓN del contrato, el cronograma de mantenimientos preventivos mensuales, con por lo menos diez (10) días hábiles de antelación al inicio de cada mes.			INTERVENTORÍA o SUPERVISIÓN del contrato, presentando los cronogramas de mantenimientos preventivos mensuales, como se evidencia en los oficios SGT-SDSCJ-098-22, SGT-SDSCJ-297-23, SGT-SDSCJ-298-23 y SGT-SDSCJ-401-23.	
21	Cumplir con los requerimientos en seguridad y salud en el trabajo exigidos por la ley. SALUD OCUPACIONAL -Ley 1016 de 1989, Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional) y cualquier avance acorde a la Ley 1443 de julio de 2014 Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	Permanente	Cumplió	Seguritech ha cumplido con los requerimientos en seguridad y salud en el trabajo exigidos en la ley sobre Salud Ocupacional, mediante el Plan de Gestión del contrato, que fue actualizado con los oficios SGT-SDSCJ-310-23 y SGT-SDSCJ-412-23. Los soportes correspondientes, se encuentran en la carpeta de la obligación específica No 21 de cada mes.	Profesional de SSTA
22	Diseñar e implementar un programa de seguridad y salud en el trabajo que incluya lo reglamentado por las normas nacionales o departamentales o distritales y que apliquen para la gestión del trabajo seguro, en condiciones de riesgos de altura, riesgo eléctrico, etc.	Permanente	Cumplió	Seguritech ha cumplido implementando un programa de seguridad y salud en el trabajo que incluya lo reglamentado por las normas nacionales o departamentales o distritales y que apliquen para la gestión del trabajo seguro, en condiciones de riesgos de altura, riesgo eléctrico, etc., mediante el “Plan de Gestión” del contrato	Profesional de SSTA

Item	Obligación	Periodicidad	Cumplió / No Cumplió	Observaciones	Responsable
				actualizado con los oficios SGT-SDSCJ-310-23 y SGT-SDSCJ-412-23. Los soportes correspondientes, se encuentran en la carpeta de la obligación específica No 22 de cada mes.	
23	Contar con su propio sistema de información y/o aplicativo web que le permita administrar los diagnósticos, visitas y utilización de elementos de la bolsa.	Permanente	Cumplió	Se dió cumplimiento con el software de gestión Citronella. Los soportes que sustentan esta obligación se encuentran en la carpeta de la obligación específica No 23 de cada mes.	Coordinador del Proyecto
24	Actualizar de forma permanente durante la ejecución del contrato y directamente en el aplicativo (y/o en el que la SDSCJ disponga para tal fin), los siguientes atributos que corresponden a los elementos mínimos de una HOJA DE VIDA 	Cuando aplique	Cumplió	Seguritech ha cumplido porque actualiza de forma permanente durante la ejecución del contrato y directamente en el aplicativo (y/o en el que la SDSCJ disponga para tal fin), los siguientes atributos que corresponden a los elementos mínimos de una hoja de vida. La hoja de vida de los puntos de videovigilancia actualizados se ha cargado en la carpeta de la obligación específica No 24 de cada mes.	Coordinador Mesa de Servicios

Item	Obligación	Periodicidad	Cumplió / No Cumplió	Observaciones	Responsable
25	Entregar la relación de ubicación, marcas, referencias y seriales de los bienes utilizados en las visitas de mantenimiento correctivo, junto a toda la evidencia fotográfica y soportes necesarios para lograr la aprobación por parte de la INTERVENTORÍA o SUPERVISIÓN, con el fin de tramitar ingreso, dada de baja y/o actualización de los bienes en el Almacén de la SDSCJ. Corresponde al contratista de mantenimiento adelantar todos los trámites frente al almacén de la SDSCJ para mantener actualizado el inventario del sistema de video vigilancia, esta actividad deberá ser realizada mensualmente bajo la aprobación de la INTERVENTORÍA o SUPERVISIÓN.	Mensual	Cumplió	Seguritech ha cumplido porque ha entregado la relación de ubicación, marcas, referencias y seriales de los bienes utilizados en las visitas de mantenimiento correctivo, junto a toda la evidencia fotográfica y soportes necesarios, con lo cual se logró la aprobación por parte de la supervisión para el trámite de ingreso, dada de baja y/o actualización de los bienes en el Almacén de la SDSCJ, mediante los oficios correspondientes. Los soportes y oficios se encuentran en la carpeta de la obligación específica No 25 de cada mes.	Coordinador Mesa de Servicios
26	Al finalizar el contrato el contratista deberá realizar una entrega del inventario final tramitado por el almacén de la SDSCJ previa aprobación de la INTERVENTORÍA o SUPERVISIÓN.	Única vez	Cumplió	Seguritech hizo entrega de la información de la hoja de vida de mantenimiento en la cual se incluye el inventario de los elementos, estas evidencias se encuentran en la carpeta de la obligación específica No 26 de cada mes.	Coordinador Mesa de Servicios
27	Contar con la capacidad técnica y experiencia para instalar los equipos que	Permanente	Cumplió	Seguritech ha cumplido porque cuenta con la capacidad técnica y	Coordinador del Proyecto

Item	Obligación	Periodicidad	Cumplió / No Cumplió	Observaciones	Responsable
	lleguen a ser suministrados por la SDSCJ y que hagan parte integral de un punto de video vigilancia para las arquitecturas descritas en el Anexo 2.			experiencia para instalar los equipos que lleguen a ser suministrados por la SDSCJ y que hagan parte integral de un punto de video vigilancia para las arquitecturas descritas en el Anexo 2. Seguritech cuenta con personal calificado, entre los cuales se encuentra el personal mínimo requerido. Adicionalmente, contamos con un Plan de Capacitación para ingenieros y líderes, que se encuentra en el "Plan de Gestión" actualizado del contrato, con los oficios SGT-SDSCJ-310-23 y SGT-SDSCJ-412-23. Los soportes se encuentran en la carpeta de la obligación específica No 27 de cada mes.	
28	Entregar, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al requerimiento, estadísticas actualizadas del sistema de video vigilancia, las cuales podrán ser requeridas por la SDSCJ en cualquier momento de la ejecución del contrato. La información mínima que el contratista deberá tener disponible y actualizada es la siguiente: a. Estado del sistema de video vigilancia por localidad, por subsistema o por proyecto/contrato. b. Cantidad de elementos	Cuando aplique	Cumplió	Seguritech ha cumplido dando respuesta a los requerimientos recibidos por parte de la SDSCJ, con relación a las estadísticas del sistema de videovigilancia. Se soporta con la entrega de los informes semanales de seguimiento al sistema de videovigilancia, que se encuentran en la carpeta de la obligación específica No 28 de cada mes.	Coordinador Mesa de Servicios

Item	Obligación	Periodicidad	Cumplió / No Cumplió	Observaciones	Responsable
	utilizados de la bolsa de repuestos durante un periodo específico, detallando fecha de utilización, valor, punto o ubicación relacionada con código SDSCJ y ubicación (localidad y georreferencia) c. Cantidad de visitas de mantenimiento ejecutadas durante un periodo específico, detallando fecha de ejecución, valor, punto o ubicación relacionada con código SDSCJ y ubicación (localidad y georreferencia)				


Item	Obligación	Periodicidad	Cumplió / No Cumplió	Observaciones	Responsable
29	Suministrar, como requisito para el último pago, toda la información histórica recopilada durante la ejecución del contrato que incluya, como mínimo: a. Hoja de vida de todos y cada uno de los puntos, ubicaciones y subsistemas. b. Listado de tickets abiertos durante la ejecución del contrato, detallando el punto o ubicación con su diagnóstico, código SDSCJ, ubicación (localidad y georreferencia) y estado final. c. Listado de elementos utilizados de la bolsa de repuestos durante la ejecución del contrato, detallando fecha de utilización, valor, punto o ubicación relacionada con código SDSCJ y ubicación (localidad y georreferencia) d. Listado de visitas de mantenimiento ejecutadas durante la ejecución del contrato, detallando fecha de ejecución, valor, punto o ubicación relacionada con código SDSCJ y ubicación (localidad y georreferencia).	Única vez	Cumplió	Seguritech cumplió entregando el informe final actualizado y los archivos consolidados de la ejecución contractual. Los soportes fueron cargados en la carpeta de la obligación específica No 29.	Coordinador Mesa de Servicios
30	Realizar el seguimiento y reportar diariamente a LA INTERVENTORÍA o	Diario	Cumplió	Seguritech cumplió realizando el seguimiento y reportando diariamente a la	Coordinador Mesa de Servicios

Item	Obligación	Periodicidad	Cumplió / No Cumplió	Observaciones	Responsable
	SUPERVISIÓN, las fallas, novedades o requerimientos sobre un punto, ubicación o subsistema, cuya indisponibilidad haya sido atribuida al proveedor de suministro eléctrico o de conectividad.			supervisión, las fallas, novedades o requerimientos sobre un punto, ubicación o subsistema, cuya indisponibilidad haya sido atribuida al proveedor de suministro eléctrico o de conectividad, mediante las actas de servicios. Los soportes y correos de escalamientos se encuentran en la carpeta de la obligación específica No 30 de cada mes.	
31	Adelantar las acciones necesarias con el personal que sea designado para implementar licencias de analítica que se instalarán en el sistema de video vigilancia de la ciudad, garantizando el correcto funcionamiento del sistema de video vigilancia independiente de la instalación de las nuevas analíticas.	Permanente	Cumplió	Seguritech adelantó las acciones necesarias con el personal designado para implementar las licencias de analítica, garantizando su correcto funcionamiento. Los soportes de estas actividades se encuentran en la carpeta de la obligación específica No 31 de cada mes.	Ingeniero Residente del Datacenter
32	Adelantar las acciones necesarias para el trámite del RMA (Return Merchandise Authorization), frente a cada uno de los fabricantes de los bienes del sistema de video vigilancia.	Cuando aplique	Cumplió	Seguritech realizó los trámites de RMA de los equipos durante cada mes con los centros de servicio autorizados por los fabricantes, la relación de los equipos, se encuentra detallada en cada informe mensual y las evidencias se encuentran cargadas en la carpeta de la obligación específica No 32 de cada mes.	Coordinador del Proyecto

Item	Obligación	Periodicidad	Cumplió / No Cumplió	Observaciones	Responsable
33	Mantener un stock de cámaras y de bienes de mayor consumo o rotación, descritos en los anexos del presente documento.	Permanente	Cumplió	Seguritech cumplió porque mantiene un stock de bienes de mayor consumo o rotación, descritos en los anexos del proceso. El stock de cámaras y bienes de mayor consumo o rotación se registraron en el tablero de control del proyecto y fueron cargados cada mes en la carpeta de la obligación específica No 33.	Coordinador del Proyecto
34	Disponer del personal necesario al finalizar el contrato que permita garantizar el empalme de actividades con la SDSCJ y de esta manera adelantar la correcta entrega del contrato ya sea a SDSCJ o a quién la entidad disponga.	Única vez	Cumplió	Seguritech ha dispuesto del personal necesario al finalizar el contrato, garantizando el empalme de actividades con la SDSCJ para la correcta entrega del contrato.	Coordinador del Proyecto
35	Responder por los actos contrarios a la Ley y a lo estipulado en el contrato, cometidos por el personal a su cargo en virtud de la ejecución contractual.	Permanente	Cumplió	Seguritech no tiene conocimiento de ningún acto contrario a la ley y a lo estipulado en el contrato, que hayan sido cometidos por personal a cargo en virtud de la ejecución contractual y no tiene conocimiento de ningún requerimiento o solicitud que vaya en contravía de esta obligación.	Coordinador del Proyecto

Item	Obligación	Periodicidad	Cumplió / No Cumplió	Observaciones	Responsable
36	Acatar las políticas de seguridad de la información establecidas por la SDSCJ.	Permanente	Cumplió	Seguritech cumplió acatando las políticas de seguridad de la información establecidas por la SDSCJ y no tiene conocimiento de ningún requerimiento o solicitud que vaya en contravía de esta obligación. Los soportes se encuentran en la carpeta de la obligación específica No 36 de cada mes.	Coordinador del Proyecto y Coordinador Mesa de Servicios
37	Garantizar la actualización del inventario de los componentes del sistema de video vigilancia, comprobando cantidades, especificaciones técnicas, certificaciones de garantía, valores y demás la cual se debe realizar durante los primeros sesenta (60) días calendario del contrato, los cuales deben ser avalados por la INTERVENTORÍA o SUPERVISIÓN.	Única vez	Cumplió	Seguritech ha cumplido con la actualización del inventario de los componentes del sistema de videovigilancia, comprobando cantidades, especificaciones técnicas, certificaciones de garantía y valores. Los soportes se encuentran en la carpeta de la obligación específica No 37 de cada mes.	Coordinador Mesa de Servicios
38	Realizar el soporte técnico de PRIMER NIVEL PIVOT3 (entiéndase por primer nivel: el servicio que se encargará de liderar día a día, el adecuado manejo de eventos asociados con el sistema de videovigilancia de la ciudad, eventos que pueden ser incidentes de funcionamiento,	Permanente	Cumplió	Seguritech ha cumplido, realizando el soporte técnico de primer nivel PIVOT3, mediante los escalamientos al fabricante sobre las novedades encontradas en el DATACENTER. Los soportes se encuentran cargados en la carpeta de la obligación específica No 38 de cada mes.	Ingeniero Residente del Datacenter

Item	Obligación	Periodicidad	Cumplió / No Cumplió	Observaciones	Responsable
	problemas donde se esté incrementando la criticidad de la situación, administrar requerimientos o solicitudes de información de la Policía Metropolitana o de las demás agencias involucradas en los operativos de seguridad en cuanto Almacenamiento y Procesamiento (Pivot3); de igual forma en caso de materializarse alguna de las siguientes eventualidades: ● Daños al Hardware por manipulación indebida. ● Daños al Hardware por descargas eléctricas. ● Daños al Hardware por sobrecalentamiento del hardware. ● Daños al Hardware por desastre natural o vandalismo. Para lo cual el contratista deberá suministrar, instalar y configurar los repuestos dejándolos en correcta operación sobre				


Item	Obligación	Periodicidad	Cumplió / No Cumplió	Observaciones	Responsable
	la infraestructura actual".				
39	Cumplir con las visitas que se describen a continuación, sin costo adicional para la Entidad y ofrecidas en la propuesta, así: 	Cuando aplique	Cumplió	Seguritech ha cumplido con la ejecución sin costo de los servicios relacionados y ofrecidos en la propuesta. El cumplimiento de esta obligación se notificó mediante los oficios SGT-SDSCJ-505-23, SGT-SDSCJ-605-23 y SGT-SDSCJ-713-23.	Coordinador Mesa de Servicios
40	Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato, el pliego de condiciones, apéndice técnico y demás documentos que se desarrollen en la ejecución del contrato.	Permanente	Cumplió	Seguritech ha cumplido con las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato, el pliego de condiciones, apéndice técnico y demás documentos que se desarrollen en la ejecución del contrato. Seguritech no tiene conocimiento de ningún requerimiento o solicitud que vaya en contravía de esta obligación.	Coordinador del Proyecto

VISITAS	CANTIDAD
MANTENIMIENTOS PREVENTIVO SIN CARRO CANASTA	200
MANTENIMIENTOS PREVENTIVO CARRO CANASTA	200
LIMPIEZA SIN CARRO CANASTA	200

Tabla 4. Obligaciones contractuales.

7. Balance de servicios prestados.


Dentro del marco del Contrato No 1932 de 2022, se ejecutaron 483 servicios de mantenimiento correctivo durante el año 2022 y ningún servicio de mantenimiento preventivo, detallados por mes así:

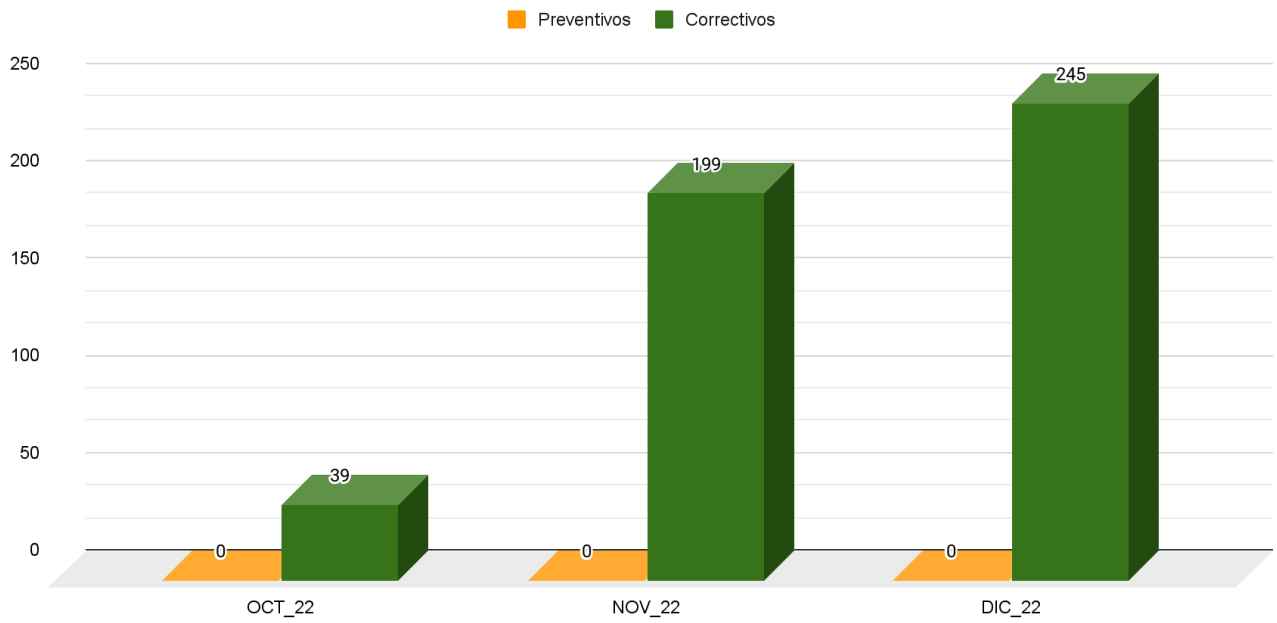

Mes	Preventivos	Correctivos
Octubre 2022	0	39
Noviembre 2022	0	199
Diciembre 2022	0	245
	Total	483

Imagen 10. Balance de servicios prestados 2022.

Por otro lado, se ejecutaron 23 servicios de mantenimiento preventivo y 2918 servicios de mantenimiento correctivo durante el año 2023, detallados por mes así:

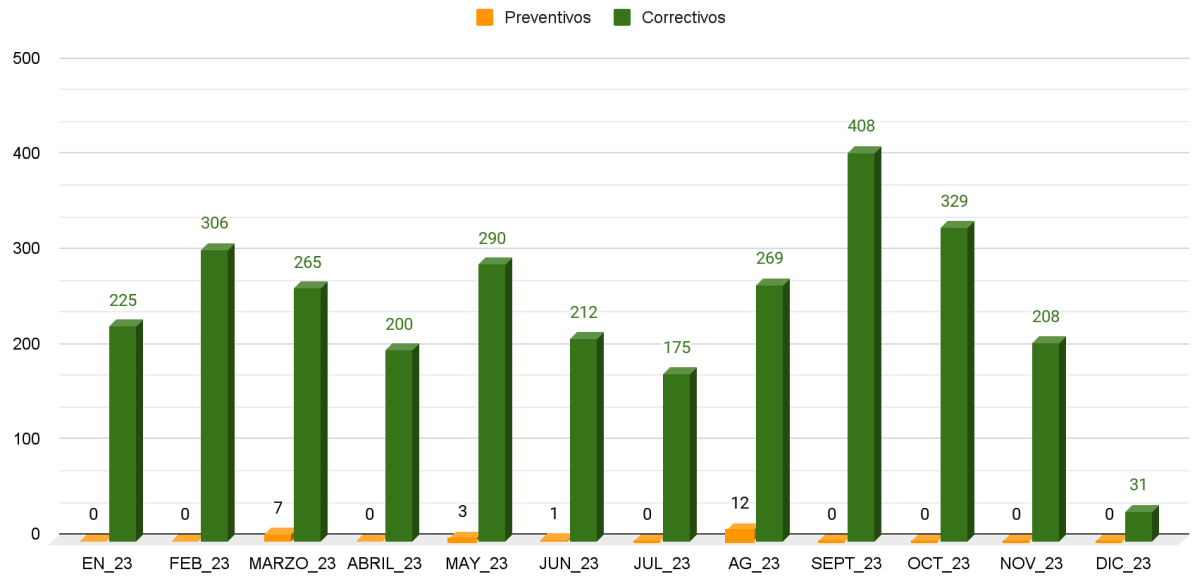

Mes	Preventivos	Correctivos
Enero 2023	0	225
Febrero 2023	0	306
Marzo 2023	7	265
Abril 2023	0	200
Mayo 2023	3	290
Junio 2023	1	212
Julio 2023	0	175
Agosto 2023	12	269
Septiembre 2023	0	408
Octubre 2023	0	329
Noviembre 2023	0	208
Diciembre 2023	0	31
Total	23	2918


Imagen 11. Balance de servicios ejecutados 2023.

El detalle de los servicios se encuentra en el siguiente enlace:

Consolidado de servicios ejecutados.

8. Balance económico.


Dentro del marco del Contrato No 1932 de 2022, se ejecutó el siguiente presupuesto durante la vigencia 2022:

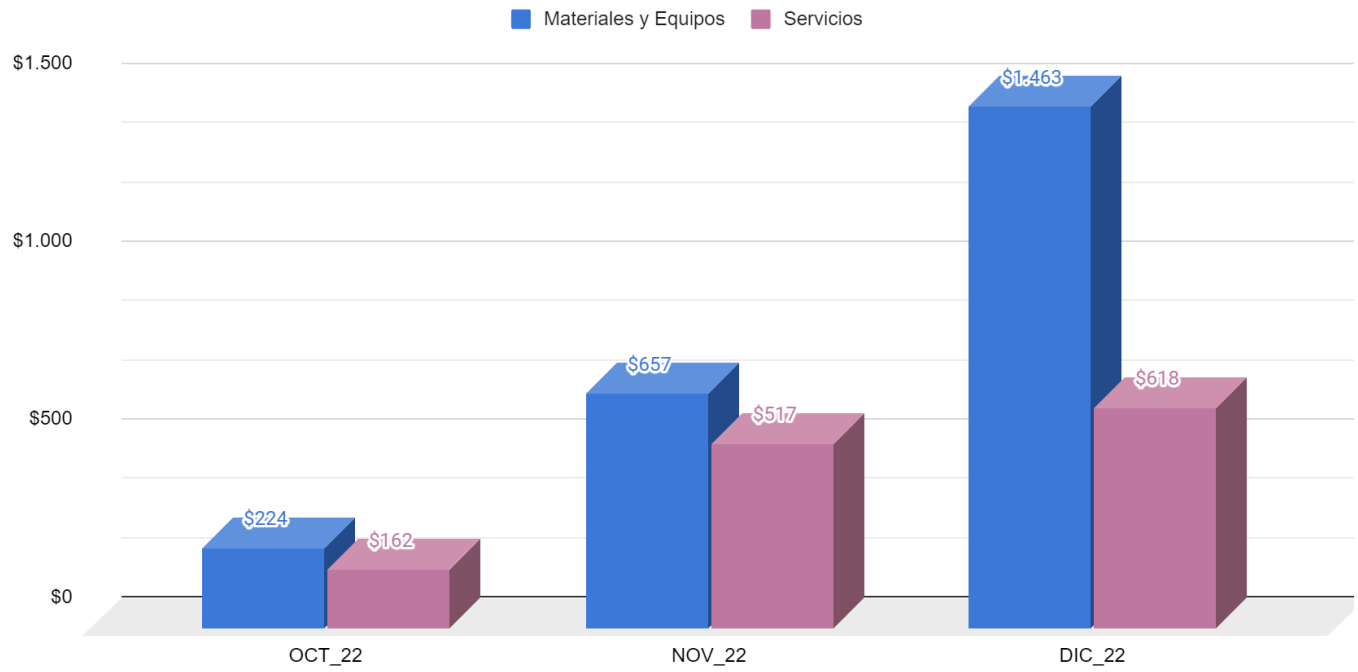

Mes	Materiales y Equipos	Servicios
Octubre 2022	$224.220.759	$162.432.251
Noviembre 2022	$657.584.516	$517.187.090
Diciembre 2022	$1.463.748.036	$618.438.359
Total	**$2.345.553.311**	**$1.298.057.700**

Imagen 12. Balance económico 2022.

Por otro lado, se ejecutó el siguiente presupuesto durante la vigencia 2023:

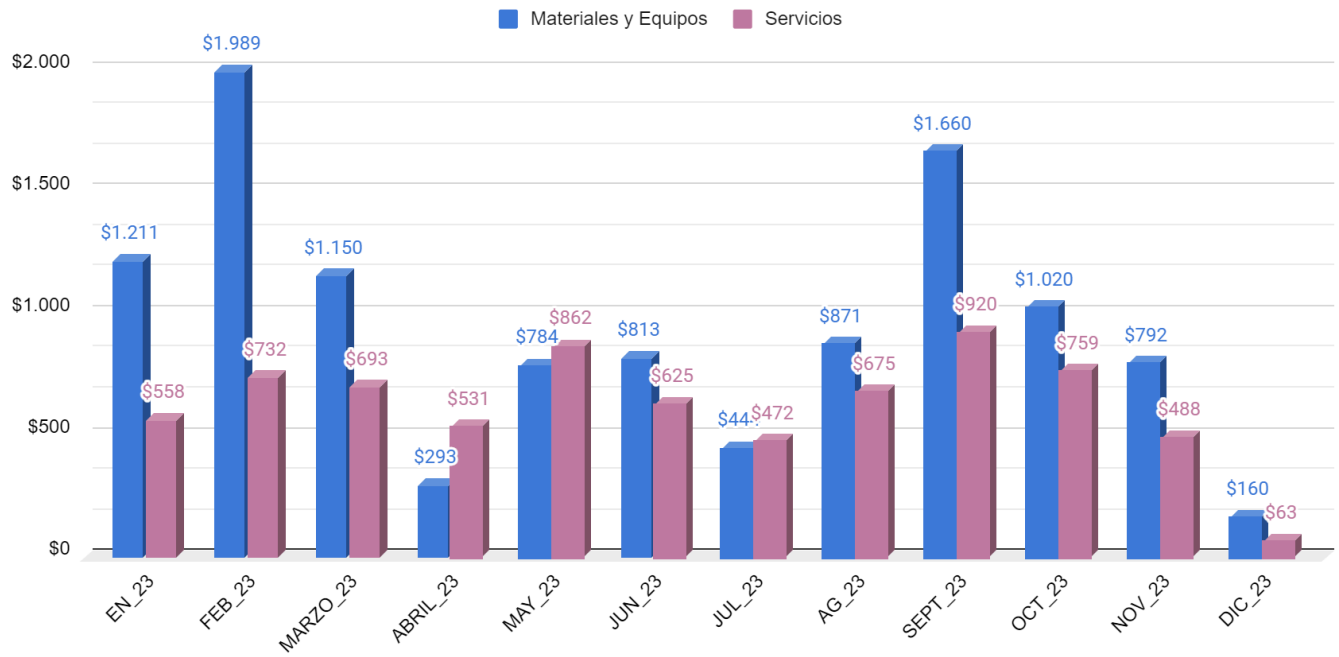

Mes	Materiales y Equipos	Servicios
Enero 2023	$1.211.685.251	$558.844.468
Febrero 2023	$1.989.831.167	$732.308.745
Marzo 2023	$1.150.913.912	$693.345.646
Abril 2023	$293.873.924	$531.405.091
Mayo 2023	$784.754.667	$862.799.861
Junio 2023	$813.151.892	$625.527.665
Julio 2023	$444.127.338	$472.237.696
Agosto 2023	$871.873.666	$675.409.228
Septiembre 2023	$1.660.083.760	$920.525.927
Octubre 2023	$1.020.600.568	$759.930.506
Noviembre 2023	$792.410.680	$488.156.624
Diciembre 2023	$160.049.610	$63.627.248
Total	**$11.193.356.435**	**$7.384.118.705**

Imagen 13. Balance económico 2023.

9. Equipos atendidos en el laboratorio de Seguritech

En el siguiente enlace, se encuentra el archivo con el detalle de los equipos que fueron atendidos en el laboratorio de Seguritech.

- Equipos atendidos proyecto Bogotá_Laboratorio.

10. Cámaras reparadas en los centros de servicio

A continuación, relacionamos los seriales de las cámaras Hanwha reparadas en los centros de servicio especializado:

ÍTEM	MES RECONOCIDO	UBICACIÓN INICIAL	SERIAL	UBICACIÓN FINAL	TICKET	FECHA INSTALACIÓN
1	ENERO 2023	SCJ17E040102	KKDA6V2JC0003EK	350-5254	2352768	2023-03-31
2	ENERO 2023	SCJ17E110027	KKDA6V2JC0000DX	350-4951	2312241	2023-02-16
3	ENERO 2023	SCJ17E040051	ZHN76V2K3000HRP	SCJ17E130036	2312387	2023-02-16
4	ENERO 2023	SCJ17E040127	ZHN76V2K10001VX	AL124	2312274	2023-02-16
5	ENERO 2023	SCJ17E190079	ZFFE70GJ90008EX	P113	2351048	2023-03-30
6	MAYO 2023	SCJ17E120051	ZHN76V2K10002HT	FN_42	2389188	2023-05-09
7	MAYO 2023	350-4985	KKDA6V2JB0001KE	ESU-260	2391506	2023-05-12
8	MAYO 2023	SCJ17E010075	ZHN76V2K10004GM	SCJ17E010001	2380996	2023-05-02
9	MAYO 2023	SCJ17E110006	KKDA6V2JC00014L	350-4956	2382221	2023-05-02
10	MAYO 2023	SCJ17E010031	KKDA6V2JC0002ZH	SCJ17E050061	2358381	2023-05-04
11	MAYO 2023	SCJ17E010035	KKDA6V2JC0000JD	P29	2365997	2023-05-04
12	MAYO 2023	SCJ17E010024	KKDA6V2JC0000EY	AL629	2376755	2023-05-02
13	MAYO 2023	SCJ17E120047	ZHN76V2K200048Z	AL1272	2398023	2023-05-18
14	MAYO 2023	SCJ17E120059	ZHN76V2K20000YA	SCJ17E140025	2392048 2586511	2023-11-19
15	MAYO 2023	SCJ17E090041	ZHN76V2K20002WY	ALB202	2394348	2023-05-15
16	MAYO 2023	SCJ17E130057	ZHN76V2K100003N	350-1999	2403325	2023-05-24
17	MAYO 2023	SCJ17E150061	ZHN76V2K3000E0Z	FVS-1132	2411186	2023-05-31
18	MAYO 2023	SCJ17E100076	ZHN76V2K20002ZK	FVS-1163	2411211	2023-06-01
19	MAYO 2023	SCJ17E190119	ZHN76V2K3000KDA	SCJ17E110010	2411187	2023-05-31
20	MAYO 2023	SCJ17E120043	ZHN76V2K3000DWN	ESU-103	2411214	2023-06-01

ÍTEM	MES RECONOCIDO	UBICACIÓN INICIAL	SERIAL	UBICACIÓN FINAL	TICKET	FECHA INSTALACIÓN
21	JUNIO 2023	SCJ18E140001	ZHN76V2K3000Z4M	MB1196	2420688	2023-06-10
22	JUNIO 2023	SCJ17E120038	KKDA6V2JC0001NZ	AL1825	2410637	2023-06-09
23	JUNIO 2023	SCJ17E020017	ZHN76V2JC00018N	ALB12	2424300	2023-06-14
24	JUNIO 2023	SCJ17E130025	ZHN76V2K100013E	350-5100	2411238	2023-06-01
25	JUNIO 2023	SCJ17E070066	ZHN76V2K3000A4P	CVID22088	2411268	2023-06-02
26	JUNIO 2023	FN_184	ZHN76V2K3000PZV	SCJ17E110076	2411223	2023-06-01
27	JUNIO 2023	SCJ17E030055	KKDA6V2JC0000SH	350-4921	2415823 2525460	2023-11-22
28	JUNIO 2023	SCJ17E110056	ZHN76V2K300082K	AL2649	2415821 2556400	2023-10-21
29	JUNIO 2023	SCJ17E190133	ZHN76V2K3000WRY	SCJ17E160011	2419086	2023-06-08
30	JUNIO 2023	SCJ17E070095	ZHN76V2K3000E3T	AL1313	2426084	2023-06-15
31	JUNIO 2023	SCJ17E190106	ZHN76V2K3000PWB	SCJ17E120008	2424328	2023-06-14
32	JUNIO 2023	FN_113	ZHN76V2K3000MXH	AL1305	2426442	2023-06-15
33	JUNIO 2023	SCJ17E160041	ZHN76V2K3000C8X	CCEL08_0018	2425462	2023-06-14
34	JUNIO 2023	SCJ17E160035	ZHN76V2K200038B	FN_74	2428086	2023-06-17
35	JUNIO 2023	SCJ17E070081	ZHN76V2K30001GA	AL1267	2424318	2023-06-14
36	JUNIO 2023	SCJ17E040069	ZHN76V2K300071T	FS_60491	2425522	2023-06-15
37	JUNIO 2023	PAQ58	ZHN76V2K3000RZY	SCJ17E130095	2431924	2023-06-21
38	JUNIO 2023	SCJ17E070020	ZHN76V2K3000P7Y	PAQ59	2430920	2023-06-21
39	JUNIO 2023	SCJ17E150003	ZHN76V2K30001FP	SCJ17E140027	2420742	2023-07-01
40	JUNIO 2023	SCJ17E150043	ZHN76V2K20001QL	FN_22	2438662	2023-06-30
41	JUNIO 2023	SCJ17E150067	ZHN76V2K3000FAM	PCE24948	2438727	2023-06-30
42	JUNIO 2023	FN_112	ZHN76V2K3000NTT	SCJ17E100100	2409819	2023-06-30
43	JUNIO 2023	SCJ17E040066	KKDA6V2JC00013Z	SCJ17E020037	2439734	2023-07-01
44	JUNIO 2023	SCJ17E010028	KKDA6V2JC0002CV	PAQ63	2424310	2023-06-30
45	JULIO 2023	SCJ17E010017	KKDA6V2JC0000KZ	PCE23418	2450738	2023-07-14
46	JULIO 2023	SCJ17E070090	ZHN76V2K3000FXJ	SCJ17E130089	2444777	2023-07-06
47	JULIO 2023	FS_140056	ZHN76V2K3000P1E	AL2744	2442103	2023-07-04
48	JULIO 2023	SCJ17E140021	ZHN76V2K10002XK	SCJ17E170052	2441973	2023-07-04
49	JULIO 2023	350-5049	ZHN76V2K3000GBV	SCJ17E170041	2442335	2023-07-04

ÍTEM	MES RECONOCIDO	UBICACIÓN INICIAL	SERIAL	UBICACIÓN FINAL	TICKET	FECHA INSTALACIÓN
50	JULIO 2023	PAQ28	ZHN76V2JC0000LP	AL2292	2452036	2023-07-13
51	JULIO 2023	SCJ17E070069	ZHN76V2K3000CPR	SCJ17E190089	2445684	2023-07-07
52	JULIO 2023	SCJ17E120041	KKDA6V2JB0000ND	SCJ17E110082	2442392 2526303	2023-09-23
53	JULIO 2023	SFGN_3	ZHN76V2K3000W9B	FN_56	2450749	2023-07-12
54	JULIO 2023	SCJ17E160009	ZHN76V2K3000C2J	AL1347	2556740	2023-10-22
55	JULIO 2023	FN_48	ZHN76V2K3000W4P	CCEL19_108	2452041	2023-07-15
56	AGOSTO 2023	SCJ17E160074	KKDA6V2JC0000TN	CCEL08_0012	2498993	2023-08-29
57	AGOSTO 2023	SCJ17E040073	ZHN76V2K30000GK	P242	2499299	2023-08-29
58	OCTUBRE 2023	SCJ17E110048	ZHN76V2K10005BA	350-2058	2539377	2023-10-05
59	OCTUBRE 2023	SCJ17E140039	ZHN76V2K300079F	AL1929	2543899	2023-10-09
60	OCTUBRE 2023	SCJ17E040128	KKDA6V2JC0002XK	350-5042	2539267	2023-10-05
61	OCTUBRE 2023	SCJ17E020006	ZHN76V2K3000GNP	ESU-282	2542135	2023-10-07
62	OCTUBRE 2023	FN_41	ZHN76V2K3000MQT	AL1685	2544649	2023-10-10
63	OCTUBRE 2023	SCJ17E030009	ZHN76V2K3000F3Z	MB515	2542127	2023-10-07
64	OCTUBRE 2023	SCJ17E150042	ZHN76V2K3000ASZ	MB470	2542116	2023-10-07
65	OCTUBRE 2023	SCJ17E020011	ZHN76V2K10004HK	AL459	2545433	2023-10-10
66	OCTUBRE 2023	SCJ17E100112	ZHN76V2K3000EBF	350-2011	2556498	2023-10-21
67	OCTUBRE 2023	SCJ17E140023	ZHN76V2K20001ZT	SCJ17E130002	2556523	2023-10-21
68	OCTUBRE 2023	SCJ17E050001	ZHN76V2K3000Y6E	SCJ17E190029	2558561	2023-10-24
69	OCTUBRE 2023	SCJ17E050058	ZFFE70GJ90008YM	AL850	2556497	2023-10-21
70	OCTUBRE 2023	SCJ17E090075	ZHN76V2K200035Z	350-5015	2558468	2023-10-24
71	OCTUBRE 2023	FN_120	ZHN76V2K300081Z	SCJ17E150046	2556329	2023-10-20
72	OCTUBRE 2023	SCJ17E160071	ZHN76V2K100004M	SCJ17E120009	2558458	2023-10-23
73	OCTUBRE 2023	SCJ17E030054	ZHN76V2K10006NM	ESU-155	2556377	2023-10-20
74	OCTUBRE 2023	350-5094	ZHN76V2K10003AW	AL1713	2556397	2023-10-21
75	OCTUBRE 2023	SCJ17E150046	ZHN76V2K3000ARY	AL2685	2556432	2023-10-21
76	OCTUBRE 2023	SCJ17E150060	ZHN76V2K3000CQF	SCJ17E090013	2556807	2023-10-22
77	OCTUBRE 2023	CCEL13_010	ZHN76V2K30006XP	AL2646	2556417	2023-10-21
78	NOVIEMBRE 2023	SCJ17E010034	ZHN76V2K30006EZ	MB1014	2586192	2023-11-18

ÍTEM	MES RECONOCIDO	UBICACIÓN INICIAL	SERIAL	UBICACIÓN FINAL	TICKET	FECHA INSTALACIÓN
79	NOVIEMBRE 2023	SCJ17E150036	ZHN76V2K30002RL	P128	2586301	2023-11-18
80	NOVIEMBRE 2023	SCJ17E190081	ZHN76V2K3000X2F	AL1621	2586108	2023-11-18

Tabla 5. Cámaras Hanwha reparadas en centro de servicio.

Por otro lado, nos permitimos relacionar los seriales de las cámaras Bosch reparadas en el centro de servicio especializado:

ÍTEM	MES RECONOCIDO	AFILIACIÓN RETIRO	SERIAL	AFILIACIÓN INSTALACIÓN	TICKET	FECHA INSTALACIÓN
1	MARZO 2023	PCE21136	40447948551101505	SCJ18E140001	2326061	2023-03-04
2	MARZO 2023	SCJ17E190077	40447949532401405	FVS-4115	2325999	2023-03-03 (VANDALIZADO)
3	MARZO 2023	AL690	40447948531201818	FVS-4118	2326002	2023-03-04
4	MARZO 2023	AL980	40447948190401902	SCJ17E040101	2330208	2023-03-22
5	MARZO 2023	AL88	40447948191501025	SCJ17E140030	2326089	2023-03-06
6	MARZO 2023	CCE_L10_21	40447948540601609	SCJ17E090041	2325979	2023-03-03
7	MARZO 2023	CCEL11_065	40447949202601403	MB490	2326001	2023-03-04
8	MARZO 2023	PCE20064	40447948532901608	SCJ17E130078	2328376	2023-03-06
9	MARZO 2023	CVID22349	40447948541501404	350-4954	2326010	2023-03-04
10	MARZO 2023	ESU-135	40475546563101600	CCEL19_119	2351018	2023-03-30
11	MAYO 2023	AL1262	40447948540701406	AL801	2362970	2023-05-04
12	MAYO 2023	CCEAD_L7_26	40447948551101506	ESU-246	2383158	2023-05-03
13	MAYO 2023	CCE_L10_32	40447948540601604	ESU-274	2364177	2023-05-03
14	MAYO 2023	MB216	40447948532901511	350-4906	2370758	2023-05-03
15	MAYO 2023	AL846	40447948532901415	SCJ17E140013	2383282	2023-05-03
16	MAYO 2023	SCJ17E140033	40447949542601504	P393	2358461	2023-05-03
17	MAYO 2023	MB478	40447948191501905	AL1015	2376753	2023-05-04
18	MAYO 2023	AL1510	40447948540601508	MB301	2380264	2023-05-04
19	MAYO 2023	CCEAD_L7_18	40447948551101605	CCEL11_148	2364569	2023-05-03
20	MAYO 2023	AL2137	40447949591201503	AL617	2383201	2023-05-03
21	MAYO 2023	ALB213	40447948532301812	SCJ17E150025	2364749-2586057	2023-11-18
22	MAYO 2023	AL644	40447948541301504	CCEL11_051	2371794	2023-05-03
23	MAYO 2023	MB988	40447948551101604	AL856	2362937	2023-05-04

ÍTEM	MES RECONOCIDO	AFILIACIÓN RETIRO	SERIAL	AFILIACIÓN INSTALACIÓN	TICKET	FECHA INSTALACIÓN
24	MAYO 2023	PCE19095	40447948532901510	AL1377	2389573	2023-05-10
25	MAYO 2023	AL710	40447948191601000	ALB34	2365951	2023-05-10
26	MAYO 2023	P43	40447948190401002	CVID22240	2357879	2023-05-04
27	MAYO 2023	AL1391	40447948190401002	SCJ17E070002	2384419	2023-05-04
28	MAYO 2023	CCEL14_07	40447948191301900	ALB193	2383980	2023-05-04
29	MAYO 2023	AL388	40447948532901507	CVID21919	2372898	2023-05-04
30	MAYO 2023	ESU-016	40447949191101807	PCE24799	2372886	2023-05-04
31	MAYO 2023	ESU-090	40447999172301801	AL2276	2391691	2023-05-12
32	MAYO 2023	CVID21901	40447948532301807	SCJ17E020016	2392709	2023-05-13
33	MAYO 2023	AL124	40447948190401002	FN_68	2365147	2023-05-13
34	MAYO 2023	AL235	40447948192001818	SCJ18ESP00005	2356564	2023-05-06
35	MAYO 2023	SCJ17E190127	40447948191301002	ESU-129	2370380	2023-05-04
36	MAYO 2023	AL1390	40447948192001819	ESU-278	2384848	2023-05-05
37	MAYO 2023	CCEL11_014	40447949191401611	ESU-324	2377746	2023-05-06
38	MAYO 2023	AL1402	40447948190401005	CVID21613	2365195	2023-05-05
39	MAYO 2023	PCE23056	40447948532901510	AL1420	2385167	2023-05-05
40	MAYO 2023	FVS-4812	40447949191101803	CCAD_L7_071	2389397	2023-05-09
41	MAYO 2023	MB432	40447948551101607	MB531	2318931	2023-05-05
42	MAYO 2023	CVID21659	40447948191601906	SCJ17E190143	2357484	2023-05-05
43	MAYO 2023	ESU-068	40447948540601508	CCEL08_0008	2385451	2023-05-06
44	MAYO 2023	CCEL04_010	40447948202601400	AL2309	2365150	2023-05-05
45	MAYO 2023	CCEL17_031	40447948531201818	CCEL19_081	2372200	2023-05-05
46	MAYO 2023	AL1986	40447948192001814	SCJ17E190001	2385236	2023-05-05
47	MAYO 2023	CCEL19_0010	40447949191401602	SCJ17E040062	2352177	2023-05-08
48	MAYO 2023	AL192	40447948191601900	FVS-2604	2386573	2023-05-08
49	MAYO 2023	AL408	40447948541701602	SCJ17E040064	2386910	2023-05-08
50	MAYO 2023	FVS-2601	40447949191101401	SFGN_61	2361216	2023-05-09
51	MAYO 2023	AL237	40447948191501011	CCEL19_0006	2388636	2023-05-09
52	MAYO 2023	CCE_L10_02	40447948532301812	AL1817	2390686	2023-05-11

ÍTEM	MES RECONOCIDO	AFILIACIÓN RETIRO	SERIAL	AFILIACIÓN INSTALACIÓN	TICKET	FECHA INSTALACIÓN
53	MAYO 2023	SCJ17E010004	40447949532401815	AL1522	2387839	2023-05-08
54	MAYO 2023	PCE20645	40447948531501603	CVID22011	2388053	2023-05-08
55	MAYO 2023	SCJ17E090079	40447948541701502	SCJ17E100064	2366042	2023-05-08
56	MAYO 2023	SCJ17E090080	40447949542601502	AL1428	2387589	2023-05-08
57	MAYO 2023	AL1540	40447948532301410	350-4874	2364870	2023-05-09
58	MAYO 2023	350-4951	40447948192401816	P176	2388595	2023-05-09
59	MAYO 2023	SCJ17E100152	40447949591201502	AL275	2365212	2023-05-09
60	MAYO 2023	PAQ53	40447948541501813	SCJ17E190084	2372190	2023-05-09
61	MAYO 2023	AL904	40447948191501915	SCJ17E190158	2357561	2023-05-09
62	MAYO 2023	P174	40447948530801415	P303	2387849	2023-05-09
63	MAYO 2023	PAQ1	40447948541501412	PCE23972	2388603	2023-05-09
64	MAYO 2023	ESU-150	40447949591101513	FVS-2608	2363023	2023-05-09
65	MAYO 2023	CCEL19_0023	40447949191301815	FVS-4607	2405292	2023-05-26
66	MAYO 2023	P476	04449718200611000	SCJ17E060005	2408530	2023-05-29
67	MAYO 2023	SCJ17E040108	40447949200101804	MB928	2404414	2023-05-26
68	MAYO 2023	CCEAD_L7_22	40447948191501025	SCJ17E170022	2406393	2023-05-27
69	MAYO 2023	AL2198	40447948532901609	SCJ17E150079	2406766	2023-05-26
70	MAYO 2023	AL1471	40447948532301811	SCJ17E040151	2405990	2023-05-26
71	MAYO 2023	AL2123	40447948532901609	SCJ17E040020	2405645	2023-05-26
72	MAYO 2023	MB490	40447948191701005	FVS-4408	2410334	2023-05-31
73	MAYO 2023	SCJ17E010012	40447949591101500	ALB125	2409248	2023-05-30
74	MAYO 2023	AL1171	40447948191301901	SCJ17E100033	2407925	2023-05-29
75	MAYO 2023	AL1863	40447948532301410	CVID21660	2406440	2023-05-27
76	MAYO 2023	CCEAD_L7_02	40447948551101505	AL1323	2405993	2023-05-25
77	MAYO 2023	P177	40447948530801412	CCEL08_041	2405367	2023-05-26
78	MAYO 2023	CCE_L10_27	40447949541901404	AL1249	2405675	2023-05-26
79	MAYO 2023	CCEAD_L7_36	40447948551101605	AL980	2406593	2023-05-27
80	MAYO 2023	AL2730	40447949191401601	AL1230	2405924	2023-05-26
81	MAYO 2023	AL1184	40447948191601902	SCJ17E040029	2325747	2023-05-26

ÍTEM	MES RECONOCIDO	AFILIACIÓN RETIRO	SERIAL	AFILIACIÓN INSTALACIÓN	TICKET	FECHA INSTALACIÓN
82	MAYO 2023	CCEL04_016	40447948551101608	SADC_3	2405227	2023-05-25
83	MAYO 2023	ESU-258	40475546601401502	PAQ35	2393616	2023-05-15
84	MAYO 2023	AL1551	40447948540601509	MB936	2388596	2023-05-09
85	JUNIO 2023	SCJ17E050064	40447948541401405	SCJ17E040117	2384164	2023-05-04
86	JUNIO 2023	ESU-115	40475546562801601	FVS-4628	2343687-24 26091	2023-05-15
87	JUNIO 2023	ESU-296	40475547550901517	FVS-1126	2419448	2023-06-08
88	JUNIO 2023	P215	40447948532301413	CVID21623	2217656	2023-05-05
89	JUNIO 2023	CCEL19_032	40447949191401609	SCJ17E100139	2461046	2023-07-28
90	JUNIO 2023	AL801	40447948532301802	AL1531	2437854	2023-06-29
91	JUNIO 2023	CCEL11_148	40447948532301620	AL1449	2437851	2023-06-29
92	JUNIO 2023	CVID22240	40447948191901001	ESU-265	2437835	2023-06-29
93	JUNIO 2023	AL617	40447949191401814	AL1726	2437857	2023-06-29
94	JUNIO 2023	AL1015	40447948190401004	SCJ17E170015	2356760	2023-06-28
95	JUNIO 2023	CVID21919	40447948540601508	ESU-236	2428404	2023-06-29
96	JUNIO 2023	ALB193	40447948540501506	AL2605	2438414	2023-06-29
97	JUNIO 2023	MB301	40447948192101000	AL2557	2438304	2023-06-29
98	JUNIO 2023	SFGN_64	40447948192101000	SFGN_64	2438234	2023-06-29
99	JUNIO 2023	MB531	40447948191701006	MB718	2445013	2023-07-06
100	JUNIO 2023	AL1420	40447948190401903	AL2623	2441967	2023-07-04
101	JUNIO 2023	AL629	40447948531401400	SCJ17E170009	2442400	2023-07-04
102	JULIO 2023	PAQ54	40447949541801506	AL1233	2445607	2023-07-07
103	JULIO 2023	SCJ18ESP00005	40447948532901610	SCJ17FJ0007_1	2443478	2023-07-05
104	JULIO 2023	ESU-278	40447949200101819	CCEAD_L7_62	2445936	2023-07-07
105	JULIO 2023	SCJ17E190001	40447949191101808	SCJ17E190056	2446030	2023-07-07
106	JULIO 2023	PCE24799	40447948540601509	SCJ17E190161	2445797	2023-07-07
107	JULIO 2023	CCEL19_081	40447949191401503	P368	2449139	2023-07-10
108	JULIO 2023	AL1930	40447948530801816	PAQ3	2445694	2023-07-07
109	JULIO 2023	CVID21660	40447948191601905	ALB220	2446042	2023-07-07
110	JULIO 2023	SCJ17E150079	40447949191101809	350-4974	2445565	2023-07-07

ÍTEM	MES RECONOCIDO	AFILIACIÓN RETIRO	SERIAL	AFILIACIÓN INSTALACIÓN	TICKET	FECHA INSTALACIÓN
111	JULIO 2023	SCJ17E190143	40447949542601504	AL1251	2445596	2023-07-07
112	JULIO 2023	CVID21613	40447948191601901	AL1474	2403863	2023-07-05
113	JULIO 2023	AL687	40447948202701403	SCJ17E140004	2465827	2023-07-27
114	JULIO 2023	AL1531	40447948532301405	CVID22169	2465569	2023-07-27
115	JULIO 2023	AL1449	40447949542601502	SCJ17E070006	2464654	2023-07-26
116	JULIO 2023	PCE24948	40447948532301804	ESU-139	2464444	2023-07-26
117	JULIO 2023	AL2557	40447949191401514	CCEL08_048	2462625	2023-07-26
118	JULIO 2023	PAQ63	40447948541601405	FVS-3608	2466696	2023-07-28
119	AGOSTO 2023	AL2605	40447949191401503	SCJ17E040128	2477910	2023-08-09
120	AGOSTO 2023	CVID22169	40447948191201001	AL757	2502186	2023-08-31
121	SEPTIEMBRE 2023	SGT4	04456691792615008	ESU-322	2521278	2023-09-18
122	SEPTIEMBRE 2023	CVID22089	40447949191401407	CCEL19_074	2508077	2023-09-06
123	SEPTIEMBRE 2023	ESU-003	40447949532401821	SCJ17E160071	2516915	2023-09-13
124	SEPTIEMBRE 2023	AL1297	40447948531501605	SCJ17E070048	2528929	2023-09-26
125	SEPTIEMBRE 2023	AL1233	40447949532101800	SCJ17E050058	2511926	2023-09-09
126	SEPTIEMBRE 2023	CCEL08_048	40447948551101506	PAQ62	2529015	2023-09-26
127	SEPTIEMBRE 2023	ESU-177	40447948541501812	CCEL11_160	2526407	2023-09-23
128	SEPTIEMBRE 2023	CVID21620	40447948191701021	AL1393	2522604	2023-09-19
129	SEPTIEMBRE 2023	FVS-3408	40447948192401816	P344	2523918	2023-09-20
130	SEPTIEMBRE 2023	CCE_L10_05	40447948531501503	350-1990	2523942	2023-09-20
131	SEPTIEMBRE 2023	AL2524	40447949592601606	AL1623	2521832	2023-09-18
132	SEPTIEMBRE 2023	CCEL08_0016	40447948541601806	FVS-1315	2521914	2023-09-19
133	SEPTIEMBRE 2023	PCE23311	40447948532901415	FVS-4211	2523313	2023-09-20
134	SEPTIEMBRE 2023	SCJ17E110030	04456691802115005	SCJ17FJ0006_2	2525336	2023-09-21
135	SEPTIEMBRE 2023	350-5078	04456691742910013	PCE26399	2522070	2023-09-19
136	SEPTIEMBRE 2023	SCJ17E040031	04456691742610001	ESU-181	2521474	2023-09-18
137	SEPTIEMBRE 2023	FN_52	04456691802115005	ESU-003	2444867	2023-07-06
138	SEPTIEMBRE 2023	350-4910	04456691752915000	AL1271	2443954	2023-07-05
139	SEPTIEMBRE 2023	FVS-1161	04456691380510001	CVID22089	2442569	2023-07-04


ÍTEM	MES RECONOCIDO	AFILIACIÓN RETIRO	SERIAL	AFILIACIÓN INSTALACIÓN	TICKET	FECHA INSTALACIÓN
140	SEPTIEMBRE 2023	350-5064	04456691742510002	MB135	2439748	2023-07-01
141	SEPTIEMBRE 2023	350-4910	04456691392210001	AL1271	2443704	2023-07-05
142	OCTUBRE 2023	AL1271	40447948540701407	SCJ17E050003	2548856	2023-10-13
143	OCTUBRE 2023	ALB194	40447948540501506	CCEL11_119	2533488	2023-09-30
144	OCTUBRE 2023	CCEL19_029	40447949191401615	CVID21626	2543736	2023-10-09
145	OCTUBRE 2023	ESU-139	40447948532301805	CCE_L10_46	2545942	2023-10-10
146	OCTUBRE 2023	SCJ17E070070	04456691391610000	AL201	2540627	2023-10-06
147	OCTUBRE 2023	AL1474	04456691802115002	PCE19695	2503759	2023-09-02
148	OCTUBRE 2023	P466	04456691752915001	MB750	2502798	2023-09-01
149	OCTUBRE 2023	AL684	40447948531201417	AL820	2552857	2023-10-17
150	OCTUBRE 2023	FVS-1128	40447948541501411	SCJ17E140018	2552952	2023-10-18
151	OCTUBRE 2023	350-5087	40447948532301805	CCE_L10_10	2552880	2023-10-17
152	OCTUBRE 2023	MB135	40447949591301500	350-5031	2555110	2023-10-19
153	OCTUBRE 2023	350-5082	40447948191301002	350-5057	2554234	2023-10-19
154	OCTUBRE 2023	CVID21957	40447949591201503	FVS-4817	2554859	2023-10-19
155	NOVIEMBRE 2023	350-5068	40447949542201402	350-4959	2590125	2023-11-23
156	NOVIEMBRE 2023	FVS-1402	40447948190401003	CVID21785	2593684	2023-11-27
157	NOVIEMBRE 2023	AL1624	40447948530801816	AL582	2591535	2023-11-24
158	NOVIEMBRE 2023	P475	40447949191401602	PAQ33	2592054	2023-11-24
159	NOVIEMBRE 2023	CCEL08_0012	40447948541601805	SCJ17E020023	2590155	2023-11-23
160	NOVIEMBRE 2023	CCEL14_01	40447948191301900	AL172	2594277	2023-11-27
161	NOVIEMBRE 2023	P242	40447948192101005	AL827	2591549	2023-11-24
162	NOVIEMBRE 2023	AL654	40447948202701404	MB915	2590177	2023-11-23
163	NOVIEMBRE 2023	MB1124	40447948191701006	ALB204	2590044	2023-11-23
164	NOVIEMBRE 2023	AL984	40447948190401001	MB417	2591839	2023-11-24
165	NOVIEMBRE 2023	CCEL11_142	40447948532301619	SCJ17E190013	2591752	2023-11-24
166	NOVIEMBRE 2023	AL1408	40447948190401006	MB188	2590285	2023-11-23
167	NOVIEMBRE 2023	AL74	40447948190401901	ESU-058	2591557	2023-11-24
168	NOVIEMBRE 2023	P346	40447948540601608	MB187	2591533	2023-11-23

ÍTEM	MES RECONOCIDO	AFILIACIÓN RETIRO	SERIAL	AFILIACIÓN INSTALACIÓN	TICKET	FECHA INSTALACIÓN
169	NOVIEMBRE 2023	PCE19553	40447948191501914	AL2752	2591596	2023-11-24
170	NOVIEMBRE 2023	AL1002	40447948191501910	ALB224	2589970	2023-11-22
171	NOVIEMBRE 2023	MB750	40447948530801418	FVS-1150	2590053	2023-11-23
172	NOVIEMBRE 2023	PAQ60	40447948541601404	350-2015	2589969	2023-11-22
173	NOVIEMBRE 2023	AL1532	40447948532301801	AL122	2590286	2023-11-23
174	NOVIEMBRE 2023	CCEL19_067	40447949191401508	ESU-237	2590168	2023-11-23
175	NOVIEMBRE 2023	AL191	40447948192101001	PCE19168	2592740	2023-11-25
176	NOVIEMBRE 2023	CCEL19_118	40447949191401509	FSC0007	2591591	2023-11-24
177	NOVIEMBRE 2023	AL1526	40447948532301404	CVID21666	2590589	2023-11-23
178	NOVIEMBRE 2023	PCE20874	40447948191301002	SCJ17E050014	2592667	2023-11-25
179	NOVIEMBRE 2023	SCJ17E090051	40447949591201522	AL838	2593045	2023-11-26
180	NOVIEMBRE 2023	FVS-4111	40447948540601507	SCJ17E110042	2592665	2023-11-25
181	NOVIEMBRE 2023	AL1543	40447948532301804	SCJ17E040121	2593101	2023-11-26
182	NOVIEMBRE 2023	AL1514	40447948531501504	AL2518	2593047	2023-11-26
183	NOVIEMBRE 2023	SCJ17E010029	40447948541501811	SCJ17E040120	2593071	2023-11-26
184	NOVIEMBRE 2023	FS_70197	40447949191501611	SCJ17E110074	2592644	2023-11-25
185	NOVIEMBRE 2023	AL210	40447948541601405	FVS-1003	2594022	2023-11-27
186	NOVIEMBRE 2023	CCEL19_038	40447948551101506	SCJ17E110018	2591558	2023-11-24
187	NOVIEMBRE 2023	CVID22347	40447948540501504	AL70	2592648	2023-11-25
188	NOVIEMBRE 2023	PCE26399	40447949191401508	350-1977	2592570	2023-11-25
189	NOVIEMBRE 2023	ESU-27	40447948540601508	AL654	2594880	2023-11-27
190	NOVIEMBRE 2023	CVID21687	40447948532301411	MB200	2594918	2023-11-28
191	NOVIEMBRE 2023	PCE19855	40447948192001813	ESU-292	2594980	2023-11-28
192	NOVIEMBRE 2023	CCEAD_L7_62	40447948551101605	ESU-053	2544914	2023-10-19
193	NOVIEMBRE 2023	P39	40447948192101003	SCJ17E190031	2596049	2023-11-29
194	NOVIEMBRE 2023	PCE23767	40447948532901416	350-1996	2595950	2023-11-29
195	NOVIEMBRE 2023	350-5065	40447949542601500	AL248	2597051	2023-11-29
196	NOVIEMBRE 2023	PCE19143	40447948532301412	SCJ17E050053	2597049	2023-11-30
197	NOVIEMBRE 2023	PAQ38	40447948541501812	MB242	2596196	2023-11-29

ÍTEM	MES RECONOCIDO	AFILIACIÓN RETIRO	SERIAL	AFILIACIÓN INSTALACIÓN	TICKET	FECHA INSTALACIÓN
198	NOVIEMBRE 2023	350-4878	40447949542601501	ESU-288	2597265	2023-11-30
199	NOVIEMBRE 2023	ESU-088	40447948201201501	ESU-280	2597417	2023-11-30
200	NOVIEMBRE 2023	PCE23861	40447948191701019	SCJ17E070101	2597306	2023-11-30
201	NOVIEMBRE 2023	CCEL11_034	40447949191401613	SCJ18E010003	2598327	2023-12-01
202	NOVIEMBRE 2023	AL65	40447948190401004	350-4958	2597938	2023-11-30
203	NOVIEMBRE 2023	AL170	40447948190401003	SCJ18ESP00019	2598050	2023-11-30
204	NOVIEMBRE 2023	SCJ17E020042	04456691802115004	AL845	2590465	2023-11-23
205	NOVIEMBRE 2023	CCEL19_074	40447949191501600	AL1708	2598560	2023-11-23
206	DICIEMBRE 2023	CCEL11_050	40447949191401812	SCJ17E060016	2598996	2023-12-01
207	DICIEMBRE 2023	ESU-011	40447948551101505	CVID21797	2602270	2023-12-04
208	DICIEMBRE 2023	PCE22490	40447948531501606	SCJ17E190006	2598616	2023-12-01

Tabla 6. Cámaras Bosch reparadas en centro de servicio.

Por último, presentamos la estadística de las cámaras reparadas en los centros de servicios.

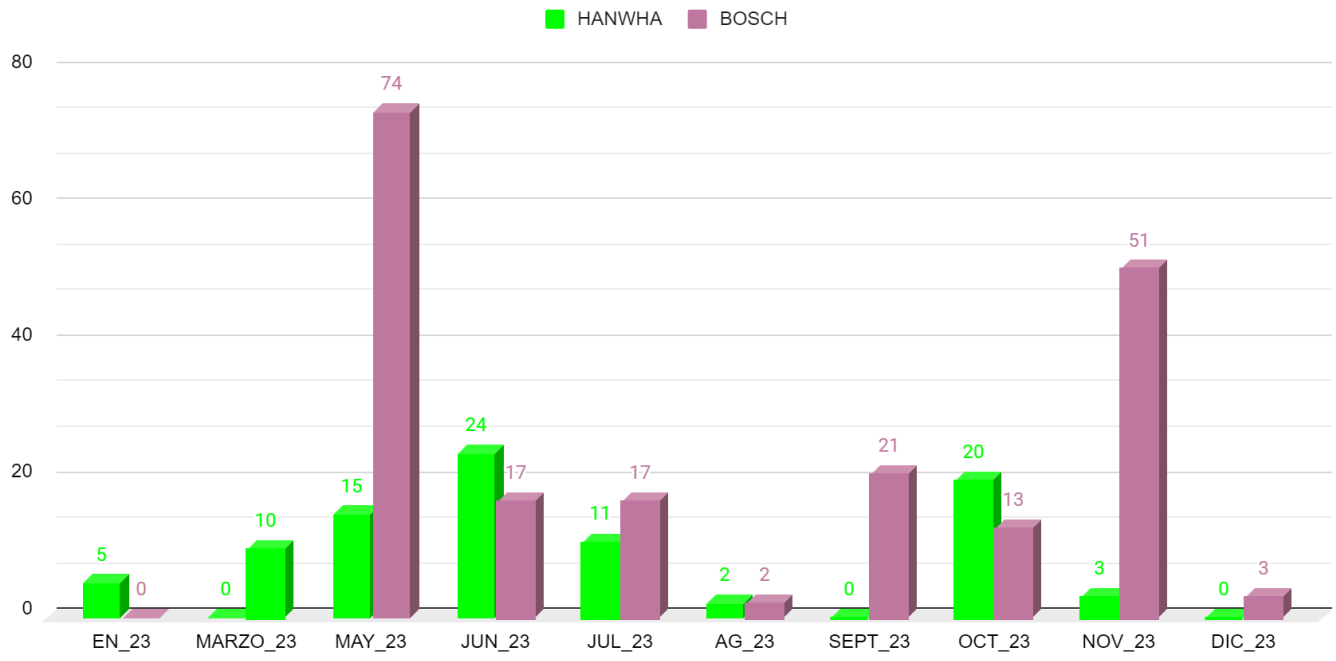

Mes	HANWHA	BOSCH
Enero 2023	5	0
Marzo 2023	0	10
Mayo 2023	15	74
Junio 2023	24	17
Julio 2023	11	17
Agosto 2023	2	2
Septiembre 2023	0	21
Octubre 2023	20	13
Noviembre 2023	3	51
Diciembre 2023	0	3
Total	**80**	**208**

Imagen 14. Estadística de las cámaras reparadas.

11. Garantía de cámaras

ÍTEM	AFILIACIÓN	CAMARA_SERIAL	CAMARA_MARCA	CÁMARA REFERENCIA	CÁMARA PLACA SDSCJ	FECHA GARANTÍA	FECHA INGRESO ALMACÉN
1	FVS-1118	40456692391701203	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA000001234	2026-02-08	2023-04-26
2	FVS-1124	40456692391701205	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA000001199	2025-11-03	2022-12-14
3	FVS-1128	B8A44F893183	AXIS	P5655-E	BDA000001267	2026-08-21	2023-09-22
4	FVS-1137	ZMJS6V4T500001E	HANWHA	XNP-6321H	BDA000001245	2026-03-15	2023-04-26
5	FVS-1140	ZMJS6V4T50000LE	HANWHA	XNP-6321H	BDA000001246	2026-03-16	2023-04-26
6	FVS-1142	40456692392001901	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA000001238	2026-02-26	2023-03-22
7	FVS-1143	ZMJS6V4T50000ST	HANWHA	XNP-6321H	BDA000001265	2026-07-19	2023-09-04
8	FVS-1161	40456692391701903	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA000001195	2025-11-02	2022-12-14
9	FVS-1170	40456692391701904	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA000001231	2026-02-02	2023-03-22
10	FVS-1200	40456692391701204	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA000001199	2025-11-03	2022-12-14
11	FVS-1204	ZMJS6V4T50000GY	HANWHA	XNP-6321H	BDA000001247	2026-03-21	2023-04-26
12	FVS-1205	ZMJS6V4T40001XF	HANWHA	XNP-6321H	BDA000001213	2025-12-27	2023-01-13
13	FVS-1402	ZMJS6V4T40002TT	HANWHA	XNP-6321H	BDA000001264	2026-08-24	2023-09-22
14	FVS-1405	40456692392101902	BOSCH	NDP-5502	BDA000001239	2026-02-27	2023-03-22
15	FVS-1410	40456692391701901	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA000001199	2025-11-05	2022-12-14
16	FVS-1411	ZMJS6V4T700038T	HANWHA	XNP-6321H	BDA000001223	2026-01-25	2023-02-15

ÍTEM	AFILIACIÓN	CAMARA_SERIAL	CAMARA_MARCA	CÁMARA REFERENCIA	CÁMARA PLACA SDSCJ	FECHA GARANTÍA	FECHA INGRESO ALMACÉN
17	FVS-1313	ZMJS6V4T50000PA	HANWHA	XNP-6321H	BDA000001253	2026-03-27	2023-05-19
18	FVS-1618	ZMJS6V4T30009AT	HANWHA	XNP-6321H	BDA000001219	2026-01-06	2023-02-15
19	FVS-1648	ZMJS6V4T700027X	HANWHA	XNP-6321H	BDA000001288	2026-10-13	2023-12-06
20	FVS-2005	B8A44F88B61F	AXIS	P5655-E	BDA000001267	2026-08-14	2023-09-22
21	FVS-2006	ZMJS6V4T700020L	HANWHA	XNP-6321H	BDA000001281	2026-09-15	2023-10-31
22	FVS-2007	ZMJS6V4T70003LE	HANWHA	XNP-6321H	BDA000001225	2026-01-27	2023-02-15
23	FVS-2008	40456692392001202	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA000001234	2026-03-16	2023-03-22
24	FVS-2203	ZMJS6V4T300051W	HANWHA	XNP-6321H	BDA000001220	2026-01-05	2023-03-22
25	FVS-2206	40456692391901202	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA000001234	2026-02-22	2023-03-22
26	FVS-2601	40456692392001201	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA000001204	2025-12-14	2023-01-13
27	FVS-2605	ZMJS6V4T400011L	HANWHA	XNP-6321H	BDA000001270	2026-08-24	2023-09-22
28	FVS-2806	40456692740401806	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA000001241	2026-02-28	2023-04-26
29	FVS-3000	ZMJS6V4T70003GH	HANWHA	XNP-6321H	BDA000001223	2026-02-03	2023-03-22
30	FVS-3006	40456692391701204	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA000001230	2026-02-06	2023-03-22
31	FVS-3203	B8A44F88B59C	AXIS	P5655-E	BDA000001258	2026-06-05	2023-07-18
32	FVS-3209	40456692391701205	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA000001196	2025-11-01	2022-12-09
33	FVS-3403	ZMJS6V4T70003HV	HANWHA	XNP-6321H	BDA000001223	2026-01-30	2023-03-22
34	FVS-3613	40456692391701203	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA000001199	2025-11-25	2023-01-13
35	FVS-3618	40456692391701900	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA000001234	2026-02-10	2023-03-22
36	FVS-3620	40456692392101901	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA000001235	2026-02-21	2023-04-26
37	FVS-4815	ZMJS6V4T500003H	HANWHA	XNP-6321H	BDA000001248	2026-03-16	2023-04-26
38	FVS-4028	ZMJS6V4T30008ER	HANWHA	XNP-6321H	BDA000001221	2026-01-03	2023-02-15
39	FVS-4035	ZMJS6V4T40003QX	HANWHA	XNP-6321H	BDA000001280	2026-09-13	2023-10-31
40	FVS-4812	40456692391601900	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA000001195	2025-11-03	2022-12-14
41	FVS-4415	ZMJS6V4T30004TP	HANWHA	XNP-6321H	BDA000001222	2026-01-03	2023-02-15
42	ESU-011	B8A44F893177	AXIS	P5655-E	BDA000001278	2026-09-06	2023-10-31
43	ESU-015	B8A44F88B78D	AXIS	P5655-E	BDA000001268	2026-08-13	2023-09-22
44	ESU-016	ZMJS6V4T30004LH	HANWHA	XNP-6321H	BDA000001220	2026-01-03	2023-02-15
45	ESU-018	40456692392001208	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA000001204	2026-01-10	2023-02-15
46	ESU-066	40456692391701203	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA000001199	2025-11-04	2022-12-14
47	ESU-067	ZMJS6V4T40002EF	HANWHA	XNP-6321H	BDA000001213	2025-12-17	2023-01-13
48	ESU-068	40456692391701202	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA000001203	2025-11-20	2023-01-13
49	ESU-070	ZMJS6V4T70002GP	HANWHA	XNP-6321H	BDA000001288	2026-10-16	2023-12-06
50	ESU-080	40456692391701206	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA000001196	2025-11-01	2022-12-09
51	ESU-082	40456692391701201	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA000001231	2026-02-06	2023-03-22
52	ESU-090	ZMJS6V4T30008QK	HANWHA	XNP-6321H	BDA000001222	2025-12-29	2023-01-13
52	ESU-123	B8A44F8941BD	AXIS	P5655-E	BDA000001278	2026-09-08	2023-10-31

ÍTEM	AFILIACIÓN	CAMARA_SERIAL	CAMARA_MARCA	CÁMARA REFERENCIA	CÁMARA PLACA SDSCJ	FECHA GARANTÍA	FECHA INGRESO ALMACÉN
53	ESU-127	ZMJS6V4T40004WL	HANWHA	XNP-6321H	BDA000001256	2026-05-19	2023-06-28
54	ESU-135	40456692391701904	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA000001198	2025-11-02	2022-12-14
55	ESU-136	ZMJS6V4T700011M	SAMSUNG	XNP-6321H	BDA000001289	2026-10-24	2023-12-06
56	ESU-147	ZMJS6V4T500016H	HANWHA	XNP-6321H	BDA000001253	2026-06-01	2023-07-18
57	ESU-163	40456692391801900	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA000001196	2025-11-02	2022-12-14
58	ESU-171	40456692391701902	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA000001195	2025-10-20	2022-12-09
59	ESU-177	ZMJS6V4T500013L	HANWHA	XNP-6321H	BDA000001270	2026-08-15	2023-09-22
60	ESU-190	40456692392001206	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA000001203	2026-01-12	2023-02-15
61	ESU-222	40456692392001206	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA000001239	2026-02-27	2023-03-22
62	ESU-239	ZMJS6V4T50000DN	HANWHA	XNP-6321H	BDA000001246	2026-03-13	2023-04-26
63	ESU-245	ZMJS6V4T50000BP	HANWHA	XNP-6321H	BDA000001245	2026-03-13	2023-05-19
64	ESU-258	40456692391701201	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA000001196	2025-10-26	2022-12-09
65	ESU-261	ZMJS6V4T70001EE	HANWHA	XNP-6321H	BDA000001290	2026-10-24	2023-12-06
66	ESU-267	ZMJS6V4T40001GV	HANWHA	XNP-6321H	BDA000001222	2025-12-29	2023-01-13
67	ESU-276	ZMJS6V4T700009K	SAMSUNG	XNP-6321H	BDA000001282	2026-09-18	2023-10-31
68	ESU-279	B8A44F887F66	AXIS	P5655-E	BDA0000012679	2026-08-25	2023-09-22
69	ESU-290	ZMJS6V4T500009Z	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012456	2026-03-27	2023-04-26
70	ESU-296	40456692391701200	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012314	2026-02-03	2023-03-22
71	ESU-302	ZMJS6V4T40004TX	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012539	2026-06-08	2023-07-18
72	ESU-303	ZMJS6V4T10004ZT	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012474	2026-03-13	2023-04-26
73	ESU-305	40456692391901201	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012361	2026-03-02	2023-05-19
74	ESU-316	ZMJS6V4T10004YH	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012477	2026-03-21	2023-04-26
75	350-1998	ZMJS6V4T70003QD	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012238	2026-01-31	2023-03-22
76	350-2012	ZMJS6V4T30003VK	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012646	2026-08-23	2023-09-22
77	350-2022	ZMJS6V4T700004B	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012822	2026-09-16	2023-10-31
78	350-4875	ZMJS6V4T400047Z	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012559	2026-05-18	2023-06-28
79	350-4878	ZMJS6V4T40001CW	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012737	2026-09-06	2023-10-31
80	350-4882	40456692392001204	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012347	2026-02-22	2023-03-22
81	350-4888	ZMJS6V4T40004SZ	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012557	2026-05-18	2023-06-28
82	350-4907	B8A44F893800	AXIS	P5655-E	BDA0000012675	2026-08-17	2023-09-22
83	350-4910	40456692740401203	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012410	2026-03-02	2023-04-26
84	350-4934	ZMJS6V4T40002WE	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012640	2026-08-22	2023-09-22
85	350-4940	ZMJS6V4T300095A	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012226	2025-12-29	2023-01-13
86	350-4941	ZMJS6V4T30003XT	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012739	2026-09-03	2023-10-31
87	350-4946	ZMJS6V4T50000NH	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012647	2026-08-25	2023-09-22
88	350-4948	40456692392001207	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012350	2026-02-23	2023-03-22
89	350-4952	ZMJS6V4T70001JD	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012889	2026-10-24	2023-12-06

ÍTEM	AFILIACIÓN	CAMARA_SERIAL	CAMARA_MARCA	CÁMARA REFERENCIA	CÁMARA PLACA SDSCJ	FECHA GARANTÍA	FECHA INGRESO ALMACÉN
90	350-4960	B8A44F89378A	AXIS	P5655-E	BDA0000012597	2026-06-14	2023-07-18
91	350-4962	ZMJS6V4T70003RF	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012239	2026-01-24	2023-02-15
92	350-4964	B8A44F8938A3	AXIS	P5655-E	BDA0000012587	2026-06-01	2023-07-18
93	350-4975	40456692392101902	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012354	2026-02-22	2023-03-22
94	350-5009	ZMJS6V4T700007H	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012228	2026-01-26	2023-02-15
95	350-5011	ZMJS6V4T70003JK	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012241	2026-01-27	2023-02-15
96	350-5021	40456692391701206	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012006	2025-11-10	2022-12-14
97	350-5049	ZMJS6V4T400033V	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012223	2026-01-02	2023-02-15
98	350-5053	B8A44F9B1289	AXIS	P5655-E	BDA0000012791	2026-09-12	2023-10-31
99	350-5056	ZMJS6V4T300099B	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012204	2026-01-04	2023-02-15
100	350-5058	B8A44F59C478	AXIS	P5655-E	BDA0000012590	2026-06-07	2023-07-18
101	350-5061	40456692391801900	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000011960	2025-11-07	2022-12-14
102	350-5064	40456692391701200	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012331	2026-02-01	2023-03-22
103	350-5065	ZMJS6V4T40002ZP	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012698	2026-08-23	2023-09-22
104	350-5068	ZMJS6V4T40000RB	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012644	2026-08-23	2023-09-22
105	350-5073	B8A44F8941AB	AXIS	P5655-E	BDA0000012593	2026-06-15	2023-07-18
106	350-5078	ZMJS6V4T40002NH	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012702	2026-08-23	2023-09-22
107	350-5082	ZMJS6V4T400017E	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012649	2026-08-23	2023-09-22
108	350-5084	40456692740401204	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012416	2026-02-28	2023-04-26
109	350-5087	ZMJS6V4T30003NX	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012697	2026-08-21	2023-09-22
110	350-5125	40456692392101902	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012047	2026-01-11	2023-02-15
111	350-5176	ZMJS6V4T400007P	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012652	2026-08-23	2023-09-22
112	350-5215	B8A44F59D0A9	AXIS	P5655-E	BDA0000012866	2026-10-03	2023-12-06
113	350-5216	40456692392101900	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012051	2025-12-14	2023-01-13
114	FN_103	ZMJS6V4T700036F	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012236	2026-01-23	2023-02-15
115	FN_109	40456692391701901	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000011998	2025-11-05	2022-12-14
116	FN_112	40456692391701901	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012340	2026-02-12	2023-02-15
117	FN_113	ZMJS6V4T70003NL	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012227	2026-01-31	2023-03-22
118	FN_120	B8A44F893142	AXIS	P5655-E	BDA0000012787	2026-09-10	2023-10-31
119	FN_137	ZMJS6V4T30004CK	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012634	2026-07-12	2023-09-04
120	FN_146	B8A44F43A5D3	AXIS	P5655-E	BDA0000012565	2026-04-27	2023-06-28
121	FN_17	ZMJS6V4T40004QR	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012555	2026-05-23	2023-06-28
122	FN_181	40456692740401209	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012409	2026-02-28	2023-04-26
123	FN_182	40456692740401202	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012411	2026-03-02	2023-04-26
124	FN_184	40456692391601200	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012336	2026-02-07	2023-03-22
125	FN_199	ZMJS6V4T50000WJ	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012551	2026-05-14	2023-06-28
126	FN_25	ZMJS6V4T40004JB	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012549	2026-06-06	2023-07-18

ÍTEM	AFILIACIÓN	CAMARA_SERIAL	CAMARA_MARCA	CÁMARA REFERENCIA	CÁMARA PLACA SDSCJ	FECHA GARANTÍA	FECHA INGRESO ALMACÉN
127	FN_3	ZMJS6V4T500004A	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012475	2026-03-16	2023-04-26
128	FN_41	B8A44F88B78A	AXIS	P5655-E	BDA0000012678	2026-08-17	2023-09-22
129	FN_48	40456692392001801	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012404	2026-02-27	2023-03-22
130	FN_52	40456692391601901	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012317	2026-02-06	2023-03-22
131	FN_75	ZMJS6V4T40004YN	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012564	2026-05-17	2023-06-28
132	FN_85	ZMJS6V4T50000AJ	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012481	2026-03-24	2023-04-26
133	FN_87	ZMJS6V4T30004YK	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012213	2026-01-02	2023-02-15
134	FN_95	40456692391701204	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012391	2026-02-24	2023-03-22
135	FS_140056	40456692391701206	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000011993	2025-11-10	2022-12-14
136	FS_70197	B8A44F887FA3	AXIS	P5655-E	BDA0000012786	2026-09-10	2023-10-31
137	FS_80003	ZMJS6V4T40002GK	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012648	2026-07-17	2023-09-04
138	SADC_1	ZMJS6V4T50000VZ	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012463	2026-03-22	2023-04-26
139	SCHO_2	40456692391701201	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012400	2026-02-28	2023-04-26
140	SCHO_5	40456692391801900	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012385	2026-02-28	2023-04-26
141	SCJ17E010004	40456692391701204	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012319	2026-02-09	2023-03-22
142	SCJ17E010011	ZMJS6V4T40000VW	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012695	2026-09-21	2023-10-31
143	SCJ17E010012	40456692391701204	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012403	2026-02-26	2023-03-22
144	SCJ17E010015	ZMJS6V4T50000QW	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012547	2026-06-02	2023-07-18
145	SCJ17E010017	ZMJS6V4T40002BM	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012137	2025-12-15	2023-01-13
146	SCJ17E010024	40456692391701204	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012021	2025-11-22	2023-01-13
147	SCJ17E010028	ZMJS6V4T70003CW	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012240	2026-01-30	2023-03-22
148	SCJ17E010029	ZMJS6V4T70000DL	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012722	2026-09-08	2023-10-31
149	SCJ17E010031	40456692392001200	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012042	2025-11-23	2023-01-13
150	SCJ17E010034	ZMJS6V4T700006N	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012823	2026-09-15	2023-10-31
151	SCJ17E010035	40456692392001204	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012045	2025-11-24	2023-01-13
152	SCJ17E010056	40456692392001207	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012055	2026-01-12	2023-02-15
153	SCJ17E010075	40456692391701205	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012012	2025-11-21	2023-01-13
154	SCJ17E010077	40456692391701904	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012014	2025-11-21	2023-01-13
155	SCJ17E020006	ZMJS6V4T30004ET	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012696	2026-08-18	2023-09-22
156	SCJ17E020007	B8A44F893763	AXIS	P5655-E	BDA0000012599	2026-06-08	2023-07-18
157	SCJ17E020011	B8A44F893812	AXIS	P5655-E	BDA0000012690	2026-08-22	2023-09-22
158	SCJ17E020017	40456692392001206	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012349	2026-02-23	2023-03-22
159	SCJ17E020028	B8A44F9B11FE	AXIS	P5655-E	BDA0000012692	2026-08-26	2023-09-22
160	SCJ17E020035	40456692392001200	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012355	2026-02-23	2023-03-22
161	SCJ17E030006	40456692391701206	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012406	2026-02-24	2023-03-22
162	SCJ17E030009	B8A44F89388C	AXIS	P5655-E	BDA0000012672	2026-08-17	2023-09-22
163	SCJ17E030022	ZMJS6V4T30008PZ	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012209	2026-01-02	2023-02-15

ÍTEM	AFILIACIÓN	CAMARA_SERIAL	CAMARA_MARCA	CÁMARA REFERENCIA	CÁMARA PLACA SDSCJ	FECHA GARANTÍA	FECHA INGRESO ALMACÉN
164	SCJ17E030030	ZMJS6V4T30003HH	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012751	2026-09-08	2023-10-31
165	SCJ17E030033	40456692391701207	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012011	2025-11-14	2022-12-14
166	SCJ17E030055	40456692391701202	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012328	2026-02-02	2023-03-22
167	SCJ17E030075	ZMJS6V4T70002XA	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012820	2026-09-15	2023-10-31
168	SCJ17E040009	ZMJS6V4T700033L	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012251	2026-08-25	2023-03-22
169	SCJ17E040014	B8A44F9B1210	AXIS	P5655-E	BDA0000012681	2026-08-24	2023-09-22
170	SCJ17E040036	40456692391701902	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000011985	2025-11-08	2022-12-14
171	SCJ17E040040	ZMJS6V4T40002SJ	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012645	2026-07-07	2023-09-04
172	SCJ17E040051	40456692391601901	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012003	2025-11-09	2022-12-14
173	SCJ17E040063	ZMJS6V4T500005W	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012466	2026-03-20	2023-04-26
174	SCJ17E040066	40456692392001202	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012031	2026-02-12	2023-03-22
175	SCJ17E040068	40456692391701206	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012316	2026-02-12	2023-03-22
176	SCJ17E040069	40456692391701904	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012326	2026-02-13	2023-03-22
177	SCJ17E040071	ZMJS6V4T50000CV	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012467	2026-03-15	2023-04-26
178	SCJ17E040073	40456692391801900	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012325	2026-02-12	2023-03-22
179	SCJ17E040075	ZMJS6V4T50000HM	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012471	2026-03-16	2023-04-26
180	SCJ17E040084	ZMJS6V4T70002FK	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012875	2026-10-11	2023-12-06
181	SCJ17E040096	40456692391701902	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012329	2026-02-08	2023-03-22
182	SCJ17E040102	40456692392001207	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012059	2025-12-28	2023-01-13
183	SCJ17E040108	40456692740401814	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012412	2026-03-01	2023-04-26
184	SCJ17E050013	40456692391701205	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012398	2026-02-28	2023-04-26
185	SCJ17E050033	40456692391701903	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012393	2026-02-28	2023-04-26
186	SCJ17E050052	B8A44F9B1222	AXIS	P5655-E	BDA0000012688	2026-08-25	2023-09-22
187	SCJ17E050054	B8A44F89317E	AXIS	P5655-E	BDA0000012671	2026-08-08	2023-09-22
188	SCJ17E050064	ZMJS6V4T400022X	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012112	2025-12-21	2023-01-13
189	SCJ17E050081	ZMJS6V4T700031E	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012245	2026-01-25	2023-02-15
190	SCJ17E050103	ZMJS6V4T700021Z	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012813	2026-09-14	2023-12-06
191	SCJ17E050105	40456692392001208	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012353	2026-02-22	2023-03-22
192	SCJ17E050107	ZMJS6V4T700030P	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012799	2026-09-14	2023-10-31
193	SCJ17E050110	40456692392001901	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012039	2025-11-27	2023-01-13
194	SCJ17E060052	ZMJS6V4T500011M	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012460	2026-03-15	2023-04-26
195	SCJ17E070026	ZMJS6V4T300071Z	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012122	2025-12-27	2023-01-13
196	SCJ17E070038	40456692391701901	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012322	2026-02-06	2023-03-22
197	SCJ17E070061	ZMJS6V4T300043F	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012729	2026-09-03	2023-10-31
198	SCJ17E070066	ZMJS6V4T70003FN	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012246	2026-01-27	2023-02-15
199	SCJ17E070069	40456692392001205	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012057	2026-01-11	2023-02-15
200	SCJ17E070070	ZMJS6V4T40003RH	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012745	2026-09-04	2023-10-31

ÍTEM	AFILIACIÓN	CAMARA_SERIAL	CAMARA_MARCA	CÁMARA REFERENCIA	CÁMARA PLACA SDSCJ	FECHA GARANTÍA	FECHA INGRESO ALMACÉN
201	SCJ17E070071	ZMJS6V4T70002KL	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012868	2026-10-11	2023-12-06
202	SCJ17E070076	B8A44F887F63	AXIS	P5655-E	BDA0000012594	2026-06-04	2023-07-18
203	SCJ17E070081	ZMJS6V4T30008XM	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012218	2025-12-29	2023-01-13
204	SCJ17E070090	ZMJS6V4T300052M	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012219	2025-12-29	2023-01-13
205	SCJ17E070093	B8A44F8931A4	AXIS	P5655-E	BDA0000012589	2026-06-05	2023-07-18
206	SCJ17E070095	ZMJS6V4T400032R	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012116	2026-01-01	2023-02-15
207	SCJ17E070109	ZMJS6V4T10007KB	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012462	2026-03-14	2023-05-19
208	SCJ17E090050	B8A44F9B1234	AXIS	P5655-E	BDA0000012687	2026-08-09	2023-09-22
209	SCJ17E090056	ZMJS6V4T30003QP	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012721	2026-09-02	2023-10-31
210	SCJ17E090060	40456692392001206	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012054	2026-02-23	2023-02-15
211	SCJ17E090067	40456692391701201	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012018	2025-11-19	2023-01-13
212	SCJ17E090068	ZMJS6V4T40000XD	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012749	2026-09-01	2023-10-31
213	SCJ17E090069	ZMJS6V4T500006X	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012484	2026-03-17	2023-04-26
214	SCJ17E090071	ZMJS6V4T400023H	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012124	2026-01-30	2023-03-22
215	SCJ17E090075	ZMJS6V4T30008AW	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012794	2026-09-11	2023-10-31
216	SCJ17E090079	40456692391701204	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012027	2025-11-18	2023-01-13
218	SCJ17E090080	40456692391609019	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012022	2025-11-18	2023-01-13
218	SCJ17E100014	40456692391701201	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012311	2026-02-07	2023-03-22
219	SCJ17E100017	40456692391701904	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012020	2025-11-22	2023-01-13
220	SCJ17E100024	40456692392001801	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012043	2026-01-10	2023-02-15
221	SCJ17E100046	ZMJS6V4T40002DP	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012134	2025-12-18	2023-01-13
223	SCJ17E100076	ZMJS6V4T700039Y	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012229	2026-01-27	2023-02-15
224	SCJ17E100089	ZMJS6V4T40002CB	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012136	2025-12-14	2023-01-13
225	SCJ17E100103	40456692392001902	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012037	2025-12-09	2023-01-13
226	SCJ17E100105	ZMJS6V4T300053J	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012210	2026-01-02	2023-02-15
227	SCJ17E100112	ZMJS6V4T70002TR	SAMSUNG	SNP-6321H	BDA0000012804	2026-09-16	2023-10-31
228	SCJ17E100113	ZMJS6V4T70002NF	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012869	2026-10-09	2023-12-06
229	SCJ17E100114	ZMJS6V4T30004VA	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012212	2026-01-02	2023-02-15
230	SCJ17E100150	40456692392001900	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012352	2026-07-27	2023-03-22
231	SCJ17E100152	40456692392101900	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012035	2026-02-28	2023-01-13
232	SCJ17E110006	40456692391701204	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012008	2025-11-16	2023-01-13
233	SCJ17E110009	40456692391701205	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012023	2026-02-22	2023-03-22
234	SCJ17E110027	40456692391701204	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000011991	2025-11-05	2022-12-14
235	SCJ17E110030	ZMJS6V4T30007GD	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012118	2025-12-27	2023-01-13
236	SCJ17E110032	B8A44F9B122A	AXIS	P5655-E	BDA0000012684	2026-08-16	2023-09-22
237	SCJ17E110047	ZMJS6V4T500010Y	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012543	2026-07-13	2023-09-04
238	SCJ17E110048	ZMJS6V4T70000MR	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012699	2026-08-25	2023-09-22

ÍTEM	AFILIACIÓN	CAMARA_SERIAL	CAMARA_MARCA	CÁMARA REFERENCIA	CÁMARA PLACA SDSCJ	FECHA GARANTÍA	FECHA INGRESO ALMACÉN
239	SCJ17E110068	B8A44F887F7E	AXIS	P5655-E	BDA0000012693	2026-08-16	2023-09-22
240	SCJ17E120038	ZMJS6V4T700005A	HANWHA	XNP-6321HN	BDA0000012248	2026-01-29	2023-02-15
241	SCJ17E120040	ZMJS6V4T300056F	HANWHA	XNP-6321HN	BDA0000012748	2026-09-03	2023-10-31
242	SCJ17E120041	40456692391701901	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012308	2026-02-05	2023-03-22
243	SCJ17E120043	40456692391701202	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012327	2026-02-05	2023-03-22
244	SCJ17E120047	40456692391601900	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012396	2026-02-27	2023-03-22
245	SCJ17E120051	40456692391701903	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012004	2025-11-17	2023-01-13
246	SCJ17E120052	40456692391701903	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012387	2026-02-27	2023-03-22
247	SCJ17E120054	ZMJS6V4T70000CJ	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012891	2026-10-26	2023-12-06
248	SCJ17E120063	B8A44F8931AA	AXIS	P5655-E	BDA0000012598	2026-06-13	2023-07-18
249	SCJ17E130007	ZMJS6V4T40001WP	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012133	2025-12-25	2023-01-13
250	SCJ17E130025	40456692391701200	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012333	2026-02-02	2023-03-22
251	SCJ17E130028	B8A44F43A63F	AXIS	P5655-E	BDA0000012143	2026-05-10	2023-06-28
252	SCJ17E130035	ZMJS6V4T40004AL	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012536	2026-03-27	2023-04-26
253	SCJ17E130036	ZMJS6V4T40004BY	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012550	2026-06-03	2023-07-18
254	SCJ17E130050	40456692391701902	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012002	2025-11-10	2022-12-14
255	SCJ17E130057	40456692392101901	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012346	2026-02-22	2023-03-22
256	SCJ17E130059	40456692391701200	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012010	2025-11-09	2022-12-14
257	SCJ17E130061	ZMJS6V4T40001ZK	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012131	2025-12-26	2023-01-13
258	SCJ17E130068	40456692391801902	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012395	2026-02-26	2023-03-22
259	SCJ17E130069	ZMJS6V4T70002BA	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012732	2026-09-05	2023-10-31
260	SCJ17E130072	ZMJS6V4T40004FA	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012554	2026-05-17	2023-06-28
261	SCJ17E130093	ZMJS6V4T70000QA	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012728	2026-08-31	2023-10-31
262	SCJ17E140023	B8A44F8931AF	AXIS	P5655-E	BDA0000012680	2026-08-15	2023-09-22
263	SCJ17E140033	ZMJS6V4T70003PZ	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012249	2026-01-26	2023-02-15
264	SCJ17E140039	B8A44F893199	AXIS	P5655-E	BDA0000012691	2026-08-14	2023-09-22
265	SCJ17E140046	40456692391701202	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012019	2025-11-25	2023-01-13
266	SCJ17E140047	ZMJS6V4T30007JA	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012121	2025-12-26	2023-01-13
267	SCJ17E150003	ZMJS6V4T40001TM	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012214	2026-01-03	2023-02-15
268	SCJ17E150020	ZMJS6V4T50000FR	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012470	2026-03-16	2023-04-26
269	SCJ17E150036	ZMJS6V4T400042W	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012811	2026-09-15	2023-10-31
270	SCJ17E150042	B8A44F9B1213	AXIS	P5655-E	BDA0000012689	2026-08-16	2023-09-22
271	SCJ17E150043	ZMJS6V4T30007ZE	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012205	2026-01-03	2023-02-15
272	SCJ17E150060	B8A44F887F9E	AXIS	P5655-E	BDA0000012790	2026-09-11	2023-10-31
273	SCJ17E150061	ZMJS6V4T70003DB	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012232	2026-02-02	2023-03-22
274	SCJ17E150067	40456692391601200	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012324	2026-02-02	2023-03-22
275	SCJ17E160004	ZMJS6V4T500008F	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012480	2026-03-22	2023-04-26

ÍTEM	AFILIACIÓN	CAMARA_SERIAL	CAMARA_MARCA	CÁMARA REFERENCIA	CÁMARA PLACA SDSCJ	FECHA GARANTÍA	FECHA INGRESO ALMACÉN
276	SCJ17E160009	40456692391701904	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012390	2026-02-23	2023-03-22
277	SCJ17E160019	ZMJS6V4T40004DJ	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012538	2026-06-06	2023-07-18
278	SCJ17E160035	ZMJS6V4T30008NY	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012207	2026-01-03	2023-02-15
279	SCJ17E160074	40456692391701200	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012321	2026-02-12	2023-03-22
280	SCJ17E160079	B8A44F887F3A	AXIS	P5655-E	BDA0000012785	2026-09-08	2023-10-31
281	SCJ17E160081	ZMJS6V4T400048X	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012561	2026-05-17	2023-06-28
282	SCJ17E190036	ZMJS6V4T700015R	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012888	2026-10-23	2023-12-06
283	SCJ17E190072	ZMJS6V4T70001CK	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012892	2026-10-23	2023-12-06
284	SCJ17E190079	40456692391801900	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000011954	2025-10-25	2022-12-09
285	SCJ17E190081	ZMJS6V4T700023F	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012810	2026-09-14	2023-10-31
286	SCJ17E190083	40456692392001205	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012405	2026-03-06	2023-04-26
287	SCJ17E190102	40456692391701903	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000011958	2025-10-27	2022-12-09
288	SCJ17E190106	ZMJS6V4T70003BR	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012247	2026-01-24	2023-02-15
289	SCJ17E190119	40456692391701903	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012330	2026-02-05	2023-03-22
290	SCJ17E190123	ZMJS6V4T500002K	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012465	2026-05-15	2023-06-28
291	SCJ17E190127	40456692391701202	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000011952	2025-10-21	2022-12-09
292	SCJ17E190133	40456692391701901	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012320	2026-02-08	2023-03-22
293	SCJ17E190168	40456692392001900	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012397	2026-02-27	2023-03-22
294	SCJ18ESP00028_2	ZMJS6V4T40001YW	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012140	2025-12-19	2023-01-13
295	SFGN_3	40456692391701902	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012337	2026-02-13	2023-03-22
296	SFGN_33	40456692391801902	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012407	2026-02-28	2023-03-22
297	SFGN_47	ZMJS6V4T40004RV	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012558	2026-06-09	2023-07-18
298	STRM_13	ZMJS6V4RC0000TN	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012898	2026-10-25	2023-12-06
299	AL710	ZMJS6V4T40004PD	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012233	2026-01-25	2023-02-15
300	CVID21620	B8A44F89383A	AXIS	P5655-E	BDA0000012677	2026-08-09	2023-09-22
301	PCE19553	ZMJS6V4T40002FW	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012740	2026-09-01	2023-10-31
302	AL1986	40456692391601200	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012339	2026-02-10	2023-03-22
303	AL1963	ZMJS6V4T40001QT	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012197	2026-01-04	2023-03-22
304	MB932	ZMJS6V4T70001AH	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012899	2026-10-25	2023-12-06
305	AL2003	ZMJS6V4T30008ZH	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012198	2026-01-04	2023-02-15
306	AL333	ZMJS6V4T70001FJ	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012896	2026-10-25	2023-12-06
307	AL1738	ZMJS6V4T40004MW	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012814	2026-09-15	2023-10-31
308	AL1209	ZMJS6V4T70002AB	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012867	2026-10-11	2023-12-06
309	AL192	40456692391601200	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012024	2025-11-20	2023-01-13
310	AL191	ZMJS6V4T400044D	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012743	2026-09-01	2023-10-31
311	CVID21830	ZMJS6V4T500015K	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012546	2026-05-15	2023-06-28
312	AL1184	ZMJS6V4T100051A	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012459	2026-03-15	2023-04-26

ÍTEM	AFILIACIÓN	CAMARA_SERIAL	CAMARA_MARCA	CÁMARA REFERENCIA	CÁMARA PLACA SDSCJ	FECHA GARANTÍA	FECHA INGRESO ALMACÉN
313	AL1195	ZMJS6V4T50000JD	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012482	2026-03-17	2023-04-26
314	MB339	40456692391601900	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012402	2026-03-06	2023-04-26
315	MB351	ZMJS6V4T100054Y	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012469	2026-03-14	2023-04-26
316	AL1596	40456692391701201	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000011984	2025-11-03	2022-12-14
317	AL1624	ZMJS6V4T40001DK	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012736	2026-08-28	2023-09-22
318	AL1002	ZMJS6V4T40002MX	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012731	2026-08-31	2023-10-31
319	AL1021	40456692392101901	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012363	2026-02-22	2023-03-22
320	AL1087	ZMJS6V4T700028R	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012878	2026-10-13	2023-12-06
321	AL110	ZMJS6V4T70002MD	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012877	2026-10-11	2023-12-06
322	AL1136	ZMJS6V4T40004XY	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012552	2026-05-19	2023-06-28
323	AL1171	40456692392101902	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012351	2026-02-22	2023-03-22
324	AL170	ZMJS6V4T70002YN	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012798	2026-09-14	2023-12-06
325	AL65	ZMJS6V4T50000YV	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012797	2026-09-14	2023-10-31
326	AL74	ZMJS6V4T70000RN	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012727	2026-09-02	2023-10-31
327	AL857	ZMJS6V4T300032N	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012733	2026-08-31	2023-10-31
328	AL88	40456692391601900	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012005	2025-11-10	2022-12-14
329	AL904	40456692392001206	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012060	2026-01-10	2023-02-15
330	AL908	ZMJS6V4T40003ZE	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012817	2026-09-15	2023-10-31
331	AL952	ZMJS6V4T400049H	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012563	2026-05-16	2023-06-28
332	AL963	ZMJS6V4T400024L	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012113	2025-12-21	2023-01-13
333	AL982	ZMJS6V4T70001KF	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012807	2026-09-14	2023-10-31
334	AL984	ZMJS6V4T40000KN	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012746	2026-08-31	2023-10-31
335	AL991	ZMJS6V4T40001BF	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012202	2026-02-01	2023-03-22
336	CVID21659	40456692392001207	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012049	2025-11-28	2023-01-13
337	P39	ZMJS6V4T700022D	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012806	2026-09-14	2023-10-31
338	P42	40456692391701206	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000011990	2025-11-16	2022-12-14
339	P43	ZMJS6V4T70002SX	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012244	2026-02-01	2023-03-22
340	AL2111	ZMJS6V4T700032J	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012243	2026-01-23	2023-02-15
341	AL2123	40456692391701206	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012384	2026-02-24	2023-03-22
342	AL2137	ZMJS6V4T30008CJ	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012216	2026-01-03	2023-02-15
343	AL2198	40456692740401805	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012417	2026-02-28	2023-04-26
344	AL388	ZMJS6V4T30006AE	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012215	2026-01-02	2023-02-15
345	CVID22262	40456692391701901	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012338	2026-02-09	2023-03-22
346	MB1066	ZMJS6V4T10007EN	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012473	2026-03-16	2023-04-26
347	MB1086	ZMJS6V4T70003EA	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012234	2026-01-26	2023-02-15
348	P120	ZMJS6V4T400028T	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012127	2025-12-14	2023-01-13
349	P129	ZMJS6V4T40002VA	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012635	2026-07-18	2023-09-04

ÍTEM	AFILIACIÓN	CAMARA_SERIAL	CAMARA_MARCA	CÁMARA REFERENCIA	CÁMARA PLACA SDSCJ	FECHA GARANTÍA	FECHA INGRESO ALMACÉN
350	AL1390	40456692391701900	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012028	2025-11-18	2023-01-13
351	AL1391	ZMJS6V4T40001VB	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012126	2025-12-16	2023-01-13
352	AL1397	ZMJS6V4T10004XD	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012478	2026-03-22	2023-04-26
353	AL1402	40456692392101900	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012034	2025-11-28	2023-01-13
354	AL1408	ZMJS6V4T30004SD	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012723	2026-09-02	2023-10-31
355	AL235	40456692392101901	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012058	2025-11-27	2023-01-13
356	AL237	40456692392101900	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012053	2025-11-27	2023-01-13
357	AL238	ZMJS6V4RC0000EY	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012890	2026-10-23	2023-12-06
358	MB445	40456692392001205	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012056	2026-01-16	2023-02-15
359	MB461	ZMJS6V4T50000EB	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012468	2026-03-17	2023-05-19
360	MB478	ZMJS6V4T400027J	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012129	2025-12-15	2023-01-13
361	MB528	40456692392101901	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012038	2025-11-28	2023-01-13
362	PCE19855	ZMJS6V4T30008FF	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012795	2026-09-12	2023-10-31
363	PCE23896	40456692391701900	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012332	2026-02-07	2023-03-22
364	AL1883	ZMJS6V4T30004XZ	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012224	2026-01-01	2023-03-22
365	P206	ZMJS6V4T40000TF	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012744	2026-09-02	2023-10-31
366	P215	40456692392001206	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012033	2025-11-24	2023-01-13
367	AL1247	ZMJS6V4T700013Y	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012897	2026-10-24	2023-12-06
368	AL1302	B8A44F8937FA	AXIS	P5655-E	BDA0000012600	2026-06-12	2023-07-18
369	AL1350	ZMJS6V4T400025Y	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012123	2025-12-15	2023-03-22
370	AL1354	ZMJS6V4T700008V	HANWHA	XNP-6321H	**BDA0000012256**	2026-01-26	2023-02-15
371	AL1979	40456692392001905	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012044	2026-01-13	2023-02-15
372	AL210	B8A44F7E0A11	AXIS	P5655-E	**BDA0000012796**	2026-09-13	2023-12-06
373	CCEL08_0016	B8A44F893174	AXIS	P5655-E	BDA0000012685	2026-08-14	2023-09-22
374	CCEL08_0023	ZMJS6V4T70002EV	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012880	2026-10-09	2023-12-06
375	CCEL08_0029	ZMJS6V4T70000PB	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012242	2026-01-23	2023-02-15
376	CCEL08_050	B8A44F59C280	AXIS	P5655-E	BDA0000012865	2026-10-05	2023-12-06
377	CVID21901	ZMJS6V4T30006CX	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012117	2025-12-21	2023-01-13
378	CVID21927	ZMJS6V4T40004ET	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012808	2026-09-15	2023-10-31
379	CVID21947	ZMJS6V4T700012T	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012886	2026-10-24	2023-12-06
380	MB111	B8A44F8938FD	AXIS	P5655-E	BDA0000012588	2026-06-12	2023-07-18
381	MB840	ZMJS6V4T40004CN	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012542	2026-06-01	2023-07-18
382	PCE18760	ZMJS6V4T700019N	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012887	2026-10-24	2023-12-06
383	PCE19957	ZMJS6V4T700014X	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012900	2026-10-24	2023-12-06
384	PCE20645	40456692391701205	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000011992	2025-11-07	2022-12-14
385	PCE24025	40456692392001207	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012032	2026-01-15	2023-02-15
386	CCEL13_003	ZMJS6V4T40004GE	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012819	2026-09-15	2023-10-31

ÍTEM	AFILIACIÓN	CAMARA_SERIAL	CAMARA_MARCA	CÁMARA REFERENCIA	CÁMARA PLACA SDSCJ	FECHA GARANTÍA	FECHA INGRESO ALMACÉN
387	P174	40456692391701901	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000011989	2025-11-02	2022-12-14
388	P177	40456692391701206	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012401	2026-02-26	2023-03-22
389	AL1432	B8A44F43A019	AXIS	P5655-E	BDA0000012592	2026-06-08	2023-07-18
390	AL1456	ZMJS6V4T40004VH	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012560	2026-06-08	2023-07-18
391	AL1471	40456692391701903	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012389	2026-02-26	2023-03-22
392	AL1472	ZMJS6V4T70003MJ	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012235	2026-01-25	2023-02-15
393	AL1510	ZMJS6V4T40003GP	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012111	2025-12-18	2023-01-13
394	AL1514	B8A44F893856	AXIS	P5655-E	BDA0000012784	2026-09-11	2023-10-31
395	AL1515	40456692391601901	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012388	2026-02-26	2023-03-22
396	AL1526	ZMJS6V4T500012D	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012724	2026-09-03	2023-10-31
397	AL1532	ZMJS6V4T400010H	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012734	2026-09-03	2023-10-31
398	AL1540	40456692391701202	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012009	2025-11-20	2023-01-13
399	AL1543	B8A44F9B1257	AXIS	P5655-E	BDA0000012793	2026-09-11	2023-10-31
400	AL1551	40456692391701203	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012313	2026-02-01	2023-03-22
401	AL2524	B8A44F9B12FD	AXIS	P5655-E	BDA0000012673	2026-08-09	2023-09-22
402	CCE_L10_02	40456692392001801	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012050	2025-11-23	2023-01-13
403	CCE_L10_05	ZMJS6V4T40000LJ	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012720	2026-08-31	2023-09-22
404	CCE_L10_07	40456692391701901	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012000	2025-11-23	2023-01-13
405	CCE_L10_17	40456692391701903	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012309	2026-02-07	2023-03-22
406	CCE_L10_18	B8A44F59C241	AXIS	P5655-E	BDA0000012864	2026-10-02	2023-12-06
407	CCE_L10_21	40456692391601900	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012016	2025-11-16	2022-12-14
408	CCE_L10_27	40456692392001207	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012360	2026-02-21	2023-03-22
409	PCE19095	ZMJS6V4T30008GE	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012201	2026-01-06	2023-02-15
410	PCE19137	B8A44F893145	AXIS	P5655-E	BDA0000012595	2026-06-08	2023-07-18
411	PCE19143	ZMJS6V4T40002JR	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012735	2026-09-05	2023-10-31
412	PCE19537	ZMJS6V4T70001HZ	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012885	2026-10-23	2023-12-06
413	PCE21136	40456692391701207	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012001	2025-11-21	2023-01-13
414	PCE22490	B8A44F9B1132	AXIS	P5655-E	BDA0000012792	2026-09-11	2023-10-31
415	PCE23767	ZMJS6V4T70000ZL	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012752	2026-09-04	2023-10-31
416	AL1	ZMJS6V4T50000XP	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012544	2026-05-15	2023-06-28
417	AL632	ZMJS6V4T70002ZH	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012818	2026-09-14	2023-10-31
418	AL644	ZMJS6V4T40002AE	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012135	2025-12-17	2023-01-13
419	AL653	ZMJS6V4T70002DH	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012882	2026-10-13	2023-12-06
420	AL687	ZMJS6V4T500017A	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012540	2026-06-02	2023-07-18
421	AL690	40456692392001205	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012048	2025-11-23	2023-01-13
422	AL691	ZMJS6V4T40002XM	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012651	2026-07-19	2023-09-04
423	AL2735	ZMJS6V4T70002RY	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012872	2026-10-13	2023-12-06

ÍTEM	AFILIACIÓN	CAMARA_SERIAL	CAMARA_MARCA	CÁMARA REFERENCIA	CÁMARA PLACA SDSCJ	FECHA GARANTÍA	FECHA INGRESO ALMACÉN
424	P346	ZMJS6V4T50000ZN	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012741	2026-09-01	2023-10-31
425	CCEL04_010	40456692391701904	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012341	2026-02-10	2023-03-22
426	CCEL04_023	ZMJS6V4T500007T	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012458	2026-03-14	2023-04-26
427	CCEL04_030	ZMJS6V4T700035D	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012803	2026-03-14	2023-10-31
428	CCEL17_006	ZMJS6V4T50000RX	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012816	2026-09-15	2023-10-31
429	CCEL17_031	40456692391701206	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000011959	2025-10-24	2022-12-09
430	MB988	ZMJS6V4T400029A	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012128	2025-12-16	2023-01-13
431	AL1863	40456692392001200	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012357	2026-02-24	2023-03-22
432	AL808	ZMJS6V4T700037M	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012255	2026-01-25	2023-03-22
433	AL829	40456692391701203	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012312	2026-02-08	2023-05-19
434	AL843	ZMJS6V4T70002QT	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012871	2026-06-21	2023-12-06
435	CVID21679	ZMJS6V4T40004KP	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012553	2026-06-21	2023-07-18
436	CVID21687	ZMJS6V4T70001MT	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012824	2026-06-21	2023-10-31
437	CVID21703	ZMJS6V4T40000PE	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012642	2026-07-07	2023-09-04
438	MB216	ZMJS6V4T40004NK	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012252	2026-01-25	2023-02-15
439	P305	ZMJS6V4T700026Y	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012874	2026-10-10	2023-12-06
440	P314	ZMJS6V4T70001YK	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012821	2026-09-15	2023-10-31
441	P345	ZMJS6V4T50000MK	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012812	2026-09-15	2023-10-31
442	ALB116	ZMJS6V4T70002PM	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012870	2026-10-11	2023-12-06
443	ALB121	40456692391601901	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012015	2025-11-17	2023-01-13
444	ALB124	ZMJS6V4T40002LZ	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012637	2026-07-10	2023-09-04
445	ALB152	ZMJS6V4T400021Z	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012132	2025-12-28	2023-01-13
446	ALB213	ZMJS6V4T40003MR	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012114	2025-12-29	2023-01-13
447	ALB54	ZMJS6V4T300076V	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012120	2025-12-29	2023-01-13
448	ALB58	B8A44F8931B1	AXIS	P5655-E	BDA0000012601	2026-06-21	2023-07-18
449	CCEAD_L7_02	40456692392001207	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012392	2026-02-27	2023-03-22
450	CCEAD_L7_08	ZMJS6V4T40002KV	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012639	2026-07-10	2023-09-04
451	CCEAD_L7_13	ZMJS6V4T40002HD	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012641	2026-07-10	2023-09-04
452	CCEAD_L7_18	ZMJS6V4T70003AX	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012250	2026-02-01	2023-03-22
453	CCEAD_L7_26	ZMJS6V4T40003HF	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012115	2025-12-27	2023-01-13
454	CCEAD_L7_36	40456692392101900	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012362	2026-02-22	2023-03-22
455	CCEAD_L7_45	ZMJS6V4T30008RB	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012206	2026-01-02	2023-02-15
456	CVID21863	ZMJS6V4T400020V	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012130	2026-01-01	2023-02-15
457	CVID21884	ZMJS6V4T40002PL	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012726	2026-09-01	2023-10-31
458	MB432	40456692391701205	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012323	2026-02-09	2023-03-22
459	P377	B8A44F893893	AXIS	P5655-E	BDA0000012591	2026-06-14	2023-07-18
460	P378	ZMJS6V4T300031E	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012217	2026-01-05	2023-02-15

ÍTEM	AFILIACIÓN	CAMARA_SERIAL	CAMARA_MARCA	CÁMARA REFERENCIA	CÁMARA PLACA SDSCJ	FECHA GARANTÍA	FECHA INGRESO ALMACÉN
461	P525	40456692391901202	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012356	2026-02-22	2023-03-22
462	P528	40456692391701900	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012017	2025-11-17	2023-01-13
463	PAQ1	40456692391601900	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012343	2026-02-05	2023-03-22
464	PAQ14	B8A44F89312E	AXIS	P5655-E	BDA0000012596	2026-06-12	2023-07-18
465	PAQ28	ZMJS6V4T30009CV	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012200	2026-01-02	2023-02-15
466	PAQ53	40456692391701902	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012029	2025-11-16	2023-01-13
467	PAQ54	B8A44F43A5B9	AXIS	P5655-E	BDA0000012145	2026-04-28	2023-06-28
468	PAQ60	ZMJS6V4T40000WK	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012750	2026-09-04	2023-10-31
469	PAQ66	ZMJS6V4T400050E	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012545	2026-06-01	2023-07-18
470	PAQ67	ZMJS6V4T30008MA	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012221	2025-12-29	2023-01-13
471	SGT4	ZMJS6V4T300089V	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012742	2026-09-01	2023-10-31
472	AL2248	ZMJS6V4T70001DP	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012895	2026-10-26	2023-12-06
473	AL2282	B8A44F43A5E9	AXIS	P5655-E	BDA0000012146	2026-05-11	2023-06-28
474	AL2305	ZMJS6V4T70002VW	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012825	2026-09-20	2023-10-31
475	AL2401	B8A44F9B121A	AXIS	P5655-E	BDA0000012862	2026-09-29	2023-10-31
476	AL2453	ZMJS6V4T40004LF	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012556	2026-05-15	2023-06-28
477	AL402	ZMJS6V4T40004HM	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012541	2026-06-07	2023-07-18
478	AL408	40456692391601900	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012315	2026-02-07	2023-03-22
479	CCEL19_0006	B8A44F9B122C	AXIS	P5655-E	BDA0000012683	2026-08-22	2023-09-22
480	CCEL19_0010	40456692391601200	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012335	2026-02-12	2023-03-22
481	CCEL19_0023	40456692740401805	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012413	2026-02-28	2023-03-22
482	CCEL19_032	B8A44F43A099	AXIS	P5655-E	BDA0000012141	2026-04-26	2023-06-28
483	CCEL19_038	ZMJS6V4T50000KL	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012638	2026-08-22	2023-09-22
484	CCEL19_067	ZMJS6V4T40000SP	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012725	2026-09-01	2023-10-31
485	CCEL19_101	40456692391601901	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000011987	2025-11-02	2022-12-14
486	CCEL19_102	40456692740401812	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012415	2026-03-01	2023-04-26
487	CCEL19_110	ZMJS6V4T70001BV	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012893	2026-10-23	2023-12-06
488	CCEL19_118	ZMJS6V4T70002LZ	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012738	2026-09-01	2023-10-31
489	CVID22294	ZMJS6V4T700002R	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012901	2026-10-23	2023-12-06
490	CVID22347	ZMJS6V4T700034Z	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012809	2026-09-14	2023-10-31
491	CVID22349	40456692391701902	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000011961	2025-10-27	2022-12-09
492	CVID22369	40456692391601901	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012334	2026-02-09	2023-03-22
493	P466	ZMJS6V4T400030K	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012636	2026-07-12	2023-09-04
494	P476	40456692740401210	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012408	2026-02-27	2023-03-22
495	PCE23981	40456692391701904	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000011955	2025-10-25	2022-12-09
496	AL2587	40456692392001205	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012364	2026-02-21	2023-03-22
497	AL2614	40456692392001207	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012040	2026-01-11	2023-02-15

ÍTEM	AFILIACIÓN	CAMARA_SERIAL	CAMARA_MARCA	CÁMARA REFERENCIA	CÁMARA PLACA SDSCJ	FECHA GARANTÍA	FECHA INGRESO ALMACÉN
498	AL2620	40456692391601900	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012013	2025-11-15	2022-12-14
499	AL2622	40456692391701203	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012007	2025-11-12	2022-12-14
500	AL2640	ZMJS6V4T70002HE	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012879	2026-10-13	2023-12-06
501	AL2677	ZMJS6V4T700029W	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012876	2026-10-13	2023-12-06
502	AL2710	ZMJS6V4T40004ZJ	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012548	2026-06-01	2023-07-18
503	AL2727	40456692392101901	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012358	2026-02-22	2023-03-22
504	AL2730	ZMJS6V4T50000TF	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012472	2026-03-15	2023-04-26
505	AL2755	ZMJS6V4T70002CN	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012873	2026-10-11	2023-12-06
506	AL613	B8A44F59666D	AXIS	P5655-E	BDA0000012866	2026-10-13	2023-12-06
507	AL614	ZMJS6V4T10007JJ	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012479	2026-03-22	2023-04-26
508	CCEL11_014	40456692391701900	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000011988	2025-11-05	2022-12-14
509	CCEL11_034	ZMJS6V4T40003TY	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012801	2026-09-13	2023-10-31
510	CCEL11_039	40456692391701901	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012026	2025-11-15	2022-12-14
511	CCEL11_057	ZMJS6V4T70002WB	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012802	2026-09-13	2023-10-31
512	CCEL11_065	40456692391701202	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012025	2025-11-16	2022-12-14
513	CCEL11_098	40456692392101901	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000012052	2026-01-09	2023-02-15
514	CCEL11_142	ZMJS6V4T40002QY	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012747	2026-08-31	2023-10-31
515	CCEL11_158	ZMJS6V4T70000SH	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012730	2026-08-31	2023-10-31
516	AL1722	ZMJS6V4T70003KP	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012253	2026-01-26	2023-02-15
517	AL1851	B8A44F43A65C	AXIS	P5655-E	BDA0000012142	2026-05-09	2023-06-28
518	CCEL14_07	ZMJS6V4T300077W	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012119	2025-12-21	2023-01-13
519	MB1186	ZMJS6V4T400026N	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012125	2025-12-26	2023-01-13
520	350-4978	ZMJS6V4T700003W	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012800	2026-09-14	2023-10-31
521	PCE23311	B8A44F2E08B2	AXIS	P5655-E	BDA0000012703	2026-08-16	2023-09-22
522	ESU-117	40456692391701205	BOSCH	NDP-5512-Z30	BDA0000011953	SINIESTRADA	2022-12-09
523	AL1962	B8A44F9B126A	AXIS	P5655-E	BDA0000012919	2026-11-18	2023-12-06
524	AL1967	B8A44F9B12A6	AXIS	P5655-E	BDA0000012936	2026-11-18	2023-12-06
525	SCJ17E160078	B8A44FB2B1D8	AXIS	P5655-E	BDA0000012907	2026-11-07	2023-12-06
526	SCJ17E160073	B8A44F9B120A	AXIS	P5655-E	BDA0000012921	2026-11-07	2023-12-06
527	AL300	B8A44F8930FF	AXIS	P5655-E	BDA0000012922	2026-11-17	2023-12-06
528	SCJ17E030027	B8A44F893171	AXIS	P5655-E	BDA0000012923	2026-11-21	2023-12-06
529	SCJ17E030043	B8A44F9B11F9	AXIS	P5655-E	BDA0000012935	2026-11-09	2023-12-06
530	350-2016	B8A44FB2B293	AXIS	P5655-E	BDA0000012925	2026-11-20	2023-12-06
531	ESU-317	B8A44F9B123C	AXIS	P5655-E	BDA0000012933	2026-11-20	2023-12-06
532	CVID22033	B8A44FA75E9E	AXIS	P5655-E	BDA0000012916	2026-11-19	2023-12-06
533	SCJ17E100015	B8A44F9B1228	AXIS	P5655-E	BDA0000012910	2026-11-19	2023-12-06
534	350-4986	B8A44FA75E4B	AXIS	P5655-E	BDA0000012932	2026-11-17	2023-12-06

ÍTEM	AFILIACIÓN	CAMARA_SERIAL	CAMARA_MARCA	CÁMARA REFERENCIA	CÁMARA PLACA SDSCJ	FECHA GARANTÍA	FECHA INGRESO ALMACÉN
535	CVID21864	B8A44F9B1218	AXIS	P5655-E	BDA0000012914	2026-11-08	2023-12-06
536	ALB198	B8A44F790D75	AXIS	P5655-E	BDA0000012863	2026-10-03	2023-12-06
537	CCEAD_L7_23	B8A44FA75EB1	AXIS	P5655-E	BDA0000012908	2026-11-21	2023-12-06
538	SCJ17E070037	B8A44F89319F	AXIS	P5655-E	BDA0000012934	2026-11-03	2023-12-06
539	CVID22328	B8A44F9B1262	AXIS	P5655-E	BDA0000012930	2026-11-02	2023-12-06
540	SCJ17E190007	B8A44F9B11DB	AXIS	P5655-E	BDA0000012917	2026-11-28	2023-12-06
541	AL1191	B8A44F7F37BD	AXIS	P5655-E	BDA0000012911	2026-11-21	2023-12-06
542	SCJ17E050084	B8A44F595B9A	AXIS	P5655-E	BDA0000012918	2026-11-15	2023-12-06
543	P175	B8A44F9B1278	AXIS	P5655-E	BDA0000012924	2026-11-16	2023-12-06
544	ESU-214	B8A44F9B1209	AXIS	P5655-E	BDA0000012927	2026-11-08	2023-12-06
545	FVS-1922	B8A44FA75E47	AXIS	P5655-E	BDA0000012931	2026-11-10	2023-12-06
546	CCEL11_144	B8A44F791015	AXIS	P5655-E	BDA0000012909	2026-11-20	2023-12-06
547	CCEL11_037	B8A44FB2B2BB	AXIS	P5655-E	BDA0000012913	2026-11-02	2023-12-06
548	CCEL11_003	B8A44F790C53	AXIS	P5655-E	BDA0000012928	2026-11-02	2023-12-06
549	P3	B8A44F7F37F5	AXIS	P5655-E	BDA0000012915	2026-11-21	2023-12-06
550	SFGN_70	B8A44F790C2A	AXIS	P5655-E	BDA0000012929	2026-11-02	2023-12-06
551	SCJ17E170042	ZMJS6V4T700018A	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012937	2026-12-02	PENDIENTE
552	SCJ17E060023	ZMJS6V4T700025T	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012968	2026-11-30	PENDIENTE
553	SCJ17E050077	ZMJS6V4T70001GL	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012938	2026-12-03	PENDIENTE
554	SCJ17E050028	ZMJS6V4T700024M	HANWHA	XNP-6321H	BDA0000012969	2026-11-30	PENDIENTE
555	SCJ17E050010	B8A44FA75EA0	AXIS	P5655-E	BDA0000012926	2026-12-03	PENDIENTE
556	SCJ17E010048	B8A44F9B120E	AXIS	P5655-E	BDA0000012920	2026-12-02	PENDIENTE

Tabla 7. Consolidado de cámaras en garantía.


12. Certificados de importación y declaración andina

Estos soportes de cámaras y UPS, fueron entregados mensualmente, durante la ejecución del contrato SCJ-1932-2022, con los ingresos al almacén. Su consolidado se entrega en el siguiente link.

Soportes certificados de importación y declaración andina

13. Relación equipos instalados en los servicios de mantenimiento.


Dentro del marco del Contrato No 1932 de 2022, se instalaron las siguientes cámaras y UPS durante la vigencia 2022:

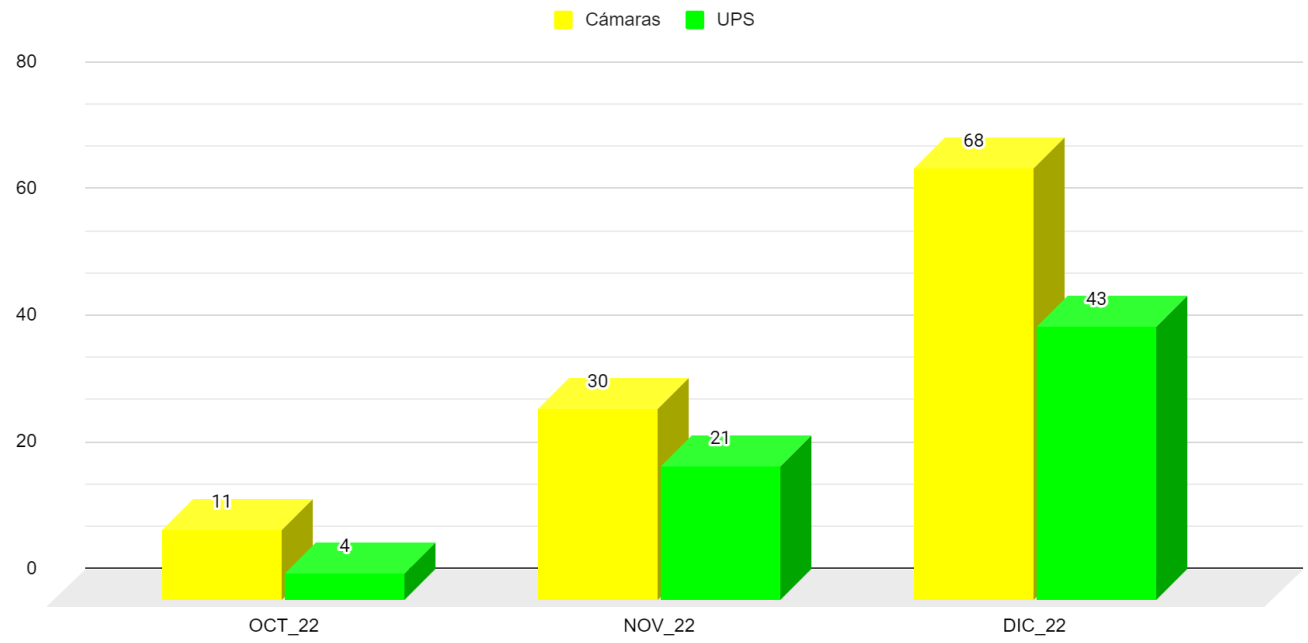

Mes	Cámaras	UPS
Octubre 2022	11	4
Noviembre 2022	30	21
Diciembre 2022	68	43
Total	109	68

Imagen 15. Equipos instalados en los servicios de mantenimiento 2022.

Por otro lado, se instalaron las siguientes cámaras y UPS durante la vigencia 2023:

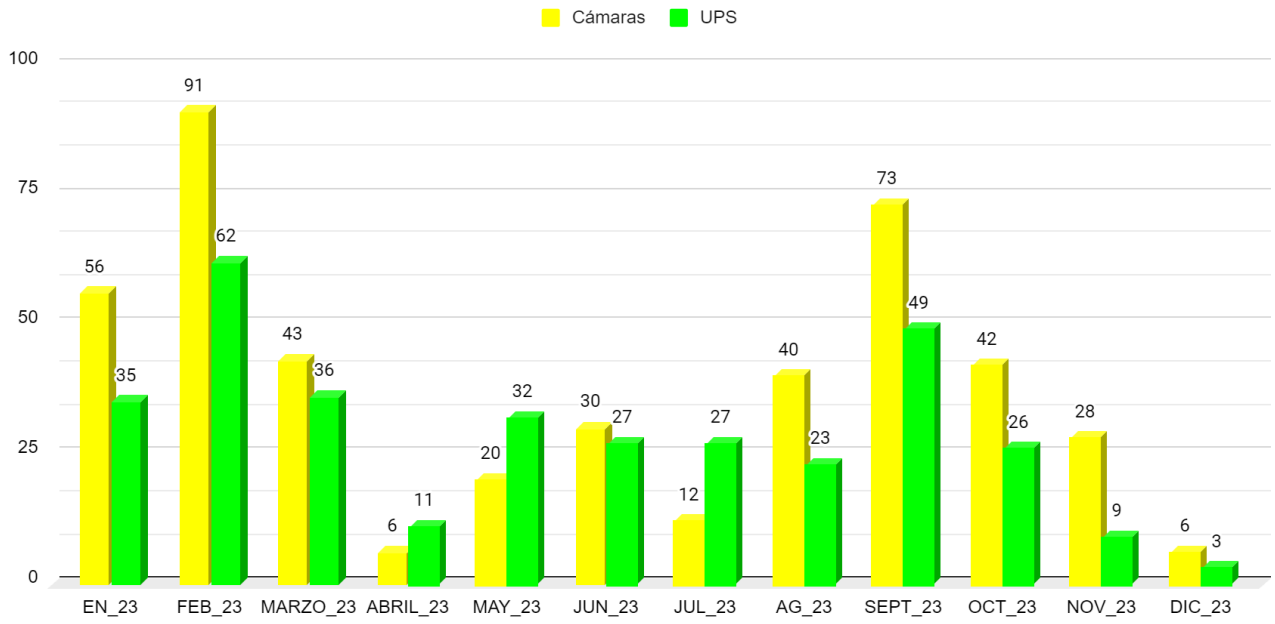

Mes	Cámaras	UPS
Enero 2023	56	35
Febrero 2023	91	62
Marzo 2023	43	36
Abril 2023	6	11
Mayo 2023	20	32
Junio 2023	30	27
Julio 2023	12	27
Agosto 2023	40	23
Septiembre 2023	73	49
Octubre 2023	42	26
Noviembre 2023	28	9
Diciembre 2023	6	3
Total	447	340

Imagen 16. Equipos instalados en los servicios de mantenimiento 2023

13.1. Detalle de materiales y equipos instalados

El detalle de los materiales y equipos aprobados durante la vigencia del contrato, se encuentran en el archivo:

- Materiales y equipos contrato SCJ 1932-2022.

14. Hoja de vida contrato SCJ 1932-2022

La hoja de vida final, con el detalle de los 50 atributos, se encuentra en el siguiente enlace:

- Hoja de vida contrato SCJ 1932-2022.

15. Novedades en los servicios de mantenimiento.

Durante el proceso de verificación para la liquidación del contrato correspondiente a los servicios ejecutados y aprobados durante la vigencia del contrato No SCJ-1932-2022, se pudieron evidenciar las siguientes novedades:

OCTUBRE 2022:

En el informe Item 9. Etapa estabilización, 9.1. Visitas de mantenimiento, servicios ejecutados en octubre de 2022, Fila 6, aparece relacionado el ticket 2205603 con el punto de video vigilancia ESU-253; sin embargo, al validar el documento del incidente, se pudo evidenciar que el servicio corresponde a la ubicación **ESU-022**.

Afiliación	Ticket
ESU-253	2205603

Situación que se corrobora en el mismo informe en su item 12. Costos, 12.1. Consolidado Servicios Ejecutados, como se muestra a continuación:

Ítem	Afiliación	Ticket	Costo
6	ESU-022	2205603	$2.035.852

Una vez verificado los datos consignados en la conciliación financiera efectuada para el mes de octubre del año 2022, ubicamos la siguiente información:

Prefactura Servicios				
Item	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor
1	SUBSISTEMA CIUDADANOS: Visita de Mantenimiento Correctivo por punto CON CARRO CANASTA	39	$ 1.710.800,00	$ 66.721.200,00
2	COMPONENTE DE DIAGNÓSTICO: Diagnósticos, Administración y Soporte (70% del mes)	1	$ 99.680.700,00	$ 69.776.490,00
	Subtotal			**$ 136.497.690,00**
	IVA			**$ 25.934.561,00**
	Total			**$ 162.432.251,00**

La conciliación de estos servicios, no son alterados por la novedad detallada para el mes de octubre de 2022, pues una vez aclarada la inconsistencia del informe, el resultado de las cantidades es equivalente a las conciliadas para el mes correspondiente.

NOVIEMBRE 2022:

En el informe Item 9. Etapa estabilización, 9.1. Visitas de mantenimiento, enuncia "*Los 219 servicios de PTZ ejecutados en noviembre de 2022, son los siguientes:*", se lograron identificar las siguientes novedades:

a) En la fila 1 se presenta un error de digitación (221119), como se evidencia a continuación:

Ítem	Afiliación	Ticket
1	ESU-188	221119

Verificado el documento Ticket generado para este servicio, se pudo corroborar que corresponde al ticket 2217119, aclarando que hizo falta digitar el número 7, como se muestra a continuación:

Ítem	Afiliación	Ticket
1	ESU-188	2217119

b) En la relación de los servicios descritos en la tabla, se identificaron nueve servicios ejecutados en el mes de octubre que no fueron objeto de reconocimiento para pago para el mes de noviembre.

Ítem	Afiliación	Ticket
17	SCJ18ESP00005	2200292
28	AL1377	2199395
37	PCE20645	2200429
38	AL1979	2200440
73	CCEL11_039	2200255
112	SCJ17E090064	2200568
119	MB242	2200271
197	FVS-3606	2243464
198	FVS-1819	2243430

Una vez validada la fecha de reconocimiento de estos servicios, se evidenció que se reconocieron en el mes de diciembre de 2022.

c) Se identificó que las filas 80 y 188 contienen los mismos datos, como se evidencia en las siguientes imágenes:

Ítem	Afiliación	Ticket
80	CVID21659	2231656
188	CVID21659	2231656

Una vez validados los tickets ejecutados para el mes de noviembre, se identifica que no se encuentra relacionado el ticket Nro. 2202549 que corresponde a la prestación del servicio Mantenimiento Correctivo, ejecutado en la ubicación CCEL19_102.

Acorde a lo expuesto, podemos deducir que hubo un error en la relación de los servicios en la tabla y se asume que en la fila 188 se debió haber relacionado los datos del ticket Nro. 2202549, como se muestra a continuación:

Ítem	Afiliación	Ticket
188	CCEL19_102	2202549

d) Así mismo se aclara que los tickets: 2238008, 2237300, 2237405, 2237505, 2237583, 2237720, 2237730, 2237790, 2237865, 2238280 y 2238204 corresponden al servicio "Visita de Limpieza de acrílico", como se relaciona a continuación:

Ítem	Afiliación	Ticket
203	COL-1947_21 ANGELES	2238008
205	COL-4841_ANDRES_BELLO	2237300
206	COL-4842_ANDRES_BELLO	2237405
207	COL-4843_ANDRES_BELLO	2237505
209	COL-4840_JULIO_GARAVITO_ARMERO	2237583
211	COL-4846_LUIS_VARGAS_TEJADA	2237720
212	COL-4847_LUIS_VARGAS_TEJADA	2237730
215	COL-1942_JUAN_LOZANO_Y_LOZANO	2237790
216	COL-1943_JUAN_LOZANO_Y_LOZANO	2237865
218	COL-1944_NUEVA_COLOMBIA	2238280
219	COL-1946_NUEVA_COLOMBIA	2238204

Una vez verificado los datos consignados en la conciliación financiera efectuada para el mes de noviembre del año 2022, ubicamos la siguiente información:

Descripción de Servicios Ejecutados	Cantidad
SUBSISTEMA CIUDADANOS - Visita de Mantenimiento Correctivo por punto CON CARRO CANASTA	192
SUBSISTEMA COLEGIOS: Visita de Mantenimiento Correctivo por punto SIN CARRO CANASTA	7
SUBSISTEMA COLEGIOS: Visita de Limpieza de Acrílico Lente por punto	11
Diagnósticos, Administración y Soporte	1

La conciliación de estos servicios, no son alterados por las novedades detalladas para el mes de noviembre, en el presente documento, pues una vez aclaradas las inconsistencias del informe, el resultado de las cantidades es equivalente a las conciliadas para el mes correspondiente.

DICIEMBRE 2022:

En el ítem ***9. Visitas de mantenimiento correctivo ejecutadas***, se describe lo siguiente:

"*En diciembre de 2023, se facturaron 235 servicios de mantenimiento correctivo en puntos de videovigilancia ciudadana, 26 limpiezas de acrílico en puntos de videovigilancia ciudadana, 3 visitas de mantenimiento correctivo en colegios, 8 limpiezas de acrílico en colegios, 7 servicios de mantenimiento correctivo en transmilenio y 1 servicio de mantenimiento correctivo al estadio…*"

Acorde a lo descrito se deben realizar las siguientes precisiones:

a) Verificado lo expresado: "…*7 servicios de mantenimiento correctivo en Transmilenio*…", se debe aclarar que se aprobaron mediante conciliación técnica, 6 servicios de mantenimiento correctivo en Transmilenio los cuales se detallan en la Tabla 9. Servicios correctivos de Transmilenio, del informe.

b) Verificado lo expresado: "…*1 servicio de mantenimiento correctivo al estadio* …", se observa que no se aportó el detalle del servicio, pero si se relaciona en el ítem 10. Mesa de servicio → 10.3. Gestión de tickets → Tabla 16. visitas de mantenimiento correctivo para atención en campo, como se evidencia en la siguiente imagen:

MTO-EST	MTO-INC-EST-MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN CARRO CANASTA	1

A continuación, se brinda el detalle del servicio:

Ítem	Afiliación	Ticket
1	EST-EL_CAMPIN	2263404

c) Verificada la Tabla 7. Servicios correctivos PTZ, se encuentra relacionado el ticket 2255500, pero verificado el contenido del ticket, corresponde a una atención remota efectuada por la Mesa de Servicio, la cual no tiene costo para la entidad, como se muestra a continuación:

Ítem	Afiliación	Ticket
123	AL1302	2255500

Sin embargo, verificados los tickets de atención para el punto de video vigilancia AL1302 aportados en el SharePoint de la entidad, se identifica un servicio de mantenimiento correctivo efectuado el 21/12/22 a través del ticket 2264134 en el cual se establece como fuente de falla "Conectividad", se realizan las pruebas de primer nivel exigidas por ETB y al no lograr la solución por parte del proveedor de conectividad, queda escalado bajo el número de incidente ETB: 06469468.

En atención a lo descrito en el informe, lo correcto para describir el mantenimiento correctivo realizado es:

Ítem	Afiliación	Ticket
123	AL1302	2264134

d) Validada la Tabla 7. Servicios correctivos PTZ, se encuentra relacionado el ticket 2246456, pero verificada la conciliación técnica correspondiente a este periodo, este servicio no fue objeto de reconocimiento para pago en el mes de diciembre.

Ítem	Afiliación	Ticket
186	350-5078	2246456

Una vez validada la fecha de reconocimiento de este servicio, se evidenció que se reconoció en el mes de febrero de 2023.

Sin embargo, verificados los tickets aportados en el SharePoint de la entidad por parte del contratista para el mes de diciembre, se identifica que no se encuentra relacionado el ticket Nro. 2214622 que corresponde a la prestación del servicio Mantenimiento Correctivo, ejecutado en la ubicación SCJ17E190077.

Acorde a lo expuesto, podemos deducir que hubo un error en la relación de los servicios en la tabla y se asume que en la fila 186 se debió haber relacionado los datos del ticket Nro. 2214622, como se ilustra a continuación:

Ítem	Afiliación	Ticket
186	SCJ17E190077	2214622

e) Validada la Tabla 7. Servicios correctivos PTZ, se encuentran relacionados los tickets 2243811, 2243459, 2239082, 2236970 y 2224758, pero verificada la conciliación técnica correspondiente a este periodo, estos servicios no fueron objeto de reconocimiento para pago en el mes de diciembre.

Ítem	Afiliación	Ticket
208	ESU-146	2243811
209	CVID21972	2243459
210	SCJ17E010016	2239082
211	SCJ17E010024	2236970
213	PCE24069	2224758

Una vez validada las fechas de reconocimiento de estos servicios, se evidenció que se reconocieron en el mes de noviembre de 2022.

Sin embargo, verificados los tickets aportados en el SharePoint de la entidad por parte del contratista para el mes de diciembre, se identifica que no se encuentran relacionados los tickets Nro. 2200568, 2200440, 2200429, 2200292 y 2200271 que corresponden a la prestación de servicios de Mantenimiento Correctivo.

Acorde a lo expuesto, podemos deducir que hubo un error en la relación de los servicios en la tabla y se asume que en las filas 208, 209, 210, 211 y 213, se debieron haber relacionado los datos como se ilustra a continuación:

Ítem	Afiliación	Ticket
208	SCJ17E090064	2200568
209	AL1979	2200440
210	PCE20645	2200429
211	SCJ18ESP00005	2200292
213	MB242	2200271

f) Validada la Tabla 7. Servicios correctivos PTZ, se encuentran relacionados los tickets 2269956, 2269962, 2270072, 2270649 y 2263259, pero verificado el contenido de los tickets, estos corresponden a limpieza de acrílicos efectuados a otros puntos de video vigilancia.

Ítem	Afiliación	Ticket
218	SCJ17E070073	2269956
219	PAQ31	2269962
220	350-5044	2270072
221	FVS-4606	2270649
234	SCJ17FJ0012_2	2263259

Sin embargo, verificados los tickets aportados en el SharePoint de la entidad por parte del contratista para el mes de diciembre, se identifica que los puntos de video vigilancia relacionados, si fueron objeto de mantenimiento correctivo, por lo cual se concluye que hubo un error en la relación de los “No Ticket” en la tabla y se asume que en las filas 218, 219, 220, 221 y 234, se debieron haber relacionado los datos como se ilustra a continuación:

Ítem	Afiliación	Ticket
218	SCJ17E070073	2269961
219	PAQ31	2269178
220	350-5044	2270284
221	FVS-4606	2270295
234	SCJ17FJ0012_2	2261085

g) Validada la Tabla 7. Servicios correctivos PTZ, se encuentra relacionado en la fila 222 el ticket Nro. 22664171, pero verificado el contenido del ticket, este corresponde a la ubicación PCE19162, el cual se validó en la fila 45 del mismo informe, como se evidencia a continuación:

Ítem	Afiliación	Ticket
222	PAQ32	2264171
45	PCE19162	2264171

Así mismo se verifica los servicios prestados a la ubicación PAQ32, evidenciando que este fue objeto de mantenimiento correctivo en el mes de diciembre de 2022, documentando sus actividades mediante el ticket 2269856. En consecuencia, la fila 222 del informe correspondiente al mes de diciembre de 2022, debe contener los siguientes datos:

Ítem	Afiliación	Ticket
222	PAQ32	2269856

h) Validada la Tabla 7. Servicios correctivos PTZ, se encuentra relacionado en la fila 223 el ticket Nro. 2261085, pero verificado el contenido del ticket, este corresponde a la ubicación SCJ17FJ0012_2 como se aclaró en el numeral f de la presente conciliación:

Ítem	Afiliación	Ticket
223	FVS-4608	2261085

Así mismo se verifica los servicios prestados a la ubicación FVS-4608, evidenciando que este fue objeto de mantenimiento correctivo en el mes de diciembre de 2022, documentando sus actividades mediante el ticket 2270163. En consecuencia, la fila 223 del informe correspondiente al mes de diciembre de 2022, debe contener los siguientes datos:

Ítem	Afiliación	Ticket
223	FVS-4608	2270163

i) Validada la Tabla 7. Servicios correctivos PTZ, se encuentra relacionado en la fila 224 el ticket Nro. 2231035, pero verificado el contenido del ticket, este corresponde a la ubicación ESU-209 que adicionalmente se debe resaltar, fue conciliado en el mes de noviembre:

Ítem	Afiliación	Ticket
224	ALB196	2231035

Así mismo se verifica los servicios prestados a la ubicación ALB196, evidenciando que este fue objeto de mantenimiento correctivo en el mes de diciembre de 2022, documentando sus actividades mediante el ticket 2270598. En consecuencia, la fila 224 del informe correspondiente al mes de diciembre de 2022, debe contener los siguientes datos:

Ítem	Afiliación	Ticket
224	ALB196	2270598

j) Validada la Tabla 7. Servicios correctivos PTZ, en la fila 233 se encuentra relacionado el ticket 2264723, pero verificado el contenido del ticket, este corresponde a limpieza de acrílico efectuado al punto de video vigilancia ESU-028.

Ítem	Afiliación	Ticket
233	ESU-028	2264723

Sin embargo, verificados los tickets aportados en el SharePoint de la entidad por parte del contratista para el mes de diciembre, se identifica que no se encuentra relacionado el ticket Nro. 2200255 que corresponde a la prestación del servicio de Mantenimiento Correctivo al punto de videovigilancia CCEL11_039.

Acorde a lo expuesto, podemos deducir que hubo un error en la relación de los servicios en la tabla y se asume que en la fila 233, se debió haber relacionado los datos como se ilustra a continuación:

Ítem	Afiliación	Ticket
233	CCEL11_039	2200255

k) Validada la Tabla 7. Servicios correctivos PTZ, en la fila 235 se encuentra relacionado el ticket 2263261, pero verificado el contenido del ticket, este corresponde a limpieza de acrílico efectuado al punto de video vigilancia FVS-3216.

Ítem	Afiliación	Ticket
235	ESU-209	2263261

Sin embargo, verificados los tickets aportados en el SharePoint de la entidad por parte del contratista para el mes de diciembre, se identifica que no se encuentra relacionado el ticket Nro. 2199395 que corresponde a la prestación del servicio de Mantenimiento Correctivo al punto de videovigilancia AL1377.

Acorde a lo expuesto, podemos deducir que hubo un error en la relación de los servicios en la tabla y se asume que en la fila 235, se debió haber relacionado los datos como se ilustra a continuación:

Ítem	Afiliación	Ticket
235	AL1377	2199395

De igual forma se enuncia: "*Los 26 servicios de limpieza de acrílico n PTZ facturados en diciembre de 2022, son los siguientes:*", en el cual se observan las siguientes irregularidades:

l) Validada la Tabla 8. Servicios de limpieza de acrílico de PTZ, se puede evidenciar que la información consignada en las filas 1 a 7, se repite en las filas 20 a la 26. Sin embargo, verificados los tickets aportados en el SharePoint de la entidad por parte del contratista para el mes de diciembre, se identifica que no se encuentran relacionados los tickets Nro. 2263295, 2263263, 2263261, 2263259, 2263253, 2243464 y 2243430, que corresponden a la prestación del servicio Limpieza de Acrílico, como se muestra en la siguiente imagen:

Ítem	Afiliación	Ticket
20	ESU-026	2263247
21	350-4960	2263226
22	ESU-132	2263494
23	FS-3220	2263416
24	CVID21956	2263338
25	AL991	2264726
26	ESU-028	2264723

Acorde a lo expuesto, podemos deducir que hubo un error en la relación de los servicios en la tabla y se asume que en las filas comprendidas entre la 20 y la 26, se debió haber relacionado los datos como se ilustra a continuación:

Ítem	Afiliación	Ticket
20	FVS-3606	2243464
21	FVS-1819	2243430
22	AL1326	2263295
23	FVS-3212	2263263
24	FVS-3216	2263261
25	ESU-023	2263259
26	ESU-197	2263253

Una vez verificado los datos consignados en la conciliación financiera efectuada para el mes de diciembre del año 2022, ubicamos la siguiente información:

Servicios	Cantidad
VISITA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CARRO CANASTA	235
VISITA DE LIMPIEZA DE ACRILICO SIN CARRO CANASTA	26
VISITA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN CARRO CANASTA - COLEGIOS	3
VISITA DE LIMPIEZA DE ACRILICO SIN CARRO CANASTA - COLEGIOS	8
VISITA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN CARRO CANASTA - TRANSMILENIO	6
VISITA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN CARRO CANASTA - ESTADIO	1
COMPONENTE DE DIAGNÓSTICO: DIAGNÓSTICO, ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE (100%)	1

La conciliación de estos servicios, no son alterados por las novedades detalladas para el mes de diciembre de 2022 en el presente documento, pues una vez aclaradas las inconsistencias del informe, el resultado de las cantidades es equivalente a las conciliadas para el mes correspondiente.

ENERO 2023:

a) Verificada la Tabla 7. Servicios correctivos PTZ, en la fila 18 se encuentra relacionado el ticket Nro. 2269582 al cual, una vez realizado seguimiento, se evidenció que no fue conciliado para el pago en el mes de enero de 2023, pues la actividad de conciliación de este ticket se llevó a cabo en el mes de diciembre de 2023.

Ítem	Afiliación	Ticket
18	SCJ17E070090	2269582

Una vez validados los tickets aportados el mes de enero para efectos de conciliación por parte del contratista, se identifica que no se encuentra relacionado el ticket Nro. 2236895 que corresponde a la prestación del servicio Mantenimiento Correctivo, ejecutado en la ubicación PCE19095.

Acorde a lo expuesto, podemos deducir que hubo un error en la relación de los servicios en la tabla y se asume que en la fila 18 se debió haber relacionado los datos del ticket Nro. 2236895, como se muestra a continuación:

Ítem	Afiliación	Ticket
18	PCE19095	2236895

Una vez verificado los datos consignados en la conciliación financiera efectuada para el mes de enero del año 2023, ubicamos la siguiente información:

Descripción	Cantidad
SUBSISTEMA CIUDADANOS - Visita de Mantenimiento Correctivo por punto CON CARRO CANASTA	220
SUBSISTEMA CIUDADANOS - Visita de Limpieza de Acrílico por punto SIN CARRO CANASTA	3
SUBSISTEMA TRANSMILENIO: Visita de Mantenimiento Correctivo por punto SIN CARRO CANASTA	5
COMPONENTE DE DIAGNÓSTICO: Diagnósticos, Administración y Soporte	1
Descuento por ANS mes de enero del 2023	1

La conciliación de estos servicios, no son alterados por la novedad detallada para el mes de febrero, pues una vez aclaradas las inconsistencias del informe, el resultado de las cantidades es equivalente a las conciliadas para el mes correspondiente.

FEBRERO 2023:
En el ítem 7. Informe de visitas ejecutadas, se enuncia lo siguiente: "*Los 308 servicios de PTZ facturados en febrero de 2023, son los siguientes…"*, situación que no corresponde a la realidad, puesto que este mes fue aprobado por la supervisión 306 servicios de mantenimiento correctivo PTZ.

Así mismo, una vez verificada la información relacionada, se identificaron las siguientes novedades:

a) Validada la Tabla 10. Servicios correctivos PTZ, se encuentra relacionado en la fila 5 el ticket 2318871, pero verificada la conciliación técnica correspondiente a este periodo, este servicio no fue objeto de reconocimiento para pago en el mes de febrero.

Ítem	Afiliación	Ticket
5	FVS-1120	2318871

Una vez validada la fecha de aprobación de este servicio, se evidenció que se reconoció en el mes de marzo de 2023.

Sin embargo, verificados los tickets aportados en el SharePoint de la entidad por parte del contratista para el mes de febrero, se identifica que no se encuentra relacionado el ticket Nro. 2256664 que corresponde a la prestación de servicios de Mantenimiento Correctivo efectuado al punto de video vigilancia SCJ17E050069.

Acorde a lo expuesto, podemos deducir que hubo un error en la relación de los servicios en la tabla y se asume que en la fila 5, se debió haber relacionado los datos como se ilustra a continuación:

Ítem	Afiliación	Ticket
5	SCJ17E050069	2256664

Validada la Tabla 10. Servicios correctivos PTZ, se encuentra relacionado en la fila 85 el ticket 2257303, pero verificada la conciliación técnica correspondiente a este periodo, este servicio no fue objeto de reconocimiento para pago en el mes de febrero.

Ítem	Afiliación	Ticket
85	350-4964	2257303

Una vez validada la fecha de aprobación de este servicio, se evidenció que se reconoció en el mes de diciembre de 2022.

b) Validada la Tabla 10. Servicios correctivos PTZ, se encuentra relacionado en la fila 102 el ticket 2267375, pero verificada la conciliación técnica correspondiente a este periodo, este servicio fue objeto de reconocimiento para pago en el mes de diciembre.

Ítem	Afiliación	Ticket
102	ESU-215	2267375

Sin embargo, verificados los tickets aportados en el SharePoint de la entidad por parte del contratista para el mes de febrero, se identifica que no se encuentra relacionado el ticket Nro. 2276694 que corresponde a la prestación de servicios de Mantenimiento Correctivo efectuado al punto de video vigilancia FVS-1191.

Acorde a lo expuesto, podemos deducir que hubo un error en la relación de los servicios en la tabla y se asume que en la fila 102, se debió haber relacionado los datos como se ilustra a continuación:

Ítem	Afiliación	Ticket
102	FVS-1191	2276694

c) Validada la Tabla 10. Servicios correctivos PTZ, se encuentra relacionado en la fila 115 el ticket 2268247, pero verificada la conciliación técnica correspondiente a este periodo, este servicio fue objeto de reconocimiento para pago en el mes de diciembre.

Ítem	Afiliación	Ticket
115	CCEAD_L7_39	2268247

Sin embargo, verificados los tickets aportados en el SharePoint de la entidad por parte del contratista para el mes de febrero, se identifica que el punto de video vigilancia relacionado, si fue objeto de mantenimiento correctivo, por lo cual se concluye que hubo un error en la relación del “No Ticket” en la tabla y se asume que en la fila 115, se debió haber relacionado los datos como se ilustra a continuación:

Ítem	Afiliación	Ticket
115	CCEAD_L7_39	2307179

d) Validada la Tabla 10. Servicios correctivos PTZ, se encuentra relacionado en la fila 307 el ticket 2234696, pero verificada la conciliación técnica correspondiente a este periodo, este servicio no fue objeto de reconocimiento para pago en el mes de febrero.

Ítem	Afiliación	Ticket
307	SCJ17E040102	2234696

En la verificación de la fecha de aprobación de este servicio, se evidenció que se reconoció en el mes de noviembre de 2022.

Una vez verificado los datos consignados en la conciliación financiera efectuada para el mes de febrero del año 2023, ubicamos la siguiente información:

Descripción	Cantidad
SUBSISTEMA CIUDADANOS - Visita de Mantenimiento Correctivo por punto CON CARRO CANASTA	306
COMPONENTE DE DIAGNÓSTICO: Diagnósticos, Administración y Soporte	1
Descuento por ANS mes de Febrero del 2023	1

La conciliación de estos servicios, no son alterados por las novedades detalladas para el mes de febrero, pues una vez aclaradas las inconsistencias del informe, el resultado de las cantidades es equivalente a las conciliadas para el mes correspondiente.

MARZO 2023:

En el ítem 8. Informe de visitas ejecutadas, se identificaron las siguientes novedades:

a) Validada la Tabla 11. Servicios correctivos PTZ, se encuentra relacionado en la fila 251 el ticket 2284684, pero verificada la conciliación técnica correspondiente a este periodo, este servicio no fue objeto de reconocimiento para pago en el mes de marzo.

Ítem	Afiliación	Ticket
251	CVID21972	2284684

Una vez validada la fecha de aprobación de este servicio, se evidenció que se reconoció en el mes de enero de 2023.

Sin embargo, verificados los tickets aportados en el SharePoint de la entidad por parte del contratista para el mes de marzo, se identifica que no se encuentra relacionado el ticket Nro. 2281665 que corresponde a la prestación de servicios de Mantenimiento Correctivo efectuado al punto de video vigilancia AL1817.

Acorde a lo expuesto, podemos deducir que hubo un error en la relación de los servicios en la tabla y se asume que en la fila 251, se debió haber relacionado los datos como se ilustra a continuación:

Ítem	Afiliación	Ticket
251	AL1817	2281665

b) No se ilustra el detalle de las demás actividades ejecutadas en el mes de marzo de 2023, por lo cual se procede a detallar acorde a la documentación existente, así:

VISITA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN CARRO CANASTA – EP

Ítem	Afiliación	Ticket
1	EP-RAFAEL URIB URIBE	2352281
2	EP-BARRIOS UNIDOS	2340957

VISITA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN CARRO CANASTA – CAI

ÍTEM	No AFILIACIÓN	No TICKET
1	CAI-CASTILLA	2348624
2	CAI-ONEIDA	2344804
3	CAI-PLAZA_DE_LAS_AMERICAS	2342846
4	CAI-BOSA_SAN_JOSE	2339183
5	CAI-ANTONIA_SANTOS	2337170
6	CAI-LA_ESTACION	2334954
7	CAI-LAURELES	2331289
8	CAI-PIAMONTE	2329301
9	CAI-VILLA_DEL_RIO	2325300
10	CAI-SAN_DIEGO	2323226
11	CAI-VERBENAL	2321711
12	CAI-CODITO	2317880

VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR UBICACIÓN - COSEC

ÍTEM	No AFILIACIÓN	No TICKET
1	COSEC-CHAPINERO	2269507
2	COSEC-PUENTE_ARANDA	2263318
3	COSEC-CIUDAD_BOLIVAR	2260360
4	COSEC-KENNEDY	2256389
5	COSEC-ENGATIVA	2251060
6	COSEC-TEUSAQUILLO	2248751
7	COSEC-BARRIOS_UNIDOS	2243963

Una vez verificado los datos consignados en la conciliación financiera efectuada para el mes de marzo del año 2023, ubicamos la siguiente información:

Descripción de Servicios Ejecutados	Cantidad
SUBSISTEMA CIUDADANOS - Visita de Mantenimiento Correctivo por punto CON CARRO CANASTA	251
SUBSISTEMA CTP-EP - Visita de Mantenimiento Correctivo por punto SIN CARRO CANASTA	2
SUBSISTEMA CAI - Visita de Mantenimiento Correctivo por punto SIN CARRO CANASTA	12
SUBSISTEMA CENTROS DE MONITOREO - Visita de Mantenimiento Preventivo por ubicación	7
Diagnósticos, Administración y Soporte	1

La conciliación de estos servicios, no son alterados por las novedades detalladas para el mes de marzo, pues una vez aclaradas las inconsistencias del informe, el resultado de las cantidades es equivalente a las conciliadas para el mes correspondiente.

ABRIL 2023:

En el ítem 8. Informe de visitas ejecutadas, se describe: "*Los 192 servicios de PTZ facturados en abril de 2023, son los siguientes…*" de los cuales se identificaron las siguientes novedades:

a) Validada la Tabla 11. Servicios correctivos PTZ, se encuentra relacionado en la fila 192 el ticket 2232724, pero verificada la conciliación técnica correspondiente a este periodo, este servicio no fue objeto de reconocimiento para pago en el mes de abril.

Ítem	Afiliación	Ticket
192	FVS-1205	2232724

Una vez validada la fecha de aprobación de este servicio, se evidenció que se reconoció en el mes de diciembre de 2022.

Sin embargo, verificados los tickets aportados en el SharePoint de la entidad por parte del contratista para el mes de abril, se identifica que no se encuentra relacionado el ticket Nro. 2283349 que corresponde a la prestación de servicios de Mantenimiento Correctivo efectuado al punto de videovigilancia MB939.

Acorde a lo expuesto, podemos deducir que hubo un error en la relación de los servicios en la tabla y se asume que en la fila 192, se debió haber relacionado los datos como se ilustra a continuación:

Ítem	Afiliación	Ticket
192	MB939	2283349

b) Validada la Tabla 12. Servicios correctivos CAI, sólo se relacionan 6 servicios omitiendo el ticket 2344877 que corresponde a la prestación del servicio de Mantenimiento Correctivo efectuado al CAI OXY, así:

Ítem	Afiliación	Ticket
7	CAI-OXY	2344877

c) No se ilustra el detalle del mantenimiento ejecutado en el mes de abril de 2023, en la estación de Policía Kennedy, por lo cual se procede a detallar acorde a la documentación existente, así:

VISITA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN CARRO CANASTA – EP

Ítem	Afiliación	Ticket
1	EP-KENNEDY	2379073

Una vez verificado los datos consignados en la conciliación financiera efectuada para el mes de abril del año 2023, ubicamos la siguiente información:

Descripción de Servicios Ejecutados	Cantidad
SUBSISTEMA CIUDADANOS - Visita de Mantenimiento Correctivo por punto CON CARRO CANASTA	192
SUBSISTEMA CTP-EP - Visita de Mantenimiento Correctivo por punto SIN CARRO CANASTA	1
SUBSISTEMA CAI - Visita de Mantenimiento Correctivo por punto SIN CARRO CANASTA	7
SUBSISTEMA CIUDADANOS - Limpiezas de acrílico	22
Diagnósticos, Administración y Soporte	1

La conciliación de estos servicios, no son alterados por las novedades detalladas para el mes de abril porque una vez aclaradas las inconsistencias del informe, el resultado de las cantidades es equivalente a las conciliadas para el mes correspondiente.

MAYO 2023:

Validado el informe publicado en la plataforma SECOPII se verifica con el contratista, que se encuentra publicada una versión anterior a la aprobada por la supervisión, por lo cual hubo la necesidad de publicar la versión aprobada y sobre la cual se harán las observaciones en la presente conciliación, como se relaciona a continuación:

a) En el ítem 8. Informe de visitas ejecutadas, se describe: "*se ejecutaron 660 servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y limpieza de acrílico, con 7 cuadrillas en campo, de los cuales se facturaron 510. La diferencia entre lo ejecutado y lo facturado, se ha visto afectado principalmente por los servicios escalados a ETB y servicios ejecutados para cumplir con la ponderación de calidad (Limpieza de acrílico - preventivos con carro canasta - preventivos sin carro canasta)*", situación que no corresponde a la realidad, puesto que este mes fue aprobado por la supervisión un total de 494 servicios que incluyen mantenimientos preventivos, correctivo y limpiezas de acrílico. Adicionalmente se ejecutaron 150 servicios sin costo para la entidad en cumplimiento a oferta del contratista por ponderación.

b) Se precisa que el ítem descrito en la tabla 12, no corresponde a un servicio sino a un valor relacionado en la bolsa de repuestos:

El servicio de montaje de punto de videovigilancia facturado en mayo de 2023, es el siguiente:

Ítem	No Afiliación	No Ticket
1	FVS-3403	2352374

Una vez verificado el informe, se evidencia que este costo se encuentra listado en la "*Tabla 23. Bolsa de repuestos usados en el mes de mayo 2023*", del ítem "*9.3. Bolsa de repuestos*".

Montaje de punto de videovigilancia	1

c) Validada la Tabla 19. Servicios correctivos PTZ, se encuentra relacionado en la fila 209 el ticket 2372953, pero verificada la conciliación técnica correspondiente a este periodo, este servicio no fue objeto de reconocimiento para pago en el mes de mayo.

Ítem	Afiliación	Ticket
209	MB301	2372953

Una vez validada la fecha de aprobación de este servicio, se evidenció que se reconoció en el mes de abril de 2023.

Sin embargo, verificados los tickets aportados en el SharePoint de la entidad por parte del contratista para el mes de mayo, se identifica que no se encuentra relacionado el ticket Nro. 2403841 que corresponde a la prestación de servicios de Mantenimiento Correctivo efectuado al punto de video vigilancia FN_17.

Acorde a lo expuesto, podemos deducir que hubo un error en la relación de los servicios en la tabla y se asume que en la fila 209, se debió haber relacionado los datos como se ilustra a continuación:

Ítem	Afiliación	Ticket
209	FN_17	2403841

d) Validada la Tabla 19. Servicios correctivos PTZ, se encuentra relacionado en la fila 282 el ticket 2276694, pero verificada la conciliación técnica correspondiente a este periodo, este servicio no fue objeto de reconocimiento para pago en el mes de mayo.

Ítem	Afiliación	Ticket
282	FVS-1191	2276694

Una vez validada la fecha de aprobación de este servicio, se evidenció que se reconoció en el mes de enero de 2023.

Sin embargo, verificados los tickets aportados en el SharePoint de la entidad por parte del contratista para el mes de mayo, se identifica que no se encuentra relacionado el ticket Nro. 2329416 que corresponde a la prestación de servicios de Mantenimiento Correctivo efectuado al punto de videovigilancia FN_62.

Acorde a lo expuesto, podemos deducir que hubo un error en la relación de los servicios en la tabla y se asume que en la fila 282, se debió haber relacionado los datos como se ilustra a continuación:

Ítem	Afiliación	Ticket
282	FN_62	2329416

e) Validada la Tabla 19. Servicios correctivos PTZ, se encuentra relacionado en la fila 237 el ticket 2364399 y verificada la conciliación técnica correspondiente a este periodo, este servicio fue objeto de reconocimiento para pago. Así mismo se cruzó información con los otros meses, identificando que este mismo servicio se reconoció en el mes de abril de 2023.

Ítem	Afiliación	Ticket
237	AL617	2364399

En consecuencia, se debe aplicar descuento equivalente a una "VISITA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CARRO CANASTA" por el cobro realizado en el mes de mayo.

f) Validada la Tabla 19. Servicios correctivos PTZ, se encuentra relacionado en la fila 280 el ticket 2312245 y verificada la conciliación técnica correspondiente a este periodo, este servicio fue objeto de reconocimiento para pago. Así mismo se cruzó información con los otros meses, identificando que este mismo servicio se reconoció en el mes de marzo de 2023.

Ítem	Afiliación	Ticket
280	AL117	2312245

En consecuencia, se debe aplicar descuento equivalente a una "VISITA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CARRO CANASTA" por el cobro realizado en el mes de mayo.

Una vez verificado los datos consignados en la conciliación financiera efectuada para el mes de mayo del año 2023, ubicamos la siguiente información:

Descripción de Servicios Ejecutados	Cantidad
SUBSISTEMA CIUDADANOS - Visita de Mantenimiento Correctivo por punto CON CARRO CANASTA	282
SUBSISTEMA CIUDADANOS - Visita de Mantenimiento preventivo por ubicación CON CARRO CANASTA	2
SUBSISTEMA CIUDADANOS - Limpiezas de acrílico	201
SUBSISTEMA TRANSMILENIO - Visita de Mantenimiento Correctivo por punto SIN CARRO CANASTA	1
SUBSISTEMA CTP-EP - Visita de Mantenimiento Correctivo por punto SIN CARRO CANASTA	3
SUBSISTEMA CTP-EP - Visita de Mantenimiento preventivo por ubicación SIN CARRO CANASTA	1
SUBSISTEMA CAI - Visita de Mantenimiento Correctivo por punto SIN CARRO CANASTA	4
Diagnósticos, Administración y Soporte	1

La conciliación de estos servicios se ve afectado por las novedades identificadas en el mes de mayo, pues una vez aclaradas las inconsistencias del informe, se debe aplicar descuento

debido a los pagos realizados por los tickets N° 2312245 y 2364399 por concepto de “VISITA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CARRO CANASTA”.

JUNIO 2023:

En el ítem 8. Informe de visitas ejecutadas, se describe: “*Los 210 servicios de PTZ facturados en junio de 2023, son los siguientes…*” de los cuales se identificaron las siguientes novedades:

a) Validada la Tabla 18. Servicios correctivos PTZ, se encuentra relacionado en la fila 210 el ticket 2329416, pero verificada la conciliación técnica correspondiente a este periodo, este servicio no fue objeto de reconocimiento para pago en el mes de junio.

Ítem	Afiliación	Ticket
210	FN_62	2329416

Una vez validada la fecha de aprobación de este servicio, se evidenció que se reconoció en el mes de mayo de 2023.

Sin embargo, verificados los tickets aportados en el SharePoint de la entidad por parte del contratista para el mes de junio, se identifica que no se encuentra relacionado el ticket Nro. 2435483 que corresponde a la prestación de servicios de Mantenimiento Correctivo efectuado al punto de video vigilancia CCEL19_0025.

Acorde a lo expuesto, podemos deducir que hubo un error en la relación de los servicios en la tabla y se asume que en la fila 210, se debió haber relacionado los datos como se ilustra a continuación:

Ítem	Afiliación	Ticket
210	CCEL19_0025	2435483

Una vez verificado los datos consignados en la conciliación financiera efectuada para el mes de junio del año 2023, ubicamos la siguiente información:

ITEM	PREFACTURA SERVICIOS			
	Descripcion	Cantidad	Valor unitario	Valor
1	SUBSISTEMA CIUDADANOS - Visita de Mantenimiento Correctivo por punto CON CARRO CANASTA	210	$ 1.710.800,00	$ 359.268.000,00
2	SUBSISTEMA CIUDADANOS - Limpiezas de acrilico	104	$ 648.000,00	$ 67.392.000,00
3	SUBSISTEMA TRASMILENIO - Visita de Mantenimiento Correctivo por punto SIN CARRO CANASTA	1	$ 723.300,00	$ 723.300,00
4	SUBSISTEMA CTP-EP - Visita de Mantenimiento Correctivo por punto SIN CARRO CANASTA	1	$ 1.011.700,00	$ 1.011.700,00
5	SUBSISTEMA CTP - Visita de Mantenimiento preventivo UPS	1	$ 577.800,00	$ 577.800,00
6	Diagnósticos, Administración y Soporte	1	$ 99.680.700,00	$ 99.680.700,00
7	Descuento de ANS Junio 2023	1	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00
	Subtotal			**$ 525.653.500,00**
	IVA			**$ 99.874.165,00**
	Total			**$ 625.527.665,00**

La conciliación de estos servicios, no son alterados por la novedad detallada para el mes de junio, pues una vez aclarada la inconsistencia del informe, el resultado de las cantidades es equivalente a las conciliadas para el mes correspondiente.

JULIO 2023:

En el ítem 8. Informe de visitas ejecutadas, se describe: "*Los 172 servicios de PTZ facturados en julio de 2023, son los siguientes…*" de los cuales se identificaron las siguientes novedades:

a) Validada la Tabla 18. Servicios correctivos PTZ, se encuentra relacionado en la fila 171 el ticket 2379405, pero verificada la conciliación técnica correspondiente a este periodo, este servicio no fue objeto de reconocimiento para pago en el mes de julio.

Ítem	Afiliación	Ticket
171	FVS-3207	2379405

Una vez validada la fecha de aprobación de este servicio, se evidenció que se reconoció en el mes de junio de 2023.

Sin embargo, verificados los tickets aportados en el SharePoint de la entidad por parte del contratista para el mes de junio, se identifica que no se encuentra relacionado el ticket Nro. 2380264 que corresponde a la prestación de servicios de Mantenimiento Correctivo efectuado al punto de video vigilancia MB301.

Acorde a lo expuesto, podemos deducir que hubo un error en la relación de los servicios en la tabla y se asume que en la fila 171, se debió haber relacionado los datos como se ilustra a continuación:

Ítem	Afiliación	Ticket
171	MB301	2380264

b) Validada la Tabla 18. Servicios correctivos PTZ, se encuentra relacionado en la fila 172 el ticket 2376782, pero verificada la conciliación técnica correspondiente a este periodo, este servicio no fue objeto de reconocimiento para pago en el mes de julio.

Ítem	Afiliación	Ticket
172	SCJ17E060032	2376782

Una vez validada la fecha de aprobación de este servicio, se evidenció que se reconoció en el mes de abril de 2023.

Sin embargo, verificados los tickets aportados en el SharePoint de la entidad por parte del contratista para el mes de julio, se identifica que no se encuentra relacionado el ticket Nro. 2462273 que corresponde a la prestación de servicios de Mantenimiento Correctivo efectuado al punto de video vigilancia ESU-022.

Acorde a lo expuesto, podemos deducir que hubo un error en la relación de los servicios en la tabla y se asume que en la fila 172, se debió haber relacionado los datos como se ilustra a continuación:

Ítem	Afiliación	Ticket
172	ESU-022	2462273

Una vez verificado los datos consignados en la conciliación financiera efectuada para el mes de junio del año 2023, ubicamos la siguiente información:

ITEM	PREFACTURA SERVICIOS			
	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor
1	SUBSISTEMA CIUDADANOS - Visita de Mantenimiento Correctivo por punto CON CARRO CANASTA	172	$ 1.710.800,00	$ 294.257.600,00
2	SUBSISTEMA CTP - Visita de Mantenimiento Correctivo por punto SIN CARRO CANASTA	1	$ 1.011.700,00	$ 1.011.700,00
3	SUBSISTEMA CAI - Visita de Mantenimiento Correctivo por punto SIN CARRO CANASTA	1	$ 876.700,00	$ 876.700,00
4	SUBSISTEMA EP - Visita de Mantenimiento Correctivo por punto SIN CARRO CANASTA	1	$ 1.011.700,00	$ 1.011.700,00
5	COMPONENTE DE DIAGNÓSTICO: Diagnósticos, Administración y Soporte	1	$ 99.680.700,00	$ 99.680.700,00
			Subtotal	**$ 396.838.400,00**
			IVA	**$ 75.399.296,00**
			Total	**$ 472.237.696,00**

La conciliación de estos servicios, no son alterados por las novedades detalladas para el mes de julio, pues una vez aclaradas las inconsistencias del informe, el resultado de las cantidades es equivalente a las conciliadas para el mes correspondiente.

AGOSTO 2023:

En el ítem 8. Informe de visitas ejecutadas, se describe: "*Los 268 servicios correctivos de PTZ facturados en agosto de 2023…*" de los cuales se identificaron las siguientes novedades:

a) Validada la Tabla 17. Servicios correctivos PTZ, se encuentra relacionado en la fila 267 el ticket 2376745 y verificada la conciliación técnica correspondiente a este periodo, este servicio fue objeto de reconocimiento para pago. Así mismo se cruzó información con los otros meses, identificando que este mismo servicio se reconoció en el mes de abril de 2023.

Ítem	Afiliación	Ticket
267	SCJ17E050094	2376745

En consecuencia, se debe aplicar descuento equivalente a una “VISITA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CARRO CANASTA” por el cobro realizado en el mes de agosto.

Una vez verificado los datos consignados en la conciliación financiera efectuada para el mes de agosto del año 2023, ubicamos la siguiente información:

Descripción de Servicios Ejecutados	Cantidad
SUBSISTEMA CIUDADANOS - Visita de Mantenimiento Correctivo por punto CON CARRO CANASTA	268
SUBSISTEMA CIUDADANOS - Visita de Mantenimiento preventivo por punto CON CARRO CANASTA	12
SUBSISTEMA ESTADIO - Visita de Mantenimiento Correctivo por punto SIN CARRO CANASTA	1
Diagnósticos, Administración y Soporte	1

La conciliación de estos servicios se ve afectado por la novedad identificada en el mes de agosto, pues una vez aclarada la inconsistencia del informe, se debe aplicar descuento debido al pago realizado por el ticket N° 2376745 por concepto de “VISITA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CARRO CANASTA”.

SEPTIEMBRE 2023:

Una vez validados los tickets relacionados en el ítem “*8. Informe de visitas ejecutadas*”, no se identifican novedades.

OCTUBRE 2023:

Una vez validados los tickets relacionados en el ítem “*8. Informe de visitas ejecutadas*”, no se identifican novedades.

NOVIEMBRE 2023:

Una vez validados los tickets relacionados en el ítem “*8. Informe de visitas ejecutadas*”, no se identifican novedades.

DICIEMBRE 2023:

Una vez validados los tickets relacionados en el ítem “*8. Informe de visitas ejecutadas*”, no se identifican novedades.

Por último, se había reportado el ingreso al almacén de la cámara Hanwha XNP-6321H con S/N ZMJS6V4T300052M, en diciembre de 2022 y enero de 2023. Por lo anterior, es necesario hacer el ingreso al almacén de la cámara instalada con el ticket No 2309659, en la afiliación FN_112 marca Bosch NDP-5512-Z30 con S/N 404566923917019018.

16. Escalamientos a terceros

Mes	ETB	ENEL
Octubre 2022	16	276
Noviembre 2022	85	13
Diciembre 2022	152	12
Total	253	301


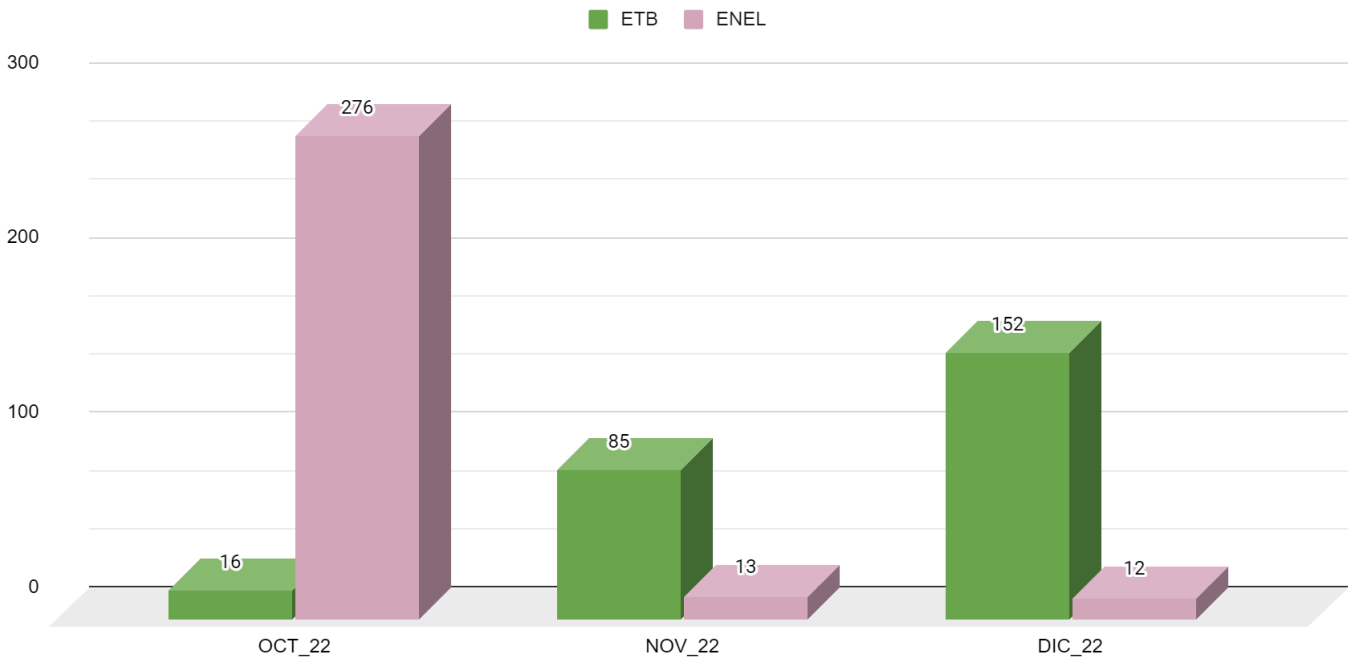



Imagen 17. Escalamientos a terceros 2022.

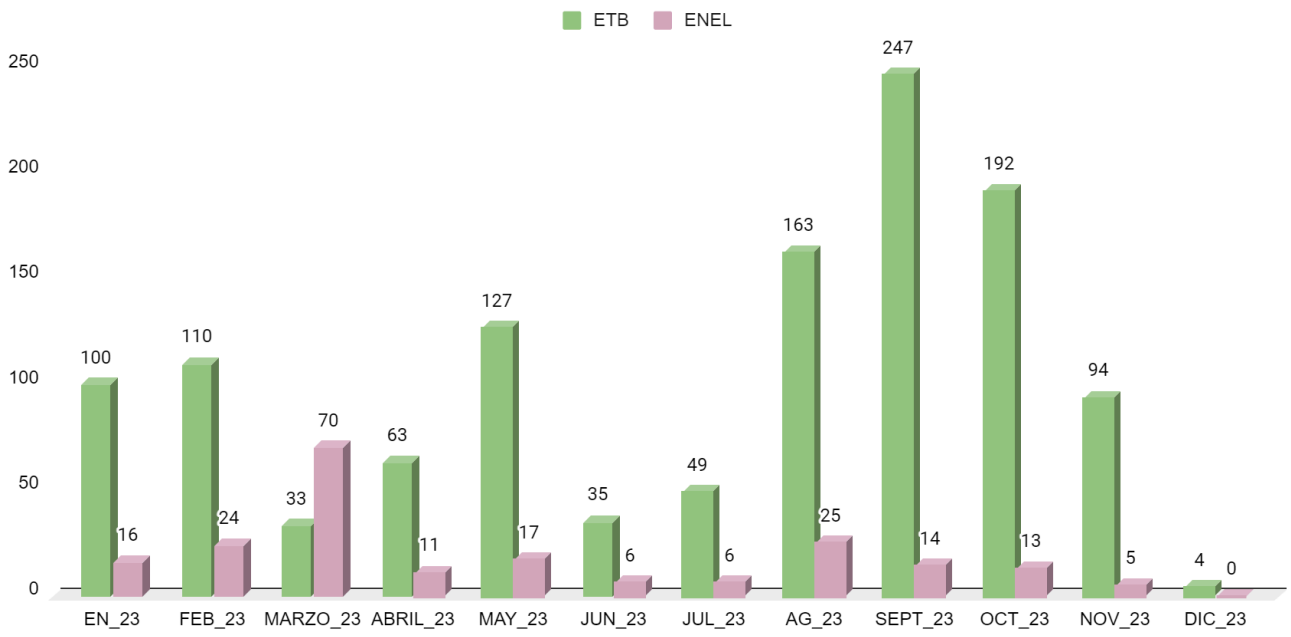

Mes	ETB	ENEL
Enero 2023	100	16
Febrero 2023	110	24
Marzo 2023	33	70
Abril 2023	63	11
Mayo 2023	127	17
Junio 2023	35	6
Julio 2023	49	6
Agosto 2023	163	25
Septiembre 2023	247	14
Octubre 2023	192	13
Noviembre 2023	94	5
Diciembre 2023	4	0
Total	1.217	207


Imagen 18. Escalamientos a terceros 2023.

17. Comportamiento del estado del sistema

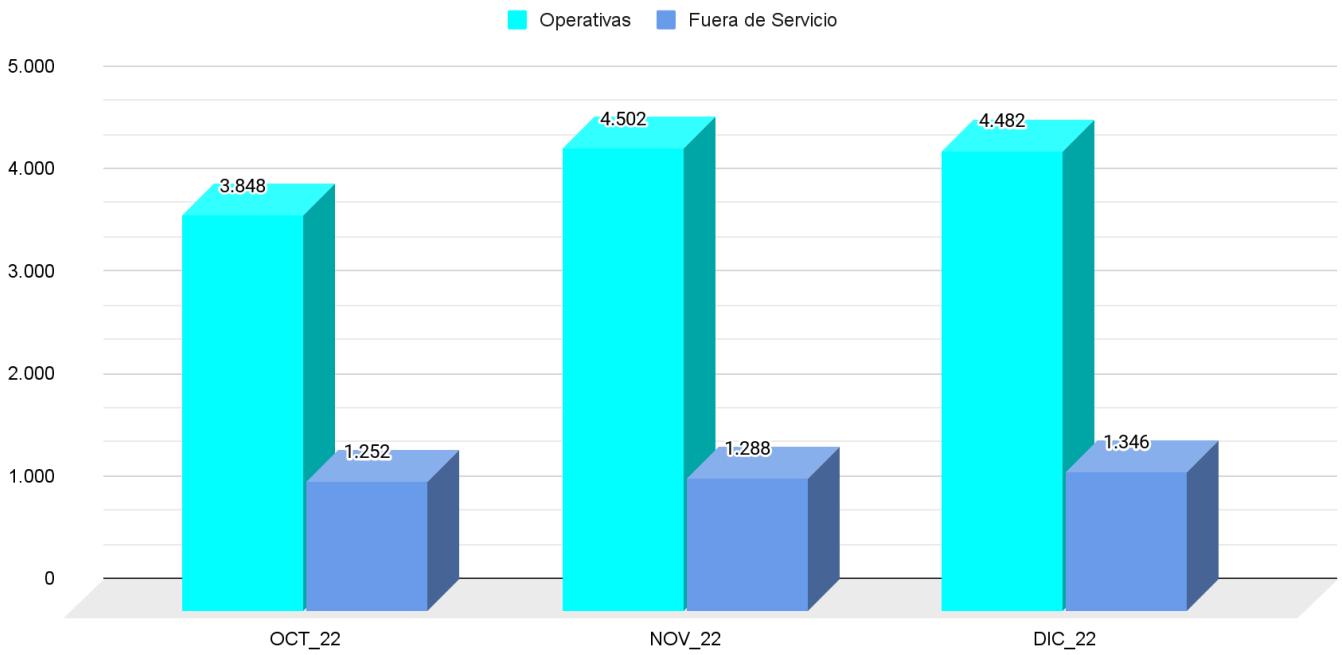

Mes	Operativas	Fuera de Servicio
Octubre 2022	3.848	1.252
Noviembre 2022	4.502	1.288
Diciembre 2022	4.482	1.346
Total	12.832	3.886

Imagen 19. Comportamiento estado del sistema 2022

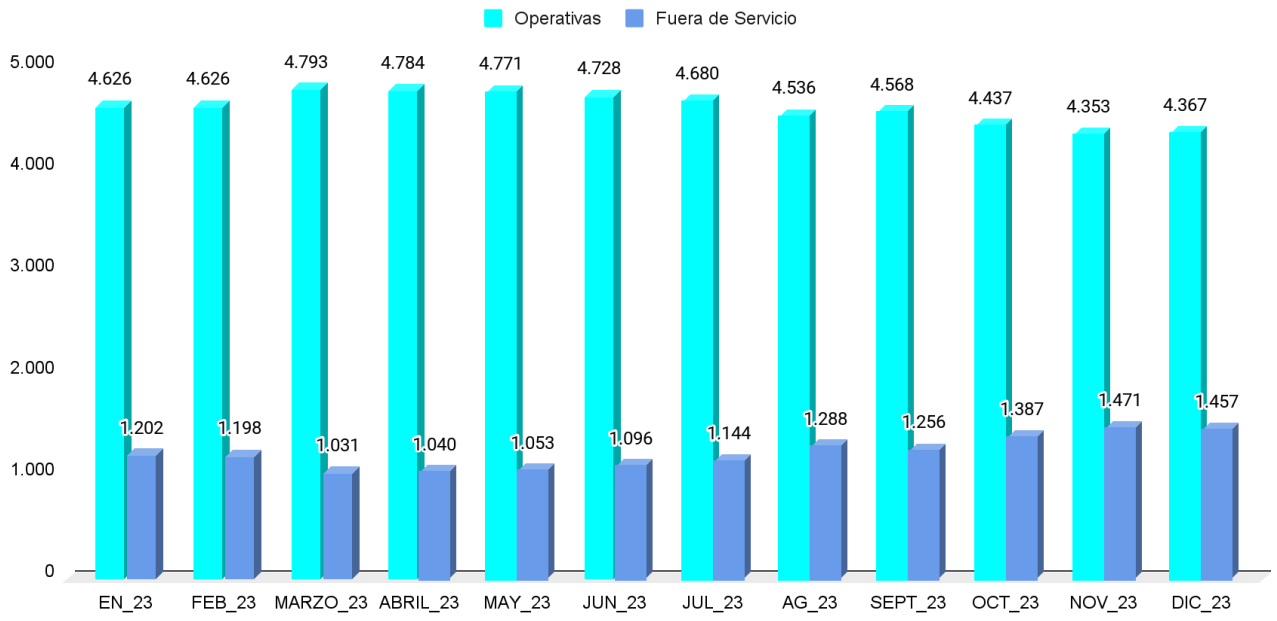

Mes	Operativas	Fuera de Servicio
Enero 2023	4.626	1.202
Febrero 2023	4.626	1.198
Marzo 2023	4.793	1.031
Abril 2023	4.784	1.040
Mayo 2023	4.771	1.053
Junio 2023	4.728	1.096
Julio 2023	4.680	1.144
Agosto 2023	4.536	1.288
Septiembre 2023	4.568	1.256
Octubre 2023	4.437	1.387
Noviembre 2023	4.353	1.471
Diciembre 2023	4.367	1.457
Total	55.269	14.623

Imagen 20. Comportamiento estado del sistema 2023

17.1. Estado del subsistema CAI

Mes	OPERATIVO	FUERA DE SERVICIO
OCT_22	60	28
NOV_22	293	183
DIC_22	287	227


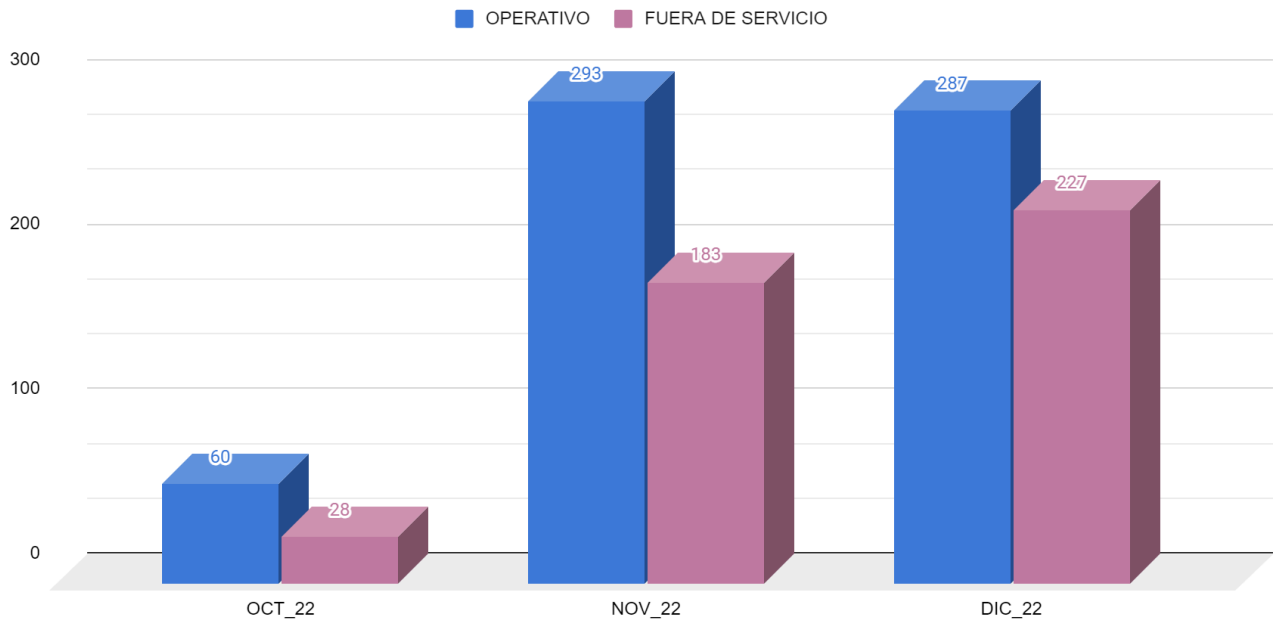



Imagen 21. Estado del subsistema CAI 2022.

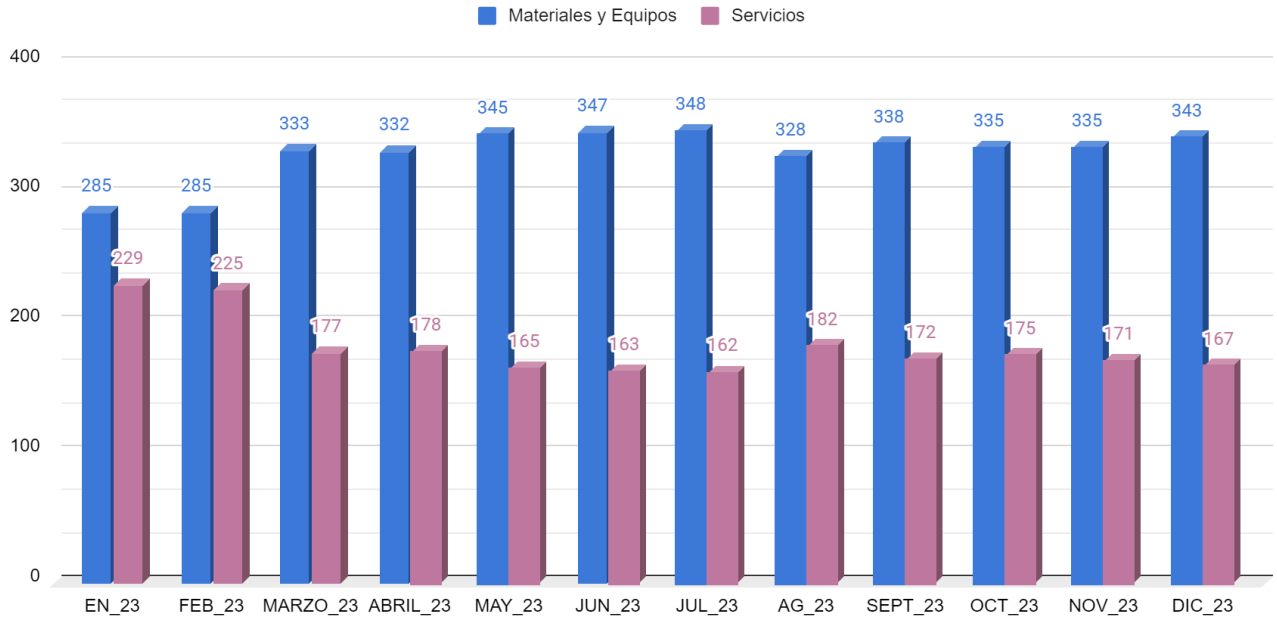

Mes	OPERATIVO	FUERA DE SERVICIO
EN_23	285	229
FEB_23	285	225
MARZO_23	333	177
ABRIL_23	332	178
MAY_23	345	165
JUN_23	347	163
JUL_23	348	162
AG_23	328	182
SEPT_23	338	172
OCT_23	335	175
NOV_23	335	171
DIC_23	343	167


Imagen 22. Estado del subsistema CAI 2023.

17.2. Estado del subsistema colegios

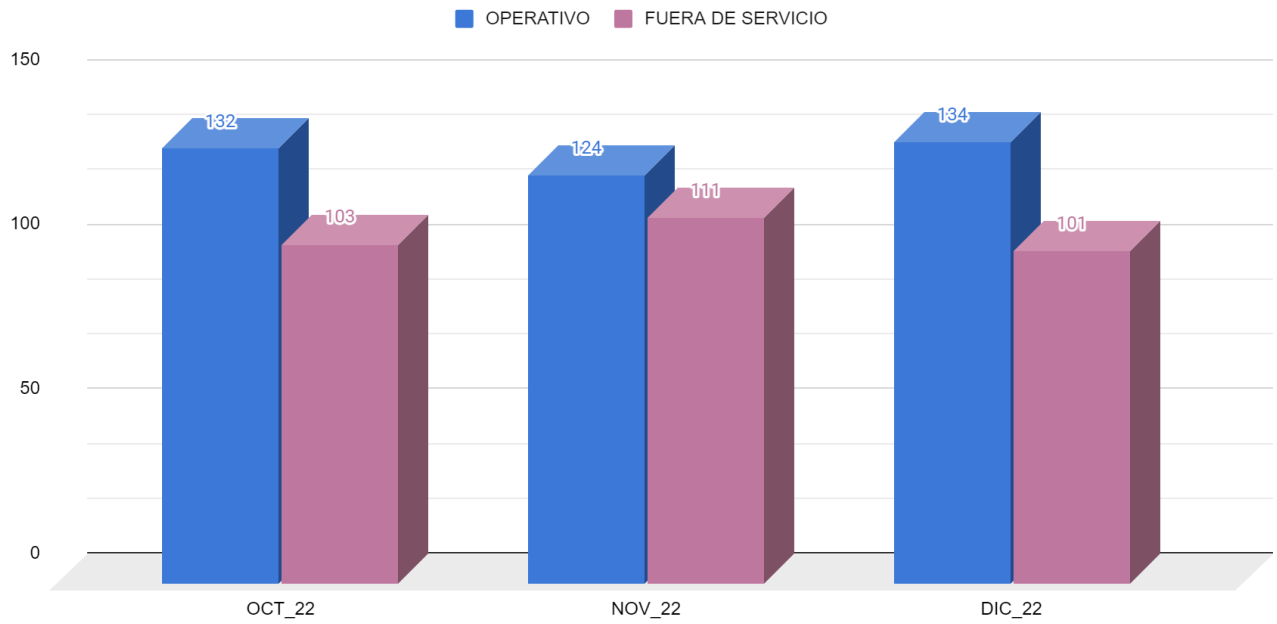

Mes	OPERATIVO	FUERA DE SERVICIO
OCT_22	132	103
NOV_22	124	111
DIC_22	134	101


Imagen 23. Estado del subsistema colegios 2022.

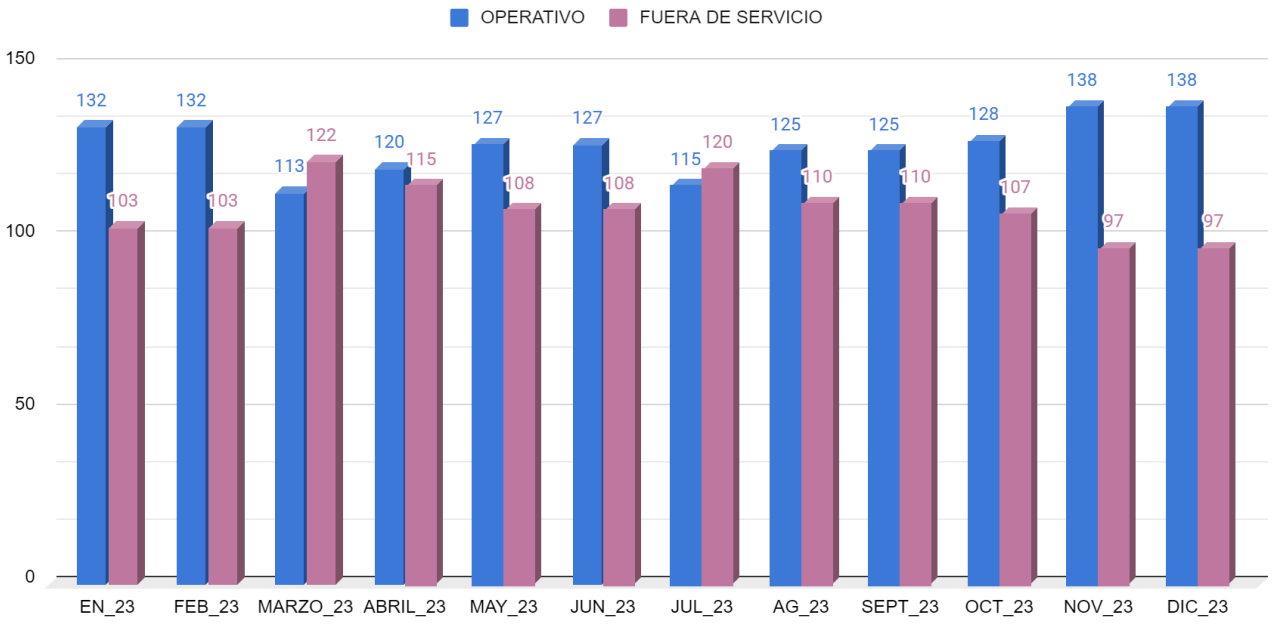

Mes	OPERATIVO	FUERA DE SERVICIO
EN_23	132	103
FEB_23	132	103
MARZO_23	113	122
ABRIL_23	120	115
MAY_23	127	108
JUN_23	127	108
JUL_23	115	120
AG_23	125	110
SEPT_23	125	110
OCT_23	128	107
NOV_23	138	97
DIC_23	138	97


Imagen 24. Estado del subsistema colegios 2023.

17.3. Estado del subsistema estaciones de policía

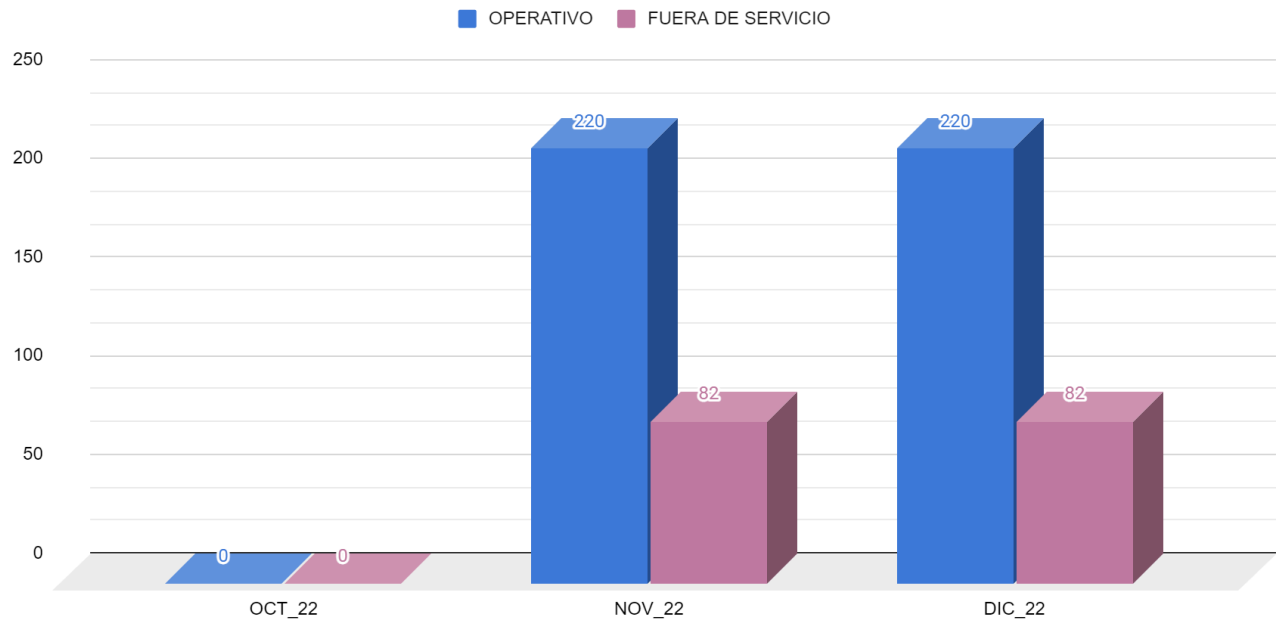

Mes	OPERATIVO	FUERA DE SERVICIO
OCT_22	0	0
NOV_22	220	82
DIC_22	220	82


Imagen 25. Estado del subsistema estaciones de policía 2022.

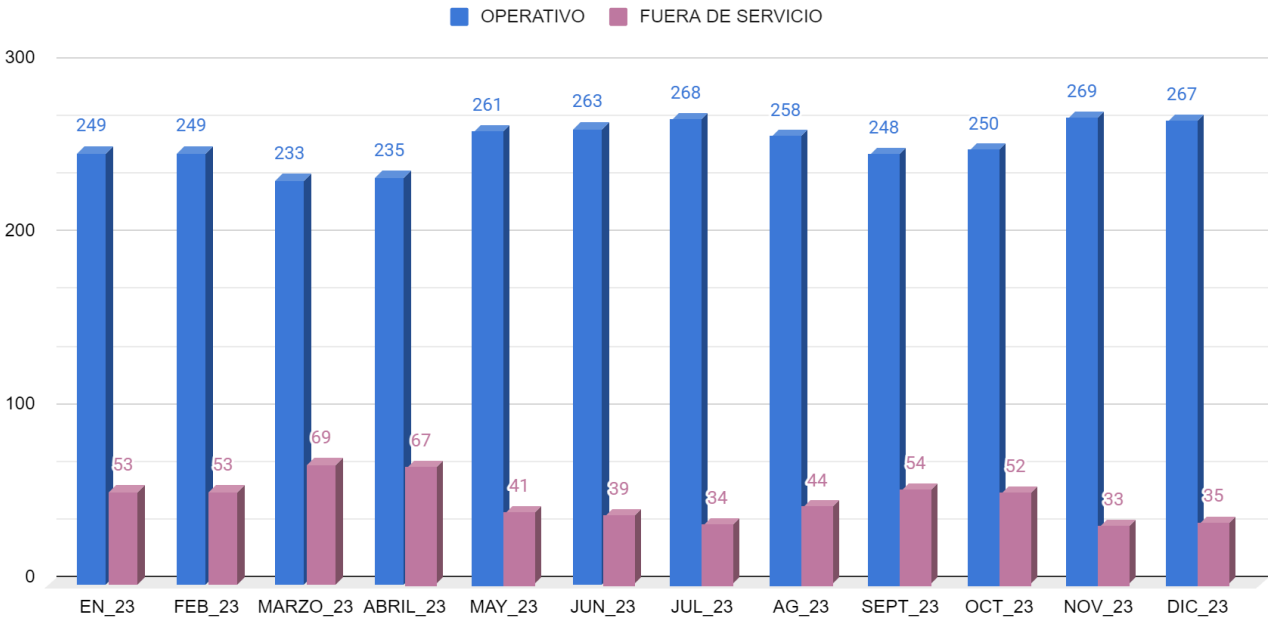

Mes	OPERATIVO	FUERA DE SERVICIO
EN_23	249	53
FEB_23	249	53
MARZO_23	233	69
ABRIL_23	235	67
MAY_23	261	41
JUN_23	263	39
JUL_23	268	34
AG_23	258	44
SEPT_23	248	54
OCT_23	250	52
NOV_23	269	33
DIC_23	267	35


Imagen 26. Estado del subsistema estaciones de policía 2023.

17.4. Estado del subsistema Transmilenio

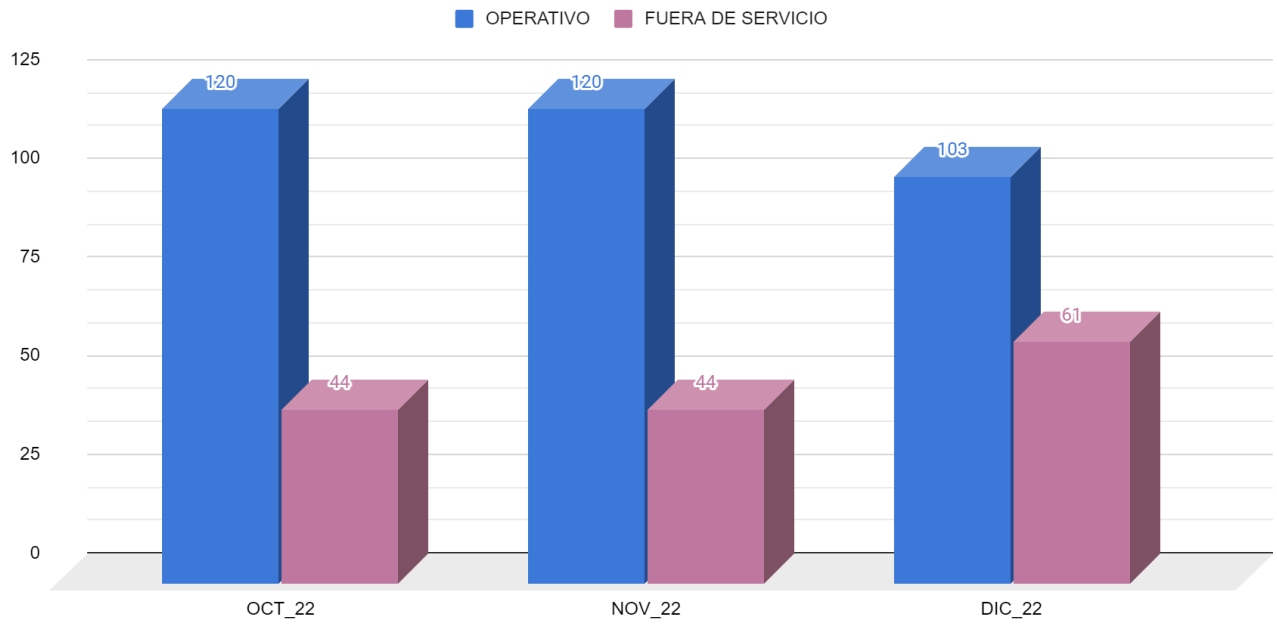

Mes	OPERATIVO	FUERA DE SERVICIO
OCT_22	120	44
NOV_22	120	44
DIC_22	103	61


Imagen 27. Estado del subsistema Transmilenio 2022.

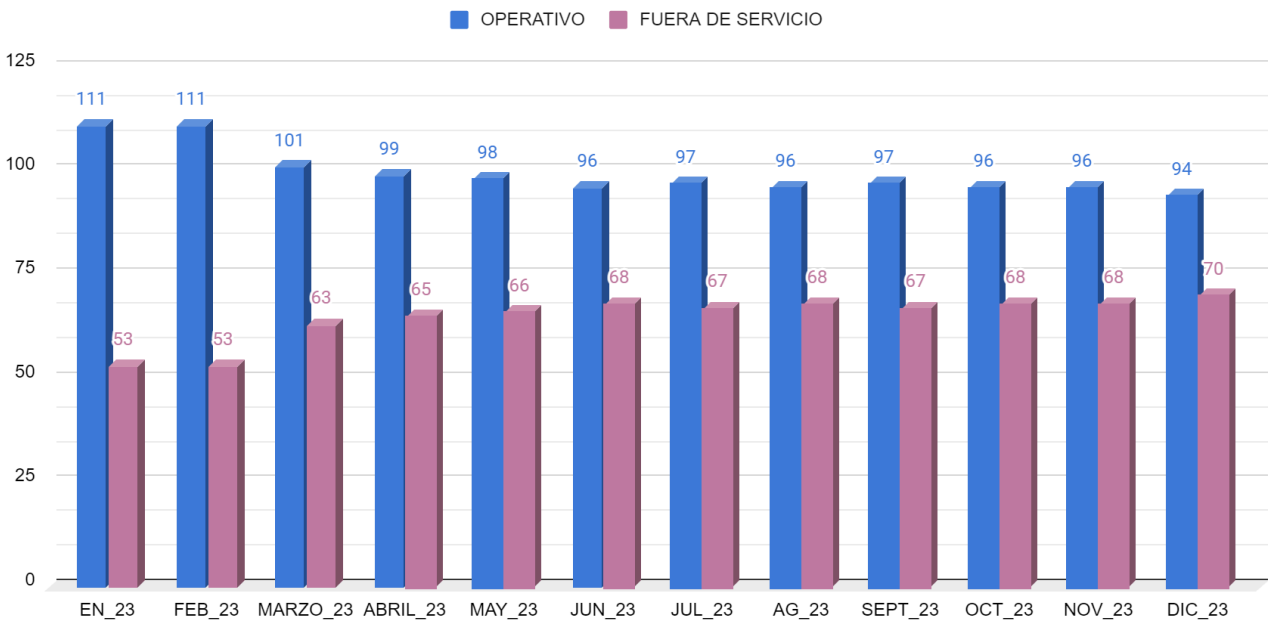

Mes	OPERATIVO	FUERA DE SERVICIO
EN_23	111	53
FEB_23	111	53
MARZO_23	101	63
ABRIL_23	99	65
MAY_23	98	66
JUN_23	96	68
JUL_23	97	67
AG_23	96	68
SEPT_23	97	67
OCT_23	96	68
NOV_23	96	68
DIC_23	94	70


Imagen 28. Estado del subsistema Transmilenio 2023.

17.5. Estado de los subsistemas CTP y estadio

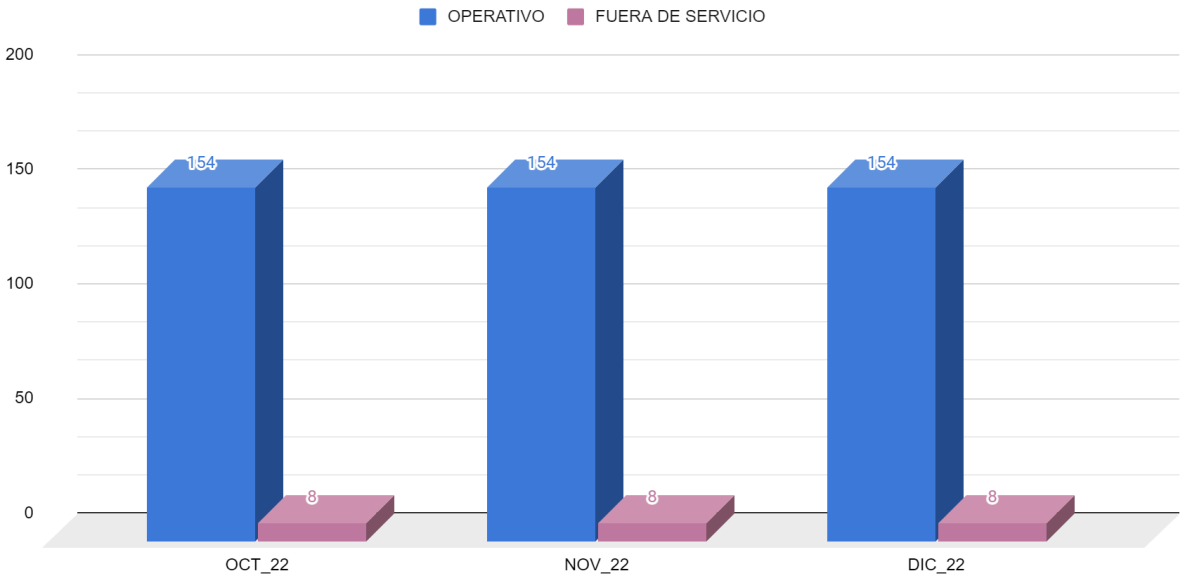

Mes	OPERATIVO	FUERA DE SERVICIO
OCT_22	154	8
NOV_22	154	8
DIC_22	154	8


Imagen 29. Estado de los subsistemas CTP y estadio 2022.

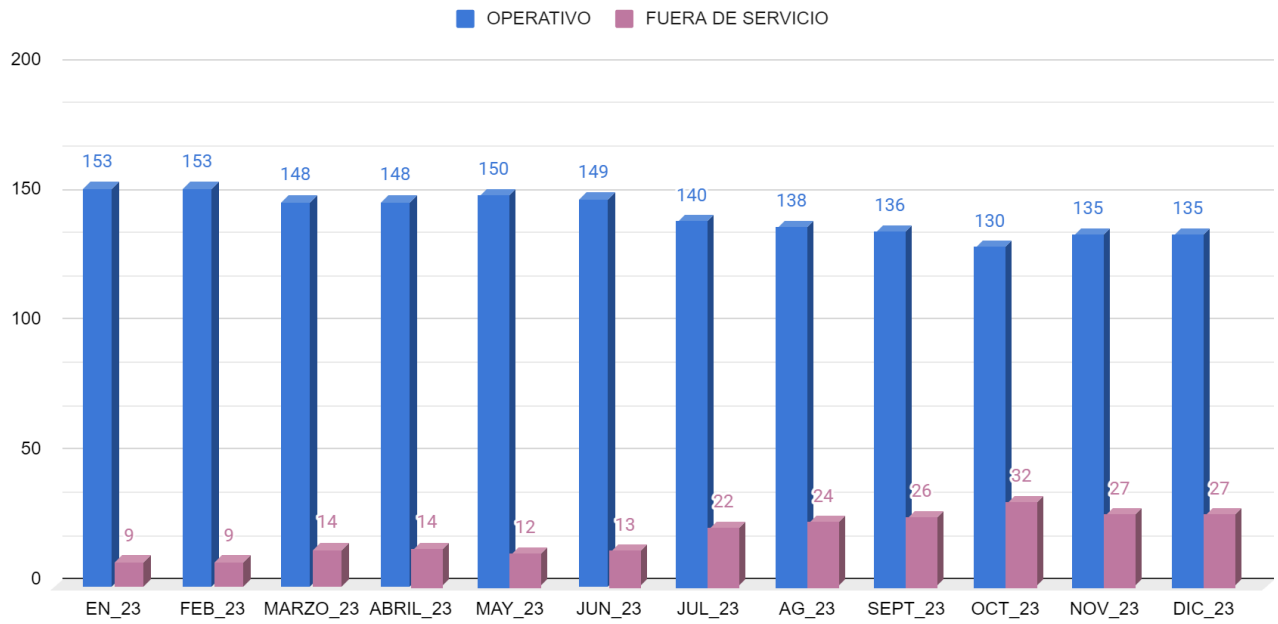

Mes	OPERATIVO	FUERA DE SERVICIO
EN_23	153	9
FEB_23	153	9
MARZO_23	148	14
ABRIL_23	148	14
MAY_23	150	12
JUN_23	149	13
JUL_23	140	22
AG_23	138	24
SEPT_23	136	26
OCT_23	130	32
NOV_23	135	27
DIC_23	135	27


Imagen 30. Estado de los subsistemas CTP y estadio 2023.

17.6. Estado del subsistema domos ciudadanos.

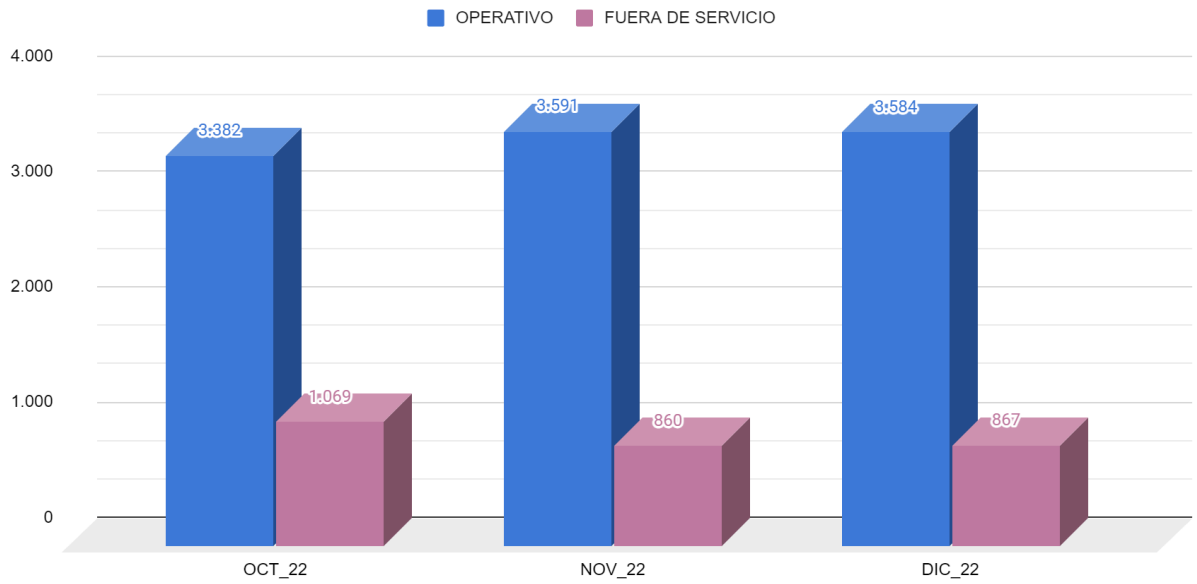

Mes	OPERATIVO	FUERA DE SERVICIO
OCT_22	3.382	1.069
NOV_22	3.591	860
DIC_22	3.584	867

Imagen 31. Estado del subsistema domos ciudadanos 2022.

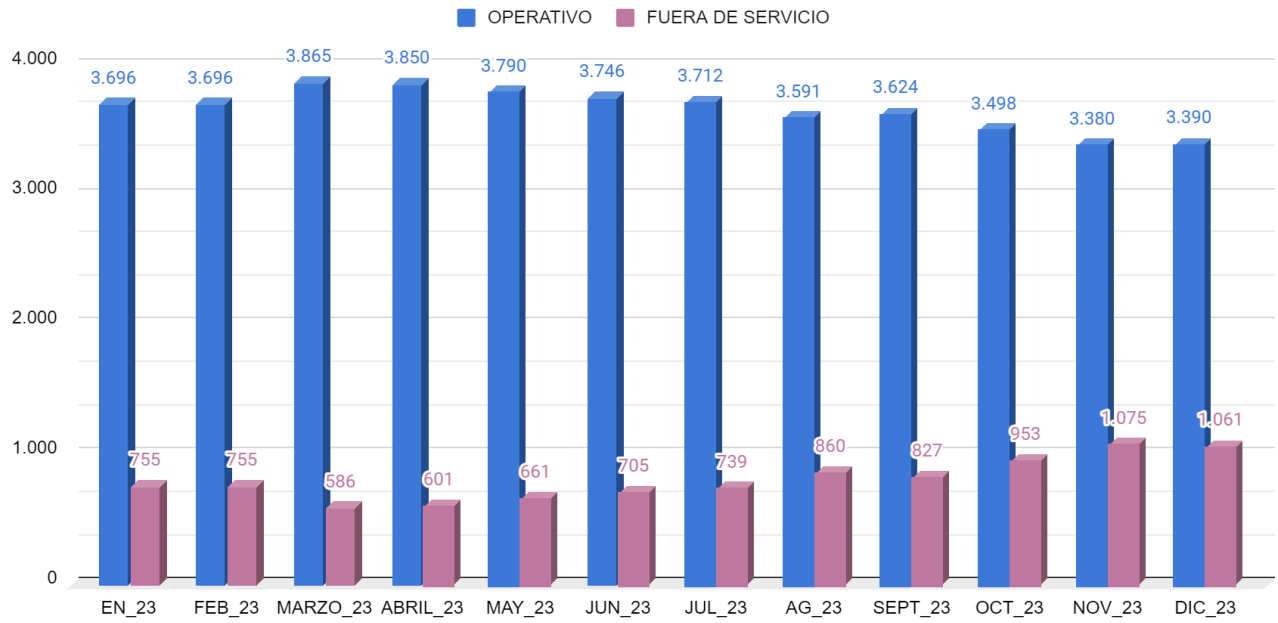

Mes	OPERATIVO	FUERA DE SERVICIO
EN_23	3.696	755
FEB_23	3.696	755
MARZO_23	3.865	586
ABRIL_23	3.850	601
MAY_23	3.790	661
JUN_23	3.746	705
JUL_23	3.712	739
AG_23	3.591	860
SEPT_23	3.624	827
OCT_23	3.498	953
NOV_23	3.380	1.075
DIC_23	3.390	1.061

Imagen 32. Estado del subsistema domos ciudadanos 2023.

18. Ponderación de calidad

Se reportó el cumplimiento de la obligación específica Nº 39 con los siguientes oficios:

- SGT-SDSCJ-505-23
- SGT-SDSCJ-605-23
- SGT-SDSCJ-713-23

19. Siniestros

Dentro del marco del contrato SCJ-1932 2022, se realizaron los siguientes reportes de siniestros:

ÍTEM	No. RADICADO	ASUNTO
1	SGT-SDSCJ-125-22	SGT-SDSCJ-125-22 reporte cámara vandalizada punto FVS-3209.
2	SGT-SDSCJ-138-22	SGT-SDSCJ-138-22 reporte siniestro punto SCJ17E190077 SGT-SDSCJ-417-23 Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-138-22 reporte siniestro punto SCJ17E190077.”
3	SGT-SDSCJ-139-22	SGT-SDSCJ-139-22 reporte siniestro punto SCJ17E050069 SGT-SDSCJ-418-23 Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-139-22 reporte siniestro punto SCJ17E050069.”
4	SGT-SDSCJ-181-22	SGT-SDSCJ-181-22 reporte vandalismo estación ricaurte calle 13 - transmilenio
5	SGT-SDSCJ-185-22	SGT-SDSCJ-185-22 reporte de cámaras vandalizadas en centros de atención CAI SGT-SDSCJ-807-23 Alcance al oficio "SGT-SDSCJ-185-22 Reporte de cámaras vandalizadas en Centros de Atención Inmediata (CAI)
6	SGT-SDSCJ-187-22	SGT-SDSCJ-187-22 reporte vandalismo Estación Américas - Transmilenio. SGT-SDSCJ-808-23 Alcance al oficio " SGT-SDSCJ-187-22 Reporte vandalismo Estación Américas - Transmilenio."
7	SGT-SDSCJ-371-23	SGT-SDSCJ-371-23 reporte siniestro punto ESU-072
8	SGT-SDSCJ-405-23	SGT-SDSCJ-405-23 reporte vandalismo punto de videovigilancia P459
9	SGT-SDSCJ-406-23	SGT-SDSCJ-406-23 reporte de incidente punto FVS-3400.
10	SGT-SDSCJ-436-23	SGT-SDSCJ-436-23 reporte siniestro punto ESU-117.
11	SGT-SDSCJ-491-23	SGT-SDSCJ-491-23 reporte de vandalismo al punto fvs-4118 localidad de mártires. SGT-SDSCJ-502-23 Respuesta a las observaciones del correo electrónico realizadas el día 15 de mayo de 2023 “SGT-SDSCJ-491-23 reporte de vandalismo al punto FVS-4118 Localidad de Mártires”.
12	SGT-SDSCJ-56-23	SGT-SDSCJ-563-23 reporte siniestro punto CCEL19_0025 localidad Ciudad Bolívar.
13	SGT-SDSCJ-566-23	SGT-SDSCJ-566-23 reporte de robo de equipos al punto FVS-1407 Localidad de Suba
14	SGT-SDSCJ-591-23	SGT-SDSCJ-591-23 reporte vandalismo Estación Jiménez - Transmilenio
15	SGT-SDSCJ-610-23	SGT-SDSCJ-610-23 reporte siniestro punto FVS-3214 localidad Kennedy. SGT-SDSCJ-646-23 Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-610-23 Reporte siniestro punto FVS-3214 localidad Kennedy

ÍTEM	No. RADICADO	ASUNTO
16	SGT-SDSCJ-624-23	SGT-SDSCJ-624-23 Reporte vandalismo en Centro de Traslado por Protección (CTP)
17	SGT-SDSCJ-765-23	SGT-SDSCJ-765-23 Reporte siniestro punto ESU-045 localidad Ciudad Bolívar
18	SGT-SDSCJ-766-23	SGT-SDSCJ-766-23 Reporte siniestro punto SCJ17E050019 localidad Ciudad Bolívar.
19	SGT-SDSCJ-781-23	SGT-SDSCJ-781-23 Reporte siniestro punto SCJ17FJ0030 localidad Rafael Uribe Uribe.

Tabla 8. Siniestros.

20. Descuentos por ANS

El siguiente gráfico detalla los descuentos aplicados durante la ejecución del contrato SCJ 1932 2022:

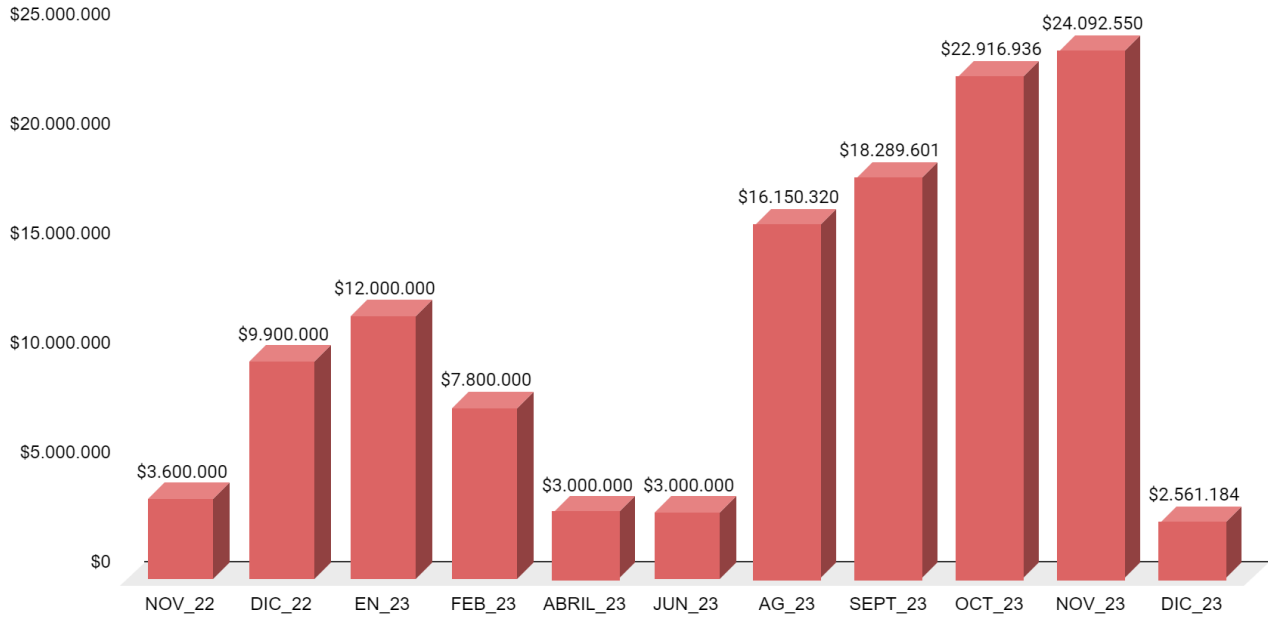


Imagen 33. Descuentos por ANS.

21. Gestión de las comunicaciones

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Alcance radicado No.20225410413401	GS-2022-COMAN-TELEM 29.25	Policía Nacional de Colombia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2022-07-11
Correo	Solicitud mantenimiento preventivo y correctivo CCTV CAI y Estaciones de Policía.	GS-2022-347453-MEBOG	Policía Nacional de Colombia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2022-07-11

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Solicitud arreglo camaras sistema de video vigilancia	GS-2021-360470-SUBCO-CAD-1.10	Policía Nacional de Colombia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2022-07-22
Correo	Solicitud arreglo camaras sistema de video vigilancia	GS-2022-460228-SUBCO-CAD-1.10	Policía Nacional de Colombia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2022-09-18
Correo	Solicitud mantenimiento preventivo y correctivo CCTV Urbano	GS-2022-472926-MEBOG	Policía Nacional de Colombia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2022-09-26
Correo	Contrato -ejecucion contrato 1932-2022- Mantenimiento de video vigilancia	No aplica	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia	2022-09-27
Correo	Radicación de hojas de vida del personal mínimo requerido.	SGT-SDSCJ-001-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4)	2022-09-27
Correo	Plan de Migración de Entrada y Estabilización del Servicio.	SGT-SDSCJ-002-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4)	2022-09-30
Correo	Respuesta a las observaciones presentadas a las hojas de vida del personal mínimo requerido, dando alcance al oficio SGT-SDSCJ-001-22	SGT-SDSCJ-003-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4)	2022-10-01
Correo	Respuesta a observaciones del 3 de octubre del 2022 en relación a las hojas de vida del personal mínimo requerido, dando alcance al oficio SGT-SDSCJ-003-22.	SGT-SDSCJ-004-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4)	2022-10-04
Correo	Acta de inicio firmada por parte de Seguritech Colombia S.A.S.	SGT-SDSCJ-005-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-10-05
Correo	Verificación cámaras sin conexión	GS-2022-489510-MEBOG	Policía Nacional de Colombia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2022-10-06
Correo	Solicitud ingreso Datacenter C4 y Bomberos.	SGT-SDSCJ-006-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4)	2022-10-07
Correo	Solicitud ingreso de equipos de mesa de servicios al C4	SGT-SDSCJ-007-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4)	2022-10-07
Correo	Solicitud ingreso al Datacenter de Bomberos.	SGT-SDSCJ-008-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4)	2022-10-07
Correo	Radicación Hojas de vida personal adicional para la mesa de servicios	SGT-SDSCJ-009-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-10-07
Correo	Solicitud de revisión del Plan de Manejo de Tránsito.	SGT-SDSCJ-010-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Movilidad	2022-10-08
Correo	Solicitud de creación de credenciales de acceso a SecurOS y segmentos de red para el personal de la Mesa de Servicios.	SGT-SDSCJ-011-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-10-10
Correo	Capacitación del software de sistema de gestión Citronella	SGT-SDSCJ-012-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-10-10

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Solicitud de placas de almacén SDSCJ contrato 1932-2022.	SGT-SDSCJ-013-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-10-12
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-002-22 Plan de Migración de Entrada y Estabilización del Servicio.”.	SGT-SDSCJ-014-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-10-12
Correo	Solicitud de aprobación del Plan de Mantenimiento y Migración e inicio de actividades de empalme del contrato.	SGT-SDSCJ-015-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-10-12
Correo	Programación visitas de diagnóstico COSEC´s - C4 - CTP - Estadio - Estaciones de Policía - CAI´s.	SGT-SDSCJ-016-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-10-13
Correo	Proyección de visitas para la semana del 18 al 22 de octubre de 2022, dentro del plan de estabilización aprobado	SGT-SDSCJ-017-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-10-15
Correo	Notificación periodicidad de entrega de informes de seguimiento del sistema de videovigilancia de Bogotá D.C.	SGT-SDSCJ-018-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-10-18
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-006-22 Solicitud ingreso al C4 y Datacenter de Bomberos”.	SGT-SDSCJ-019-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4)	2022-10-18
Correo	Cámara Bosch IP5000i para cambio de cámara en los mantenimientos correctivos Contrato SCJ-1932-2022.	SGT-SDSCJ-020-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-10-18
Correo	Solicitud permisos de ingreso al Subsistema Integrado de Transmilenio.	SGT-SDSCJ-021-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Transmilenio S.A.	2022-10-19
Correo	Entrega de informe de seguimiento semanal No. 1	SGT-SDSCJ-022-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-10-20
Correo	Solicitud requerimientos para permisos de ingreso al Parque Metropolitano Simón Bolívar.	SGT-SDSCJ-023-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Parque Metropolitano Simón Bolivar	2022-10-20
Correo	Entrega de usuario en sistema de monitoreo y control (Citronella).	SGT-SDSCJ-024-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-10-20
Correo	Entrega del Plan de gestión Contrato No SCJ-1932-2022	SGT-SDSCJ-025-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-10-20
Correo	Radicación de Hojas de vida personal adicional para la mesa de servicios	SGT-SDSCJ-026-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-10-21
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones de CAI´s - Estaciones de Policía y COSEC.	SGT-SDSCJ-027-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-10-21
Correo	Solicitud de ingreso al Datacenter de C4 (Bomberos).	SGT-SDSCJ-028-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4)	2022-10-21

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del Estadio Nemesio Camacho El Campín.	SGT-SDSCJ-029-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	ESTADIO NEMESIO CAMACHO EL CAMPÍN	2022-10-21
Correo	CONTRATO SCJ- 1932 -2022 RADICADO 202261203098922	202261203098922	Secretaría de Movilidad	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2022-10-21
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del COSEC.	SGT-SDSCJ-030-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Policía Metropolitana de Bogotá - MEBOG	2022-10-25
Correo	Radicación de informe de diagnóstico infraestructura existente C4 y Datacenter del sistema de videovigilancia de Bogotá D.C.	SGT-SDSCJ-031-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-10-25
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-030-22 Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del COSEC”.	SGT-SDSCJ-032-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Policía Metropolitana de Bogotá - MEBOG	2022-10-26
Correo	Procedimiento Escalamiento de Fallas de Puntos de Cámara Sistema de Videovigilancia de Bogotá - SEGURITECH-ETB-SDSCJ.	SGT-SDSCJ-033-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-10-26
Correo	Solicitud de reunión para definición de temas y procedimiento de facturación	SGT-SDSCJ-034-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-10-26
Correo	Entrega de informe de seguimiento semanal No. 2	SGT-SDSCJ-035-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-10-28
Correo	Entrega de informe quincenal No. 1	SGT-SDSCJ-036-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-10-31
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones de CAI´s y Estaciones de Policía.	SGT-SDSCJ-037-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Policía Metropolitana de Bogotá - MEBOG	2022-10-31
Correo	Solicitud de suspensión de ANS.	SGT-SDSCJ-038-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-10-31
Correo	Coordinación de entrega de laboratorio - Contrato 1932 de 2022.	SGT-SDSCJ-039-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-10-31
Correo	Solicitud de correos del personal para permisos documentales	SGT-SDSCJ-040-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-11-01
Correo	Entrega de informe de seguimiento semanal No. 3	SGT-SDSCJ-041-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-11-02
Correo	Solicitud ingreso al C4 y Datacenter de Bomberos.	SGT-SDSCJ-042-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4)	2022-11-03
Correo	Respuesta al requerimiento “CONTRATO SCJ- 1932 -2022 RADICADO 202261203098922”.	SGT-SDSCJ-043-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Movilidad	2022-11-03
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones de CAI´s y Estaciones de Policía.	SGT-SDSCJ-044-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Policía Metropolitana de Bogotá - MEBOG	2022-11-03

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Cumplimiento del Anexo 3 - Especificaciones técnicas mesa de servicio.	SGT-SDSCJ-045-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-11-03
Correo	Cumplimiento Anexo 4. Laboratorio para el servicio técnico del sistema de videovigilancia.	SGT-SDSCJ-046-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-11-03
Correo	Requerimiento para el cumplimiento de la funcionalidad del software de mesa de servicio conforme al anexo 3.	20221600821822	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2022-11-03
Correo	Respuesta al oficio “20221600821822 Requerimiento para el cumplimiento de la funcionalidad del software de mesa de servicio conforme al anexo 3.”.	SGT-SDSCJ-047-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-11-04
Correo	Solicitud de autorización de ventanas de mantenimiento 1 y 2 para Datacenter - Sistema de videovigilancia de Bogotá D.C.	SGT-SDSCJ-048-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-11-06
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-020-22 Cámara Bosch IP5000i para cambio de cámara en los mantenimientos correctivos Contrato SCJ-1932-2022.”.	SGT-SDSCJ-049-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-11-08
Correo	Reiteración a los oficios “SGT-SDSCJ-009-22 Radicación Hojas de vida personal adicional para la mesa de servicios” y “SGT-SDSCJ-026-22 Radicación de Hojas de vida personal adicional para la mesa de servicios”.	SGT-SDSCJ-050-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-11-08
Correo	Entrega de informe de seguimiento semanal No. 4	SGT-SDSCJ-051-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-11-08
Correo	Solicitud de entrada a almacén de la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia de equipos instalados en el mes de octubre del 2022 dentro del marco de la ejecución del contrato 1932-2022.	SGT-SDSCJ-052-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-11-08
Correo	Entrega de informe de gestión mensual de octubre del 2022	SGT-SDSCJ-053-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-11-08
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones de Presidencia.	SGT-SDSCJ-054-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	2022-11-09
Correo	Solicitud ingreso al C4 y Datacenter de Bomberos.	SGT-SDSCJ-055-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-11-09
Correo	Entrega de informe quincenal No. 2.	SGT-SDSCJ-056-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-11-09
Correo	Respuesta a solicitud atención Requerimiento No. GS-2022-489510-MEBOG.	SGT-SDSCJ-057-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-11-10

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Solicitud de autorización de ventanas de mantenimiento 2 y 3 para Datacenter - Sistema de videovigilancia de Bogotá D.C	SGT-SDSCJ-058-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-11-11
Correo	Respuesta al oficio “Nro.GS-2021-360470-SUBCO-CAD-1.10 Solicitud arreglo cámaras sistema de video vigilancia”.	SGT-SDSCJ-059-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-11-11
Correo	Respuesta al oficio “Nro.GS-2022-460228-SUBCO-CAD-1.10 Solicitud arreglo cámaras sistema de video vigilancia”.	SGT-SDSCJ-060-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-11-11
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones de CAI´s y Estaciones de Policía.	SGT-SDSCJ-061-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - MEBOG	2022-11-11
Correo	Alcance al oficio “ SGT-SDSCJ-042-22 Solicitud ingreso al C4 y Datacenter de Bomberos”.	SGT-SDSCJ-062-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-11-15
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-043-22 Respuesta al requerimiento “CONTRATO SCJ-1932 -2022 RADICADO 202261203098922”.	SGT-SDSCJ-063-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Movilidad	2022-11-15
Correo	Entrega de informe de seguimiento semanal No. 5.	SGT-SDSCJ-064-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-11-15
Correo	Radicación de prefecturas y documentos de soporte para el mes de octubre 2022	SGT-SDSCJ-065-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-11-15
Correo	Respuesta Radicados No. SGT-SDSCJ-002-22 y SGT-SDSCJ-031-22	20221600831692	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2022-11-15
Correo	Programación de mantenimientos preventivos en salas de monitoreo	SGT-SDSCJ-066-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-11-16
Correo	Avance solicitud de aprobación del Plan de Manejo de Tránsito.	SGT-SDSCJ-067-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-11-16
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-065-22 Radicación de prefecturas y documentos de soporte para el mes de octubre 2022”.	SGT-SDSCJ-068-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-11-17
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones de CAI´s y Estaciones de Policía.	SGT-SDSCJ-069-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - MEBOG	2022-11-18
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del COSEC.	SGT-SDSCJ-070-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - MEBOG	2022-11-18
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del COSEC.	SGT-SDSCJ-071-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - MEBOG	2022-11-21
Correo	Solicitud autorización de salida de equipos de C4 al laboratorio de	SGT-SDSCJ-072-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia	2022-11-21

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
	Seguritech.			y Justicia	
Correo	Respuesta al correo electrónico “solicitud cargué anexos y evidencias ejecución contrato No. SCJ- 1932 - 2022 en el share point C4”.	SGT-SDSCJ-073-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-11-21
Correo	Solicitud entrega de equipos de aseguradora, características técnicas de equipos nuevos y plan de trabajo, para implementación CAIs vandalizados.	SGT-SDSCJ-074-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-11-21
Correo	Observaciones PMT contrato SCJ1932	202261203098922	Secretaría de Movilidad	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2022-11-21
Correo	Actualización de SecurOS a Versión 11, Datacenter C4	SGT-SDSCJ-075-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-11-22
Correo	Definición de tiempos y procedimientos para facturación	SGT-SDSCJ-076-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-11-22
Correo	Respuesta al requerimiento “2 OBSERVACIONES CONTRATO SCJ- 1932 -2022 RADICADO 202261203098922”.	SGT-SDSCJ-077-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Movilidad	2022-11-22
Correo	Solicitud de permiso para la instalación de un canal de internet en el edificio del C4	SGT-SDSCJ-078-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-11-22
Correo	Entrega de informe de seguimiento semanal No. 6.	SGT-SDSCJ-079-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-11-22
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-073-22 Respuesta al correo electrónico “solicitud cargué anexos y evidencias ejecución contrato No. SCJ- 1932 - 2022 en el share point C4”.”	SGT-SDSCJ-080-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-11-22
Correo	Solicitud de ingreso al Datacenter de C4 (Bomberos).	SGT-SDSCJ-081-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-11-23
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del Parque Metropolitano Simón Bolívar.	SGT-SDSCJ-082-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR	2022-11-23
Correo	Solicitud de placas de almacén SDSCJ contrato 1932-2022.	SGT-SDSCJ-083-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-11-23
Correo	Solicitud permisos de ingreso al Subsistema Integrado de Transmilenio.	SGT-SDSCJ-084-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Transmilenio S.A.	2022-11-23
Correo	Solicitud permisos de ingreso a los sistemas integrados de videovigilancia ubicados en instituciones educativas.	SGT-SDSCJ-085-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria de Educación	2022-11-23
Correo	Entrega de actas de seguimiento contractual.	SGT-SDSCJ-086-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-11-23
Correo	Solicitud presencia personal de mantenimiento sistema video	0410-2022	Parque Central Simón Bolivar	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2022-11-23

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
	vigilancia ciudadana				
Correo	Solicitud arreglo de cámara N 6517.	GS-2022-573968-MEBOG	Policía Nacional de Colombia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2022-11-23
Correo	Entrega de informe quincenal No. 3	SGT-SDSCJ-087-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-11-24
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del Estadio Nemesio Camacho El Campín.	SGT-SDSCJ-088-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	ESTADIO NEMESIO CAMACHO EL CAMPÍN	2022-11-24
Correo	Radicación de facturas del mes de octubre de 2022	SGT-SDSCJ-089-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-11-24
Correo	Respuesta al correo electrónico “Reunión revisión y aprobación software mesa de servicios contrato N°SCJ-1932-2022.”.	SGT-SDSCJ-090-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-11-25
Correo	Respuesta a solicitud de mantenimiento CCTV Estaciones de Policía y CAI's.	SGT-SDSCJ-091-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-11-25
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-089-22 Radicación de facturas del mes de octubre de 2022”.	SGT-SDSCJ-092-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-11-25
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-081-22 Solicitud de ingreso al Datacenter de C4 (Bomberos)”.	SGT-SDSCJ-093-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-11-25
Correo	Solicitud entrega software de mesa de servicio	20221600874952	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2022-11-25
Correo	Respuesta a la solicitud de aprobación del Plan de Manejo de Tránsito (Tipologías). Radicado SDM 202261203098922. (Comunicado SGT-SDSCJ-010-22)	202231210014571	Secretaría de Movilidad	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2022-11-25
Correo	Informe de laboratorio.	SGT-SDSCJ-094-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-11-28
Correo	Programación de mantenimientos a los sistemas integrados de videovigilancia.	SGT-SDSCJ-095-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) – EL REDENTOR	2022-11-28
Correo	Reiteración 2 al oficio “SGT-SDSCJ-050-22 Reiteración a los oficios “SGT-SDSCJ-009-22 Radicación Hojas de vida personal adicional para la mesa de servicios” y “SGT-SDSCJ-026-22 Radicación de Hojas de vida personal adicional para la mesa de servicios”.”.	SGT-SDSCJ-096-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-11-28
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-066-22 Programación de mantenimientos preventivos en salas de monitoreo.”	SGT-SDSCJ-097-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-11-28

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Programación de mantenimientos preventivos.	SGT-SDSCJ-098-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-11-28
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del Centro de Traslado por Protección.	SGT-SDSCJ-099-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Centro de Traslado por Protección	2022-11-28
Correo	Entrega del Plan de Comunicaciones V.01.	SGT-SDSCJ-100-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-11-28
Correo	Respuesta a las observaciones realizadas el día 24 de noviembre de 2022, en el Informe mensual del mes de octubre.	SGT-SDSCJ-101-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-11-28
Correo	Solicitud de aprobación de servicios de mantenimiento correctivo en Usaquén.	SGT-SDSCJ-102-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-11-29
Correo	Ajuste de ficha técnica de cámara fija 2MP y definición ficha técnica grabador de video y propuesta económica grabador.	SGT-SDSCJ-103-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-11-29
Correo	Entrega de informe de seguimiento semanal No. 7.	SGT-SDSCJ-104-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-11-29
Correo	Solicitud ingreso al C4 y Datacenter (Bomberos).	SGT-SDSCJ-105-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-11-29
Correo	Solicitud ingreso a las instalaciones del C4.	SGT-SDSCJ-106-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-11-29
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-071-22 Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del COSEC”.	SGT-SDSCJ-107-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - MEBOG	2022-11-29
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones de CAI´s y Estaciones de Policía.	SGT-SDSCJ-108-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - MEBOG	2022-11-30
Correo	Solicitud permisos de ingreso a los sistemas integrados de videovigilancia ubicados en instituciones educativas.	SGT-SDSCJ-109-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-11-30
Correo	Reporte de atención a sistemas CCTV de instituciones educativas de Suba y Puente Aranda - Atención prioritaria.	SGT-SDSCJ-110-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-12-01
Correo	Solicitud aprobación formato Consolidado de Obras de Infraestructura (COI).	SGT-SDSCJ-111-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-12-01
Correo	Solicitud de autorización de ventanas de mantenimiento 4 y 5 para Datacenter - Sistema de videovigilancia de Bogotá D.C.	SGT-SDSCJ-112-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-12-02
Correo	Actualización de personal para ingreso a las instalaciones del	SGT-SDSCJ-113-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	POLICÍA METROPOLITANA DE	2022-12-02

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
	COSEC.			BOGOTÁ - MEBOG	
Correo	Plan de trabajo, subsanación de observaciones a software Citronella.	SGT-SDSCJ-114-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-12-05
Correo	Reporte de equipos para facturación en noviembre.	SGT-SDSCJ-115-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-12-05
Correo	Entrega de informe de gestión mensual de noviembre del 2022	SGT-SDSCJ-116-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-12-05
Correo	Notificación del plan de acción ejecutado sobre ANS incumplido en noviembre de 2022.	SGT-SDSCJ-117-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-12-06
Correo	Definición ficha técnica y propuesta económica cámara fija domo de 2MP y grabador de video para CAIs.	SGT-SDSCJ-118-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-12-06
Correo	Solicitud de fichas técnicas de los equipos activos.	SGT-SDSCJ-119-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-12-06
Correo	Solicitud aprobación formato Consolidado de Obras de Infraestructura (COI).	SGT-SDSCJ-120-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-12-06
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-094-22 informe de laboratorio”.	SGT-SDSCJ-121-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-12-06
Correo	Entrega de informe de seguimiento semanal No. 8.	SGT-SDSCJ-122-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-12-07
Correo	Solicitud ingreso al C4 y Datacenter de Bomberos.	SGT-SDSCJ-123-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-12-07
Correo	Entrega de informe quincenal No. 4	SGT-SDSCJ-124-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-12-07
Correo	Reporte cámara vandalizada punto FVS-3209.	SGT-SDSCJ-125-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-12-09
Correo	Reporte cámara con filtración punto SCJ17E010077.	SGT-SDSCJ-126-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-12-09
Correo	Respuesta al oficio “Nro.GS-2022-573968-MEBOG Solicitud arreglo de cámara N 6517”.	SGT-SDSCJ-127-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-12-09
Correo	Solicitud permisos de ingreso a los sistemas integrados de videovigilancia ubicados en instituciones educativas.	SGT-SDSCJ-128-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-12-09
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones de MEBOG	SGT-SDSCJ-129-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - MEBOG	2022-12-09

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Cumplimiento Anexo 4 - Laboratorio para el servicio técnico del sistema de videovigilancia.	SGT-SDSCJ-130-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-12-09
Correo	Reiteración 1 al oficio “SGT-SDSCJ-086-22 Entrega de actas de seguimiento contractual.”.	SGT-SDSCJ-131-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-12-09
Correo	Consolidado novedades CAI - Comando de atención inmediata y estaciones de Policía.	SGT-SDSCJ-132-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-12-09
Correo	Entrega Formato Conciliación Financiera Noviembre	SGT-SDSCJ-133-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-12-09
Correo	Reiteración al oficio “SGT-SDSCJ-097-22 Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-066-22 Programación de mantenimientos preventivos en salas de monitoreo.”.”	SGT-SDSCJ-134-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-12-12
Correo	Solicitud de entrada a almacén de la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia de los equipos instalados en el mes de noviembre del 2022 dentro del marco de la ejecución del contrato 1932-2022	SGT-SDSCJ-135-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	2022-12-12
Correo	Reporte del laboratorio sobre los equipos ingresados de C4.	SGT-SDSCJ-136-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-12-13
Correo	Entrega de informe de seguimiento semanal No. 9.	SGT-SDSCJ-137-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-12-13
Correo	Reporte siniestro punto SCJ17E190077.	SGT-SDSCJ-138-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-12-13
Correo	Reporte siniestro punto SCJ17E050069.	SGT-SDSCJ-139-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-12-13
Correo	Respuesta Solicitud 20222100319202 ESTADIO EL CAMPIN	20226100270311	Instituto Distrital de Recreación y Deporte	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2022-12-13
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-135-22 Solicitud de entrada a almacén de la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia de los equipos instalados en el mes de noviembre del 2022 dentro del marco de la ejecución del contrato 1932-2022”.	SGT-SDSCJ-140-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-12-14
Correo	Solicitud permisos de ingreso al Subsistema Integrado de Transmilenio.	SGT-SDSCJ-141-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Transmilenio S.A.	2022-12-15
Correo	Solicitud ingreso al C4 y	SGT-SDSCJ-142-22	SEGURITECH COLOMBIA	CENTRO DE	2022-12-15

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
	Datacenter (Bomberos).		S.A.S	COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	
Correo	Solicitud de ingreso al Datacenter de C4 (Bomberos).	SGT-SDSCJ-143-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-12-15
Correo	Respuesta a las observaciones realizadas el día 09 de diciembre de 2022, en el Informe mensual del mes de octubre.	SGT-SDSCJ-144-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-12-15
Correo	Solicitud aprobación formato Consolidado de Obras de Infraestructura (COI).	SGT-SDSCJ-145-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-12-15
Correo	Comunicado entrega de herramienta tecnológica softwares citronella	20221600988372	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2022-12-15
Correo	Entrega del Plan de Comunicaciones V.02.	SGT-SDSCJ-146-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-12-16
Correo	Respuesta al radicado “20221600988372 COMUNICADO ENTREGA DE HERRAMIENTA TECNOLÓGICA SOFTWARES CITRONELLA”	SGT-SDSCJ-147-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-12-19
Correo	Solicitud ingreso al C4 y Datacenter de Bomberos.	SGT-SDSCJ-148-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-12-19
Correo	Solicitud ingreso de servidor a Datacenter UAECOB (Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá).	SGT-SDSCJ-149-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-12-19
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones de MEBOG.	SGT-SDSCJ-150-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - MEBOG	2022-12-20
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-088-22 Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del Estadio Nemesio Camacho El Campín”.	SGT-SDSCJ-151-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	ESTADIO NEMESIO CAMACHO EL CAMPÍN	2022-12-20
Correo	Radicación de Hoja de vida - personal para el Datacenter.	SGT-SDSCJ-152-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-12-20
Correo	Cotización partes para adición a bolsa de repuestos.	SGT-SDSCJ-153-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-12-20
Correo	Solicitud ingreso al C4 para instalación de Fibra Óptica.	SGT-SDSCJ-154-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-12-20
Correo	Entrega de informe de seguimiento semanal No. 10.	SGT-SDSCJ-155-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y	2022-12-20

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
				CÓMPUTO (C4)	
Correo	Respuesta a las observaciones realizadas el día 19 de diciembre de 2022, en el Informe mensual del mes de octubre.	SGT-SDSCJ-156-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-12-20
Correo	Respuesta a comunicación con radicado No.20225410757711	20221600996312	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2022-12-20
Correo	Alcance al oficio "SGT-SDSCJ-149-22 Solicitud ingreso de servidor a Datacenter UAECOB (Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá)."	SGT-SDSCJ-157-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-12-22
Correo	Alcance al oficio "SGT-SDSCJ-154-22 Solicitud ingreso al C4 para instalación de Fibra Óptica".	SGT-SDSCJ-158-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-12-22
Correo	Solicitud aprobación formato Consolidado de Obras de Infraestructura (COI).	SGT-SDSCJ-159-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-12-22
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones COSEC.	SGT-SDSCJ-160-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - MEBOG	2022-12-22
Correo	Solicitud de autorización de entrada de cámara PTZ a la Mesa de Servicios C4	SGT-SDSCJ-161-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-12-22
Correo	Solicitud ingreso a las instalaciones C4.	SGT-SDSCJ-162-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-12-22
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del Estadio Nemesio Camacho El Campín.	SGT-SDSCJ-163-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	ESTADIO NEMESIO CAMACHO EL CAMPÍN	2022-12-22
Correo	Solicitud permisos de ingreso al Subsistema Integrado de Transmilenio.	SGT-SDSCJ-164-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	TRANSMILENIO S.A.	2022-12-22
Correo	Entrega de informe quincenal No. 5	SGT-SDSCJ-165-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-12-23
Correo	Solicitud de ingreso al Datacenter de C4 (Bomberos).	SGT-SDSCJ-166-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-12-23
Correo	Solicitud de placas de almacén SDSCJ contrato 1932-2022.	SGT-SDSCJ-167-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-12-23
Correo	Respuesta a las observaciones realizadas al informe mensual del mes de noviembre.	SGT-SDSCJ-168-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-12-23
Correo	Alcance al oficio "SGT-SDSCJ-166-22 Solicitud de ingreso al Datacenter de C4 (Bomberos".	SGT-SDSCJ-169-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-12-26

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Equipos y dispositivos requeridos para los centros de monitoreo.	SGT-SDSCJ-170-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-12-26
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del Parque Metropolitano Simón Bolívar.	SGT-SDSCJ-171-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR	2022-12-26
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del Centro de Traslado por Protección.	SGT-SDSCJ-172-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN	2022-12-26
Correo	Radicación de Factura de servicios noviembre de 2022.	SGT-SDSCJ-173-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-12-26
Correo	Cotización partes para adición a bolsa de repuestos.	SGT-SDSCJ-174-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-12-27
Correo	Respuesta al requerimiento “OBSERVACIONES SEGURITECH COLOMBIA S.A.S”.	SGT-SDSCJ-175-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD (SDM)	2022-12-27
Correo	Solicitud autorización de entrada de equipos al C4.	SGT-SDSCJ-176-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-12-27
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-136-22 Reporte del laboratorio sobre los equipos ingresados de C4.”.	SGT-SDSCJ-177-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-12-27
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones de CAI´s y Estaciones de Policía.	SGT-SDSCJ-178-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - MEBOG	2022-12-28
Correo	Entrega de informe de seguimiento semanal No. 11.	SGT-SDSCJ-179-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-12-29
Correo	Reporte del laboratorio de equipos en estado irreparables.	SGT-SDSCJ-180-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-12-29
Correo	Reporte vandalismo Estación Ricaurte Calle 13 - Transmilenio.	SGT-SDSCJ-181-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-12-29
Correo	Reporte vandalismo Estación Ricaurte NQS - Transmilenio.	SGT-SDSCJ-182-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-12-29
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-001-22 Radicación Hojas de vida personal mínimo requerido contrato 1932-2022”, y Reiteración de oficio SGT-SDSCJ-152-22 “Radicación de Hoja de vida - personal para el Datacenter”.	SGT-SDSCJ-183-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-12-29
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones de la Estación de	SGT-SDSCJ-184-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	POLICÍA METROPOLITANA DE	2022-12-29

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
	Polícia Terminal-Salitre.			BOGOTÁ - MEBOG	
Correo	Reporte de cámaras vandalizadas en Centros de Atención Inmediata (CAI).	SGT-SDSCJ-185-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-12-29
Correo	Reporte vandalismo Estación Héroes - Transmilenio.	SGT-SDSCJ-186-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-12-30
Correo	Reporte vandalismo Estación Américas - Transmilenio.	SGT-SDSCJ-187-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-12-30
Correo	Entrega de Ficha Técnica Cámara Hanwha XNP-6321H.	SGT-SDSCJ-188-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-12-30
Correo	Cambio de baterías punto de videovigilancia ESU-209.	SGT-SDSCJ-189-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-12-30
Correo	Presentación de avances del software Citronella - Cumplimiento Anexo 3 “Especificaciones técnicas mesa de servicio para el seguimiento y control del sistema de video vigilancia”.	SGT-SDSCJ-190-22	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2022-12-30
Correo	Solicitud de ingreso al Datacenter de C4 (Bomberos).	SGT-SDSCJ-191-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-01-02
Correo	Notificación del cambio de coordinador Mesa de servicios.	SGT-SDSCJ-192-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-01-02
Correo	Fwd: SGT-SDSCJ-192-23 Notificación cambio de coordinador Mesa de servicios.	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-01-03
Correo	Programación de mantenimientos a los sistemas integrados de videovigilancia.	SGT-SDSCJ-193-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) – EL REDENTOR	2023-01-04
Correo	Respuesta al requerimiento “CONTRATO IDUSCJ- 1932 -2022 RADICADO 202261204049052”.	SGT-SDSCJ-194-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD (SDM)	2023-01-04
Correo	RADICADO 202261204049052 CONTRATO IDUSCJ- 1932 -2022	202261204049052	Secretaría de Movilidad	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-01-04
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-162-22 Solicitud ingreso a las instalaciones C4”	SGT-SDSCJ-195-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-01-05
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones de Presidencia.	SGT-SDSCJ-196-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	2023-01-05
Correo	Solicitud aprobación formato Consolidado de Obras de Infraestructura (COI).	SGT-SDSCJ-197-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-01-05

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Solicitud de pago de facturas No. FES 23 y FES 24 de Octubre de 2022 y envío de certificación de cumplimiento para aceptación y pago de facturas No. FES 28 y FES 29 de Noviembre de 2022.	SGT-SDSCJ-198-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-01-06
Correo	Entrega del Software de mesa de servicios contrato N°SCJ-1932-2022 con parametrización solicitada y solicitud de aprobación.	SGT-SDSCJ-199-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-01-06
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-194-23 Respuesta al requerimiento “CONTRATO IDUSCJ- 1932 -2022 RADICADO 202261204049052”.”.	SGT-SDSCJ-200-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD (SDM)	2023-01-06
Correo	Entrega Formato Conciliación Técnica Diciembre de 2022.	SGT-SDSCJ-201-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-01-06
Correo	Entrega de informe de seguimiento semanal No. 12.	SGT-SDSCJ-202-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-01-06
Correo	Entrega de informe de gestión mensual de diciembre del 2022.	SGT-SDSCJ-203-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-01-08
Correo	Radicación Hoja de vida personal adicional para la mesa de servicios	SGT-SDSCJ-204-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-01-10
Correo	Solicitud ingreso a las instalaciones C4.	SGT-SDSCJ-205-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-01-10
Correo	Solicitud ampliación de alcance, nuevos típicos. Radicado SDM-202261204049052 (Comunicado SGT-SDSCJ-175-010-22).	202331200097741	Secretaria de Movilidad	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-01-10
Correo	Entrega Formato Conciliación Financiera Diciembre 2022.	SGT-SDSCJ-206-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-01-11
Correo	Radicación informes mantenimiento preventivo Salas de Monitoreo.	SGT-SDSCJ-207-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-01-11
Correo	Solicitud aprobación formato Consolidado de Obras de Infraestructura (COI).	SGT-SDSCJ-208-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-01-12
Correo	Solicitud de entrada a almacén de la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia de los equipos instalados en el mes de diciembre del 2022 dentro del marco de la ejecución del contrato	SGT-SDSCJ-209-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-01-12

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
	1932-2022.				
Correo	Solicitud aprobación PMT´s.	SGT-SDSCJ-210-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD (SDM)	2023-01-12
Correo	Respuesta al correo electrónico del 13 de enero de 2023 en respuesta al oficio SGT-SDSCJ-173-22 Radicación de Factura de servicios noviembre de 2022.”	SGT-SDSCJ-211-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-01-13
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-201-23 Entrega Formato Conciliación Técnica Diciembre de 2022.”	SGT-SDSCJ-212-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-01-16
Correo	Respuesta a las observaciones realizadas el día 14 de enero de 2023 - Notificación cambio de coordinador Mesa de servicios.	SGT-SDSCJ-213-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-01-16
Correo	Entrega de informe de seguimiento semanal No. 13.	SGT-SDSCJ-214-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-01-16
Correo	Solicitud ingreso a las instalaciones C4.	SGT-SDSCJ-215-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-01-16
Correo	Entrega de informe quincenal No. 6	SGT-SDSCJ-216-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-01-17
Correo	Entrega de informe quincenal No. 7	SGT-SDSCJ-217-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-01-17
Correo	Solicitud de ingreso al Datacenter de C4 (Bomberos).	SGT-SDSCJ-218-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-01-17
Correo	Solicitud de autorización de ventana de mantenimiento No. 6 para Datacenter - Sistema de videovigilancia de Bogotá D.C.	SGT-SDSCJ-219-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-01-17
Correo	Creación Usuario Software Citronella	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-01-17
Correo	Respuesta a las observaciones del correo electrónico realizadas el 6 de enero de 2023 “(SGT-SDSCJ-180 Reporte del laboratorio de equipos en estado irreparables.).”	SGT-SDSCJ-220-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-01-18
Correo	Respuesta al correo electrónico del 16 de enero de 2023 - Actualización Informe Semanal N° 13.	SGT-SDSCJ-221-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-01-18
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones de CAI´s y Estaciones de Policía.	SGT-SDSCJ-222-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - MEBOG	2023-01-18

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Solicitud aprobación formato Consolidado de Obras de Infraestructura (COI).	SGT-SDSCJ-223-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-01-18
Correo	Reiteración No. 1 a los oficios “SGT-SDSCJ-076-22, SGT-SDSCJ-153-22, SGT-SDSCJ-170-22, SGT-SDSCJ-174-22 y SGT-SDSCJ-189-222.	SGT-SDSCJ-224-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-01-20
Correo	Reiteración No. 1 al oficio “SGT-SDSCJ-199-23 Entrega del Software de mesa de servicios contrato N°SCJ-1932-2022 con parametrización solicitada y solicitud de aprobación”.	SGT-SDSCJ-225-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-01-20
Correo	Solicitud COI - Contrato SCJ-1932-2022 Mantenimiento del Sistema de Videovigilancia de Bogotá	No aplica	Secretaría de Movilidad	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-01-20
Correo	Solicitud COI - Contrato SCJ-1932-2022 Mantenimiento del Sistema de Videovigilancia de Bogotá Frentes no Autorizados	No aplica	Secretaría de Movilidad	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-01-20
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-160-22 Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones COSEC”.	SGT-SDSCJ-226-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - MEBOG	2023-01-23
Correo	Programación mantenimiento correctivo al sistema de video vigilancia MTO-PTZ de Bogotá D.C.	SGT-SDSCJ-227-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-01-23
Correo	Entrega de informe de seguimiento semanal No. 14.	SGT-SDSCJ-228-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-01-23
Correo	Reiteración No. 1 a los oficios “SGT-SDSCJ-010-22, SGT-SDSCJ-025-22, SGT-SDSCJ-100-22 y SGT-SDSCJ-146-22”.	SGT-SDSCJ-229-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-01-23
Correo	Reiteración No. 1 a los oficios “SGT-SDSCJ-103-22, SGT-SDSCJ-118-22, SGT-SDSCJ-125-22, SGT-SDSCJ-126-22, SGT-SDSCJ-132-22, SGT-SDSCJ-138-22, SGT-SDSCJ-139-22, SGT-SDSCJ-181-22, SGT-SDSCJ-182-22, SGT-SDSCJ-186-22 y SGT-SDSCJ-187-22”.	SGT-SDSCJ-230-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-01-23
Correo	Reiteración No. 1 a los oficios “SGT-SDSCJ-033-22 y SGT-SDSCJ-075-22”.	SGT-SDSCJ-231-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-01-23
Correo	Respuesta a las observaciones del correo electrónico realizadas el 20 de enero de 2023	SGT-SDSCJ-232-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y	2023-01-24

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
	"(SGT-SDSCJ-220 Reporte del laboratorio de equipos en estado irreparables.)."			CÓMPUTO (C4)	
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones de Presidencia.	SGT-SDSCJ-233-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	2023-01-24
Correo	Alcance a los oficios "SGT-SDSCJ-153-22" y "SGT-SDSCJ-174-22 Cotización partes para adición a bolsa de repuestos.".	SGT-SDSCJ-234-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-01-24
Correo	Respuesta al correo electrónico del 18 de enero de 2023 con asunto: "Disposición de bienes del SVV recibidos en calidad de reposición".	SGT-SDSCJ-235-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-01-25
Correo	Segunda capacitación del software de sistema de gestión Citronella.	SGT-SDSCJ-236-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-01-25
Correo	Solicitud aprobación formato Consolidado de Obras de Infraestructura (COI).	SGT-SDSCJ-237-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-01-25
Correo	informe de novedad sistema de circuito cerrado de televisión SIPOL-MEBOG	SIPOL-GROPI - 29.57	MEBOG	Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo- C4	2023-01-26
Correo	Solicitud de ingreso al Datacenter de C4 (Bomberos).	SGT-SDSCJ-238-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-01-27
Correo	Informe actualizado de topología sistema de videovigilancia estadio El Campín.	SGT-SDSCJ-239-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-01-27
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones de CAI´s y Estaciones de Policía.	SGT-SDSCJ-240-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - MEBOG	2023-01-27
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones de Comandos Operativos de Seguridad Ciudadana (COSEC).	SGT-SDSCJ-241-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - MEBOG	2023-01-27
Correo	Informe actualizado del estado funcional de CTP.	SGT-SDSCJ-242-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-01-27
Correo	Solicitud permisos de ingreso al Subsistema Integrado de Transmilenio.	SGT-SDSCJ-243-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	TRANSMILENIO S.A.	2023-01-27
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del Parque Metropolitano Simón Bolívar.	SGT-SDSCJ-244-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR	2023-01-27
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del Estadio Nemesio Camacho El Campín.	SGT-SDSCJ-245-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	ESTADIO NEMESIO CAMACHO EL CAMPÍN	2023-01-27
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del Centro de Traslado por Protección.	SGT-SDSCJ-246-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN	2023-01-27

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Cotización de disco duro de estado sólido de 1TB para adición a la bolsa de repuestos.	SGT-SDSCJ-247-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-01-27
Correo	Programación mantenimiento correctivo al sistema de video vigilancia MTO-PTZ de Bogotá D.C.	SGT-SDSCJ-248-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-01-30
Correo	Entrega de informe de seguimiento semanal No. 15.	SGT-SDSCJ-249-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-01-30
Correo	Entrega de actas de seguimiento contractual mes de Enero de 2023.	SGT-SDSCJ-250-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-01-30
Correo	Atributos pendientes por definir para las hojas de vida de los puntos de videovigilancia.	SGT-SDSCJ-251-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-01-30
Correo	Programación de mantenimientos a los sistemas integrados de videovigilancia.	SGT-SDSCJ-252-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) – EL REDENTOR	2023-01-31
Correo	Entrega de informe quincenal No. 8	SGT-SDSCJ-253-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-01-31
Correo	Radicación de Factura de servicios Diciembre de 2022.	SGT-SDSCJ-254-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-01-31
Correo	Formatos y/o acuerdo de confidencialidad o no divulgación de la información	SGT-SDSCJ-255-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-01
Correo	Solicitud de placas de almacén SDSCJ contrato 1932-2022.	SGT-SDSCJ-256-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-01
Correo	Verificación estado cámara código MEBOG C1E02-1113	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-02-01
Correo	Documentos reporte incidentes sistema de videovigilancia secretaria distrital de seguridad convivencia y justicia	GT-500459-2023	Corredores de Seguros	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-02-01
Correo	Reiteración 1 al oficio “SGT-SDSCJ-247-23 Cotización de disco duro de estado sólido de 1TB para adición a la bolsa de repuestos.”	SGT-SDSCJ-257-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-02
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones de CAI´s priorizados para restaurar el CCTV.	SGT-SDSCJ-258-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - MEBOG	2023-02-03
Correo	Retiro de 128 equipos - AERS BIENES REPOSICION C4	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-02-03

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones de Presidencia.	SGT-SDSCJ-259-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	2023-02-04
Correo	Respuesta a observaciones del plan de gestión del contrato de referencia.	SGT-SDSCJ-260-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-06
Correo	Programación mantenimiento correctivo al sistema de video vigilancia MTO-PTZ de Bogotá D.C.	SGT-SDSCJ-261-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-06
Correo	Cotización de refracciones para reparación cámaras Bosch, segundo grupo	SGT-SDSCJ-262-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-06
Correo	Solicitud de autorización para la instalación de UPS gestionable para CAI Gaitana.	SGT-SDSCJ-263-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-06
Correo	Entrega de informe de seguimiento semanal No. 16.	SGT-SDSCJ-264-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-06
Correo	Solicitud de autorización de ventana de mantenimiento No. 7 para Datacenter - Sistema de videovigilancia de Bogotá D.C.	SGT-SDSCJ-265-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-06
Correo	Respuesta cambio de baterías ESU-209	20231600111892	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-02-06
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-174-22 Cotización partes para adición a bolsa de repuestos”.	SGT-SDSCJ-266-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-07
Correo	Respuesta a las observaciones realizadas al informe mensual del mes de diciembre.	SGT-SDSCJ-267-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-07
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-240-23 Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones de CAI´s y Estaciones de Policía”.	SGT-SDSCJ-268-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - MEBOG	2023-02-07
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-241-23 Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones de Comandos Operativos de Seguridad Ciudadana (COSEC)”.	SGT-SDSCJ-269-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - MEBOG	2023-02-07
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-244-23 Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del Parque Metropolitano Simón Bolívar”.	SGT-SDSCJ-270-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR	2023-02-07
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-243-23 Solicitud permisos de ingreso al Subsistema Integrado de Transmilenio”.	SGT-SDSCJ-271-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	TRANSMILENIO S.A.	2023-02-07

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-246-23 Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del Centro de Traslado por Protección”.	SGT-SDSCJ-272-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN	2023-02-07
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-245-23 Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del Estadio Nemesio Camacho El Campín”.	SGT-SDSCJ-273-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	ESTADIO NEMESIO CAMACHO EL CAMPÍN	2023-02-07
Correo	Entrega de informe de mensual de SST	SGT-SDSCJ-274-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-07
Correo	Entrega de informe de gestión mensual de enero de 2023.	SGT-SDSCJ-275-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-07
Correo	Respuesta al correo electrónico del 31 de enero de 2023 con asunto “Disposición de bienes del SVV recibidos en calidad de reposición”.	SGT-SDSCJ-276-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-08
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-275-23 Entrega de informe de gestión mensual de enero de 2023.”	SGT-SDSCJ-277-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-08
Correo	Respuesta al requerimiento “Fwd:SGT-SDSCJ-261-23 Programación mantenimiento correctivo al sistema de video vigilancia MTO-PTZ de Bogotá D.C.”.	SGT-SDSCJ-278-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-08
Correo	Solicitud de información para gestión de permisos documentales.	SGT-SDSCJ-279-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-08
Correo	Solicitud aprobación unidad lectora biométrico COSEC-CIUDAD BOLÍVAR - bolsa de repuestos.	SGT-SDSCJ-280-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-08
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-265-23 Solicitud de autorización de ventana de mantenimiento No. 7 para Datacenter - Sistema de videovigilancia de Bogotá D.C.”.	SGT-SDSCJ-281-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-10
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-210-23 Solicitud aprobación PMT´s”.	SGT-SDSCJ-282-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD (SDM)	2023-02-10
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-276-23 Respuesta al correo electrónico del 31 de enero de 2023 con asunto “Disposición de bienes del SVV recibidos en calidad de reposición”.”.	SGT-SDSCJ-283-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-10
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-258-23 Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones de CAI´s priorizados	SGT-SDSCJ-284-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - MEBOG	2023-02-13

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
	para restaurar el CCTV".				
Correo	Observación sobre la obligación específica # 15 del informe mensual de diciembre de 2022.	SGT-SDSCJ-285-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-13
Correo	Observación sobre la obligación específica # 15 del informe mensual de enero de 2023.	SGT-SDSCJ-286-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-13
Correo	Notificación capacitación sistema de video vigilancia en las instalaciones de Estaciones de Policía.	SGT-SDSCJ-287-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - MEBOG	2023-02-13
Correo	Informe diagnóstico de las actividades realizadas en el Centro de Traslado por Protección (CTP).	SGT-SDSCJ-288-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-13
Correo	Programación mantenimiento correctivo al sistema de video vigilancia MTO-PTZ de Bogotá D.C.	SGT-SDSCJ-289-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-13
Correo	Entrega de informe de seguimiento semanal No. 17.	SGT-SDSCJ-290-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-13
Correo	RE: SGT-SDSCJ-289-23 Programacion mantenimiento correctivo al sistema de video vigilancia MTO-PTZ de Bogotá D.C.	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-02-13
Correo	SGT-SDSCJ-290-23 Entrega de informe de seguimiento semanal No. 17.	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-02-13
Correo	Plan de mantenimiento datacenter	SGT-SDSCJ-291-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-14
Correo	Notificación del plan de acción ejecutado sobre ANS incumplido en Enero 2023	SGT-SDSCJ-292-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-14
Correo	Reporte instalación cable HDMI COSEC-CHAPINERO.	SGT-SDSCJ-293-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-14
Correo	Alcance al oficio"SGT-SDSCJ-292-23 Notificación del plan de acción ejecutado sobre ANS incumplido en Enero 2023".	SGT-SDSCJ-294-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-14
Correo	Entrega Formato Conciliación Financiera Enero 2023.	SGT-SDSCJ-295-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-14
Correo	Visitas de diagnóstico CAI vandalizados.	SGT-SDSCJ-296-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-14

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	RE: SGT-SDSCJ-292-23 Notificacion del plan de accion ejecutado sobre ANS incumplido en Enero 2023	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-02-14
Correo	RE: SGT-SDSCJ-293-23 Reporte instalacion cable HDMI COSEC-CHAPINERO.	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-02-14
Correo	Autorización del listado priorizado para limpieza de acrílico de puntos de videovigilancia.	SGT-SDSCJ-297-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-15
Correo	Autorización del listado priorizado para mantenimiento preventivo de puntos de videovigilancia.	SGT-SDSCJ-298-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-15
Correo	Notificación del cambio de Gestora de Permisos.	SGT-SDSCJ-299-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-15
Correo	Solicitud aprobación formato Consolidado de Obras de Infraestructura (COI).	SGT-SDSCJ-300-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-15
Correo	Respuesta al correo electrónico del 15 de febrero de 2023 con asunto “SGT-SDSCJ-290-23 Entrega de informe de seguimiento semanal No. 17.”.	SGT-SDSCJ-301-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-15
Correo	Solicitud de entrada a almacén de la SDSCJ de los equipos instalados en el mes de enero de 2023 dentro del marco de la ejecución del contrato 1932-2022”.	SGT-SDSCJ-302-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-15
Correo	Entrega de informe quincenal No. 9	SGT-SDSCJ-303-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-16
Correo	Solicitud aprobación uso bolsa de repuestos (inversor) punto ESU-223.	SGT-SDSCJ-304-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-16
Correo	Solicitud aprobación uso bolsa de repuestos para CAI Vandalizados.	SGT-SDSCJ-305-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-16
Correo	Solicitud aprobación equipos y dispositivos requeridos para los centros de monitoreo	SGT-SDSCJ-306-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-16
Correo	Solicitud aprobación equipos y dispositivos requeridos para el Centro de Traslado por Protección (CTP).	SGT-SDSCJ-307-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-17
Correo	Notificación capacitación sistema de video vigilancia en las instalaciones de Estaciones de Policía.	SGT-SDSCJ-308-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - MEBOG	2023-02-17

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones de CAI´s priorizados para restaurar el CCTV.	SGT-SDSCJ-309-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - MEBOG	2023-02-17
Correo	Respuesta a las observaciones del Plan de Gestión recibidas mediante acta de reunión del 18 de enero de 2023.	SGT-SDSCJ-310-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-17
Correo	Entrega de informe de seguimiento semanal No. 18.	SGT-SDSCJ-311-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-20
Correo	Programación mantenimiento correctivo al sistema de video vigilancia MTO-PTZ de Bogotá D.C.	SGT-SDSCJ-312-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-20
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-310-23 Respuesta a las observaciones del Plan de Gestión recibidas mediante acta de reunión del 18 de enero de 2023.”.	SGT-SDSCJ-313-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-21
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-308-23 Notificación capacitación sistema de video vigilancia en las instalaciones de Estaciones de Policía.”.	SGT-SDSCJ-314-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - MEBOG	2023-02-21
Correo	Segundo reporte del laboratorio de equipos en estado irreparables.	SGT-SDSCJ-315-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-22
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-302-23 solicitud de entrada a almacén de la SDSCJ de los equipos instalados en el mes de enero de 2023 dentro del marco de la ejecución del contrato 1932-2022”.	SGT-SDSCJ-316-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-22
Correo	Solicitud aprobación formato Consolidado de Obras de Infraestructura (COI).	SGT-SDSCJ-317-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-22
Correo	Citación audiencia para establecer un posible incumplimiento en el Contrato Nro. SCJ-1932-2022, suscrito entre SEGURITECH COLOMBIA SAS, representada legalmente por: RUBEN GUILLERMO GARDUÑO FUENTES y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ).	20234200164082	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-02-22
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del Centro de Traslado por Protección.	SGT-SDSCJ-318-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN	2023-02-23
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del Estadio Nemesio Camacho El Campín.	SGT-SDSCJ-319-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	ESTADIO NEMESIO CAMACHO EL CAMPÍN	2023-02-23
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del Parque	SGT-SDSCJ-320-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	PARQUE METROPOLITANO	2023-02-23

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
	Metropolitano Simón Bolívar.			SIMÓN BOLÍVAR	
Correo	Solicitud de ingreso al Data Center de C4 (Bomberos).	SGT-SDSCJ-321-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-23
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones de CAI´s priorizados para restaurar el CCTV.	SGT-SDSCJ-322-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - MEBOG	2023-02-23
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones de CAI´s y Estaciones de Policía.	SGT-SDSCJ-323-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - MEBOG	2023-02-23
Correo	Solicitud permisos de ingreso al Subsistema Integrado de Transmilenio.	SGT-SDSCJ-324-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	TRANSMILENIO S.A.	2023-02-23
Correo	Solicitud de permisos de ingreso a las instalaciones de Comandos Operativos de Seguridad Ciudadana (COSEC).	SGT-SDSCJ-325-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - MEBOG	2023-02-23
Correo	Notificación presunto incumplimiento contrato No. SCJ-1932-2022	NB-100225270	Corredores de Seguros	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-02-23
Correo	Reiteración 1 al oficio “SGT-SDSCJ-280-23 Solicitud aprobación unidad lectora biométrico COSEC-CIUDAD BOLÍVAR - bolsa de repuestos.”	SGT-SDSCJ-326-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-24
Correo	Alcance al oficio "SGT-SDSCJ-307-23 Solicitud aprobación equipos y dispositivos requeridos para el Centro de Traslado por Protección (CTP)".	SGT-SDSCJ-327-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-24
Correo	Reiteración 1 al oficio “SGT-SDSCJ-263-23 Solicitud de autorización para la instalación de UPS gestionable para CAI Gaitana.”	SGT-SDSCJ-328-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-24
Correo	Reiteración 2 al oficio “SGT-SDSCJ-257-23 Reiteración 1 al oficio “SGT-SDSCJ-247-23 Cotización de disco duro de estado sólido de 1TB para adición a la bolsa de repuestos.”.”	SGT-SDSCJ-329-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-24
Correo	Solicitud aprobación PMT´s.	SGT-SDSCJ-330-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD (SDM)	2023-02-24
Correo	Reiteración 1 al oficio “ SDSCJ-250-23 Entrega de actas de seguimiento contractual mes de Enero de 2023.”.	SGT-SDSCJ-331-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-24
Correo	Alcance en relación al acta de reunión del 30 de enero del 2023 “Continuación proceso de verificación y aprobación del anexo No 3 del contrato 1932-2022”.	SGT-SDSCJ-332-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-24
Correo	Entrega de actas de seguimiento contractual del mes de febrero de 2023.	SGT-SDSCJ-333-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-24

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Informe de seguimiento semanal No. 19.	SGT-SDSCJ-334-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-27
Correo	Notificación capacitación sistema de video vigilancia en las instalaciones de Estaciones de Policía.”.	SGT-SDSCJ-335-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - MEBOG	2023-02-27
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-321-23 Solicitud de ingreso al Data Center de C4 (Bomberos).”	SGT-SDSCJ-336-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-27
Correo	DERECHO DE PETICIÓN.	SGT-SDSCJ-337-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-27
Correo	Solicitud ingreso a las instalaciones C4.	SGT-SDSCJ-338-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-28
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-337-23 DERECHO DE PETICIÓN”.	SGT-SDSCJ-339-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-28
Correo	Programación mantenimiento correctivo al sistema de video vigilancia MTO-PTZ de Bogotá D.C.	SGT-SDSCJ-340-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-28
Correo	Reporte de cámaras AXIS fijas presentes en el sistema de video vigilancia MTO-PTZ de Bogotá D.C.	SGT-SDSCJ-341-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-02-28
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones de Presidencia.	SGT-SDSCJ-342-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	2023-03-01
Correo	Solicitud aprobación formato Consolidado de Obras de Infraestructura (COI).	SGT-SDSCJ-343-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-01
Correo	Entrega de informe quincenal No. 10	SGT-SDSCJ-344-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-01
Correo	Respuesta al correo electrónico recibido el día 28 de febrero de 2023 - solicitud diligenciamiento Formato F-AJ-232 de acuerdo al oficio “SGT-SDSCJ-318-23 Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del Centro de Traslado por Protección.”.	SGT-SDSCJ-345-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN	2023-03-02
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-255-23 Formatos y/o acuerdo de confidencialidad o no divulgación de la información”.	SGT-SDSCJ-346-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-03
Correo	Solicitud permisos de ingreso a los sistemas integrados de videovigilancia ubicados en instituciones educativas.	SGT-SDSCJ-347-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-03

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Respuesta a las observaciones recibidas por correo electrónico el día 27 de febrero de 2023 al informe mensual del mes de enero.	SGT-SDSCJ-348-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-03
Correo	Respuesta a la observación del correo electrónico del 01 de marzo de 2023 “SGT-SDSCJ-315-23 Segundo reporte del laboratorio de equipos en estado irreparables”.	SGT-SDSCJ-349-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-06
Correo	Solicitud de delimitación de reuniones de seguimiento del contrato No. SCJ-1932 de 2022.	SGT-SDSCJ-350-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-06
Correo	Radicación de Hoja de vida personal para la mesa de servicios	SGT-SDSCJ-351-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-06
Correo	Informe de seguimiento semanal No. 20.	SGT-SDSCJ-352-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-06
Correo	Solicitud de ingreso a las instalaciones del C4.	SGT-SDSCJ-353-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-06
Correo	Consolidado de solicitudes pendientes de respuesta por parte de la supervisión del contrato No. SCJ-1932 de 2022.	SGT-SDSCJ-354-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-06
Correo	Solicitud de ampliación de alcance, nuevos típicos. Radicado SDM - 202361200116282 (Comunicado SGT-SDSCJ-175-210-23), SDM - 20236121200775312 (Comunicado SGT-SDSCJ-330-23) Y SDM - 202361200572962 (Comunicado SGT-SDSCJ-282-23).	202331203210071	Secretaria de Movilidad	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-03-06
Correo	Radicación de Factura de servicios Enero 2023.	SGT-SDSCJ-355-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-07
Correo	Solicitud aprobación uso bolsa de repuestos para punto de video vigilancia con sistema fotovoltaico ESU-218.	SGT-SDSCJ-356-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-07
Correo	Solicitud aprobación uso bolsa de repuestos para segundo grupo de CAI Vandalizados.	SGT-SDSCJ-357-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-07
Correo	Entrega de informe de gestión mensual de febrero de 2023.	SGT-SDSCJ-358-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-07
Correo	Solicitud aprobación formato Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)	SGT-SDSCJ-359-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-08

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	RESPUESTA RADICADO N° 20235410092471 y 20235410111031- CONTRATO N° SCJ-19332-2022	20233100182462	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-03-08
Correo	Cámaras PTZ Hanwha y Bosch para cambio de repuestos y reparacion en centro de servicios	SGT-SDSCJ-360-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-09
Correo	Reiteración No. 1 a las solicitudes de gestión y aprobación de los formatos COI presentadas con los oficios “SGT-SDSCJ-120-22”; “SGT-SDSCJ-145-22”; “SGT-SDSCJ-197-23”; “SGT-SDSCJ-223-23”; “SGT-SDSCJ-237-23”; “SGT-SDSCJ-317-23”; “SGT-SDSCJ-300-23”; “SGT-SDSCJ-343-23” y “SGT-SDSCJ-359-23.”.	SGT-SDSCJ-361-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-09
Correo	Respuesta SGT-SDSCJ-316-23 Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-302-23 solicitud de entrada a almacén de la SDSCJ de los equipos instalados en el mes de enero de 2023 dentro del marco de la ejecución del contrato 1932-2022”	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-03-10
Correo	Informe de seguimiento semanal No. 21.	SGT-SDSCJ-362-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-13
Correo	Respuesta a la observación del correo electrónico del 22 de febrero de 2023 “SGT-SDSCJ-314-23 Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-308-23 Notificación capacitación sistema de video vigilancia en las instalaciones de Estaciones de Policía”.	SGT-SDSCJ-363-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-13
Correo	Solicitud aprobación formatos COI - Contrato de Mantenimiento SVV	No aplica	Secretaría de Movilidad	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-03-13
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones de Presidencia.	SGT-SDSCJ-364-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	2023-03-14
Correo	Solicitud de permisos para mantenimiento del sistemas integrados de videovigilancia al anillo vial de la Presidencia.	SGT-SDSCJ-365-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	2023-03-14
Correo	Confirmación instalación UPS Vertiv 1kva.	SGT-SDSCJ-366-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-14
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-364-23 Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones de Presidencia.”	SGT-SDSCJ-367-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	2023-03-14

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-365-23 Solicitud de permisos para mantenimiento del sistemas integrados de videovigilancia al anillo vial de la Presidencia”	SGT-SDSCJ-368-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	2023-03-15
Correo	Instalación de monitores de 49 " para salas de monitoreo de Kennedy y Chapinero.	SGT-SDSCJ-369-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-15
Correo	Programación mantenimiento correctivo al sistema de video vigilancia MTO-PTZ de Bogotá D.C.	SGT-SDSCJ-370-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-15
Correo	Reporte siniestro punto ESU-072.	SGT-SDSCJ-371-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-15
Correo	Solicitud aprobación formato Consolidado de Obras de Infraestructura (COI).	SGT-SDSCJ-372-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-15
Correo	Solicitud de permisos para mantenimiento de sistemas integrados de videovigilancia al anillo vial de la Presidencia.	SGT-SDSCJ-373-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	2023-03-16
Correo	Entrega informe quincenal No. 11.	SGT-SDSCJ-374-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-16
Correo	Soportes de la obligación específica # 15 de febrero de 2023.	SGT-SDSCJ-375-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-16
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-373-23 Solicitud de permisos para mantenimiento de sistemas integrados de videovigilancia al anillo vial de la Presidencia”.	SGT-SDSCJ-376-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	2023-03-17
Correo	Entrega plan de acción pérdida de ANS.	SGT-SDSCJ-377-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-17
Correo	Solicitud aprobación uso bolsa de repuestos para equipos requeridos en las Estaciones de Policía con novedad en el sistema de videovigilancia.	SGT-SDSCJ-378-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-17
Correo	Solicitud aprobación uso bolsa de repuesto para CAI Ferias.	SGT-SDSCJ-379-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-17

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Reiteración 1 al oficio “SGT-SDSCJ-354-23 Consolidado de solicitudes pendientes de respuesta por parte de la supervisión del contrato No. SCJ-1932 de 2022."	SGT-SDSCJ-380-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-17
Correo	Novedad Cámara CAI Las ferias	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-03-17
Correo	Informe de seguimiento semanal No. 22.	SGT-SDSCJ-381-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-21
Correo	Solicitud de ingreso a las instalaciones del C4.	SGT-SDSCJ-382-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-21
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-331-23 Reiteración 1 al oficio “ SDSCJ-250-23 Entrega de actas de seguimiento contractual mes de Enero de 2023.”.	SGT-SDSCJ-383-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-21
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-333-23 Entrega de actas de seguimiento contractual del mes de febrero de 2023.”.	SGT-SDSCJ-384-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-21
Correo	Solicitud de entrada a almacén de la SDSCJ de los equipos instalados en el mes de marzo de 2023 dentro del marco de la ejecución del contrato 1932-2022”.	SGT-SDSCJ-385-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-22
Correo	Solicitud de placas de almacén SDSCJ contrato 1932-2022.	SGT-SDSCJ-386-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-22
Correo	Reiteración 1 al oficio “SGT-SDSCJ-327-23 Alcance al oficio "SGT-SDSCJ-307-23 Solicitud aprobación equipos y dispositivos requeridos para el Centro de Traslado por Protección (CTP)".”.	SGT-SDSCJ-387-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-22
Correo	Solicitud aprobación formato Consolidado de Obras de Infraestructura (COI).	SGT-SDSCJ-388-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-22
Correo	Respuesta derecho de petición SGT-SDSCJ-337-23 de 28 de febrero de 2023-CTO1932-2022.	20231600232232	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-03-23
Correo	Informe de novedad con la fuente de energía de la cámaras de video Estación Mártires	COPER 4-ESTPO-29.57	MEBOG	LUIS FERNANDO ROMERO ROA Jefe Telemática	2023-03-23
Correo	Solicitud de retiro de equipo.	SGT-SDSCJ-389-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-27

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del Centro de Traslado por Protección.	SGT-SDSCJ-390-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN	2023-03-27
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del Estadio Nemesio Camacho El Campín.	SGT-SDSCJ-391-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	ESTADIO NEMESIO CAMACHO EL CAMPÍN	2023-03-27
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del Parque Metropolitano Simón Bolívar.	SGT-SDSCJ-392-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR	2023-03-27
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones de CAI´s priorizados para restaurar el CCTV.	SGT-SDSCJ-393-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - MEBOG	2023-03-27
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones de CAI´s y Estaciones de Policía.	SGT-SDSCJ-394-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - MEBOG	2023-03-27
Correo	Solicitud permisos de ingreso al Subsistema Integrado de Transmilenio.	SGT-SDSCJ-395-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	TRANSMILENIO S.A.	2023-03-27
Correo	Solicitud de permisos de ingreso a las instalaciones de Comandos Operativos de Seguridad Ciudadana (COSEC).	SGT-SDSCJ-396-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - MEBOG	2023-03-27
Correo	Solicitud permiso de ingreso al Datacenter de C4 (Bomberos).	SGT-SDSCJ-397-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-27
Correo	Informe de seguimiento semanal No. 23.	SGT-SDSCJ-398-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-27
Correo	Respuesta supervisión contrato 1932 SCJ	20231600117003	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-03-27
Correo	Traslado prueba y citación reanudación audiencia contrato SCJ-1932-2022	20234200240952	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-03-27
Correo	Tercer reporte del laboratorio de equipos en estado irreparables corte mes de marzo 2023	SGT-SDSCJ-399-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-28
Correo	Cámaras PTZ Hanwha y Bosch para cambio de repuestos y reparacion en centro de servicios	SGT-SDSCJ-400-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-28
Correo	Contrato No. SCJ-1932-2022, Autorización reparación cámaras PTZ, HANWHA Y BOSCH para cambio de repuestos.	20231600248142	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-03-28
Correo	Respuesta a los oficios SGT-SDSCJ-297-23 Y SGT-SDSCJ-298-23.	20231600248212	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-03-28
Correo	Aprobación listado de mantenimiento preventivo al sistema de video vigilancia MTO-PTZ de Bogotá D.C.	SGT-SDSCJ-401-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-29

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Solicitud aprobación formato Consolidado de Obras de Infraestructura (COI).	SGT-SDSCJ-402-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-29
Correo	Respuesta a las observaciones recibidas por correo electrónico el día 23 de marzo de 2023 al informe mensual del mes de febrero.	SGT-SDSCJ-403-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-29
Correo	Radicación de Factura de servicios Febrero 2023.	SGT-SDSCJ-404-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-29
Correo	Segundo grupo DE CAI´S priorizados que fueron vandalizados	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-03-29
Correo	Reporte vandalismo en el punto P459.	SGT-SDSCJ-405-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-30
Correo	Reporte de incidente punto FVS-3400.	SGT-SDSCJ-406-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-30
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-387-23 Reiteración 1 al oficio “SGT-SDSCJ-327-23 Alcance al oficio "SGT-SDSCJ-307-23 Solicitud aprobación equipos y dispositivos requeridos para el Centro de Traslado por Protección (CTP)".	SGT-SDSCJ-407-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-30
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-385-23” Solicitud de entrada a almacén de la SDSCJ de los equipos instalados en el mes de febrero de 2023 dentro del marco de la ejecución del contrato 1932-2022”.	SGT-SDSCJ-408-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-31
Correo	Solicitud aprobación mantenimiento preventivo a UPS de 6KVA para el Centro de Traslado por Protección (CTP).	SGT-SDSCJ-409-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-31
Correo	Cámaras PTZ Hanwha y Bosch para cambio de repuestos y reparación en centro de servicios.	SGT-SDSCJ-410-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-31
Correo	Aprobación ficha técnica de sillas para centros de monitoreo.	SGT-SDSCJ-411-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-31
Correo	Respuesta a las observaciones del Plan de Gestión recibidas mediante acta de reunión del 23 de marzo de 2023.	SGT-SDSCJ-412-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-31
Correo	Entrega de actas de seguimiento contractual del mes de febrero y marzo de 2023.	SGT-SDSCJ-413-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-03-31

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Solicitud para gestionar ante la secretaría de seguridad el desmonte de cámaras de seguridad - Parque Gilma Jimenez	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-03-31
Correo	Entrega informe quincenal No. 12.	SGT-SDSCJ-414-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-04-03
Correo	Informe de seguimiento semanal No. 24.	SGT-SDSCJ-415-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-04-03
Correo	Alcance al oficio "SGT-SDSCJ-394-23 Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones de CAI´s y Estaciones de Policía.".	SGT-SDSCJ-416-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-04-03
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-138-22 Reporte siniestro punto SCJ17E190077.”	SGT-SDSCJ-417-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-04-03
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-139-22 Reporte siniestro punto SCJ17E050069.”	SGT-SDSCJ-418-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-04-03
Correo	Cuarto reporte del laboratorio de equipos en estado irreparables.	SGT-SDSCJ-419-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-04-04
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-409-23 Solicitud aprobación mantenimiento preventivo a UPS de 6KVA para el Centro de Traslado por Protección (CTP).”.	SGT-SDSCJ-420-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-04-04
Correo	Respuesta a solicitud recibida por correo electrónico el día 03 de abril de 2023 - SGT-ITS-396-23.	SGT-SDSCJ-421-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - MEBOG	2023-04-04
Correo	Inconsistencias en el Primer Nivel por parte de Seguritech	No aplica	ETB	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-04-04
Correo	Solicitud aprobación uso bolsa de repuestos para puntos de video vigilancia con sistema fotovoltaico ESU-216.	SGT-SDSCJ-422-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-04-05
Correo	Solicitud aprobación formato Consolidado de Obras de Infraestructura (COI).	SGT-SDSCJ-423-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-04-05
Correo	Solicitud aprobación uso bolsa de repuesto para CAI NAVARRA.	SGT-SDSCJ-424-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-04-05
Correo	Contrato N° SCJ-1932-2022, Aprobación equipos y dispositivos requeridos para el centro de traslado de protección (CTP)	20231600260592	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-04-05

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Solicitud aprobación uso bolsa de repuestos para puntos de video vigilancia con sistema fotovoltaico 350-5254.	SGT-SDSCJ-425-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-04-10
Correo	Solicitud aprobación uso bolsa de repuestos para puntos de video vigilancia con sistema fotovoltaico ESU-215.	SGT-SDSCJ-426-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-04-10
Correo	Informe de seguimiento semanal No. 25.	SGT-SDSCJ-427-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-04-10
Correo	Solicitud de retiro de pantallas de vídeo wall de la sala de monitoreo COSEC-CHAPINERO	SGT-SDSCJ-428-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-04-11
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-276-23 Respuesta al correo electrónico del 31 de enero de 2023 con asunto “Disposición de bienes del SVV recibidos en calidad de reposición”.”.	SGT-SDSCJ-429-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-04-11
Correo	Informe novedad sistema aire acondicionado.	SGT-SDSCJ-430-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-04-11
Correo	Aprobación retiro de 4 Workstation que se encuentran en el C4.	SGT-SDSCJ-431-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-04-11
Correo	Entrega de informe de mensual de SST	SGT-SDSCJ-432-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-04-11
Correo	Entrega de informe de gestión mensual de marzo de 2023.	SGT-SDSCJ-433-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-04-11
Correo	Solicitud aprobación formato Consolidado de Obras de Infraestructura (COI).	SGT-SDSCJ-434-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-04-12
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones por parte de nuestro especialista técnico al Centro de Traslado por Protección.	SGT-SDSCJ-435-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN	2023-04-12
Correo	Reporte siniestro punto ESU-117.	SGT-SDSCJ-436-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-04-13
Correo	Acompañamiento durante la ejecución de la visita de mantenimiento preventivo en el Centro de Traslado de Protección (CTP).	SGT-SDSCJ-437-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-04-14

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-207-23 Radicación informes mantenimiento preventivo Salas de Monitoreo”.	SGT-SDSCJ-438-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-04-14
Correo	Solicitud de aprobación para disposición final de materiales de puntos de video vigilancia.	SGT-SDSCJ-439-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-04-14
Correo	Informe de seguimiento semanal No. 26.	SGT-SDSCJ-440-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-04-17
Correo	Entrega informe quincenal No. 13.	SGT-SDSCJ-441-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-04-17
Correo	Atención de visita y requerimientos de información realizados por la Fiscalía.	SGT-SDSCJ-442-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-04-18
Correo	Reiteración 1 al oficio “SGT-SDSCJ-428-23 Solicitud de retiro de pantallas de vídeo wall de la sala de monitoreo COSEC-CHAPINERO”.	SGT-SDSCJ-443-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-04-18
Correo	Solicitud de permisos para mantenimiento de sistemas integrados de videovigilancia al anillo vial de la Presidencia.	SGT-SDSCJ-444-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	2023-04-18
Correo	Solicitud aprobación formato Consolidado de Obras de Infraestructura (COI).	SGT-SDSCJ-445-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-04-19
Correo	Quinto reporte del laboratorio de equipos en estado irreparables.	SGT-SDSCJ-446-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-04-19
Correo	Respuesta a oficios SGT-SDSCJ-385-23 Solicitud de entrada a almacén de la SDSCJ de los equipos instalados en el mes de febrero de 2023 dentro del marco de la ejecución del contrato 1932-2022”.	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-04-19
Correo	Contrato N| SCJ-1932-2022 Autorización reparación cámaras PTZ HANWHA Y BOSCH para cambio de repuestos	20231600321832	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-04-19
Correo	Informe estado de equipos en sala de monitoreo Chapinero	GS-2023-186618-MEBOG	MEBOG	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-04-19
Correo	Informe novedad sistema de visualización Sala de video COSEC-CHAPINERO.	SGT-SDSCJ-447-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-04-20

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Respuesta a las observaciones del correo electrónico realizadas el 18 de abril de 2023 “(SGT-SDSCJ-399-23 Tercer reporte del laboratorio de equipos en estado irreparables corte mes de marzo 2023).”	SGT-SDSCJ-448-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-04-21
Correo	Respuesta oficios SGT-SDSCJ-428-23	20231600328512	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-04-22
Correo	Respuesta a los oficios SGT-SDSCJ-297-23 Y SGT-SDSCJ-298-23.	20231600328582	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-04-23
Correo	Solicitud aprobación PMT´s.	SGT-SDSCJ-449-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD (SDM)	2023-04-24
Correo	Acta de verificación equipos irreparables durante la visita en las instalaciones de Seguritech Colombia S.A.S el día 20/04/2023.	SGT-SDSCJ-450-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-04-24
Correo	Solicitud de aprobación de suministro e instalación de patch cords de 1m para el Centro de Traslado de Protección(CTP).	SGT-SDSCJ-451-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-04-24
Correo	Solicitud ingreso a las instalaciones C4.	SGT-SDSCJ-452-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-04-24
Correo	Informe de seguimiento semanal No. 27.	SGT-SDSCJ-453-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-04-24
Correo	Error en el ingreso al almacén cámara Hanwha XNP-6321H.	SGT-SDSCJ-454-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-04-25
Correo	Respuesta a las observaciones del correo electrónico realizadas el 24 de abril de 2023“(SGT-SDSCJ-450-23 Acta de verificación equipos irreparables durante la visita en las instalaciones de Seguritech Colombia S.A.S el día 20/04/2023).”	SGT-SDSCJ-455-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-04-25
Correo	Alcance al oficio "SGT-SDSCJ-452-23 Solicitud ingreso a las instalaciones C4"	SGT-SDSCJ-456-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-04-26
Correo	Solicitud aprobación formato Consolidado de Obras de Infraestructura (COI).	SGT-SDSCJ-457-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-04-26
Correo	Solicitud tratamiento de silvicultura para los puntos de videovigilancia del contrato No SCJ-1932-2022.	SGT-SDSCJ-458-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Secretaria Distrital de Medio Ambiente	2023-04-26
Correo	Observaciones Masivo COI 17-Contrato de Mantenimiento SVV - SCJ-1932-2022	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-04-26

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del Centro de Traslado por Protección.	SGT-SDSCJ-459-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN	2023-04-27
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del Estadio Nemesio Camacho El Campín.	SGT-SDSCJ-460-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	ESTADIO NEMESIO CAMACHO EL CAMPÍN	2023-04-27
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del Parque Metropolitano Simón Bolívar.	SGT-SDSCJ-461-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR	2023-04-27
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones de CAI´s y Estaciones de Policía.	SGT-SDSCJ-462-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - MEBOG	2023-04-27
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones de CAI´s priorizados para restaurar el CCTV.	SGT-SDSCJ-463-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - MEBOG	2023-04-27
Correo	Solicitud permisos de ingreso al Subsistema Integrado de Transmilenio.	SGT-SDSCJ-464-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	TRANSMILENIO S.A.	2023-04-27
Correo	Solicitud de entrada a almacén de la SDSCJ de los equipos instalados en el mes de marzo de 2023 dentro del marco de la ejecución del contrato 1932-2022".	SGT-SDSCJ-465-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-04-27
Correo	Solicitud de permisos de ingreso a las instalaciones de Comandos Operativos de Seguridad Ciudadana (COSEC).	SGT-SDSCJ-466-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - MEBOG	2023-04-27
Correo	Solicitud permiso de ingreso al Datacenter de C4 (Bomberos).	SGT-SDSCJ-467-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-04-27
Correo	Soportes de la obligación específica # 15 de marzo de 2023.	SGT-SDSCJ-468-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-04-28
Correo	Reiteración 1 al oficio "SGT-SDSCJ-401-23 Aprobación listado de mantenimiento preventivo al sistema de video vigilancia MTO-PTZ de Bogotá D.C" - Mantenimiento preventivos sin carro canasta.	SGT-SDSCJ-469-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-04-28
Correo	Contrato N° SCJ-1932-2022, reporte de cámaras axis fijas presentes en el sistema de videovigilancia MTO-PTZ DE BOGOTA D.C.	20231600338102	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-04-28
Correo	Elementos dados de baja	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-04-29
Correo	Respuesta a las observaciones recibidas por correo electrónico el día 28 de abril de 2023 al informe mensual del mes de marzo.	SGT-SDSCJ-470-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-02
Correo	Entrega informe quincenal No. 14.	SGT-SDSCJ-471-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-02

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Informe de seguimiento semanal No. 28.	SGT-SDSCJ-472-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-02
Correo	Radicación de Factura de servicios Marzo 2023.	SGT-SDSCJ-473-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-02
Correo	Solicitud de aprobación del suministro, reposición e instalación de switch para el Parque Metropolitano Simón Bolívar.	SGT-SDSCJ-474-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-02
Correo	Inclusion Tipicos 158 AL 208	202361201682602	Secretaría de Movilidad	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-05-02
Correo	notificación de la Resolución Nro. 003 del 27 de abril de 2023 dentro del Proceso administrativo sancionatorio contractual para establecer el presunto incumplimiento en el Contrato Nro. SCJ-1932- 2022, suscrito entre SEGURITECH COLOMBIA SAS y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ).	20234200341412	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-05-02
Correo	Solicitud aprobación formatos COI 4to envío - Contrato de Mantenimiento SVV	No aplica	Secretaria de Movilidad	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-05-02
Correo	Solicitud aprobación formato Consolidado de Obras de Infraestructura (COI).	SGT-SDSCJ-475-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-03
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del Estadio Nemesio Camacho El Campín.	SGT-SDSCJ-476-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	ESTADIO NEMESIO CAMACHO EL CAMPÍN	2023-05-03
Correo	Puntos fuera de servicio	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-05-03
Correo	Informe de seguimiento semanal No. 29.	SGT-SDSCJ-477-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-08
Correo	Entrega del Plan de Manejo Ambiental V.03.	SGT-SDSCJ-478-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-08
Correo	Cámaras PTZ Bosch para cambio de repuestos y reparacion en centro de servicios	SGT-SDSCJ-479-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-08
Correo	Solicitud permisos de ingreso a los sistemas integrados de videovigilancia ubicados en instituciones educativas.	SGT-SDSCJ-480-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-08
Correo	Entrega de informe de gestión mensual de abril de 2023.	SGT-SDSCJ-481-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-08

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Respuesta Oficio SGT-SDSCJ-401-23	20231600348052	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-05-08
Correo	Reporte actual del estado del servidor de descargas video vigilancia Bogotá.	SGT-SDSCJ-482-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-09
Correo	Respuesta al oficio “GS-2023-186618-MEBOG, Informe estado de equipos en sala de monitoreo Chapinero.”.	SGT-SDSCJ-483-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-09
Correo	Solicitud de aprobación para cambio de repuestos y reparación en centro de servicios para Cámaras PTZ Bosch.	SGT-SDSCJ-484-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-09
Correo	Sexto reporte del laboratorio de equipos en estado irreparables.	SGT-SDSCJ-485-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-09
Correo	Solicitud aprobación formato Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)	SGT-SDSCJ-486-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-10
Correo	Respuesta al correo electrónico recibido el 02 de mayo de 2023 “Solicitud aprobación formatos COI 4to envío - Contrato de Mantenimiento SVV.”	SGT-SDSCJ-487-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-10
Correo	Solicitud permiso de ingreso a las instalaciones C4.	SGT-SDSCJ-488-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-10
Correo	Verificación de CAI	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-05-10
Correo	Soportes de la obligación específica # 15 de abril de 2023.	SGT-SDSCJ-489-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-11
Correo	Respuesta a las observaciones del correo electrónico realizadas el día 11 de mayo de 2023 “SGT-SDSCJ-465-23 Solicitud de entrada a almacén de la SDSCJ de los equipos instalados en el mes de marzo de 2023 dentro del marco de la ejecución del contrato 1932-2022”.	SGT-SDSCJ-490-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-11
Correo	RME - BOBSHU930601 LINK DOWN EN INTERFAZ GE 1_0_3 __ caso 08975720	No aplica	ETB	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	2023-05-11
Correo	EQUIPO DEMARCADOR AISLADO_ BOCRRA_MEADALBOCR28_C11 SK10C_SCJ_CAV30CI1111756 CASO 09013975	No aplica	ETB	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	2023-05-14
Correo	RME - BOTEHU930301 LINK DOWN EN INTERFAZ GE 2_0_8 DE EQUIPO QUIDWAY caso 09015078	No aplica	ETB	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	2023-05-14

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	RME - BOYOHU930601 LINK DOWN INTERFAZ GIGABITETHERNET2_0_7 CASO 09015460	No aplica	ETB	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	2023-05-14
Correo	Reporte de vandalismo al punto FVS-4118 Localidad de Mártires.	SGT-SDSCJ-491-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-15
Correo	Informe de seguimiento semanal No. 30.	SGT-SDSCJ-492-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-15
Correo	Entrega informe quincenal No. 15.	SGT-SDSCJ-493-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-16
Correo	Informe falla del aire acondicionado en el Datacenter C4.	SGT-SDSCJ-494-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-16
Correo	Respuesta a las observaciones del correo electrónico realizadas el día 16 de mayo de 2023 “SGT-SDSCJ-439-23 Solicitud de aprobación para disposición final de materiales de puntos de video vigilancia”.	SGT-SDSCJ-495-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-16
Correo	Solicitud permiso de ingreso a las instalaciones C4.	SGT-SDSCJ-496-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-16
Correo	Plan de acción pérdida de ANS actualizado.	SGT-SDSCJ-497-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-17
Correo	Servicios pendientes de validación con corte al 16 de mayo de 2023.	SGT-SDSCJ-498-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-17
Correo	RESTAURACIÓN SERVIDOR PRIVADOS	No aplica	VERYTEL	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-05-17
Correo	Reiteración 1 al oficio SGT-SDSCJ-412-23 “Respuesta a las observaciones del Plan de Gestión del Proyecto recibidas mediante acta de reunión del 23 de marzo de 2023.”.	SGT-SDSCJ-499-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-18
Correo	Contrato No. SCJ-1932-2022. Autorización reparación cámaras ptz bosch para cambio de repuestos	20231600396852	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-05-18
Correo	RME - BOBCHU930601 LINK DOWN EN INTERFAZ GE 2_1_22 DE EQUIPO QUIDWAY CASO ETB 09105650	No aplica	ETB	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	2023-05-18

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Entrega de usuario en sistema de monitoreo y control (Citronella).	SGT-SDSCJ-500-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-19
Correo	ALARMA PROACTIVA__CAV30010332__INC000012250475	No aplica	ETB	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	2023-05-19
Correo	Solicitud No 7 - Aprobación formatos COI - Contrato de Mantenimiento SVV (C4)	No aplica	Secretaría de Movilidad	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-05-19
Correo	Mantenimiento de camaras	No aplica	ETB	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-05-19
Correo	RME - BOCOHU930602 LINK DOWN EN INTERFAZ GE 5_0_0 DE EQUIPO QUIDWAY __ CASO 09126541	No aplica	ETB	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	2023-05-19
Correo	RME - BOOLHU930601 LINK DOWN EN INTERFAZ GE 1_0_34 __ CASO 09127823	No aplica	ETB	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	2023-05-19
Correo	EQUIPO DEMARCADOR AISLADO_ BOSCHU930302_BOSCRA_MEADALBOSC73_CAERDENS_IVLAN601 __ caso 09143620	No aplica	ETB	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	2023-05-20
Correo	RME - BOOLHU930601 LINK DOWN EN INTERFAZ GE 1_0_34 DE EQUIPO QUIDWAY __CASO 09151887	No aplica	ETB	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	2023-05-22
Correo	Solicitud de atención a la obligación de aprobación/autorización de actividades y reunión inmediata para segunda capacitación del personal de apoyo a la Supervisión en el uso del Software de Mesa de servicio.	SGT-SDSCJ-501-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-23
Correo	Respuesta a las observaciones del correo electrónico realizadas el día 15 de mayo de 2023 “SGT-SDSCJ-491-23 Reporte de vandalismo al punto FVS-4118 Localidad de Mártires”.	SGT-SDSCJ-502-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-23
Correo	Informe de seguimiento semanal No. 31.	SGT-SDSCJ-503-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-23
Correo	Solicitud de entrada a almacén de la SDSCJ de los equipos instalados en el mes de abril de 2023 dentro del marco de la ejecución del contrato 1932-2022”.	SGT-SDSCJ-504-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-23
Correo	Servicios ejecutados de limpieza de acrilico sin carro canasta para la ponderación de calidad contemplado en la obligación específica # 39 del contrato en ejecución No. 1932-2022.	SGT-SDSCJ-505-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-23

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Respuesta al radicado SDA 2023ER93044 del 27 de abril de 2023 Radicado SEGURITECH SGT-SDSCJ-458-23 del 26 de abril de 2023.	2023EE109809	Secretaría de Ambiente	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-05-23
Correo	Solicitud aprobación formato Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)	SGT-SDSCJ-506-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-24
Correo	Respuesta a la observación del correo electrónico realizada el día 24 de mayo de 2023 “SGT-SDSCJ-504-23 Solicitud de entrada a almacén de la SDSCJ de los equipos instalados en el mes de abril de 2023 dentro del marco de la ejecución del contrato 1932-2022”.	SGT-SDSCJ-507-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-25
Correo	Respuesta a la observación del correo electrónico realizada el día 17 de mayo de 2023 “SGT-SDSCJ-485-23 Sexto reporte del laboratorio de equipos en estado irreparables.”	SGT-SDSCJ-508-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-25
Correo	Respuesta a la solicitud realizada mediante correo electrónico el día 25 de mayo de 2023 - Listado de oficios enviados por Seguritech Colombia SAS.	SGT-SDSCJ-509-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-26
Correo	Entrega de actas de seguimiento contractual de los meses de marzo, abril y mayo de 2023.	SGT-SDSCJ-510-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-26
Correo	Respuesta a la solicitud de ajuste a las hojas de vida.	SGT-SDSCJ-511-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-26
Correo	Informe de seguimiento semanal No. 32.	SGT-SDSCJ-512-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-29
Correo	Solicitud de priorización a los tickets de servicios registrados en el Software de Mesa de Servicio, con corte al 31 de mayo de 2023.	SGT-SDSCJ-513-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-29
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del Estadio Nemesio Camacho El Campín.	SGT-SDSCJ-514-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	ESTADIO NEMESIO CAMACHO EL CAMPÍN	2023-05-29
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del Centro de Traslado por Protección.	SGT-SDSCJ-515-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN	2023-05-29
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del Parque Metropolitano Simón Bolívar.	SGT-SDSCJ-516-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR	2023-05-29
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones de CAI´s y Estaciones de Policía.	SGT-SDSCJ-517-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - MEBOG	2023-05-29

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Solicitud permisos de ingreso al Subsistema Integrado de Transmilenio.	SGT-SDSCJ-518-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	TRANSMILENIO S.A.	2023-05-29
Correo	Solicitud de permisos de ingreso a las instalaciones de Comandos Operativos de Seguridad Ciudadana (COSEC).	SGT-SDSCJ-519-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - MEBOG	2023-05-29
Correo	Solicitud permiso de ingreso al Datacenter de C4 (Bomberos).	SGT-SDSCJ-520-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-29
Correo	Respuesta a las observaciones recibidas por correo electrónico el día 26 de mayo de 2023 al informe mensual del mes de abril.	SGT-SDSCJ-521-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-29
Correo	Radicación de Factura de Servicios Abril 2023.	SGT-SDSCJ-522-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-29
Correo	Séptimo reporte del laboratorio de equipos en estado irreparables.	SGT-SDSCJ-523-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-29
Correo	Solicitud ingreso a las instalaciones C4.	SGT-SDSCJ-524-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-30
Correo	Manual de configuración de tour cámaras SVV	SGT-SDSCJ-525-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-30
Correo	Estado de equipos en sala de monitoreo de Puente Aranda y Chapinero.	SGT-SDSCJ-526-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-30
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-298-23 Autorización del listado priorizado para mantenimiento preventivo de puntos de videovigilancia.”.	SGT-SDSCJ-527-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-30
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-291-23 Plan de mantenimiento Datacenter”.	SGT-SDSCJ-528-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-31
Correo	Cámaras PTZ Bosch para cambio de repuestos y reparación en centro de servicios.	SGT-SDSCJ-529-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-31
Correo	Solicitud aprobación formato Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)	SGT-SDSCJ-530-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-31
Correo	Solicitud de retiro para el ingreso a las instalaciones del C4.	SGT-SDSCJ-531-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-31

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Respuesta al Radicado “202361201682602 INCLUSION TÍPICOS 158 AL 208”.	SGT-SDSCJ-532-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD (SDM)	2023-05-31
Correo	Informe de desconexión cámaras de recaudo.	SGT-SDSCJ-533-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-05-31
Correo	Entrega informe quincenal No. 16.	SGT-SDSCJ-534-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-06-01
Correo	Respuesta a radicado no. 20235410185421 y a oficios SGT-SDSCJ-499-23 Reiteración 1 al oficio SGT-SDSCJ-412-23 Respuesta a las observaciones del plan de gestión.	2-2023-45516	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-06-01
Correo	Solicitud de aprobación para suministro e instalación de disco duro interno Sata 1TB para workstation de Estación de policía Antonio Nariño.	SGT-SDSCJ-535-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-06-02
Correo	Solicitud información	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-06-02
Correo	Solicitud de ampliación de alcance, nuevos típicos. Radicado SDM - 202361201682602 (Comunicado SGT-SDSCJ-449-23) y SDM - 202361202314412 (Comunicado SGT-SDSCJ-532-23)	202331204876351	Secretaría de Movilidad	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-06-02
Correo	ALARMA PROACTIVA__CAV30CI1049589__INC000012285706	No aplica	ETB	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	2023-06-03
Correo	ALARMA PROACTIVA__CAV30CI1063089__INC000012285597	No aplica	ETB	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	2023-06-03
Correo	Octavo reporte de laboratorio de equipos en estado irreparables.	SGT-SDSCJ-536-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-06-05
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-521-23 Respuesta a las observaciones recibidas por correo electrónico el día 26 de mayo de 2023 al informe mensual del mes de abril.”.	SGT-SDSCJ-537-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-06-05
Correo	Solicitud de aprobación para suministro e instalación de disco duro interno Sata 1TB para workstation de C4 - CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO.	SGT-SDSCJ-538-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-06-05
Correo	Informe de seguimiento semanal No. 33.	SGT-SDSCJ-539-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-06-05

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Informe de desconexión cámaras de movilidad.	SGT-SDSCJ-540-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-06-05
Correo	ALARMA PROACTIVA__CAV30CI1087622__INC000012289663	No aplica	ETB	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	2023-06-05
Correo	Respuesta a citación de reunión con asunto “Revisión de Aplicativo Citronella Cto 1932-2022”.	SGT-SDSCJ-541-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-06-06
Correo	Solicitud de servicios de mantenimiento preventivo sin carro canasta para la ponderación de calidad contemplado en la obligación específica # 39 del contrato en ejecución No.1932-2022.	SGT-SDSCJ-542-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-06-06
Correo	Entrega de usuario en sistema de monitoreo y control (Citronella).	SGT-SDSCJ-543-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-06-07
Correo	Entrega de informe de gestión mensual de mayo de 2023.	SGT-SDSCJ-544-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-06-07
Correo	Solicitud designación de personal para la configuración de analítica de comportamiento.	SGT-SDSCJ-545-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-06-09
Correo	RESPUESTA A RADICADO NO.20235410232731 Y OFICIO SGT-SDSCJ-454-23 ERROR EN EL INGRESO AL ALMACÉN CÁMARA HANWHA XNP-6321H.	2-2023-46660	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-06-09
Correo	Aprobación cambio de repuesto y reparación en centro de servicio de cámaras PTZ BOSH.	2-2023-46587	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-06-09
Correo	Informe de seguimiento semanal No. 34.	SGT-SDSCJ-546-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-06-13
Correo	Radicación hoja de vida personal para la mesa de servicio.	SGT-SDSCJ-547-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-06-14
Correo	Solicitud permiso de ingreso a las instalaciones C4.	SGT-SDSCJ-548-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-06-14
Correo	Solicitud aprobación formato Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)	SGT-SDSCJ-549-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-06-14
Correo	Reporte de las actividades realizadas en el Centro de Traslado por Protección(CTP).	SGT-SDSCJ-550-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-06-15

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Solicitud ampliación de alcance, nuevos típicos. Radicado SDM - 202361201682602 (Comunicado SGT-SDSCJ-449-23) y SDM – 202361202314412 (Comunicado SGT-SDSCJ-532-23)	SPMT 202331204876351	Secretaría de Movilidad	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-06-15
Correo	Entrega informe quincenal No. 17.	SGT-SDSCJ-551-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-06-16
Correo	Cronograma de actividades para mantenimientos preventivos sin carro canasta en Colegios para la ponderación de calidad contemplado en la obligación específica # 39 del contrato en ejecución No.1932-2022.	SGT-SDSCJ-552-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-06-16
Correo	Solicitud aprobación equipos y dispositivos requeridos para el C4 - CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO.	SGT-SDSCJ-553-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-06-16
Correo	SGT-SDSCJ-529-23 Aprobación cambio de repuesto y reparación en centro de servicio de cámaras PTZ BOSH.	2-2023-46587	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-06-16
Correo	Solicitud mantenimiento preventivo y diagnóstico cctv estaciones de policía.	2-2023-51646	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-06-16
Correo	Respuesta radicado 1-2023-30633	2-2023-46153	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-06-16
Correo	Informe de seguimiento semanal No. 35.	SGT-SDSCJ-554-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-06-20
Correo	Notificación del cambio de Gestora de Permisos.	SGT-SDSCJ-555-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-06-21
Correo	Puntos fuera de servicio	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-06-21
Correo	Entrega del Plan de Comunicaciones V.05.	SGT-SDSCJ-556-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-06-22
Correo	Respuesta al oficio SGT-SDSCJ-482-23. Servidor datacenter	2-2023-52309	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-06-22
Correo	SGT-SDSCJ-533-23. Traslado solicitud de informe de desconexión cámaras de recaudo.	2-2023-52314	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-06-22
Correo	Proactivo caso 09711533	No aplica	ETB	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	2023-06-22
Correo	Entrega de minutas de juntas - Anexo 3 del contrato No. 1932 de 2022.	SGT-SDSCJ-557-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-06-23

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-552-23 Cronograma de actividades para mantenimientos preventivos sin carro canasta en Colegios para la ponderación de calidad contemplado en la obligación específica # 39 del contrato en ejecución No.1932-2022.”.	SGT-SDSCJ-558-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-06-26
Correo	Noveno reporte del laboratorio de equipos en estado irreparables.	SGT-SDSCJ-559-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-06-26
Correo	Informe de seguimiento semanal No. 36.	SGT-SDSCJ-560-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-06-26
Correo	Radicación hoja de vida personal para la mesa de servicio.	SGT-SDSCJ-561-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-06-26
Correo	Solicitud de retiro e ingreso a las instalaciones del C4.	SGT-SDSCJ-562-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-06-26
Correo	Reporte siniestro punto CCEL19_0025 localidad Ciudad Bolívar.	SGT-SDSCJ-563-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-06-27
Correo	Respuesta a la solicitud realizada mediante correo electrónico el día 27 de junio de 2023 - Listado de oficios pendientes por respuesta al contrato 1932-2023.	SGT-SDSCJ-564-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-06-28
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-544-23 Entrega de informe de gestión mensual de mayo de 2023.”.	SGT-SDSCJ-565-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-06-28
Correo	Reporte de robo de equipos al punto FVS-1407 Localidad de Suba.	SGT-SDSCJ-566-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-06-28
Correo	Solicitud aprobación formato Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)	SGT-SDSCJ-567-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-06-28
Correo	Solicitud aprobación uso bolsa de repuesto para Estación de Policía CIUDAD BOLÍVAR.	SGT-SDSCJ-568-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-06-28
Correo	Solicitud aprobación PMT´s.	SGT-SDSCJ-569-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD (SDM)	2023-06-28
Correo	Solicitud aprobación uso bolsa de repuesto para Estación de Policía CARABINEROS VILLA NIDIA.	SGT-SDSCJ-570-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-06-28

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Solicitud de entrada a almacén de la SDSCJ de los equipos instalados en el mes de mayo de 2023 dentro del marco de la ejecución del contrato 1932-2022.	SGT-SDSCJ-571-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-06-28
Correo	Reporte de poste desaplomado para montaje de equipos punto ESU-101.	SGT-SDSCJ-572-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-06-29
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del Estadio Nemesio Camacho El Campín.	SGT-SDSCJ-573-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Estadio Nemesio Camacho El Campín	2023-06-29
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del Centro de Traslado por Protección.	SGT-SDSCJ-574-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Centro de Traslado por Protección.	2023-06-29
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del Parque Metropolitano Simón Bolívar.	SGT-SDSCJ-575-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Parque Metropolitano Simón Bolívar.	2023-06-29
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones de CAI´s y Estaciones de Policía.	SGT-SDSCJ-576-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CAI´s y Estaciones de Policía.	2023-06-29
Correo	Solicitud permisos de ingreso al Subsistema Integrado de Transmilenio.	SGT-SDSCJ-577-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Subsistema Integrado de Transmilenio.	2023-06-29
Correo	Solicitud de permisos de ingreso a las instalaciones de Comandos Operativos de Seguridad Ciudadana (COSEC).	SGT-SDSCJ-578-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Comandos Operativos de Seguridad Ciudadana (COSEC).	2023-06-29
Correo	Solicitud permiso de ingreso al Datacenter de C4 (Bomberos).	SGT-SDSCJ-579-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Datacenter de C4 (Bomberos).	2023-06-29
Correo	Respuesta a la observación del correo electrónico realizada el día 30 de junio de 2023 “SGT-SDSCJ-571-23 Solicitud de entrada a almacén de la SDSCJ de los equipos instalados en el mes de mayo de 2023 dentro del marco de la ejecución del contrato 1932-2022”.	SGT-SDSCJ-580-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-06-30
Correo	Solicitud de desmonte de CÁMARA - CALLE 52B SUR - Av Guayacanes G1	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	2023-07-01
Correo	Reporte de novedad cámara de la sala CIUDAD BOLÍVAR	No aplica	MEBOG	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	2023-07-01
Correo	Resumen del estado del sistema de videovigilancia a corte 01-07-2023 16-00	No aplica	MEBOG	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-07-01
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-574-23 Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del Centro de Traslado por Protección”.	SGT-SDSCJ-581-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	Centro de Traslado por Protección.	2023-07-04
Correo	Propuesta adición y prórroga del contrato SCJ-1932-2022 por 3 meses y 25 días.	SGT-SDSCJ-582-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-07-04

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Informe de seguimiento semanal No. 37.	SGT-SDSCJ-583-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-07-04
Correo	Verificación de cámaras	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	2023-07-04
Correo	Entrega informe quincenal No. 18.	SGT-SDSCJ-584-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-07-05
Correo	Solicitud aprobación uso bolsa de repuesto para Estación de Policía RAFAEL URIBE URIBE.	SGT-SDSCJ-585-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-07-05
Correo	Solicitud aprobación uso bolsa de repuesto para Estación de Policía USAQUÉN.	SGT-SDSCJ-586-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-07-05
Correo	Solicitud aprobación uso bolsa de repuesto para Estación de Policía USME.	SGT-SDSCJ-587-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-07-05
Correo	Cámaras PTZ Bosch para cambio de repuestos y reparación en centro de servicios (05-07-2023).	SGT-SDSCJ-588-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-07-05
Correo	Respuesta oficios de trámite administrativo contrato 1932-2022	2-2023-54153	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	Seguritech Colombia SAS	2023-07-06
Correo	Respuesta a los oficios de trámite administrativo. contrato 1932-2022	2-2023-54152	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-07-06
Correo	Derecho de petición	2023EE12121	Concejo de Bogotá	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-07-06
Correo	Solicitud aprobación uso bolsa de repuesto para Estación de Policía KENNEDY.	SGT-SDSCJ-589-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-07-07
Correo	Decimo reporte del laboratorio de equipos en estado irreparables.	SGT-SDSCJ-590-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-07-07
Correo	Reporte vandalismo Estación Jimenez - Transmilenio.	SGT-SDSCJ-591-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-07-07
Correo	SGT-SDSCJ-592-23 Solicitud aprobación uso bolsa de repuesto para Estación de Policía ANTONIO NARIÑO.	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-07-09
Correo	Solicitud aprobación uso bolsa de repuesto para Estación de Policía ANTONIO NARIÑO.	SGT-SDSCJ-592-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-07-10
Correo	Informe de seguimiento semanal No. 38.	SGT-SDSCJ-593-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-07-10

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Solicitud aprobación uso bolsa de repuesto para Cosec PUENTE ARANDA	SGT-SDSCJ-594-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-07-10
Correo	Solicitud aprobación uso bolsa de repuesto para Estación de Policía PARQUE NACIONAL.	SGT-SDSCJ-595-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-07-10
Correo	Alcance al oficio "SGT-SDSCJ-582-23 Propuesta adición y prórroga del contrato SCJ-1932-2022."	SGT-SDSCJ-596-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-07-10
Correo	Soportes de la obligación específica # 15 del mes de mayo de 2023.	SGT-SDSCJ-597-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-07-10
Correo	Soportes de la obligación específica # 15 del mes de junio de 2023.	SGT-SDSCJ-598-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-07-10
Correo	Entrega de informe de gestión mensual de junio de 2023.	SGT-SDSCJ-599-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-07-10
Correo	Solicitud instalación sistema ARGIS en salas de video.	No aplica	MEBOG	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-07-10
Correo	Cámaras PTZ Bosch para cambio de repuestos y reparación en centro de servicios (11-07-2023).	SGT-SDSCJ-600-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-07-11
Correo	Propuesta adición y prórroga ajustada del contrato SCJ-1932-2022 por 4 meses.	SGT-SDSCJ-601-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-07-11
Correo	Radicación de Factura de Servicios Mayo 2023.	SGT-SDSCJ-602-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-07-12
Correo	Propuesta adición y prórroga del contrato SCJ-1932-2022 por 4 meses.	SGT-SDSCJ-603-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-07-12
Correo	Solicitud aprobación uso bolsa de repuesto para Estación de Policía BOSA.	SGT-SDSCJ-604-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-07-13
Correo	Servicios ejecutados de mantenimiento preventivo con carro canasta para la ponderación de calidad contemplado en la obligación específica # 39 del contrato en ejecución No. 1932-2022.	SGT-SDSCJ-605-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-07-14
Correo	Respuesta a las observaciones del correo electrónico del día 12 de julio de 2023 - Entrega de informe de gestión mensual de mayo de 2023.	SGT-SDSCJ-606-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-07-14

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Notificación del cambio de Documentador.	SGT-SDSCJ-607-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-07-14
Correo	Entrega del Plan de Comunicaciones V.06.	SGT-SDSCJ-609-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-07-14
Correo	Reporte siniestro punto FVS-3214 localidad Kennedy.	SGT-SDSCJ-610-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-07-14
Correo	Solicitud aprobación uso bolsa de repuesto para Estación de Policía CARABINEROS SUR.	SGT-SDSCJ-611-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-07-14
Correo	Informe de seguimiento semanal No. 39.	SGT-SDSCJ-612-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-07-17
Correo	Entrega informe quincenal No. 19.	SGT-SDSCJ-613-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-07-17
Correo	Entrega de usuarios en sistema de monitoreo y control (Citronella).	SGT-SDSCJ-614-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-07-18
Correo	Plan de acción pérdida de ANS actualizado.	SGT-SDSCJ-615-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-07-18
Correo	Solicitud de información de mantenimientos preventivos y correctivos de los componentes del sistema de videovigilancia.	2-2023-55994	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-07-18
Correo	Solicitud de autorización de ventana de mantenimiento No. 8 para Datacenter - Sistema de videovigilancia de Bogotá D.C.	SGT-SDSCJ-616-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-07-19
Correo	Cotización de micrófono para escritorio conferencia omnidireccional.	SGT-SDSCJ-617-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-07-19
Correo	Respuesta al oficio “2-2023-55994 solicitud de información mantenimientos preventivos y correctivos de los componentes del sistema de videovigilancia”.	SGT-SDSCJ-618-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-07-21
Correo	Radicación hoja de vida personal para la mesa de servicio.	SGT-SDSCJ-619-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-07-21
Correo	Solicitud de entrada a almacén de la SDSCJ de los equipos instalados en el mes de junio de 2023 dentro del marco de la ejecución del contrato 1932-2022.	SGT-SDSCJ-620-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-07-21

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Informe de seguimiento semanal No. 40.	SGT-SDSCJ-621-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-07-24
Correo	Solicitud permiso de ingreso a las instalaciones C4.	SGT-SDSCJ-622-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-07-24
Correo	Traslado solicitud Nro. GE-2023-354849-MEBOG Antecedente GE-2023-340180-MEBOG	1-2023-42837	MEBOG	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	2023-07-24
Correo	Undécimo reporte del laboratorio de equipos en estado irreparable.	SGT-SDSCJ-623-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-07-25
Correo	Reporte vandalismo en Centro de Traslado por Protección (CTP).	SGT-SDSCJ-624-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-07-26
Correo	Solicitud aprobación formato Consolidado de Obras de Infraestructura (COI).	SGT-SDSCJ-625-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-07-26
Correo	Solicitud información	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-07-26
Correo	Reporte novedad cámaras entregadas por aseguradora instaladas en los CAI-VERBENAL y CAI-FLORIDA.	SGT-SDSCJ-626-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-07-27
Correo	Plan de acción pérdida de ANS V.03.	SGT-SDSCJ-627-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-07-27
Correo	Solicitud informe cámaras arregladas y capacitación para crear tours	No aplica	MEBOG	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-07-27
Correo	Novedad DATACENTER sala Ciudad Bolivar.	No aplica	MEBOG	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-07-27
Correo	Solicitud ingreso a las instalaciones C4.	SGT-SDSCJ-628-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-07-28
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del Estadio Nemesio Camacho El Campín.	SGT-SDSCJ-629-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	ESTADIO NEMESIO CAMACHO EL CAMPÍN	2023-07-28
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del Centro de Traslado por Protección.	SGT-SDSCJ-630-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN	2023-07-28
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del Parque Metropolitano Simón Bolívar.	SGT-SDSCJ-631-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR	2023-07-28
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones de CAI´s y Estaciones de Policía.	SGT-SDSCJ-632-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - MEBOG	2023-07-28

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Solicitud permisos de ingreso al Subsistema Integrado de Transmilenio.	SGT-SDSCJ-633-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	TRANSMILENIO S.A.	2023-07-28
Correo	Solicitud de permisos de ingreso a las instalaciones de Comandos Operativos de Seguridad Ciudadana (COSEC).	SGT-SDSCJ-634-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - MEBOG	2023-07-28
Correo	Solicitud permiso de ingreso al Datacenter de C4 (Bomberos).	SGT-SDSCJ-635-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-07-28
Correo	Solicitud ampliación de alcance, nuevos típicos. Radicado SDM - 202361202832812 (Comunicado SGT-SDSCJ-569-23)	SPMT 202331206623791	Secretaria de Movilidad	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-07-28
Correo	Informe de seguimiento semanal No. 41.	SGT-SDSCJ-636-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-07-31
Correo	Solicitud instalación paneles solares de estación Engativa	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-07-31
Correo	Entrega informe quincenal No. 20.	SGT-SDSCJ-637-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-08-01
Correo	Solicitud de ingreso a las instalaciones del C4 y radicación de hoja de vida - Personal mesa de servicio.	SGT-SDSCJ-638-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-08-02
Correo	Respuesta a las observaciones del correo electrónico del día 27 de julio de 2023 - Entrega de informe de gestión mensual de junio de 2023.	SGT-SDSCJ-639-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-08-02
Correo	Solicitud de cámara priorizada no operando.	No aplica	MEBOG	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-08-02
Correo	Radicación de Factura de Servicios Junio 2023.	SGT-SDSCJ-640-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-08-03
Correo	Listado de puntos de video vigilancia MTO-PTZ con novedades para ejecutar servicios de mantenimiento correctivo.	SGT-SDSCJ-641-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-08-04
Correo	Procedimiento a realizar para la solicitud novedad de sala de video USAQUEN realizada por la MEBOG.	No aplica	MEBOG	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-08-04
Correo	Procedimiento a realizar para la solicitud de enrolamiento de huella y desactivación de otras realizada por la MEBOG.	No aplica	MEBOG	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-08-04
Correo	Programación de mantenimientos preventivos MTO-PTZ del 08 al 11 de agosto.	SGT-SDSCJ-642-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-08-08

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Informe de seguimiento semanal No. 42.	SGT-SDSCJ-643-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-08-08
Correo	Entrega de informe de gestión mensual de julio de 2023.	SGT-SDSCJ-644-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-08-08
Correo	Puntos de cámara que se encuentran asignado como responsable CODENSA	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-08-08
Correo	Soportes de la obligación específica # 15 del mes de julio de 2023.	SGT-SDSCJ-645-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-08-09
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-610-23 Reporte siniestro punto FVS-3214 localidad Kennedy”.	SGT-SDSCJ-646-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-08-09
Correo	Reporte de vandalismo al punto SCJ17E170041 - Localidad La Candelaria.	SGT-SDSCJ-647-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-08-09
Correo	Solicitud aprobación uso bolsa de repuesto para el C4 - CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO.	SGT-SDSCJ-648-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-08-10
Correo	Cámaras PTZ Bosch para cambio de repuestos y reparación en centro de servicios (10-08-2023).	SGT-SDSCJ-649-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-08-10
Correo	Solicitud aprobación uso bolsa de repuesto para Estación de Policía FONTIBÓN.	SGT-SDSCJ-650-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-08-11
Correo	Listado de puntos de video vigilancia MTO-PTZ con novedades para ejecutar servicios de mantenimiento correctivo entre los días 14 y 19 de agosto de 2023.	SGT-SDSCJ-651-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-08-11
Correo	Programación de mantenimientos preventivos MTO-PTZ del 14 al 19 de agosto.	SGT-SDSCJ-652-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-08-11
Correo	Cronograma autorizado para mantenimientos correctivos - 14/08/2023 a 19/08/2023	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-08-11
Correo	Radicación hoja de vida Coordinador de Proyecto temporal.	SGT-SDSCJ-653-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-08-14
Correo	Reporte de laboratorio de UPS del punto FVS-3214.	SGT-SDSCJ-654-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-08-15

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Informe de seguimiento semanal No. 43.	SGT-SDSCJ-655-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-08-15
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-628-23 Solicitud ingreso a las instalaciones C4”.	SGT-SDSCJ-656-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-08-15
Correo	Informe ingreso no autorizado a servidor de privados.	SGT-SDSCJ-657-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-08-15
Correo	Verificación de serial	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-08-15
Correo	Respuesta a correo enviado por etb 15 agosto 2023 con asunto" ETB -secretaria distrital de seguridad, convivencia y justicia || Bosa ||avance de caso 10648704	No aplica	ETB	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	2023-08-15
Correo	Solicitud de ingreso equipo Fortigate a C4.	SGT-SDSCJ-658-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-08-16
Correo	Solicitud aprobación formato Consolidado de Obras de Infraestructura (COI).	SGT-SDSCJ-659-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-08-16
Correo	Entrega de actas de seguimiento contractual de los meses de mayo, junio y julio de 2023.	SGT-SDSCJ-660-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-08-16
Correo	Solicitud permiso de ingreso a las instalaciones C4.	SGT-SDSCJ-661-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-08-17
Correo	Entrega informe quincenal No. 21.	SGT-SDSCJ-662-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-08-17
Correo	Cronograma autorizado para mantenimientos correctivos - 21/08/2023 a 27/08/2023	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-08-20
Correo	Informe de seguimiento semanal No. 44.	SGT-SDSCJ-663-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-08-22
Correo	Derecho de petición	No aplica	Congreso de la República de Colombia	Alcaldía de Bogotá	2023-08-24
Correo	Reiteración 1 al oficio “SGT-SDSCJ-383-23 Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-331-23 Reiteración 1 al oficio “ SDSCJ-250-23 Entrega de actas de seguimiento contractual mes de Enero de 2023”.	SGT-SDSCJ-664-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-08-25

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Reiteración 1 al oficio “SGT-SDSCJ-384-23 Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-333-23 Entrega de actas de seguimiento contractual del mes de febrero de 2023”.	SGT-SDSCJ-665-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-08-25
Correo	Reiteración 1 al oficio “SGT-SDSCJ-510-23 Entrega de actas de seguimiento contractual de los meses de marzo, abril y mayo de 2023”.	SGT-SDSCJ-666-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-08-25
Correo	Solicitud inclusión ítem no previsto bolsa de repuestos y solicitud de aprobación suministro e instalación de batería solar de 12V/200AH para los puntos de videovigilancia MTO-PTZ SCJ17FJ0021, SCJ18ESP00008_1 y ESU-201.	SGT-SDSCJ-667-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-08-25
Correo	Cámaras PTZ Bosch para cambio de repuestos y reparación en centro de servicios (25-08-2023).	SGT-SDSCJ-668-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-08-25
Correo	Cronograma aprobado por la supervisión - mantenimientos correctivos desde 28/08/2023 hasta 03/09/2023	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-08-26
Correo	Notificación del cambio de Documentador.	SGT-SDSCJ-669-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-08-28
Correo	Cámaras PTZ Bosch y Hanwha para cambio de repuestos y reparación en centro de servicios (29-08-2023).	SGT-SDSCJ-670-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-08-29
Correo	Solicitud de permisos para mantenimiento de sistemas integrados de videovigilancia al anillo vial de la Presidencia.	SGT-SDSCJ-671-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	2023-08-29
Correo	Duodécimo reporte de laboratorio, equipos en estado irreparable.	SGT-SDSCJ-672-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-08-29
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del Estadio Nemesio Camacho El Campín.	SGT-SDSCJ-673-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	ESTADIO NEMESIO CAMACHO EL CAMPÍN	2023-08-29
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del Centro de Traslado por Protección.	SGT-SDSCJ-674-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN	2023-08-29
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del Parque Metropolitano Simón Bolívar.	SGT-SDSCJ-675-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR	2023-08-29
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones de CAI´s y Estaciones de Policía.	SGT-SDSCJ-676-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - MEBOG	2023-08-29
Correo	Solicitud permisos de ingreso al Subsistema Integrado de Transmilenio.	SGT-SDSCJ-677-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	TRANSMILENIO S.A.	2023-08-29

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Solicitud de permisos de ingreso a las instalaciones de Comandos Operativos de Seguridad Ciudadana (COSEC).	SGT-SDSCJ-678-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - MEBOG	2023-08-29
Correo	Solicitud permiso de ingreso al Datacenter de C4 (Bomberos).	SGT-SDSCJ-679-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-08-29
Correo	Entrega del Plan de Comunicaciones V.07.	SGT-SDSCJ-680-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-08-29
Correo	Informe de seguimiento semanal No. 45.	SGT-SDSCJ-681-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-08-29
Correo	Concepto técnico generado por el laboratorio de Seguritech Colombia S.A.S de los equipos que en su reemplazo, se instalaron cámaras nuevas durante el mes de agosto de 2023.	SGT-SDSCJ-682-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-08-30
Correo	Puntos de videovigilancia identificados con falla de cámara.	SGT-SDSCJ-683-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-08-30
Correo	Solicitud de placas de almacén SDSCJ contrato 1932-2022.	SGT-SDSCJ-684-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-08-30
Correo	Solicitud de aprobación de suministro e instalación de disco duro interno marca Sata 1TB para la workstation de la Estación de policía de Modelia.	SGT-SDSCJ-685-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-08-31
Correo	Cronograma de visitas de diagnóstico a Cosec, EP, CAI, CTP y Estadio para el mes de septiembre.	SGT-SDSCJ-686-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-09-01
Correo	Entrega informe quincenal No. 22.	SGT-SDSCJ-687-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-09-01
Correo	Solicitud retiro infraestructura secretaria vigilancia av. 68 con 1 de mayo	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-09-01
Correo	Cronograma aprobado por la supervisión - mantenimientos correctivos desde 04/09/2023 hasta 10/09/2023	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-09-03
Correo	Respuesta solicitud cotización de equipos requeridos para cuatro (4) CAI.	SGT-SDSCJ-688-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-09-04

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Solicitud de entrada a almacén de la SDSCJ de los equipos instalados en el mes de julio de 2023 dentro del marco de la ejecución del contrato 1932-2022.	SGT-SDSCJ-689-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-09-04
Correo	Citación continuación audiencia proceso administrativo contractual	2-2023-69429	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-09-04
Correo	Informe de seguimiento semanal No. 46.	SGT-SDSCJ-690-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-09-05
Correo	Solicitud de permisos para mantenimiento de sistemas integrados de videovigilancia al anillo vial de la Presidencia.	SGT-SDSCJ-691-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	2023-09-06
Correo	Cámaras PTZ Bosch y Hanwha para cambio de repuestos y reparación en centro de servicios (04-09-2023).	SGT-SDSCJ-692-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-09-06
Correo	Solicitud aprobación formato Consolidado de Obras de Infraestructura (COI).	SGT-SDSCJ-693-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-09-06
Correo	Solicitud puesta en funcionamiento paneles solares centro de monitoreo Engativa	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-09-06
Correo	Resolución proceso contrato Nro. SCJ-1932-2022	Resolución N° 013 del 06 de septiembre de 2023	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-09-06
Correo	Plan de acción pérdida de ANS V.04.	SGT-SDSCJ-694-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-09-07
Correo	Entrega de usuario para el sistema de monitoreo y control (Citronella).	SGT-SDSCJ-695-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-09-07
Correo	Entrega de informe de gestión mensual de agosto de 2023.	SGT-SDSCJ-696-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-09-07
Correo	Alcance al oficio "SGT-SDSCJ-691-23 Solicitud de permisos para mantenimiento de sistemas integrados de videovigilancia al anillo vial de la Presidencia".	SGT-SDSCJ-697-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	2023-09-08
Correo	Observación sobre la obligación específica # 15 del informe mensual de agosto de 2023.	SGT-SDSCJ-698-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-09-11
Correo	Cámaras PTZ Bosch para cambio de repuestos y reparación en centro de servicios (11-09-2023).	SGT-SDSCJ-699-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-09-11

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Cronograma aprobado por la supervisión - mantenimientos correctivos desde 11/09/2023 hasta 17/09/2023	20230911-17	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-09-11
Correo	Reanudación de actividades Coordinador de Proyecto.	SGT-SDSCJ-700-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-09-13
Correo	Solicitud aprobación uso bolsa de repuesto para Estación de Policía TUNJUELITO	SGT-SDSCJ-701-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-09-13
Correo	Solicitud aprobación uso bolsa de repuesto para Estación de Policía MÁRTIRES.	SGT-SDSCJ-702-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-09-13
Correo	Solicitud aprobación uso bolsa de repuesto para Estación de Policía SAN CRISTÓBAL.	SGT-SDSCJ-703-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-09-13
Correo	Solicitud aprobación formato Consolidado de Obras de Infraestructura (COI).	SGT-SDSCJ-704-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-09-13
Correo	Informe de seguimiento semanal No. 47.	SGT-SDSCJ-705-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-09-14
Correo	Solicitud aprobación uso bolsa de repuesto para Estación de Policía ENGATIVÁ.	SGT-SDSCJ-706-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-09-14
Correo	Solicitud aprobación uso bolsa de repuesto para Estación de Policía SUBA.	SGT-SDSCJ-707-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-09-14
Correo	Segundo listado cámaras	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-09-14
Correo	Solicitud aprobación uso bolsa de repuestos para los centros de monitoreo.	SGT-SDSCJ-708-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-09-15
Correo	Solicitud aprobación de conversor de video para Estación de Policía TUNJUELITO.	SGT-SDSCJ-709-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-09-15
Correo	Respuesta a las observaciones del correo electrónico del día 06 de septiembre de 2023 - Entrega de informe de gestión mensual de julio de 2023 V.01.	SGT-SDSCJ-710-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-09-15
Correo	Cronograma aprobado por la supervisión - mantenimientos correctivos desde 18/09/2023 hasta 24/09/2023	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-09-17

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Notificación de no visita a las instalaciones de Comandos Operativos de Seguridad Ciudadana (COSEC).	SGT-SDSCJ-711-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - MEBOG	2023-09-18
Correo	Radicación de Factura de Servicios Julio 2023.	SGT-SDSCJ-712-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-09-18
Correo	Servicios ejecutados de mantenimiento preventivo sin carro canasta para la ponderación de calidad contemplado en la obligación específica # 39 del contrato en ejecución No. 1932-2022.	SGT-SDSCJ-713-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-09-18
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-682-23 Concepto técnico generado por el laboratorio de Seguritech Colombia S.A.S de los equipos que en su reemplazo, se instalaron cámaras nuevas durante el mes de agosto de 2023”.	SGT-SDSCJ-714-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-09-18
Correo	Informe de seguimiento semanal No. 48.	SGT-SDSCJ-715-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-09-18
Correo	Entrega informe quincenal No. 23.	SGT-SDSCJ-716-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-09-18
Correo	Respuesta al oficio “2-2023-51646 solicitud mantenimiento preventivo y diagnóstico cctv estaciones de policía”.	SGT-SDSCJ-717-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-09-18
Correo	Cámaras PTZ Bosch y Hanwha para cambio de repuestos y reparación en centro de servicios(19-09-2023).	SGT-SDSCJ-718-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-09-19
Correo	Solicitud retiro de estación de trabajo.	SGT-SDSCJ-719-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-09-20
Correo	Estado de servidor Pivot3 J11YHM0	SGT-SDSCJ-720-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-09-20
Correo	Solicitud de descarga de videos en el cai la aurora	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-09-20
Correo	Puntos de videovigilancia identificados con falla de cámara con corte al 20/09/2023.	SGT-SDSCJ-721-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-09-21
Correo	Solicitud de entrada a almacén de la SDSCJ de los equipos instalados en el mes de agosto de 2023 dentro del marco de la ejecución del contrato 1932-2022.	SGT-SDSCJ-722-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-09-22

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Cámaras PTZ Bosch para cambio de repuestos y reparación en centro de servicios (22-09-2023).	SGT-SDSCJ-723-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-09-22
Correo	Respuesta a las observaciones realizadas por el apoyo a la Supervisión mediante el correo electrónico del día 30 de agosto de 2023 - Entrega de actas de seguimiento contractual de los meses de mayo, junio y julio de 2023.	SGT-SDSCJ-724-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-09-25
Correo	Décimo tercer reporte de laboratorio, equipos en estado irreparable.	SGT-SDSCJ-725-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-09-25
Correo	Concepto técnico generado por el laboratorio de Seguritech Colombia S.A.S de los equipos que en su reemplazo, se instalaron cámaras nuevas durante el mes de septiembre de 2023 parte 1.	SGT-SDSCJ-726-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-09-25
Correo	Cronograma autorizado para mantenimientos correctivos - 25092023 a 30092023	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-09-25
Correo	Informe de seguimiento semanal No. 49.	SGT-SDSCJ-727-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-09-26
Correo	Servicios pendientes de validación con corte al 26 de septiembre de 2023.	SGT-SDSCJ-728-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-09-26
Correo	Reiteración 1 al oficio “SGT-SDSCJ-696-23 Entrega de informe de gestión mensual de agosto de 2023”.	SGT-SDSCJ-729-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-09-26
Correo	Solicitud a acceso y acompañamiento mcc	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-09-26
Correo	Solicitud aprobación formato Consolidado de Obras de Infraestructura (COI).	SGT-SDSCJ-730-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-09-27
Correo	vPG1 en estado crítico.	SGT-SDSCJ-731-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-09-27
Correo	vPGs en estado crítico.	SGT-SDSCJ-732-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-09-28
Correo	Solicitud de la mebog dios y patria buenos dias reportó novedad camara video-vigilancia	No aplica	MEBOG	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-09-28
Correo	SGT-SDSCJ-647-23 Reporte de vandalismo al punto SCJ17E170041 - Localidad La Candelaria	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-09-28

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Solicitud permiso de ingreso al Datacenter de C4 (Bomberos).	SGT-SDSCJ-733-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-09-29
Correo	Solicitud de permisos de ingreso a las instalaciones de Comandos Operativos de Seguridad Ciudadana (COSEC).	SGT-SDSCJ-734-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - MEBOG	2023-09-29
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones de CAI´s y Estaciones de Policía.	SGT-SDSCJ-735-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - MEBOG	2023-09-29
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del Centro de Traslado por Protección.	SGT-SDSCJ-736-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN	2023-09-29
Correo	Solicitud permisos de ingreso al Subsistema Integrado de Transmilenio.	SGT-SDSCJ-737-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	TRANSMILENIO S.A.	2023-09-29
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del Parque Metropolitano Simón Bolívar.	SGT-SDSCJ-738-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR	2023-09-29
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del Estadio Nemesio Camacho El Campín.	SGT-SDSCJ-739-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	ESTADIO NEMESIO CAMACHO EL CAMPÍN	2023-09-29
Correo	Cámaras PTZ Bosch y Hanwha para cambio de repuestos y reparación en centro de servicios (29-09-2023).	SGT-SDSCJ-740-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-09-29
Correo	RESPUESTA / SGT-SDSCJ-725-23	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-09-29
Correo	SGT-SDSCJ-738-23 Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del Parque Metropolitano Simón Bolívar.	No aplica	Parque Central Simòn Bolivar	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-09-29
Correo	Respuesta oficio SGT-SDSCJ-666-23 Reiteración 1 al oficio “SGT-SDSCJ-510-23	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-09-29
Correo	Respuesta a las observaciones del correo electrónico realizadas el 29 de septiembre de 2023 “(SGT-SDSCJ-725-23 Décimo tercer reporte de laboratorio, equipos en estado irreparable)”.	SGT-SDSCJ-741-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-10-02
Correo	Entrega informe quincenal No. 24.	SGT-SDSCJ-742-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-10-02
Correo	Cronograma autorizado para mantenimientos correctivos - 02102023 a 08102023	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-10-02
Correo	Cronograma de visitas de diagnóstico a Cosec, EP, CAI, CTP y Estadio para el mes de octubre.	SGT-SDSCJ-743-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-10-04
Correo	Radicación de Factura de Servicios Agosto 2023.	SGT-SDSCJ-744-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-10-04

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Solicitud costos optimización subsistema videovigilancia CTP-PUENTE_ARANDA	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-10-04
Correo	Respuesta a las observaciones del correo electrónico del día 01 de octubre de 2023 - Entrega de informe de gestión mensual de agosto de 2023 V.01.	SGT-SDSCJ-745-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-10-05
Correo	Solicitud de pago de las facturas correspondientes a los servicios prestados y repuestos suministrados en los meses de julio de 2023 y agosto de 2023, en el marco del contrato No.1932-2022.	SGT-SDSCJ-746-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-10-05
Correo	Concepto técnico generado por el laboratorio de Seguritech Colombia S.A.S de los equipos que en su reemplazo, se instalaron cámaras nuevas durante el mes de septiembre de 2023 parte 2.	SGT-SDSCJ-747-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-10-05
Correo	Informe de seguimiento semanal No. 50.	SGT-SDSCJ-748-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-10-05
Correo	SGT-SDSCJ-624-23 Reporte vandalismo en Centro de Traslado por Protección (CTP).	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-10-05
Correo	Acta de visita a campo emitida por la supervisión del décimo tercer reporte de laboratorio, equipos en estado irreparable.	SGT-SDSCJ-749-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-10-06
Correo	Entrega de informe de gestión mensual de septiembre de 2023.	SGT-SDSCJ-750-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-10-06
Correo	Cronograma autorizado para mantenimientos correctivos - 09/10/2023 a 15/10/2023	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-10-08
Correo	Informe de seguimiento semanal No. 51.	SGT-SDSCJ-751-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-10-09
Correo	Respuesta a las observaciones del correo electrónico del día 09 de octubre de 2023 - Entrega de informe de gestión mensual de agosto de 2023 V.02.	SGT-SDSCJ-752-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-10-09
Correo	RESPUESTA: SGT-SDSCJ-745-23	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-10-09
Correo	Soportes de la obligación específica # 15 de septiembre de 2023.	SGT-SDSCJ-753-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-10-11
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del Centro de Traslado por Protección.	SGT-SDSCJ-754-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN	2023-10-11

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Solicitud aprobación formato Consolidado de Obras de Infraestructura (COI).	SGT-SDSCJ-755-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-10-11
Correo	Urgente insumo consejo.	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-10-12
Correo	Cronograma autorizado para mantenimientos correctivos - 16/10/2023 a 22/10/2023.	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-10-15
Correo	Informe de seguimiento semanal No. 52.	SGT-SDSCJ-756-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-10-17
Correo	Entrega informe quincenal No. 25.	SGT-SDSCJ-757-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-10-17
Correo	Fallas asociadas a conectividad	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-10-18
Correo	RESPUESTA: SGT-SDSCJ-712-23 Radicación de Factura de Servicios Julio 2023.	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-10-19
Correo	SGT-SDSCJ-722-23 Solicitud de entrada a almacén de la SDSCJ de los equipos instalados en el mes de agosto de 2023 dentro del marco de la ejecución del contrato 1932-2022.	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-10-19
Correo	RESPUESTA SGT-SDSCJ-710-23 Respuesta a las observaciones del correo electrónico del día 06 de septiembre de 2023 - Entrega de informe de gestión mensual de julio de 2023 V.01.	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-10-19
Correo	SGT-SDSCJ-689-23 Solicitud de entrada a almacén de la SDSCJ de los equipos instalados en el mes de julio de 2023 dentro del marco de la ejecución del contrato 1932-2022.	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-10-19
Correo	SGT-SDSCJ-696-23 Entrega de informe de gestión mensual de agosto CTO 1032-2023.	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-10-19
Correo	SGT-SDSCJ-722-23 Solicitud de entrada a almacén de la SDSCJ de los equipos instalados en el mes de agosto de 2023 dentro del marco de la ejecución del contrato 1932-2022.	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-10-19
Correo	RV: HT-122089 - Solicitud documentos - caída de la cámara bosch de referencia DNP 5502 Z30 Y S/N 40447948202015008 Reclamo No: 68751 Caso Onbase No. 284252 Póliza todo riesgo daño material N° 1003797	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-10-19

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Solicitud de permisos para mantenimiento de sistemas integrados de videovigilancia al anillo vial de la Presidencia	SGT-SDSCJ-758-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	2023-10-20
Correo	Solicitud ingreso a las instalaciones C4	SGT-SDSCJ-759-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-10-20
Correo	Solicitud aprobación uso bolsa de repuesto para CAI´s.	SGT-SDSCJ-760-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-10-20
Correo	Actualización de servidores Pivot3.	SGT-SDSCJ-761-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-10-23
Correo	Informe de seguimiento semanal No. 53.	SGT-SDSCJ-762-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-10-23
Correo	Solicitud aprobación uso bolsa de repuesto para Estaciones de Policía.	SGT-SDSCJ-763-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-10-25
Correo	Décimo cuarto reporte de laboratorio, equipos en estado irreparable.	SGT-SDSCJ-764-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-10-26
Correo	Reporte siniestro punto ESU-045 localidad Ciudad Bolívar	SGT-SDSCJ-765-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-10-26
Correo	Reporte siniestro punto SCJ17E050019 localidad Ciudad Bolívar.	SGT-SDSCJ-766-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-10-26
Correo	SGT-SDSCJ-766-23 Reporte siniestro punto SCJ17E050019 localidad Ciudad Bolívar.	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-10-27
Correo	Plan de acción pérdida de ANS v05.	SGT-SDSCJ-767-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-10-30
Correo	Informe de seguimiento semanal No. 54.	SGT-SDSCJ-768-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-10-30
Correo	Respuesta - SGT-SDSCJ-762-23 Informe de seguimiento semanal No. 53.	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-10-30
Correo	Informes Pago 11 agosto 2023 CTO 1932-2022 para publicar en SECOP	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-10-30
Correo	Informes pago 10 JULIO 2023 CTO 1932-2022 PARA PUBLICAR EN SECOP	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-10-30

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Solicitud permiso de ingreso al Datacenter de C4 (Bomberos).	SGT-SDSCJ-769-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-10-31
Correo	Solicitud de permisos de ingreso a las instalaciones de Comandos Operativos de Seguridad Ciudadana (COSEC).	SGT-SDSCJ-770-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - MEBOG	2023-10-31
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones de CAI´s y Estaciones de Policía.	SGT-SDSCJ-771-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - MEBOG	2023-10-31
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del Centro de Traslado por Protección.	SGT-SDSCJ-772-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN	2023-10-31
Correo	Solicitud permisos de ingreso al Subsistema Integrado de Transmilenio.	SGT-SDSCJ-773-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	TRANSMILENIO S.A.	2023-10-31
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del Parque Metropolitano Simón Bolívar.	SGT-SDSCJ-774-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR	2023-10-31
Correo	Puntos de videovigilancia identificados con falla de cámara con corte al 31/10/2023.	SGT-SDSCJ-775-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-10-31
Correo	SGT-SDSCJ-773-23 Solicitud permisos de ingreso al Subsistema Integrado de Transmilenio.	No aplica	Transmilenio	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-10-31
Correo	Solicitud de placas de almacén SDSCJ contrato 1932-2022.	SGT-SDSCJ-776-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-11-01
Correo	Respuesta - SGT-SDSCJ-772-23 Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del Centro de Traslado por Protección.	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-11-01
Correo	Solicitud de entrada a almacén de la SDSCJ de los equipos instalados en el mes de septiembre de 2023 dentro del marco de la ejecución del contrato 1932-2022.	SGT-SDSCJ-777-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-11-02
Correo	Entrega informe quincenal No. 26.	SGT-SDSCJ-778-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-11-02
Correo	Décimo quinto reporte de laboratorio, equipos en estado irreparable.	SGT-SDSCJ-779-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-11-02
Correo	Solicitud de autorización de ventana de mantenimiento No. 9 para Datacenter - Sistema de videovigilancia de Bogotá D.C.	SGT-SDSCJ-780-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-11-02
Correo	Reporte siniestro punto SCJ17FJ0030 localidad Rafael Uribe Uribe.	SGT-SDSCJ-781-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-11-02

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Entrega de Diagramas Datacenter SVV Bogotá	SGT-SDSCJ-782-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-11-02
Correo	Solicitud - SGT-SDSCJ-777-23 Solicitud de entrada a almacén de la SDSCJ de los equipos instalados en el mes de septiembre de 2023 dentro del marco de la ejecución del contrato 1932-2022.	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-11-02
Correo	LIQUIDACIÓN PARA INDEMNIZACIÓN DEL SINIESTRO REPORTADO EN MEMORANDO SGT-SDSCJ-371-23 PUNTO VIDEOVIGILANCIA ESU-072.	2-2023-85370	Siniestros	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-11-02
Correo	LIQUIDACIÓN PARA INDEMNIZACIÓN DEL SINIESTRO REPORTADO EN MEMORANDO SGT-SDSCJ-436-23 PUNTO VIDEOVIGILANCIA ESU-117.	2-2023-85371	Siniestros	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-11-02
Correo	LIQUIDACIÓN PARA INDEMNIZACIÓN DEL SINIESTRO REPORTADO EN MEMORANDO SGT-SDSCJ-610-23 Y 646-23 PUNTO VIDEOVIGILANCIA FVS 3214.	2-2023-85373	Siniestros	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-11-02
Correo	LIQUIDACIÓN PARA INDEMNIZACIÓN DEL SINIESTRO REPORTADO EN MEMORANDO SGT-SDSCJ-417-23 PUNTO VIDEOVIGILANCIA SCJ17E190077	2-2023-85372	Siniestros	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-11-02
Correo	Radicación de Factura de Servicios Septiembre 2023.	SGT-SDSCJ-783-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-11-03
Correo	SGT-SDSCJ-780-23 Solicitud de autorización de ventana de mantenimiento No. 9 para Datacenter - Sistema de videovigilancia de Bogotá D.C	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-11-04
Correo	Observaciones al informe mensual de septiembre - SGT-SDSCJ-750-23 1932-2022	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-11-06
Correo	Cronograma autorizado para mantenimientos correctivos - 06/11/2023 a 12/11/2023	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-11-06
Correo	Proactivo SSCJ CAV30CI1034772 DOWN // 12120482	No aplica	ETB	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-11-06
Correo	Reporte siniestros para conciliación	No aplica	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-11-07

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Entrega de informe de gestión mensual de octubre de 2023.	SGT-SDSCJ-784-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-11-08
Correo	RE: PROACTIVO SSCJ CAV3000004074 DOWN // 12141888	No aplica	ETB	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-11-08
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-685-23 Solicitud de aprobación de suministro e instalación de disco duro interno marca Sata 1TB para la workstation de la Estación de policía de Modelia”	SGT-SDSCJ-785-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-11-09
Correo	Informe de seguimiento semanal No. 55.	SGT-SDSCJ-786-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-11-09
Correo	Observación sobre la obligación específica # 15 del informe mensual de octubre de 2023.	SGT-SDSCJ-787-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-11-09
Correo	Caida SUPER CADE 20 DE JULIO | caso etb: 12174440	No aplica	ETB	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-11-09
Correo	Cotización puntos de red para puesto de trabajo en sala SOAR ubicado en el C4 - CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO.	SGT-SDSCJ-788-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-11-10
Correo	Indemnización siniestro SCJ17E050069 por $40.935.473	No aplica	secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-11-10
Correo	Informe de seguimiento semanal No. 56.	SGT-SDSCJ-789-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-11-14
Correo	Décimo sexto reporte de laboratorio, equipos en estado irreparable.	SGT-SDSCJ-790-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-11-14
Correo	Respuesta a las observaciones del correo electrónico del día 06 de noviembre de 2023 - Entrega de informe de gestión mensual de septiembre de 2023 V.01	SGT-SDSCJ-791-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-11-14
Correo	PROACTIVO SSCJ CAV30CI1028097 DOWN // 12203633	No aplica	ETB	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-11-14
Correo	Solicitud aprobación formato Consolidado de Obras de Infraestructura (COI).	SGT-SDSCJ-792-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-11-15
Correo	Solicitud ingreso a las instalaciones C4.	SGT-SDSCJ-793-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-11-15

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Cotización de baterías para sistema fotovoltaico.	SGT-SDSCJ-794-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-11-16
Correo	Respuesta - SGT-SDSCJ-660-23 Entrega de actas de seguimiento contractual de los meses de mayo, junio y julio de 2023.	No aplica	secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-11-16
Correo	Informe de seguimiento semanal No. 57.	SGT-SDSCJ-795-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-11-20
Correo	Entrega informe quincenal No. 27.	SGT-SDSCJ-796-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-11-20
Correo	RV: Requerimiento - elementos retirados de la bodega del almacén- contrato 1932-2022	No aplica	secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-11-20
Correo	Décimo séptimo reporte de laboratorio, equipos en estado irreparable.	SGT-SDSCJ-797-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-11-21
Correo	Solicitud aprobación de repuestos para puesta en funcionamiento de los trailers ESU-207 y ESU-209.	SGT-SDSCJ-798-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-11-21
Correo	Comunicación Oficial N° 2-2023-91412	No aplica	secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-11-21
Correo	LIQUIDACIÓN PARA INDEMNIZACIÓN DEL SINIESTRO REPORTADO EN MEMORANDOS SGT-SDSCJ-139-2022 Y 418-2023 PUNTO VIDEOVIGILANCIA SCJ17E050069.	2-2023-91412	Siniestros	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-11-21
Correo	Solicitud aprobación uso bolsa de repuestos para centro de monitoreo Teusaquillo.	SGT-SDSCJ-799-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-11-22
Correo	Solicitud aprobación formato Consolidado de Obras de Infraestructura (COI).	SGT-SDSCJ-800-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-11-22
Correo	Solicitud copia actas de reunión	No aplica	secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-11-22
Correo	PCP-AP-SDSCJ-01 Plan de Migración de Entrega.	SGT-SDSCJ-801-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-11-27
Correo	Informe de seguimiento semanal No. 58.	SGT-SDSCJ-802-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-11-27
Correo	RV: Respuesta - SGT-SDSCJ-784-23 Entrega de informe de gestión mensual de octubre de 2023.	No aplica	secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-11-27

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Fwd: 20236100278821 - Respuesta radicado IDRD 20232100367832 del 1 de Noviembre 2023 - Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del Parque Metropolitano Simón Bolívar	No aplica	IDRD	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-11-27
Correo	Respuesta al correo del 22 de noviembre - Solicitud copia actas de reunión.	SGT-SDSCJ-803-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-11-28
Correo	Comunicación Oficial N° 2-2023-92134	No aplica	secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-11-28
Correo	Solicitud permiso de ingreso al Datacenter de C4 (Bomberos).	SGT-SDSCJ-804-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-11-29
Correo	Solicitud de permisos de ingreso a las instalaciones de Comandos Operativos de Seguridad Ciudadana (COSEC).	SGT-SDSCJ-805-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-11-29
Correo	Alcance al oficio " SGT-SDSCJ-181-22 Reporte vandalismo Estación Ricaurte Calle 13 - Transmilenio.	SGT-SDSCJ-806-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-11-29
Correo	Alcance al oficio "SGT-SDSCJ-185-22 Reporte de cámaras vandalizadas en Centros de Atención Inmediata (CAI)."	SGT-SDSCJ-807-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-11-29
Correo	Alcance al oficio " SGT-SDSCJ-187-22 Reporte vandalismo Estación Américas - Transmilenio."	SGT-SDSCJ-808-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-11-29
Correo	Décimo octavo reporte de laboratorio, equipos en estado irreparable.	SGT-SDSCJ-809-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-11-29
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones de CAI´s y Estaciones de Policía.	SGT-SDSCJ-810-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - MEBOG	2023-11-29
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del Centro de Traslado por Protección.	SGT-SDSCJ-811-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN	2023-11-29
Correo	Solicitud permisos de ingreso al Subsistema Integrado de Transmilenio.	SGT-SDSCJ-812-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	TRANSMILENIO S.A.	2023-11-29
Correo	Solicitud permisos de ingreso a las instalaciones del Parque Metropolitano Simón Bolívar.	SGT-SDSCJ-813-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR	2023-11-29
Correo	Solicitud ingreso de equipos de mesa de servicios al C4.	SGT-SDSCJ-814-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-11-30
Correo	Solicitud de entrada a almacén de la SDSCJ de los equipos instalados en el mes de octubre de 2023 dentro del marco de la ejecución del contrato 1932-2022.	SGT-SDSCJ-815-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-11-30

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Radicación de Factura de Servicios octubre 2023.	SGT-SDSCJ-816-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-11-30
Correo	LIQUIDACIÓN PARA INDEMNIZACIÓN DEL SINIESTRO REPORTADO EN MEMORANDO SGT-SDSCJ-563-23 PUNTO VIDEOVIGILANCIA CCEL19_0025 LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR.	2-2023-92637	Siniestros	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-11-30
Correo	Comunicación Oficial N° 2-2023-92637 (4-72)	No aplica	secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-11-30
Correo	Solicitud autorización de salida de Datacenter UAECOB para servidor Zabbix perteneciente a Seguritech Colombia SAS .	SGT-SDSCJ-817-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-12-01
Correo	Solicitud de salida de equipos de mesa de servicios al C4.	SGT-SDSCJ-818-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-12-01
Correo	Informe de seguimiento semanal No. 59.	SGT-SDSCJ-819-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-12-04
Correo	Entrega informe quincenal No. 28.	SGT-SDSCJ-820-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-12-04
Correo	Respuesta a las observaciones del correo electrónico-SGT-SDSCJ-784-23 Entrega de informe de gestión mensual de octubre de 2023.	SGT-SDSCJ-821-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-12-05
Correo	Décimo noveno reporte de laboratorio, equipos en estado irreparable.	SGT-SDSCJ-822-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-12-07
Correo	Vigésimo reporte de laboratorio, equipos en buen estado y posible reparación.	SGT-SDSCJ-823-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-12-07
Correo	Alcance al oficio “SGT-SDSCJ-822-23 Décimo noveno reporte de laboratorio, equipos en estado irreparable”.	SGT-SDSCJ-824-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-12-07
Correo	Entrega de informe de gestión mensual de noviembre de 2023.	SGT-SDSCJ-825-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-12-07
Correo	Soportes de la obligación específica # 15 de noviembre de 2023.	SGT-SDSCJ-826-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-12-11

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Solicitud de entrada a almacén de la SDSCJ de los equipos instalados en el mes de noviembre de 2023 dentro del marco de la ejecución del contrato 1932-2022.	SGT-SDSCJ-827-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-12-11
Correo	Entrega de informe de gestión mensual de diciembre de 2023.	SGT-SDSCJ-828-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-12-11
Correo	Entrega de informe final.	SGT-SDSCJ-829-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-12-13
Correo	Radicado SINPROC 422566 de 2023	2023-EE-0692631	Personería de Bogotá	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-12-13
Correo	Respuesta a las observaciones del correo electrónico recibido el 14 de diciembre de 2023 “SGT-SDSCJ-825-23 Entrega de informe de gestión mensual de noviembre de 2023.”	SGT-SDSCJ-830-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-12-14
Correo	Reintegro del equipo de MEBOG.	SGT-SDSCJ-831-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ / MEBOG	2023-12-15
Correo	SOLICITUD DE INFORMACIÓN "CÁMARAS DE SEGURIDAD"	2023-EE-0692793	secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	2023-12-18
Correo	Entrega de credenciales Datacenter SVV Bogotá.	SGT-SDSCJ-832-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-12-19
Correo	Vigésimo primer reporte de laboratorio, equipos en buen estado y posible reparación.	SGT-SDSCJ-833-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-12-20
Correo	Vigésimo segundo reporte de laboratorio, equipos en buen estado almacén secretaria.	SGT-SDSCJ-834-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-12-20
Correo	Radicación de Factura de Servicios noviembre 2023.	SGT-SDSCJ-835-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-12-21
Correo	Respuesta al oficio 2-2023-92637 "Liquidación para indemnización del siniestro reportado en memorando SGT-SDSCJ 563-23 punto videovigilancia CCEL19_0025 LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR."	SGT-SDSCJ-836-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-12-21
Correo	Respuesta al oficio 2-2023-91412 "Liquidación para indemnización del siniestro reportado en memorandos SGT-SDSCJ 139-2022 y 418-2023 punto videovigilancia SCJ17E050069."	SGT-SDSCJ-837-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-12-21

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Respuesta al oficio 2-2023-85373 "Liquidación para indemnización del siniestro reportado en memorandos SGT-SDSCJ 610-23 y 646-23 punto videovigilancia FVS 3214."	SGT-SDSCJ-838-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-12-21
Correo	Respuesta al oficio 2-2023-85372 "Liquidación para indemnización del siniestro reportado en memorando SGT-SDSCJ 417-23 punto videovigilancia SCJ17E190077."	SGT-SDSCJ-839-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-12-21
Correo	Respuesta al oficio 2-2023-85371 "Liquidación para indemnización del siniestro reportado en memorando SGT-SDSCJ 436-23 punto videovigilancia ESU-117."	SGT-SDSCJ-840-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-12-21
Correo	Respuesta al oficio 2-2023-85370 "Liquidación para indemnización del siniestro reportado en memorando SGT-SDSCJ 371-23 punto videovigilancia ESU-072."	SGT-SDSCJ-841-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-12-21
Correo	Cámaras reparadas en estado operativo para entrega.	SGT-SDSCJ-842-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-12-26
Correo	Respuesta al correo del 18 de diciembre 2023 con asunto “Solicitud de información Seguritech”.	SGT-SDSCJ-843-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-12-27
Correo	Cámaras Axis tramitadas por garantía.	SGT-SDSCJ-844-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2023-12-27
Correo	Respuesta a la solicitud del correo electrónico del día 11 de enero de 2043 - Solicitud información para empalme contrato mantenimiento videovigilancia.	SGT-SDSCJ-845-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2024-01-16
Correo	Entrega de equipos de ETB.	SGT-SDSCJ-846-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2024-01-17
Correo	Entrega de equipos de ETB.	SGT-SDSCJ-847-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2024-01-17
Correo	Solicitud de entrada a almacén de la SDSCJ de los equipos instalados en el mes de diciembre de 2023 dentro del marco de la ejecución del contrato 1932-2022.	SGT-SDSCJ-848-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2024-02-06
Correo	Reporte de atención a siniestro del punto de videovigilancia SCJ17E190077.	SGT-SDSCJ-849-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2024-02-08

Medio	Asunto	Código	Quien genera el documento	Dirigido a	Fecha
Correo	Reporte de atención a siniestro del punto de videovigilancia CCEL19_0025.	SGT-SDSCJ-850-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2024-02-09
Correo	Respuesta correo electrónico con solicitud de reinstalación de cámaras reparadas por parte de la SDSCJ.	SGT-SDSCJ-851-23	SEGURITECH COLOMBIA S.A.S	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)	2024-02-09

Tabla 9. Comunicaciones internas y externas

22. Novedades en las facturas

Durante el proceso de verificación de facturas del contrato, se evidenció que en el mes de abril la factura FES46 presentó una imprecisión en la descripción de los servicios objeto de facturación del periodo.

Se informa que los valores facturados no presentan errores tal y como son contemplados en la bolsa de repuestos. Lo anterior puede ser corroborado en el documento publicado en SECOP II *07. Informe de Supervisión abril* en la conciliación financiera contenida en el "*documento financiera pago 7 abril 2023 cto 1932-2022 mantenimiento svv*" de la página 20 a la 24, con la cual la Supervisión aprobó los montos correspondientes a los servicios efectivamente prestados en el mes de abril de 2023, así como en el "documentos jurídica pago 7 abril 2023 cto 1932-2022 mantenimiento svv", en el capítulo *8. Informe de visitas ejecutadas*, página 78 a la 83 en donde se encuentra la relación de los 192 servicios de ptz facturados en el mes de abril de 2023 en detalle, así como en el capítulo *9. Informe de bienes y servicios utilizados*, 9.2 consolidados servicios ejecutados la consolidación de estos, como se muestra en la imagen.

9.2. Consolidado Servicios Ejecutados

Servicios Ejecutados - Abril 2023				
Descripcion de Servicios Ejecutados	Cantidad	Valor Unitario sin Iva	Valor Unitario con Iva	Valor Total
SUBSISTEMA CIUDADANOS - Visita de Mantenimiento Correctivo por punto CON CARRO CANASTA	192	$1.710.800	$2.035.852	$390.883.584
SUBSISTEMA CTP-EP - Visita de Mantenimiento Correctivo por punto SIN CARRO CANASTA	1	$1.011.700	$1.203.923	$1.203.923
SUBSISTEMA CAI - Visita de Mantenimiento Correctivo por punto SIN CARRO CANASTA	7	$876.700	$1.043.273	$7.302.911
SUBSISTEMA CIUDADANOS - Limpiezas de acrilico	22	$648.000	$771.120	$16.964.640
Diagnósticos, Administración y Soporte	1	$99.680.700	$118.620.033	$118.620.033
Total Servicios Abril 2023				$534.975.091

Fuente: Informe pago 7 SECOPII. Informe mensual

De lo anterior resulta, un error de digitación en la mencionada factura, dado que el ítem 1 corresponde al servicio "subsistema ciudadano – visita de mantenimiento correctivo por punto con carro canasta" y él ítem 5 hace referencia a "diagnóstico, administración y soporte" conforme a los valores descritos en el anexo 2 – bolsa de repuestos.

23. Cumplimiento de aspectos SST

- **Accidentalidad:** Durante el periodo de desarrollo del proyecto, no se registraron accidentes de trabajo. Este logro refleja el compromiso y la eficacia de las medidas implementadas en el marco de la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). La ausencia de accidentes laborales es un testimonio del enfoque proactivo adoptado para mitigar riesgos y promover un entorno de trabajo seguro. Se implementaron rigurosos protocolos de seguridad, se proporcionó el equipo de protección personal necesario, y se llevaron a cabo inspecciones regulares para identificar y abordar posibles peligros; estas medidas de control se presentan a continuación.

- **Plan de inspecciones:** Se llevaron a cabo de manera exhaustiva todos los procesos de inspecciones de seguridad programadas a lo largo del desarrollo del proyecto. Estas inspecciones abordaron diversos aspectos del entorno laboral, contribuyendo significativamente al mantenimiento de un ambiente de trabajo seguro y libre de riesgos. Las inspecciones se realizaron regularmente, evaluando la efectividad de las medidas de seguridad implementadas y abordando áreas críticas. Cada inspección tuvo como objetivo identificar posibles peligros, verificar el cumplimiento de protocolos de seguridad y proponer mejoras continuas.

- **Plan de capacitaciones:** Se implementó un programa integral de capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Estas sesiones formativas abordaron una variedad de temas cruciales para la prevención de riesgos laborales y el fomento de un entorno de trabajo seguro. Se logró una participación significativa, con más del 97% de los empleados asistiendo a las capacitaciones programadas. Estas sesiones incluyeron instrucciones detalladas sobre el uso adecuado del equipo de protección personal, identificación de riesgos, procedimientos de emergencia y otras prácticas de seguridad relevantes.

  La retroalimentación recibida de los participantes indicó un alto nivel de satisfacción y comprensión de los conceptos presentados. Además, se llevaron a cabo evaluaciones para medir la eficacia de las capacitaciones, asegurando que los conocimientos adquiridos se asimilen de manera efectiva.

- **Equipos de protección personal y protección contra caídas:** Se desarrollaron rigurosamente políticas y procedimientos para asegurar el uso adecuado de Equipos de Protección Personal (EPP). Se proporcionaron EPP, como cascos, gafas de seguridad, guantes y calzado de seguridad, de acuerdo con la naturaleza específica de las tareas y los riesgos asociados. Garantizamos una distribución eficiente de estos equipos, asegurando que cada miembro del equipo tuviera acceso al equipo necesario y estuviera debidamente capacitado en su uso correcto. Además, se realizaron inspecciones regulares de EPP para asegurar su estado óptimo, reemplazando cualquier equipo desgastado o dañado.

  En el ámbito de la protección contra caídas, implementamos medidas específicas para tareas en altura. Se utilizaron sistemas de protección contra caídas, como arneses y eslingas, según la evaluación de riesgos correspondiente. Realizamos inspecciones periódicas de estos sistemas para garantizar su funcionalidad y seguridad. También proporcionamos capacitación especializada sobre el uso adecuado de equipos de protección contra caídas, reforzando las prácticas seguras en trabajos en alturas.

La efectividad de estas medidas se evidencia en la ausencia de incidentes relacionados con la falta de EPP o caídas durante el proyecto. La cultura de seguridad fomentada en el equipo contribuyó a la aceptación y adhesión activa a estas prácticas, asegurando un entorno de trabajo donde la prevención de riesgos fue una prioridad constante.

- **Comunicaciones SST:** Se estableció un sistema efectivo de comunicación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), desempeñando un papel fundamental en la promoción de una cultura de seguridad entre todos los miembros del equipo. Se llevaron a cabo reuniones regulares para difundir información relevante sobre prácticas seguras, cambios en los procedimientos de seguridad y cualquier otra actualización pertinente en el ámbito de la SST. Estas reuniones permitieron un diálogo abierto donde los empleados tuvieron la oportunidad de plantear preguntas, expresar inquietudes y contribuir con sus observaciones.

  Además, se implementaron comunicados periódicos, paneles y pantallas informativas en áreas clave, proporcionando recordatorios visuales sobre protocolos de seguridad, ubicación de equipos de primeros auxilios y salidas de emergencia. Esta estrategia visual reforzó constantemente los principios de seguridad en el entorno laboral.

- **Cumplimiento de objetivos:** Se logró un cumplimiento integral de los objetivos establecidos en el ámbito de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Los objetivos planteados al inicio fueron alcanzados de manera satisfactoria, evidenciando el compromiso constante con la seguridad laboral. Uno de los principales objetivos fue la prevención de accidentes de trabajo, se destaca que, a lo largo del proyecto, no se registró ningún incidente de esta naturaleza. Este logro resalta la efectividad de las medidas preventivas implementadas y la dedicación del equipo para mantener un entorno laboral seguro.

  Asimismo, se cumplió con la meta de mantener un alto nivel de cumplimiento de las normativas y regulaciones en materia de SST. Se llevaron a cabo auditorías internas y se realizaron seguimientos regulares para garantizar que todas las prácticas estuvieran alineadas con los estándares requeridos, resultando en un cumplimiento continuo a lo largo del proyecto.

  El cumplimiento de objetivos en SST no solo se mide en términos de estadísticas, sino también en la creación y mantenimiento de una cultura de seguridad arraigada. La participación activa del personal, la comunicación efectiva y la adaptabilidad a los cambios contribuyeron al éxito general en la consecución de los objetivos propuestos.

24. Conclusiones y recomendaciones

- Ejecución de Servicios de Mantenimiento:

  Nos permitimos recomendar, la ejecución de mantenimientos preventivos periódicos, a los diferentes subsistemas del proyecto de videovigilancia, con el fin de disminuir las tasas de falla del sistema. Este enfoque proactivo, permite reducir los costos operativos, minimizar el tiempo de inactividad y mejorar la confiabilidad y la eficiencia general del sistema.

- Reparaciones por Mes y Marca de Cámaras:

  Las reparaciones por mes varían significativamente, mostrando fluctuaciones en la necesidad de reparación tanto para las cámaras de marca HANWHA como para las de marca BOSCH.

Se destaca que en los meses con mayor instalación de cámaras reparadas, hay una significativa mejora en el estado del sistema.

- Instalación de Cámaras y UPS:

  Hubo una instalación importante de cámaras y UPS durante ambas vigencias (2022-2023). Estas instalaciones son fundamentales para mantener y mejorar el estado del sistema. No se observa un patrón estacional claro en la instalación de equipos, dado posiblemente a que la mayoría de estos equipos están cumpliendo con su ciclo de vida útil. En este aspecto, es importante considerar que no se han ejecutado proyectos con adquisición de equipos nuevos, con lo que es posible hacer la reposición de los equipos obsoletos.

- Escalamientos a Terceros:

  El registro de escalamientos a terceros, específicamente a entidades como ETB y ENEL, revela un patrón dinámico a lo largo de los meses. Este fenómeno afecta fuertemente la operación del sistema de videovigilancia. Esto sugiere la presencia de problemas técnicos que requieren recursos que no son responsabilidad directa del contratista de mantenimiento.

  El hecho de que el número de escalamientos varíe a lo largo del tiempo sugiere que la naturaleza de los problemas encontrados también varía, lo que subraya la importancia de mantener una colaboración estrecha y efectiva con estos contratistas (ENEL-ETB), coordinada por la supervisión del contrato. Esta colaboración no solo implica la resolución de problemas técnicos específicos, sino también la identificación de áreas de mejora en el sistema y la implementación de soluciones preventivas para evitar la recurrencia de problemas similares en el futuro.

  El análisis de los escalamientos a terceros ofrece una visión significativa de la complejidad operativa del sistema, la naturaleza de los problemas encontrados y la necesidad de colaboración efectiva con proveedores externos para garantizar su resolución y mejorar continuamente la eficiencia y confiabilidad del sistema en su conjunto.

- Comportamiento del Estado del Sistema:

  Aunque la cantidad de cámaras operativas se mantiene en niveles aceptables, se observa una tendencia al aumento en el número de cámaras fuera de servicio en los últimos meses de 2023. Se recomienda el monitoreo constante de la red, con el propósito de realizar las alertas pertinentes, de acuerdo con su responsabilidad.

25. Histórico de cambios

Ver.	Fecha	Descripción del cambio
00	13-diciembre-2023	Creación de documento.
01	11-marzo-2024	Actualización informe final
02	23-julio-2024	Actualización informe final

26. Cuadro de aprobación

Elaboró	Revisó	Aprobó
 Olga Lucía Peña Riveros **Coordinador Mesa de Servicio**	 Elisabeth Ramírez Martin **Coordinadora de Operaciones**	 Jorge Alexander Reyes **Director de Operaciones**
Fecha: 23-julio-2024	Fecha: 23-julio-2024	Fecha: 23-julio-2024
