DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
NIT. 891.800.466-4
ALCALDÍA

EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - E.A.E.P.

PROYECTO:	"ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, BOYACA"
LOCALIZACIÓN :	ZONA URBANA MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CAPÍTULO:	4,00	ESTRUCTURAS EN CONCRETOS-MORTEROS Y PAÑETES
ÍTEM:	4,01	SUMINISTRO E INSTALACION BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO (ACARREO LIBRE DE 10km)


									UNIDAD	**m3**
DESCRIPCIÓN	**LONGITUD**	**ANCHO**	**ALTURA**	**ÁREA**	**VOLUMEN**	**BARRA O ELEMENTO**	**MASA**	**ELEMENTOS**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
	m	**m**	**m**	**m²**	**m³**	**Tipo**	**Kg/m**	**#**		
GQ 1	76,35	0,10	0,20		1,53				1,00	1,53
GQ 2	44,60	0,10	0,20		0,89				1,00	0,89
GQ 3	16,00	0,10	0,20		0,32				1,00	0,32
GQ 4	24,30	0,10	0,20		0,49				1,00	0,49
GQ 5	20,20	0,10	0,20		0,40				1,00	0,40
GQ 6	122,80	0,10	0,20		2,46				1,00	2,46
GQ 7	76,50	0,10	0,20		1,53				1,00	1,53
GQ 8	27,90	0,10	0,20		0,56				1,00	0,56
AN 1	22,20	0,10	0,20		0,44				1,00	0,44
AN 2	15,60	0,10	0,20		0,31				1,00	0,31
PAB JUEGOS	33,85	0,10	0,20		0,68				1,00	0,68
LONGITUD TOTAL	480,30									
									TOTAL	**9,61**


OBSERVACIONES:


MEMORIA GRÁFICA


CAPÍTULO:	4,00	ESTRUCTURAS EN CONCRETOS-MORTEROS Y PAÑETES
ÍTEM:	4,0	SUMINISTRO E INSTALACION BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO (ACARREO LIBRE DE 10km)

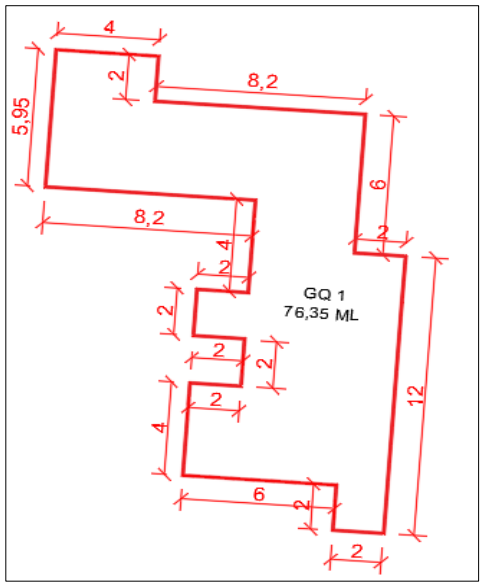











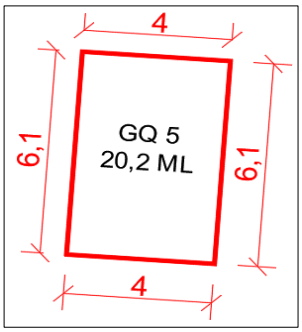


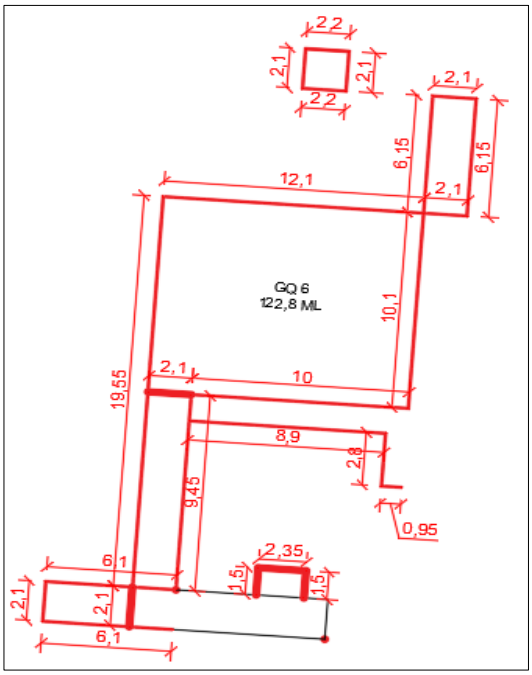

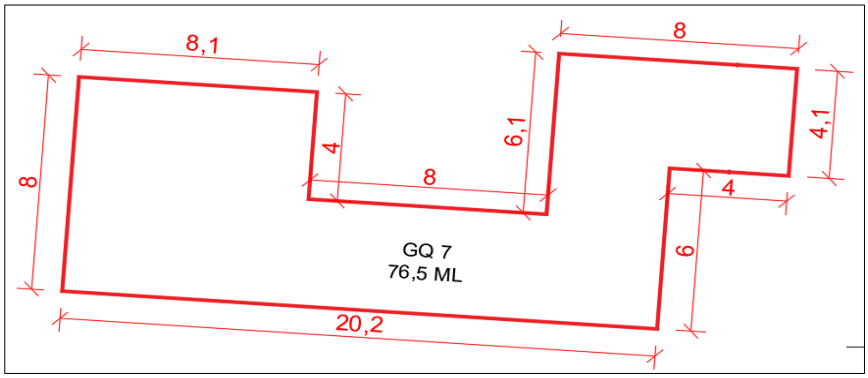

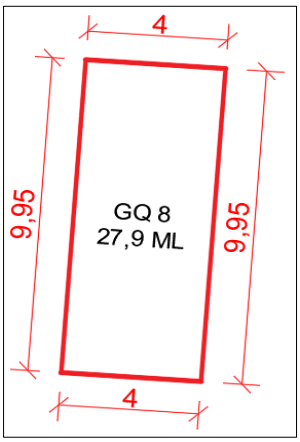




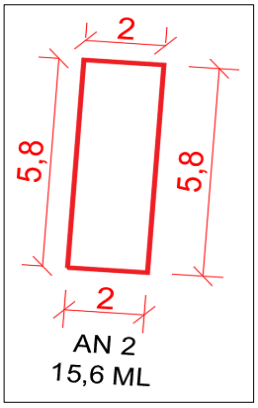



CAPÍTULO:	4,00	ESTRUCTURAS EN CONCRETOS-MORTEROS Y PAÑETES
ÍTEM:	4,0	SUMINISTRO E INSTALACION BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO (ACARREO LIBRE DE 10km)

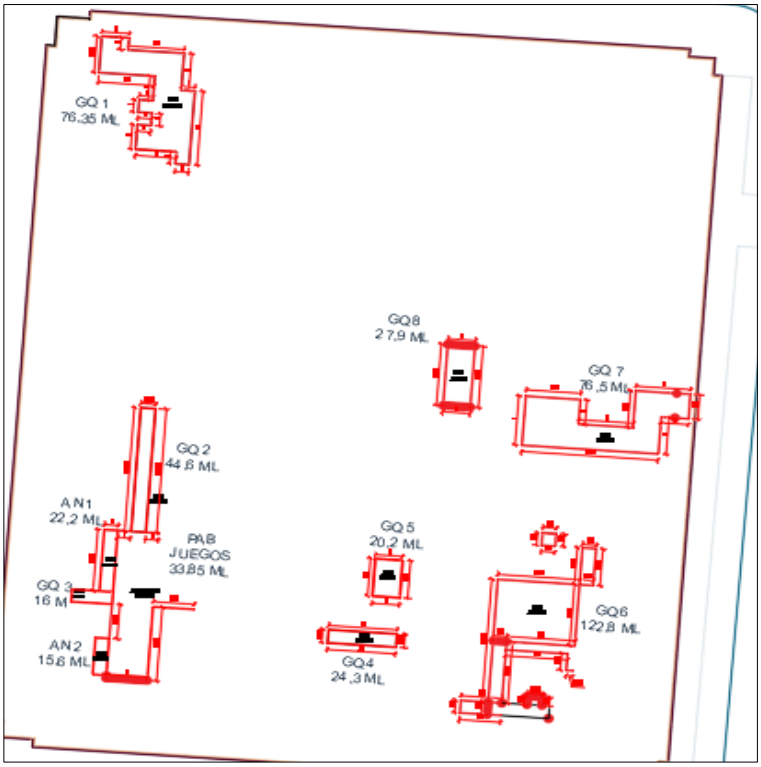

PLANO DE LOCALIZACION

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CAPÍTULO:	4,00	ESTRUCTURAS EN CONCRETOS-MORTEROS Y PAÑETES
ÍTEM:	4,01	SUMINISTRO E INSTALACION BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO (ACARREO LIBRE DE 10km)







OBSERVACIONES:

		VALIDO PARA PARCIAL 1 CONTRATO IP-002-2025
ERNESTO DAVID MEZA ERAZO	JUAN PABLO SALAZAR SALAZAR	ANNGY MILENA URIBE CIRO
RESIDENTE DE OBRA	SECRETARIO DE OBRAS PÙBLICAS	REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - E.A.E.P.
GPM MANTENIMIENTO Y MONTAJES S.A.S	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÀ	ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS - SUPERVISIÓN
ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
