PARQUES MARGARITAS.

COP 7470-2024.

OBJETO: "EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LOS PARQUES DE PROPIEDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."

CONTRATISTA: CONSORCIO USAQUÉN 005 2024.

INTERVENTOR: R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍA SAS.

DIRECTOR DE OBRA: MARCOS VARGAS.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. MARGARITA GÓMEZ.

RESIDENTE DE OBRA: DANIEL CAMARGO CORREA.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA: ING. ESPERANZA CASTAÑEDA.

Lunes 16 de Junio del 2025

Personal obra: 1 oficial - 3 ayudantes

ACTIVIDADES: Se inicia instalando cerramiento provisional de obra (Lona verde/Peligro)

- Se inicia demolicion de manual de sendero peatonal en concreto ubicado al costado oriental del parque. Se evidencia que el anden existente "Sendero concreto" no presentaba estructura "recebo", dicho sendero estaba construido sobre tierra negra.

Nicolas Ch - Int

Martes 17 de Junio del 2025

Personal obra: 1 oficial - 3 ayudantes

ACTIVIDADES: Se continua con la demolicion manual de sendero existente ubicado al costado oriental

- Se inicia excavacion para sendero peatonal, debido a la carencia de recebo, se realiza mejoramiento de terreno con rajon recebado



Nicolas Ch - Int


Norma
Norma
Powered by CamScanner

Miercoles 18 de Junio del 2025

Personal obra: 1 oficial - 3 ayudantes

ACTIVIDADES: Se finaliza excavacion en sendero del costado oriental del parque

- Se inicia instalacion de rejon para mejoramiento de terreno en sendero peatonal



Jueves 19 de Junio del 2025

Personal obra: 1 oficial - 3 ayudantes - 1 operario maquina

MAQUINARIA = Vibro compactador

ACTIVIDADES: Se inicia instalacion de sub base granular en sendero peatonal del costado oriental:


- Se instala Geotextil Tejido sobre el suelo.

Viernes 20/06/2025.

Personal: 1 Of.

Actividades: - Traslado de material de demolicion a punto de acopio.

- En comité de obra la entidad solicita ampliar el tramo de intervención 12m hacia el oriente:

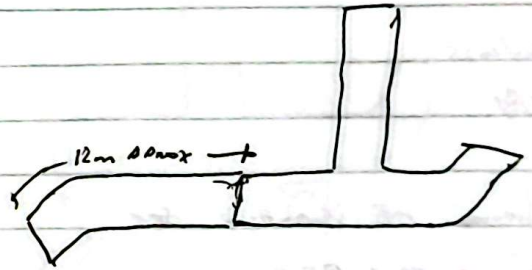


Martes 24/06/2025.

Personal: 1 Of + 2 Ay.

Clima: Lluvia en la tarde.

Actividades: - Instalación de testigos en pruebas fallido por fundir en el costado oriental.

- Instalación de Bordillo para confinar sendero cerca árbol existente y poder nivelar la intervención:

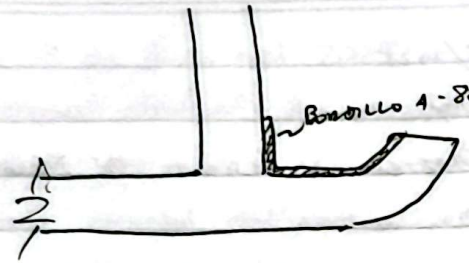

Nicolas Ch - Int

Miércoles 25/06/2025.


Personal: 1 of. + 3 Ay.

Clima:

Actividades: - Instalación de Sumidero 586.

- Corte e instalación de malla electrosoldada.

- Se inicia fundido en concreto de sendero peatonal en el costado sur

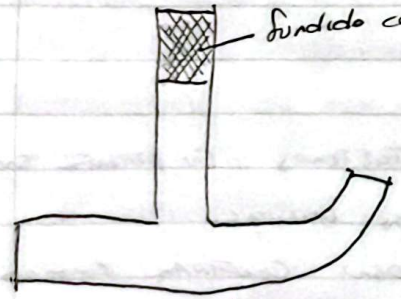


En horas de la tarde se presentan lluvias fuertes

Hora inicio: 3:00 Pm Hora Fin 5:00 Pm

Jueves 26 de Junio del 2025

Personal obra: 1 oficial - 3 ayudantes

ACTIVIDADES: Se continua con lo fundido en concreto de sendero peatonal del costado sur.

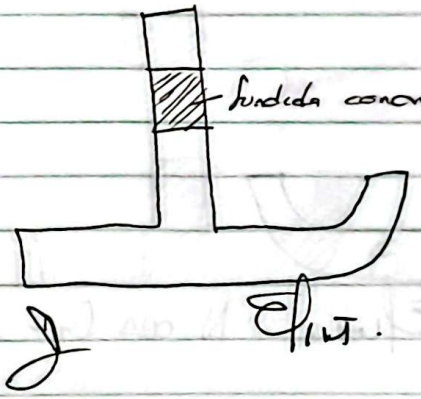

Int. Nicolas Ch - Int

Viernes 27 de Junio del 2025

Personal obra: 1 oficial - 3 ayudantes

ACTIVIDADES: Se continua con fundido en concreto de sendero peatonal del costado sur.

En horas de la mañana se presentan lluvias fuertes


Hora inicio 8:30 Am Hora Fin 11:30 Am

Hora inicio 3:00 Pm Hora Fin 4:30 Pm


Se aplica antisol a senderos peatonales

Int - Nicolas Ch - Int


Sabado 28 de Junio del 2025
Personal obra : 1oficial - 1ayudante
ACTIVIDADES: Se inicia demolicion de sendero existente en concreto, ubicado al costado norte

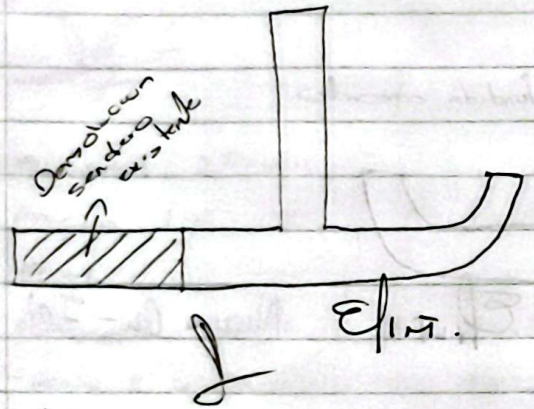


Martes 1 de Julio del 2025
Personal obra: 1 oficial-2 ayudantes
ACTIVIDADES. Se inicio demolicion de sendero existente en concreto, ubicado al costado sur

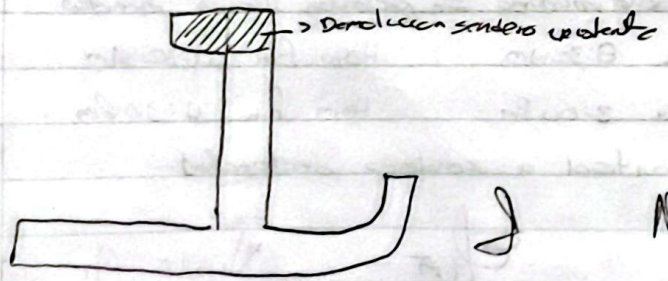

Miercoles 2 de Julio del 2025
Personal obra: 1oficial - 3 ayudantes
ACTIVIDADES: Se continua con la fundida en concreto de sendero peatonal del costado norte

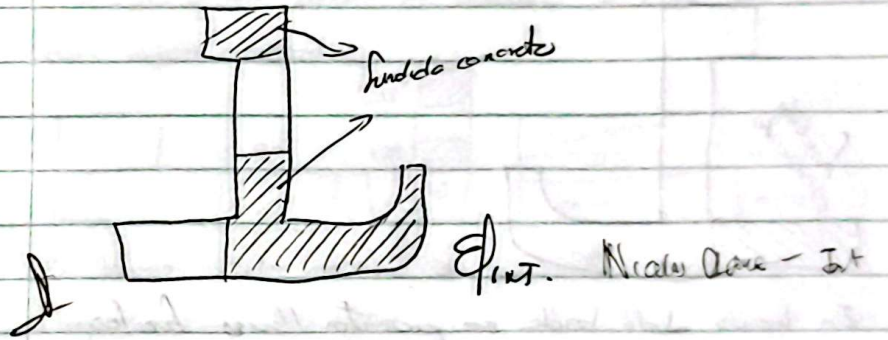


Jueves 3 de Julio del 2025
Personal obra: 1oficial - 3 ayudantes
ACTIVIDADES: se inicia demolicion de sendero existente, ubicado al costado occidental



En horas de la mañana se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 10:00 Am Hora fin 11:40 Am
Hora inicio 2:10 Pm Hora fin 4:00 Pm
Nicolas Chaulet - Int


Viernes 4 de Julio del 2025
Personal obra: 1 oficial - 3 ayudantes
ACTIVIDADES: Se continua con la fundida en concreto de sendero peatonal del costado norte

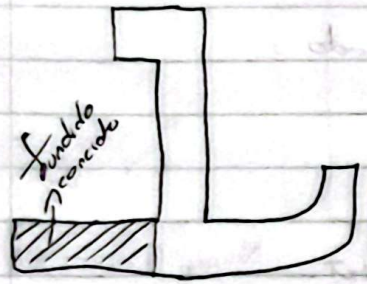

En horas dela tarde se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 12:30Pm Hora fin 3:00Pm
Hora inicio 3:40 Pm Hora fin 5:00Pm

Ing. Nicolas Arias - Int


Sabado 5 de Julio del 2025
Personal obra: 1 oficial - 5 ayudantes
ACTIVIDADES: Se inicio instalacion de sub base granular en sendero del costado occidental





Ing. Nicolas Arias - Int

Lunes 7 de Julio del 2025
Personal obra = 1 oficial - 3 ayudantes
ACTIVIDADES: Se finaliza instalacion de sub base en sendero del costado occidental
- Se presentan fallas en sendero, el cual se subsanan con rajon recalado




En horas dela mañana se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 8:00Am Hora fin 11:30 Am
Hora inicio 3:00 Pm Hora fin 4:30 Pm

Ing. Nicolas Arias - Int

Martes 8 de Julio del 2025
Personal obra = 1 oficial - 1 ayudante
ACTIVIDADES: Se continua con la fundida de sendero peatonal en concreto del costado occidental
Se realizan muestras de concreto para enviar al laboratorio
En horas dela mañana se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 10:50 Am Hora fin 11:40 Am

Norma
Norma
Powered by CamScanner

Hora inicio 2:00 Pm Hora fin 4:00 Pm




Elit. Nicolas Chavez - Int

Miercoles 9 de Julio del 2025

Personal obra: 1 obrero - 3 ayudantes

ACTIVIDADES: Se demole sendero peatonal existente ubicado al costado occidental

- Se funde sendero peatonal en concreto al costado occidental

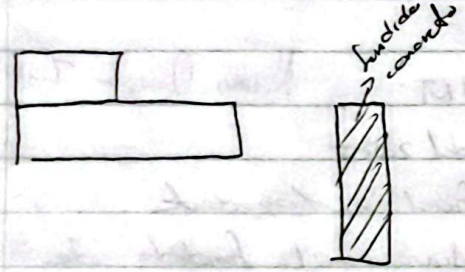

En horas de la mañana se excavan 11 uñas frentes

Hora inicio 7:00 Am Hora fin 9:00 Am

Elit. Nicolas Chavez - Int

Jueves 10 de Julio del 2025

Personal obra: 1 ayudante

ACTIVIDADES - Se inicia el desarmante y retiro de cerramiento de obra

- 8 Am y 9:00

Elit. Nicolas Chavez - Int

Viernes 11 de Julio del 2025

Personal obra: 2 instaladores mobiliario

ACTIVIDADES: Se ~~instalo~~ instalan columpios en juegos infantiles existentes (Juegos en madera y metalicos)

Elit.

Sabado 12 de Julio del 2025

Personal obra: 2 ayudantes - 1 obrero

ACTIVIDADES: se inicia conformacion de terreno en perimetro de senderos peatonales del costado oriental

Elit.


Powered by CamScanner

Lunes 14 de Julio del 2025

Personal obra : 1 oficial - 2 ayudantes

ACTIVIDADES: Se continua confinando terreno manualmente en perimetro de senderos peatonales





CIERRE BITACORA.



