MUNICIPIO DE SAN LUIS, ANTIOQUIA	MEMORIA CANTIDADES ACTA DE PAGO

OBRA:	"MEJORAMIENTO SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR CPSAM DE SAN LUIS, ANTIOQUIA"	**FECHA:**	**DICIEMBRE 2025**
CONTRATO Nº:	**IP-CD 140-2025**	**ACTA**	**1**
INTERVENTORIA:	**MUNICIPIO DE SAN LUIS**	**HOJA Nº:**	1 **DE** 1
CONTRATISTA:	**W.J. CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S ZOMAC**		


MEMORIA DE CALCULO


ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	Menores (-)	CANTIDAD CONTRACTUAL	Mayores (+)	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
7,1	Construcción de ANDEN en concreto de 21 Mpa, espesor de 0.10m. Incluye suministro y transporte de los materiales, malla electrosoldada D-84; juntas para andenes de 5X5 mm con cortadora de disco, soporte fondo de junta, sellante de juntas elastomérico de poliuretano, acabado escobillado y llaneado 0.10m en los bordes, entresuelo en piedra (e=0.15 m.), grenilla compactada (e=0.05 m.) y	M2		69,87		54,00	54,00

SECTOR Y/O UBICACIÓN	MEDIDAS				TOTALES					
LOCALIZACIÓN	Cantidad	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	Area (m2)	Cant (un)	Long (m)		Subtotal
Rampa de salon ppal a nivel inferior		40	1,35			54				54,00
										0,00
										0,00
										0,00
							TOTAL ITEM			**54,00**

OBSERVACIONES: **OK**





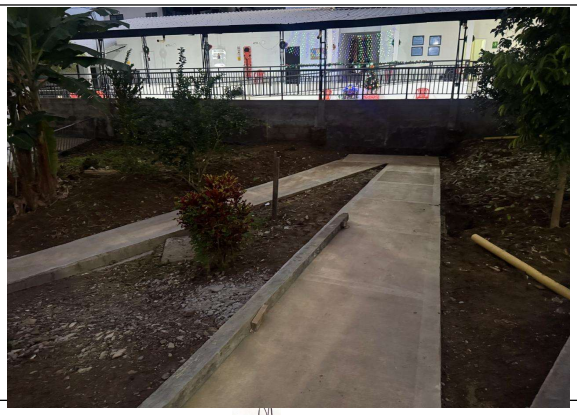

JUAN DIEGO MARTÍNEZ QUINTERO
Gerente General (e)
Empresa Autónoma de Guatapé.

SUPERVISIÓN

CONTRATISTA: SANTIAGO PELAEZ ARIAS
RESIDENTE DE OBRA-W.J. CONSTRUCTORES Y CONSULTORES
