RAMA JUDICIAL

DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL

INTERVENTOR: SOLUCIONES RYS SAS- NIT 901955690-9

CONTRATO N°MC 13 DE 2025, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNION SUCRE

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO JUDICIAL SUCRE

CONTRATO N° SAMC 06 DE 2025, CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNION SUCRE.

INFORME TECNICO PARA ACTA PARCIAL N°1 DE OBRA

PERIODO DEL INFORME DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE

1. INTRODUCCION

El presente informe tiene como propósito describir y documentar las actividades realizadas en el marco del proyecto de **adecuaciones locativas y reforzamiento estructural de la sede judicial del municipio de la Unión**, **Sucre**. Estas intervenciones surgieron de la necesidad de garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura, así como de asegurar condiciones óptimas de seguridad, accesibilidad y confort para funcionarios, usuarios y demás actores que hacen uso de las Instalaciones.

Las obras ejecutadas estuvieron orientadas no solo a mejorar la habitabilidad y el aspecto físico de la edificación, sino también a fortalecer su estabilidad estructural, en cumplimiento de la normativa vigente en materia de construcción y sismo resistencia. Con ello se busca prolongar la vida útil del inmueble, prevenir riesgos asociados al deterioro físico y asegurar que la sede judicial continúe prestando un servicio eficiente a la comunidad. Este documento expone de manera ordenada los objetivos, alcances, actividades desarrolladas y resultados obtenidos durante la ejecución del proyecto, sirviendo como soporte técnico y administrativo para el seguimiento y la evaluación de las acciones adelantadas.

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

- **GENERAL**

Ejecutar las actividades de mantenimiento y adecuaciones locativas complementarias en la Sede Judicial del Municipio de La Unión, Sucre, garantizando la estabilidad estructural, el mejoramiento de las condiciones físicas, funcionales y de seguridad del inmueble, contribuyendo al adecuado funcionamiento de la administración de justicia y al cumplimiento de los objetivos institucionales trazados por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo.

- **ESPECIFICO**

- Intervenir los muros de cerramiento y demás elementos estructurales del área posterior, mediante actividades de reforzamiento y reconstrucción, con el fin de restablecer su integridad, estabilidad y vida útil.
- Ejecutar las adecuaciones en cimentación y mejoramiento del suelo, para asegurar la capacidad portante requerida y garantizar el comportamiento adecuado del nuevo cerramiento perimetral.
- Instalar protectores en acero inoxidable para ventanas y puertas, así como la cerca eléctrica perimetral, con el propósito de reforzar las condiciones de seguridad de los bienes, usuarios y servidores judiciales.

- Realizar las mejoras necesarias en los acabados finales del área intervenida, garantizando un adecuado desempeño estético, funcional y locativo conforme a los lineamientos de conservación de la infraestructura judicial.
- Documentar, reportar y soportar técnicamente cada una de las actividades ejecutadas, mediante informes periódicos, registros fotográficos, memorias de cálculo, procedimientos constructivos y demás evidencias requeridas por la interventoría.
- Dar cumplimiento a las obligaciones contractuales, técnicas, ambientales, laborales y de seguridad, asegurando que la ejecución de la obra se realice bajo parámetros de calidad, oportunidad y seguridad para trabajadores y usuarios.

3. OBJETIVO INTERNEOTIRA

OBJETIVO GENERAL

El principal objetivo del proyecto es realizar la revision y supervision de la obra que cumplan con el contrato que tiene cono objeto el mantenimiento y adecuaciones locativas complementarias en el Palacio de Justicia de La Unión, Sucre, con el fin de optimizar las condiciones funcionales, de seguridad y operatividad de la edificación, garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de las actividades judiciales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Ejercer las obras de adecuación y mantenimiento conforme a los planos, diseños y especificaciones técnicas establecidas.
- Construir el nuevo muro perimetral en concreto reforzado que brinde seguridad y delimitación al inmueble.
- Realizar la instalación del tanque de almacenamiento de agua y sistema de bombeo para mejorar el suministro interno.
- Implementar trabajos de carpintería metálica, cerramiento eléctrico y sistemas eléctrico regulado para garantizar el correcto funcionamiento y protección de las instalaciones.
- Asegurar la calidad de los materiales y procesos constructivos, cumpliendo con las normas técnicas y de seguridad aplicables.


4. LOCALIZACIÓN GENERAL

Colombia se encuentra en el continente americano, en la esquina noroccidental de américa del sur; sobre la línea ecuatorial, limitando con Venezuela y Brasil al oriente, Perú y ecuador al sur, al norte occidente con panamá, rodeado por el océano pacifico al occidente y al norte por el océano atlántico.

El Departamento de Sucre, ubicado en la parte noroeste de Colombia, en la región caribe, limitados por el norte y el oriente con el departamento de Bolívar; por el sur con los departamentos de Bolívar, Antioquia y Córdoba; y por el occidente con el departamento de Córdoba y el Mar Caribe.

La unión es un municipio colombiano del departamento de Sucre ubicado en la región caribe, al norte del país, y en la subregión del San Jorge. Se encuentra a 75 kilómetros de Sincelejo, la capital departamental.

La unión Sucre, Palacio de Justicia

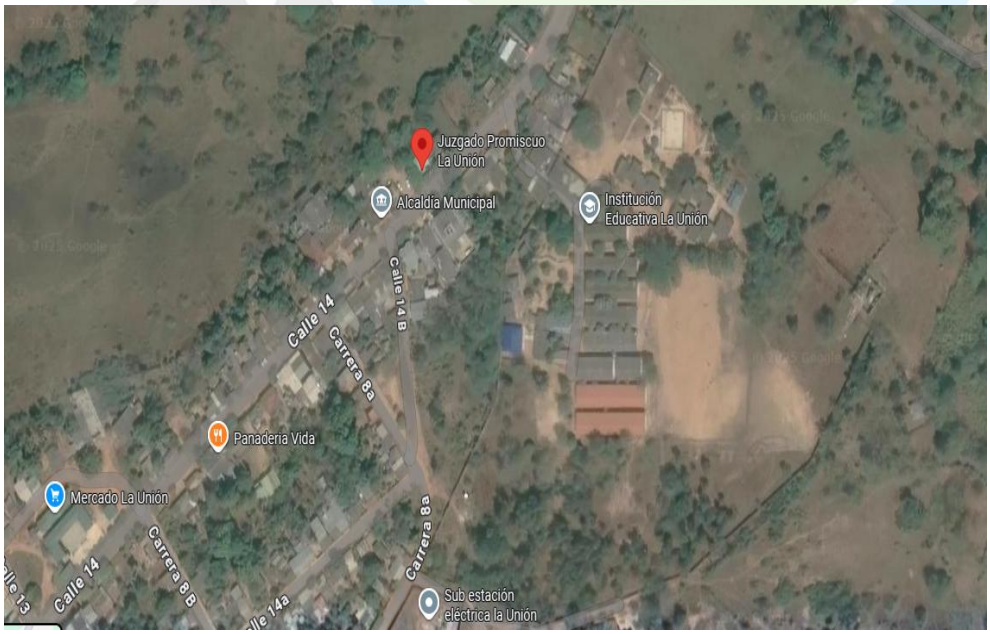

5. ASPECTOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA Y CONTRATO INTERVENTORÍA

CONTRATO	OBRA	INTERVENTORIA
No CONTRATO	SAMC 06 2025(ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8257714	MC13-2025(ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8133700)
CONTRATISTA	CONSORCIO JUDICIALSUCRE	SOLUCIONES R&S
REPRESENTATE LEGAL	ING. JAIR RICARDO MANJAREZ CUESTA	ING. RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO
OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNION SUCRE	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PACIO DE JUSTICIA DE LA UNION SUCRE
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$207.255.277,00	$30.038.635,00
PLAZO INICIAL	18 DE SEPTIEMBRE	18 DE SEPTIEMBRE
VALOR ADICIONAL	N/A	$15.019.317
PLAZO ADICIONAL	UN (1) MES	UN (1) MES
FECHA ACTA DE INICIACION	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025
VALOR TOTAL	$207.255.277,00	$45.057.952
PLAZO TOTAL	TRES (3) MESES	TRESN (3) MESES

6. SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CONTRATO DE OBRA

POLIZA DE CONTRATO DE OBRA

Las garantías exigidas para respaldar a la entidad contratante en cuanto al adecuado cumplimiento del contrato, la calidad y la estabilidad de la obra, así como el aseguramiento del pago de salarios y prestaciones al personal vinculado, junto con las pólizas de responsabilidad civil extracontractual establecidas conforme a las normas legales y contractuales, se relacionan a continuación como soporte del Contrato de Obra N.° SAMC 06 de 2025. Dicho contrato, cuyo objeto corresponde a las "**MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNION SUCRE"**, es ejecutado por el consorcio judicial sucre., representada legalmente por Jair Manjarrez, en favor de la Dirección Seccional de Administración Judicial. En seguida, se presentan las condiciones iniciales de estas pólizas, así como las modificaciones efectuadas durante el desarrollo del proyecto

POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL N°11-44-101263887 ANEXO 0.

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	ASEGURADO
Cumplimiento	04-09-2025	03-11-2026	$41.451.045,40
Pago de salarios y prestaciones Sociales	04-09-2025	03-11-2028	$31.088.284,05

SOLUCIONES R&S S.A.S
INGENIERÍA

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO. N°11-40-101082499 ANEXO 1

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	ASEGURADO
Predio laborales y operaciones	04-09-2025	03-11-2026	$284.700.000,00
Contratista y subcontratista	15-09-2025	03-11-2028	$284.700.000,00
Vehículos propios y no propios	15-09-2025	03-11-2028	$284.700.000,00

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL ANEXO 2

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	ASEGURADO
Cumplimiento	18-09-2025	17-11-2026	$41.451.045,40
Pago de salarios y prestaciones Sociales	18-09-2025	17-11-2028	$31.088.284,05

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO. N°11-40-101082499 ANEXO 3

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	ASEGURADO
Predio laborales y operaciones	18-09-2025	17-11-2025	$284.700.000,00
Contratista y subcontratista	29-09-2025	17-11-2025	$284.700.000,00

Vehículos propios y no propios	29-09-2025	17-11-2025	$284.700.000,00

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDAD ESTATAL N°11-44-101263887 ANEXO 3

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	18-09-2025	17-12-2026	$41.451.045
Salario prestaciones socialese indemnizaciones	18-09-2025	17-12-2028	$31.088.284

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO. N°11-40-101082499 ANEXO 3

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	ASEGURADO
Predio laborales y operaciones	18-09-2025	17-12-2025	$284.700.000,00
Contratista y subcontratista	29-09-2025	17-12-2025	$284.700.000,00
Vehículos propios y no propios	29-09-2025	17-12-2025	$284.700.000,00

SOLUCIONES R&S S.A.S
INGENIERÍA

CUADRO DE POLIZAS CONTRATISTA INTERVENTORIA

Las garantías exigidas para respaldar a la entidad contratante en cuanto al adecuado desarrollo del contrato, la solidez y calidad de la obra, así como el aseguramiento del pago de salarios y prestaciones al personal vinculado, junto con las pólizas de responsabilidad civil extracontractual que cumplen con las disposiciones legales y contractuales vigentes, se relacionan a continuación como soporte del Contrato de Obra N.° MC 13 de 2025.

Este contrato, cuyo objeto corresponde "**INTERVENTORIA AL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNION SUCRE"**, es ejecutado por la empresa **Soluciones R&S S.A.S**, representada legalmente por **Ramón López Camargo**, y tiene como beneficiaria a la Dirección Seccional de Administración Judicial.

En lo sucesivo se detallan las condiciones iniciales de dichas pólizas, así como los ajustes que estas han tenido durante el desarrollo del proyecto.

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	ASEGURADO
Póliza cumplimiento	28-07-2025	28-03-2026	$6.007.727,00
Prestaciones Sociales	28-07-2025	28-09-2028	$3.003.863,50
Calidad del Servicio	28-07-2025	28-09-2028	$6.007.727,00
Total, asegurado			$15.019.317,00

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	ASEGURADO
Póliza cumplimiento	14-11-2025	19-06-2026	$9.011.590,40
Prestaciones Sociales	14-11-2025	19-12-2028	$4.505.795,20
Calidad del Servicio	14-11-2025	19-12-2028	$9.011.590,40
Total, asegurado			$22.528.976

6.1 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.

Se estableció un plazo inicial de dos (02) meses para la ejecución de la obra, desde el 18 de septiembre al 18 de noviembre del 2025 contados a partir de la firma del acta de inicio. Posteriormente, mediante el acto administrativo modificatorio N.º 1, se autorizó una ampliación de un (1) mes adicional al tiempo originalmente previsto, quedando como nueva fecha de terminación el 18 de diciembre de 2025.

Seguidamente, se presenta el equipo profesional, administrativo y técnico asignado por CONSORCIO JUDIAL SUCRE. para el desarrollo del proyecto.

No	CANTIDAD	NOMBRE	CARGO
1	1	Jair Ricardo Manjarrez cuesta	Director de obra
2	1	Diego Arrieta Monterrosa	Residente de obra
3	1	Sebastián David Pérez Teherán	Siso
4	1	Alfonso Ricardo Barragán	Ingeniero Ambiental

6.1.1 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Se estableció un plazo inicial de dos (02) meses para la ejecución de la obra, desde el 18 de septiembre al 18 de noviembre del 2025 contados a partir de la firma del acta de inicio. Posteriormente, mediante el acto administrativo modificatorio N.º 1, se autorizó una ampliación de un (1) mes adicional al tiempo originalmente previsto, quedando como nueva fecha de terminación el 18 de diciembre de 2025.

A continuación, se presentan el personal mínimo exigido por la disposición laboral, de la interventoría, el cual hizo presencia durante el periodo reportado, dando cumplimiento a sus obligaciones contractuales.

No	CANTIDAD	NOMBRE	CARGO
1	1	Jhon López Domínguez	Director de obra
2	1	Aldahir Quiroz Guerra	Residente de interventoría
3	1	Laura Osorio Monterroza	Siso
4	1	Heyda Rodríguez Munévar	Ingeniera ambiental

6.2 ACTAS SUSCRITAS DEL CONTRATO DE OBRA- INTERVENTORIA.

Como parte de las responsabilidades administrativas de esta interventoría, se presenta el siguiente informe, en el cual se expone de manera resumida el avance de las actividades ejecutadas en el marco del contrato de obra, el estado general del proyecto, las dificultades encontradas y la calidad de los trabajos realizados.

Hasta la fecha de elaboración del presente documento, además del contrato principal, se han firmado las siguientes actas.

TIPO DE ACTA	FECHA DE SUSCRIOCION
ACTA DE INCIO	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ACTA DE MODIFICACION N°1	18 DE DICIEMBRE DE 2025

6.3 ACTA DE COMITE OBRA- INTERVENTORIA

ACTA	FECHA DE ACTA	OBJETIVO ACTA
ACTA DE COMITE 1	19/09/2025	Verificacion de condiciones iniciales del palacio de justicia de la Union en el marco del contrato samc 06 de 2025
ACTA DE COMITE 2	26/11/2025	Seguimiento y control del contrato de obra samc 06 de 2025, condicones actuales del contrato de obra(estudio geotecnico y plano estructural)

SOLUCIONES R&S S.A.S
INGENIERÍA

7 CONDICIONES INICIALES: PRESUPUESTO

A continuacion, se presenta el presupuesto inicial del proyecto.

OBJETO: "ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNION, SUCRE"					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**V.UNITARIO**	**V.TOTAL**
1	**PRELIMINARES**				
1,01	Trazado y replanteo	m2	131,54	3.466,00	455.918,00
1,02	Realización de tala de arboles, compensación y reforestación	Und	1	611.100,00	611.100,00
1,03	Demolición de muro perimetral	m3	33,4	42.386,00	1.415.692,00
1,04	Retiro a disposición final de material de demolición	m3	43,42	12.138,00	527.032,00
1,05	Suministro e instalación de cerramiento en tela verde y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	ml	41,75	35.919,00	1.499.618,00
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2,01	Excavación manual en material común (incluye cargue y retiro)	m3	12,24	53.710,00	657.410,00
2,02	Excavación manual en material común (incluye cargue y retiro) < 0,50 mts	ml	37,00	14.175,00	524.475,00
2,03	Suministro e instalación de relleno con material seleccionado suelto	m3	141,37	122.959,00	17.382.960,00
3	**IDENTIFICACION INSTITUCIONAL**				
3,01	Suministro e instalación de logo institucional en letras de acero inoxidable brillante con corte láser color a elección h: 20 cm y escudo en acero inoxidable en contraste satinado d: 80 cm	UND	1,00	9.188.395,00	9.188.395,00
4	**CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL**				

4,01	Suministro, corte, figurado e instalación de acero de refuerzo 60.000 psi	kg	2240,36	8.404,00	18.827.985,00
4,02	Suministro y colocación de solado en concreto pobre de 17,5 MPa (2500 PSI) hecho en obra	m2	7,20	47.791,00	344.095,00
4,03	Suministro y colocación de concreto de 24 MPa (3,500 psi)	m3	1,80	514.600,00	926.280,00
4,04	Suministro y colocación de concreto de 21 mpa para columnas y vigas (3,000 psi)	m3	12,53	482.837,00	6.049.948,00
4,05	Sobrecimiento en bloque estructural e=0,15mts	ml	46,60	62.993,00	2.935.474,00
4,06	Suministro e instalación de levante de muro en bloque e = 0,15 mts	m2	139,80	90.705,00	12.680.559,00
4,07	Suministro e instalacion de pañete para muros	m2	139,80	36.853,00	5.152.049,00
5	**TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA**				
4,01	Suministro, corte, figurado e instalación de acero de refuerzo 60.000 psi	kg	563,45	8.404,00	4.735.224,00
4,03	Suministro y colocación de concreto de 24 mpa (3,500 psi)	m3	5,52	514.600,00	2.840.592,00
5,01	Suministro y colocación de concreto de 28 mpa (4,000 psi)	m3	2,03	550.099,00	1.115.601,00
4,04	Suministro y colocación de concreto de 21 mpa para columnas y vigas (3,000 psi)	m3	1,92	482.837,00	927.047,00
5,02	Suministro e instalación de tapa en concreto de 21mpa (3000 psi) con bordes en ángulo de 2"x2" y reforzado con varillas de 3/8" de medidas 0,6mx0,6m, incluye ganchos de apertura.	und	1,00	504.021,00	504.021,00
5,03	Pañete impermeabilizado dosificación 1:4	m2	245,00	42.353,00	10.376.485,00
5,04	Caseta para electrobomba de 0,6H x 0,6L x 0,6B dimensiones internas (incluye placa en concreto 3000 psi e = 8 cm y protector metálico y sistema de seguridad cadena y candado)	GBL	1,00	746.466,00	746.466,00
5,05	Suministro e instalación de electrobomba de 1 Caballo	und	1,00	942.816,00	942.816,00
5,06	suministro e instalación de tubería pvc de 1/2" (incluye accesorios)	mL	22,00	13.979,00	307.538,00
5,07	suministro e instalación de tubería pvc de 3/4" (inc. accesorios)	mL	26,00	16.727,00	434.902,00
5,08	Suministro e instalación de sika waterbar/cinta pvc o-22 sellar e impermeabilizar juntas en tanques	mL	12,00	100.375,00	1.204.500,00

5,09	Suministro e instalación de interruptor flotador eléctrico	UND	1,00	175.018,00	175.018,00
6	**CARPINTERIA METALICA**				
6,01	Suministro e instalación de protectores para ventanas en acero inoxidable en tubería de 1" y ½".	m2	13,44	537.097,00	7.221.054,00
6,02	Suministro e instalación de vinilo esmerilado para puertas y ventanas	m2	14,30	54.138,00	773.914,00
6,03	Suministro e instalación de cortina tipo panel japonés con corredera horizontal, incluye accesorios de instalación y herrajes. hmax: 1.50 mts aproximadamente	m2	13	200.700,00	2.609.100,00
6,04	Suministro e instalación de rejas para patio en tubería de 1 pulgada en acero inoxidable REF. 304	m2	16	568.491,00	9.095.856,00
6,05	Suministro e instalación de puerta de acceso en vidrio templado 2,30x2,20 incluye bisagra y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, incluye desmonte de puerta existente y disposición final.	m2	5,06	560.843,00	2.837.866,00
7	**CERRAMIENTO ELECTRICO**				
7,01	Suministro e instalación de kit solar para cerca eléctrica	und	1	3.995.240,00	3.995.240,00
7,02	Suministro e instalación de postes para cerca eléctrica. Incluye anclado de postes y aisladores para el cable	und	20	590.522,00	11.810.440,00
7,03	Cable para cercado eléctrico de 4 líneas	m	40	16.752,00	670.080,00
8	**SISTEMA ELÉCTRICO REGULADO**				
8,01	Suministro e instalación de tablero bypass de 40 A, con luz indicadora de la posición (Red o UPS).	und	1	3.044.740,00	3.044.740,00
8,02	Suministro e instalación de breaker enchufable de 2 x 40 A	und	2	105.660,00	211.320,00
8,03	Suministro e instalación de breaker enchufable de 1 x 15 A	und	3	54.180,00	162.540,00
8,04	Suministro e instalación de coraza liquid tight de 1" para conectar la entrada y salida de la UPS, conexionado del tablero regulado. Debe incluir acoples para conexión y correcta instalación.	m	12	30.612,00	367.344,00
8,05	Suministro e Instalación de ducto para salida 220 V desde el tablero hasta caja de conexión. Incluye regata, resane y acabado con pintura tipo 1 desde el tablero hasta el cuarto técnico.	m	10	40.910,00	409.100,00

8,06	Suministro e instalación de cable de cobre calibre #8 AWG THWN-2	m	22	40.546,00	892.012,00
8,07	Suministro e instalación de borna para ponchar de cobre calibre #8 AWG THWN-2	und	16	12.124,00	193.984,00
8,08	Suministro e instalación de caja de paso y conexiones	und	1	106.725,00	106.725,00
8,09	Instalación de tablero de 8 circuitos para el sistema regulado	und	1	211.853,00	211.853,00
8,1	Suministro e instalación de salida eléctrica para tomacorriente doble regulado a 120 V, hasta 3 m. Incluye tomacorriente, conectores y demás elementos necesarios para su correcta instalación en canaleta metálica de 10 cm.	und	8	116.177,00	929.416,00
8,11	Suministro e instalación de alimentador en cable 3* # 12 AWG	m	59	20.476,00	1.208.084,00
8,12	Suministro e instalación de tubo PVC SCH 40 de 1/2" para alimentador en cable 3* # 12 AWG	m	33	13.563,00	447.579,00
8,13	Suministro e instalación de tubo PVC de 1/2" incrustado para alimentador en cable 3* # 12 AWG. Incluye regata, resane y acabado con pintura tipo 1	m	24	31.769,00	762.456,00
8,14	Suministro e instalación de salida para toma de electrobomba de 1 hp. Incluye tablero con protección termica y contol para los niveles	und	1	2.271.236,00	2.271.236,00
8,15	Suministro e instalación de puente para equipotencialización a la puesta a tierra en cable calibre # 8 AWG en el tablero principal	und	1	28.094,00	$ 28.094,00
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**$ 153.749.233,00**
ADMINISTRACIÓN				**26,85%**	**$ 41.282.929,00**
IMPREVISTOS				**2,00%**	**$ 3.074.985,00**
UTILIDAD				**5,00%**	**$ 7.687.462,00**
IVA SOBRE LA UTILIDAD				**19,00%**	**$ 1.460.618,00**
TOTAL OFERTA ECONOMICA					**$ 207.255.227,00**

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

JAIR RICARDO MANJARREZ CUESTA
C.C. 84.083.215 de Riohacha
Representante Legal
CONSORCIO JUDICIAL SUCRE

8. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES.

Debido al acto administrativo Modificatoria N.° 1, se realizó únicamente un ajuste en el plazo de ejecución del proyecto, **dado que durante su desarrollo se presentaron condiciones que no estaban previstas inicialmente**. En consecuencia, la programación de actividades fue modificada para reflejar la nueva duración establecida y se convierte en el cronograma de referencia para realizar el seguimiento del avance de la obra.

8.1 ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS

A continuacion, se describen las actividades ejecutadas durante este periodo.

8.1.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuacion, se describen las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 18 de septiembre hasta el 30 de noviembre.

Teniendo en cuenta la reprogramación de actividades derivada de la Modificatoria N.° 1, se establece que durante el periodo ampliado se alcanzó un valor ejecutado de $55.959.945, lo cual corresponde al 27 % del presupuesto total del proyecto. Este porcentaje refleja el avance financiero logrado dentro del nuevo plazo, evidenciando la ejecución de las actividades reprogramadas y permitiendo llevar un control más preciso del progreso técnico, administrativo y presupuestal del contrato.

8.1.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS.

Se describen en la bitacora de obra.

9. INFORMACION FINANCIERA DE OBRA

9.1 DISPONIBILIDAD PRESPUESTAL.

Se tiene un monto acomulado de $ 207.255.227,00 para amparar el proyecto “MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNION SUCRE"

9.2 DESEMBOLSOS Y PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA.

En cumplimiento de las funciones de carácter jurídico, el contratista revisó las condiciones de pago definidas en el contrato de obra, verificando que este establece que la cancelación del valor contratado se realizará a través de actas parciales correspondientes al avance de la ejecución.

10 INFORMACION FINANCIERA DE INTERVENTORIA

10.1 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Se tiene un monto acomulado de $30.038.635,00 para amparar el proyecto de “INTERVENTORIA AL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNION SUCRE.”

10.2 DESEMBOLSOS Y PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA.

En cumplimiento de las funciones de carácter jurídico, el contratista revisó las condiciones de pago definidas en el contrato de obra, verificando que este establece que la cancelación del valor contratado se realizará a través de actas parciales correspondientes al avance de la ejecución.

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Hasta la fecha del presente informe el contratista ha registrado un avance del 27% lo que corresponde a un monte de $55.959.945.

El contratista ha demostrado un adecuado desempeño en la ejecución de las actividades, cumpliendo con las exigencias técnicas del proyecto. Durante el periodo evaluado también se verificó que realizó de manera correcta los aportes a la seguridad social y atendió las obligaciones relacionadas con el manejo ambiental. Con base en estas verificaciones, esta interventoría **CONSIDERA PROCEDENTE** autorizar el pago correspondiente al **Acta Parcial N.° 1**.

A lo largo del desarrollo de las labores, la interventoría ha mantenido un acompañamiento constante y ha identificado una gestión satisfactoria por parte del contratista. Se continuará con el seguimiento riguroso del avance de la obra para asegurar el cumplimiento de los objetivos y la adecuada finalización del contrato.

Ramon Andrés López Camargo
RL. Soluciones R&S S.A.S

SOLUCIONES R&S S.A.S
INGENIERÍA

ANEXOS

SOLUCIONES R&S S.A.S
INGENIERÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Trazado y replanteo





Tala de arboles









Compensación de arboles





Demolición de muro perimetral existente





Retiro de material





cerramiento provisional.









Excavación manual de zapatas y vigas





Acero de tapa de tanque






Acero de paredes del tanque



Solado tanque.



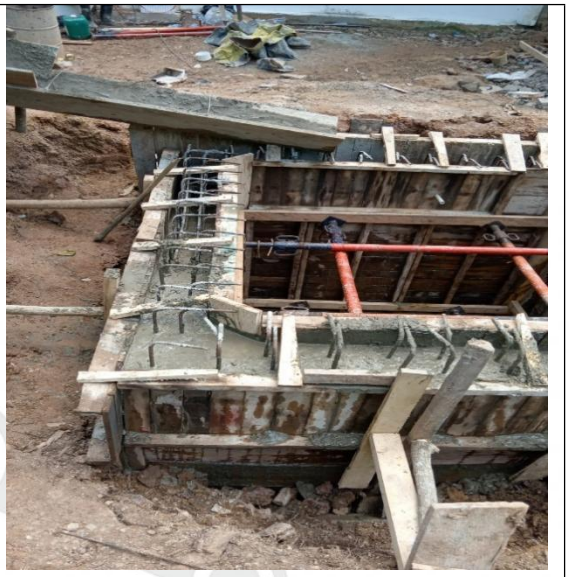

Fundida de paredes del tanque





Fundida de tapa en concreto





Fundida de tapa del tanque





Pañete impermeabilizado en el tanque






Instalación de cinta PVC





Instalación de protectores para ventana



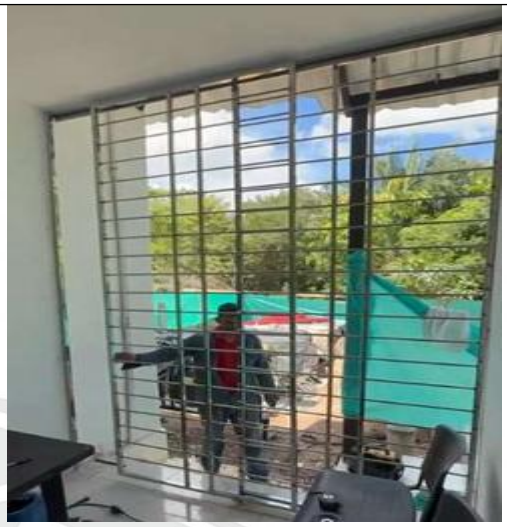


Instalación de puerta en tubería de 1”





Suministro e instalación de puerta

	
Logo institucional	

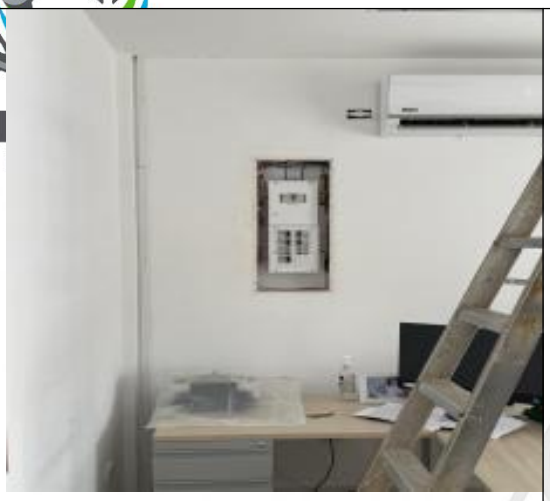













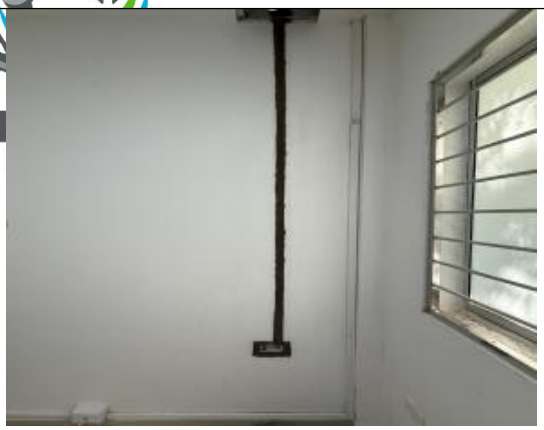






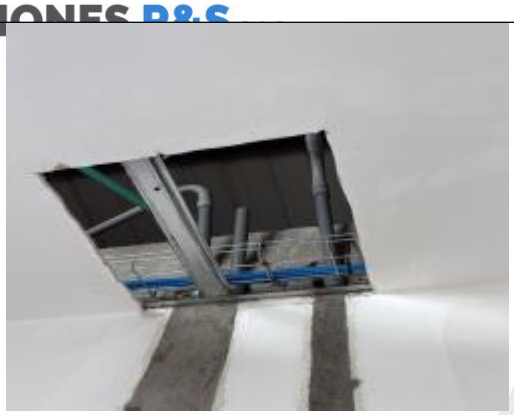



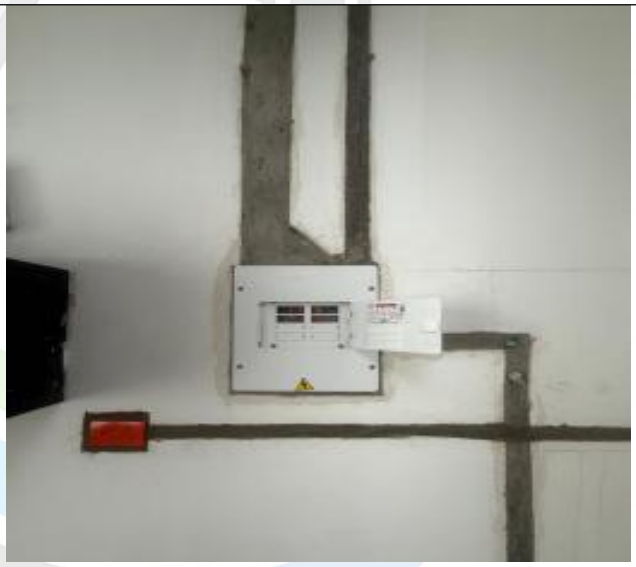

SOLUCIONES R&S S.A.S
INGENIERÍA

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL - INTERVENTORIA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901955690	9	SOLUCIONES R&S SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SOLUCIONES RYS SAS	CRA 40 D 29 C 04	SINCELEJO-SUCRE	2802211	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1909491031	9494475810	E	2025/11/25	2025/11/06	BANCOLOMBIA	0	$1,390,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1102860756	ARAUJO LUIS	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF41	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
2	CC	1100623796	LOPEZ JHON	230201	16	$1,066,667	$170,700	ESSC07	16	$1,066,667	$42,700	CCF41	16	$1,066,667	$42,700	14-11	16	$1,066,667	$74,300	16	$0	$0
3	CC	1102890221	OSORIO LAURA	230201	30	$1,623,500	$259,800	ESSC07	30	$1,623,500	$65,000	CCF41	30	$1,623,500	$65,000	14-11	30	$1,623,500	$113,000	30	$0	$0
Total	**Afiliados(3)**					**$4,490,167**	**$718,500**			**$4,490,167**	**$179,700**			**$4,490,167**	**$179,700**			**$4,490,167**	**$312,600**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$718,500	$0	$0	$718,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$288,000	$0	$0	$288,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$430,500	$0	$0	$430,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$312,600	$0	$0	$312,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$312,600	$0	$0	$312,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$179,700	$0	$0	$179,700
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	3	$179,700	$0	$0	$179,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$179,700	$0	$0	$179,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$107,700	$0	$0	$107,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$72,000	$0	$0	$72,000
TOTAL				3	$1,390,500	$0	$0	$1,390,500

2025/11/06 03:16 PM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40029368		HEYDA GINETH RODRIGUEZ MUNEVAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 26 Nro 05 14	SINCELEJO-SUCRE	2800002	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1910015480	9494012871	I	2025/11/03	2025/11/02	BANCOLOMBIA		$808,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	40029368	HEYDA RODRIGUEZ MUNEVAR	230301	30	$2,278,222	$364,600	ESSC07	30	$2,278,222	$284,800		0	$0	$0	14-23	30	$2,278,222	$158,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$2,278,222**	**$364,600**			**$2,278,222**	**$284,800**			**$0**	**$0**			**$2,278,222**	**$158,600**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$364,600	$0	$364,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$364,600	$0	$364,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$158,600	$0	$158,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$158,600	$0	$158,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$284,800	$0	$284,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$284,800	$0	$284,800
TOTAL				**1**	**$808,000**	**$0**	**$808,000**

2025/11/02 01:12 PM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1102868937	ALDAHIR RAFAEL QUIROZ GUERRA	carrera 18 A #44-50	3043987271	ing.aldahir@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		ANTIOQUIA	APARTADÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	05/11/2025	92048104	$1.602.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	562.500	0		0		0	7	2.500	0	565.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	723.100	0	0	0	0	0	0	0	723.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	313.200				313.200	7	1.400	314.600			3.132	314.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	565.000	565.000
Pensión	1	723.100	723.100
Riesgos Laborales	1	314.600	314.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.602.700	1.602.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1102868937	ALDAHIR RAFAEL QUIROZ GUERRA		carrera 18 A #44-50	3043987271	ing.aldahir@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			ANTIOQUIA	APARTADÓ	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	05/11/2025	92048104	$1.602.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1102868937	QUIROZ GUERRA ALDAHIR RAFAEL	57	0			N																	230301	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS048	4.500.000	562.500	14-23	4.500.000	5	313.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40029368		HEYDA GINETH RODRIGUEZ MUNEVAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 26 Nro 05 14	SINCELEJO-SUCRE	2800002	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1910136250	954002870	I	2025/12/03	2025/12/02	BANCOLOMBIA		$808,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	40029368	HEYDA RODRIGUEZ MUNEVAR	230301	30	$2,278,222	$364,600	ESSC07	30	$2,278,222	$284,800		0	$0	$0	14-23	30	$2,278,222	$158,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$2,278,222**	**$364,600**			**$2,278,222**	**$284,800**			**$0**	**$0**			**$2,278,222**	**$158,600**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$364,600	$0	$364,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$364,600	$0	$364,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$158,600	$0	$158,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$158,600	$0	$158,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$284,800	$0	$284,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$284,800	$0	$284,800
TOTAL				**1**	**$808,000**	**$0**	**$808,000**

2025/12/02 11:12 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901955690	9	SOLUCIONES R&S SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SOLUCIONES RYS SAS	CRA 40 D 29 C 04	SINCELEJO-SUCRE	2802211	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1910258741	9541003698	E	2025/12/22	2025/12/02	BANCOLOMBIA	0	$325,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1100623796	LOPEZ JHON	230201	6	$400,000	$64,000	ESSC07	6	$400,000	$16,000	CCF41	6	$400,000	$16,000	14-11	6	$400,000	$27,900	6	$0	$0
2	CC	1102890221	OSORIO LAURA	230201	12	$649,400	$104,000	ESSC07	12	$649,400	$26,000	CCF41	12	$649,400	$26,000	14-11	12	$649,400	$45,200	12	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					**$1,049,400**	**$168,000**			**$1,049,400**	**$42,000**			**$1,049,400**	**$42,000**			**$1,049,400**	**$73,100**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$168,000	$0	$0	$168,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$168,000	$0	$0	$168,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$73,100	$0	$0	$73,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$73,100	$0	$0	$73,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$42,000	$0	$0	$42,000
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	2	$42,000	$0	$0	$42,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$42,000	$0	$0	$42,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$42,000	$0	$0	$42,000
TOTAL				**2**	**$325,100**	**$0**	**$0**	**$325,100**

2025/12/02 04:11 PM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1102868937	ALDAHIR RAFAEL QUIROZ GUERRA	carrera 18 A #44-50	3043987271	ing.aldahir@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		ANTIOQUIA	APARTADÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	04/12/2025	93014017	$1.602.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	562.500	0		0		0	7	2.500	0	565.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	723.100	0	0	0	0	0	0	0	723.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	313.200				313.200	7	1.400	314.600			3.132	314.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	565.000	565.000
Pensión	1	723.100	723.100
Riesgos Laborales	1	314.600	314.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.602.700	1.602.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1102868937	ALDAHIR RAFAEL QUIROZ GUERRA	carrera 18 A #44-50	3043987271	ing.aldahir@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		ANTIOQUIA	APARTADÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	04/12/2025	93014017	$1.602.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1102868937	QUIROZ GUERRA ALDAHIR RAFAEL	57	0			N																	230301	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS048	4.500.000	562.500	14-23	4.500.000	5	313.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SOLUCIONES R&S S.A.S
INGENIERÍA

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL-OBRA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901984201	4	CONSORCIO JUDICIAL SUCRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 11B 18 19	LA UNION-SUCRE	7850079	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1905775372	9494183168	E	2025/11/05	2025/11/05	BANCOLOMBIA	0	$3,211,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1003499581	LOBO FEIVER																		230301	12	$711,750	$113,900		0	$0	$0	CCF41	12	$711,750	$28,500	14-11	30	$1,423,500	$99,100	12	$0	$0	No	$241,500
2	CC	11052730	MERCADO ONIX	X																	230301	12	$711,750	$113,900		0	$0	$0	CCF41	12	$711,750	$28,500	14-11	30	$1,423,500	$99,100	12	$0	$0	No	$241,500
3	CC	1102122705	MONTERROSA RAFAEL	X																	230301	12	$711,750	$113,900		0	$0	$0	CCF41	12	$711,750	$28,500	14-11	30	$1,423,500	$99,100	12	$0	$0	No	$241,500
4	CC	15667128	OVIEDO FRANCISCO																			0	$0	$0		0	$0	$0	CCF41	12	$711,750	$28,500	14-11	30	$1,423,500	$99,100	12	$0	$0	No	$127,600
5	CC	11051207	OVIEDO WILLIAM		X																	0	$0	$0		0	$0	$0	CCF41	8	$711,750	$28,500	14-11	30	$1,423,500	$99,100	8	$0	$0	No	$127,600
6	CC	1100246845	PEREZ HAROL																		25-14	12	$711,750	$113,900		0	$0	$0	CCF41	12	$711,750	$28,500	14-11	30	$1,423,500	$99,100	12	$0	$0	No	$241,500
7	CC	1082350136	PEREZ SEBASTIAN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS042	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
8	CC	1069467621	RIVERA EDGAR		X																230301	8	$711,750	$113,900		0	$0	$0	CCF41	8	$711,750	$28,500	14-11	30	$1,423,500	$99,100	8	$0	$0	No	$241,500
9	CC	1005423749	TALAIGUA ANDRES	X																	230301	15	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF41	15	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$99,100	15	$0	$0	No	$312,800
10	CC	1005423748	TALAIGUA JAN																		231001	15	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF41	15	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$99,100	15	$0	$0	No	$312,800
11	CC	11050472	TALEIGUA GUSTAVO																		231001	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
12	CC	1102118291	VEGA LUIS	X																	230301	12	$711,750	$113,900		0	$0	$0	CCF41	12	$711,750	$28,500	14-11	30	$1,423,500	$99,100	12	$0	$0	No	$241,500
Total	**Afiliados(12)**																						$9,252,750	$1,480,800			$2,847,000	$114,000			$10,676,250	$427,600			$17,082,000	$1,189,200		$0	$0		$3,211,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901984201	4	CONSORCIO JUDICIAL SUCRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 11B 18 19	LA UNION-SUCRE	7850079	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1905775372	9494183168	E	2025/11/05	2025/11/05	BANCOLOMBIA	0	$3,211,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$1,480,800	$0	$0	$1,480,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$398,700	$0	$0	$398,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$113,900	$0	$0	$113,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$968,200	$0	$0	$968,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,189,200	$0	$0	$1,189,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$1,189,200	$0	$0	$1,189,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$427,600	$0	$0	$427,600
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	12	$427,600	$0	$0	$427,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$114,000	$0	$0	$114,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$57,000	$0	$0	$57,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				**12**	**$3,211,600**	**$0**	**$0**	**$3,211,600**

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DIEGO ARRIETA MONTERROSA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1235539438
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-12
FECHA DE PAGO:	2025-10-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	35075527
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35075527
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 250.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.500	$ 10.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 580.500	$ 580.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/12/2025

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901984201	4	CONSORCIO JUDICIAL SUCRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 11B 18 19	LA UNION-SUCRE	7850079	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1976000288	9495834433	E	2025/12/02	2025/12/02	BANCOLOMBIA	0	$2,699,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1003499581	LOBO FEIVER																		230301	10	$711,750	$113,900		0	$0	$0	CCF41	10	$711,750	$28,500	14-11	30	$1,423,500	$99,100	10	$0	$0	No	$241,500
2	CC	11052730	MERCADO ONIX																		230301	10	$711,750	$113,900		0	$0	$0	CCF41	10	$711,750	$28,500	14-11	30	$1,423,500	$99,100	10	$0	$0	No	$241,500
3	CC	1102122705	MONTERROSA RAFAEL																		230301	10	$711,750	$113,900		0	$0	$0	CCF41	10	$711,750	$28,500	14-11	30	$1,423,500	$99,100	10	$0	$0	No	$241,500
4	CC	15667128	OVIEDO FRANCISCO																			0	$0	$0		0	$0	$0	CCF41	10	$711,750	$28,500	14-11	30	$1,423,500	$99,100	10	$0	$0	No	$127,600
5	CC	1100246845	PEREZ HAROL																		25-14	10	$711,750	$113,900		0	$0	$0	CCF41	10	$711,750	$28,500	14-11	30	$1,423,500	$99,100	10	$0	$0	No	$241,500
6	CC	1082350136	PEREZ SEBASTIAN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS042	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
7	CC	1005423749	TALAIGUA ANDRES																		230301	10	$711,750	$113,900		0	$0	$0	CCF41	10	$711,750	$28,500	14-11	30	$1,423,500	$99,100	10	$0	$0	No	$241,500
8	CC	1005423748	TALAIGUA JAN																		231001	10	$711,750	$113,900		0	$0	$0	CCF41	10	$711,750	$28,500	14-11	30	$1,423,500	$99,100	10	$0	$0	No	$241,500
9	CC	11050472	TALEIGUA GUSTAVO																		231001	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
10	CC	1102118291	VEGA LUIS																		230301	10	$711,750	$113,900		0	$0	$0	CCF41	10	$711,750	$28,500	14-11	30	$1,423,500	$99,100	10	$0	$0	No	$241,500
Total	**Afiliados(10)**																						$7,829,250	$1,252,900			$2,847,000	$114,000			$8,541,000	$342,000			$14,235,000	$991,000		$0	$0		$2,699,900

2025/12/02 03:04 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901984201	4	CONSORCIO JUDICIAL SUCRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 11B 18 19	LA UNION-SUCRE	7850079	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1976000288	9495834433	E	2025/12/02	2025/12/02	BANCOLOMBIA	0	$2,699,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$1,252,900	$0	$0	$1,252,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$341,700	$0	$0	$341,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$113,900	$0	$0	$113,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$797,300	$0	$0	$797,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$991,000	$0	$0	$991,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$991,000	$0	$0	$991,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$342,000	$0	$0	$342,000
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	10	$342,000	$0	$0	$342,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$114,000	$0	$0	$114,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$57,000	$0	$0	$57,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				**10**	**$2,699,900**	**$0**	**$0**	**$2,699,900**

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DIEGO ARRIETA MONTERROSA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1235539438
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-10
FECHA DE PAGO:	2025-12-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35165162
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35165162
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 250.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.500	$ 10.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 580.500	$ 580.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/01/2026

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	84083215
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAIR RICARDO MANJARREZ CUESTA
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA	DEPARTAMENTO:	GUAJIRA
DIRECCIÓN:	CLL 11B N 18 05	TELÉFONO:	3444444
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4632738826**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/02			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9994906940

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 34.700	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 34.700
SUBTOTALES:									**$ 34.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 34.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 84083215	MANJARREZ CUESTA JAIR RICARDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 6.000.000				NO								01-30										25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	84083215	$ 34.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 440.500

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	84083215
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAIR RICARDO MANJARREZ CUESTA
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA	DEPARTAMENTO:	GUAJIRA
DIRECCIÓN:	CLL 11B N 18 05	TELÉFONO:	3444444
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4630304195**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	5				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/12			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9994678037

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 800	$ 0	$ 227.800	$ 800	$ 228.600
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 800**	**$ 228.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 600	$ 0	$ 178.000	$ 600	$ 0	$ 178.600
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 600**	**$ 0**	**$ 178.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 34.700	$ 34.700	$ 200	$ 0	$ 34.900
SUBTOTALES:									**$ 34.700**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 34.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD					ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 84083215	MANJARREZ CUESTA JAIR RICARDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 6.000.000				NO								01-30										25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	84083215	$ 34.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 442.100

Planilla Pagada
