UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS
NIT. 9 0 1 7 9 2 9 2 5 – 3
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 009-RAPLL-2024

MEMORIAS DE CANTIDADES


PAZ DE ARIPORO

OBJETO: "ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS	**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA	
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS	**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024	
ACTIVIDAD:	Viga aerea en concreto de resistencia 4000 psi	**Unidad :**	m³	*CAPITULO*	7	*REFORZAMIENTO*	
ITEM : N.P. 7,13 **ESP:**	INV 630-22	**CANT. CONTRACTUAL**	5,51	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	5,51	m³	Fecha: 12/12/2025

FOTO O ESQUEMA



OBSERVACIONES

DIMENSIONES

LOCALIZACIÓN	Longitud(m)	ancho (m)	Alto (m)	Volumen	REPETICIONES	TOTAL
Auditorio	7,00	0,25	0,37	0,65	3,00	1,94
Auditorio	7,20	0,25	0,37	0,67	3,00	2,00
Auditorio	4,70	0,25	0,37	0,43	1,00	0,43
Edif Lecturas	22,60	0,25	0,20	1,13	1,00	1,13
					SubTotal	5,51
Pasan			0		0	5,51
					Total	5,51
Viga aerea en concreto de resistencia 4000 psi			Unidad	m³	TOTAL	5,51

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PAZ DE ARIPORO

OBJETO: "ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS			**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA			
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS			**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024			
ACTIVIDAD:	Limpieza y lavado mecanico de cubiertas tipo metalicas, fibrocemento, pvc, policarbonato			**Unidad :**	m²	*CAPITULO*	*8*	*CUBIERTA*			
ITEM :	8,1	**ESP:**	PART 8.01	**CANT. CONTRACTUAL**	1332,47	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	1332,47	m²		Fecha:	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA



OBSERVACIONES

DIMENSIONES

LOCALIZACIÓN	Longitud(m)	Ancho (m)	Alto (m)	Area/Unidad	REPETICIONES	TOTAL
	3,34	27,69		92,47	1,00	92,47
					SubTotal	92,47
Pasa			0		0	92,47
					Total	92,47

Limpieza y lavado mecanico de cubiertas tipo metalicas, fibrocemento, pvc, policarbonato	**Unidad**	**m²**	**TOTAL**	**92,47**

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

867

PAZ DE ARIPORO


OBJETO: "ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS		**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA		
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS		**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024		
ACTIVIDAD:	Limpieza y lavado mecanico de perfiles metalicos tipo: correa, cercha, angulo, alto 100 - 250 mm y ancho 50 - 200 mm		**Unidad :**	m	*CAPITULO*	*8*	*CUBIERTA*		
ITEM : 8,5	**ESP:**	PART 8.05	**CANT. CONTRACTUAL**	1294,74	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	1294,74	m²	Fecha:	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA



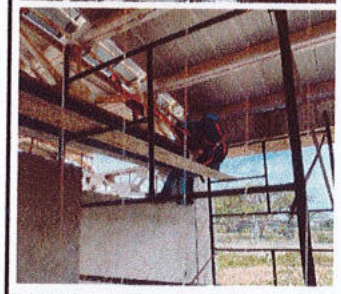


DIMENSIONES

LOCALIZACIÓN	Longitud(m)	Ancho (m)	Alto (m)	Area/Unidad	REPETICIONES	TOTAL
	69,15			69,15	13,00	898,95
					SubTotal	898,95
Pasa			0		0	898,95
					Total	898,95

Limpieza y lavado mecanico de perfiles metalicos tipo: correa, cercha, angulo, alto 100 - 250 mm y ancho 50 - 200 mm	Unidad	m	TOTAL	898,95

OBSERVACIONES

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ:
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



PAZ DE ARIPORO

OBJETO: "ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS			**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA			
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS			**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024			
ACTIVIDAD:	Pintura en esmalte para estructura metalica existente tipo: correas, cerchas, laminas y angulos, alto 100 - 250 mm y ancho 50 - 200 mm, 2 manos.			**Unidad :**	m	*CAPITULO*	*8*	*CUBIERTA*			
ITEM	8,7	**ESP:**	PART 8.07	**CANT. CONTRACTUAL**	724,49	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	724,49	m²		Fecha:	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA

DIMENSIONES

LOCALIZACIÓN	Longitud(m)	Ancho (m)	Alto (m)	Area/Unidad	REPETICIONES	TOTAL
	12,00			12,00	13,00	156,00
	62,00			62,00	5,00	310,00
	1,20			1,20	1,00	1,20
	2,50			2,50	3,00	7,50
	2,50			2,50	4,00	10,00
					SubTotal	484,70
Pasa			0		0	484,70
					Total	484,70
Pintura en esmalte para estructura metalica existente tipo: correas, cerchas, laminas y angulos, alto 100 - 250 mm y ancho 50 - 200 mm, 2 manos.			**Unidad**	**m**	**TOTAL**	**484,70**

OBSERVACIONES

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


PAZ DE ARIPORO


OBJETO: "ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS		**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA		
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS		**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024		
ACTIVIDAD:	Limpieza y lavado de pisos en concreto, ceramica, granito, arcilla, marmol, piedra, con acido muriatico		**Unidad :**	m²	*CAPITULO*	*9*	*DIAGNOSTICO INTEGRAL*		
ITEM : 9,7	**ESP:**	PART 9.07	**CANT. CONTRACTUAL**	768,35	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	768,35	m²	Fecha:	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA

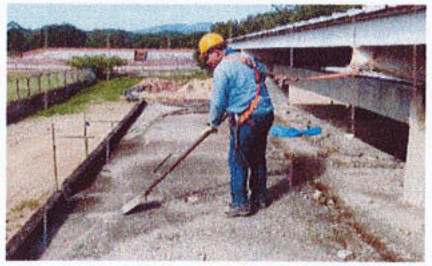

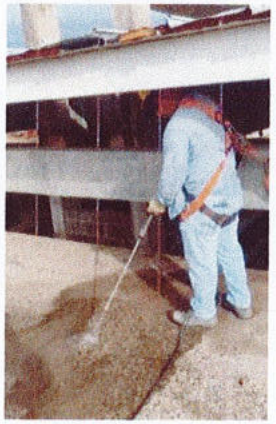

DIMENSIONES

LOCALIZACIÓN	Longitud(m)	Ancho (m)	Alto (m)	Area/Unidad	REPETICIONES	TOTAL
Viga canal Auditorio	41,47	3,94		163,40	1,00	163,40
					SubTotal	163,40
Pasa			0		0	163,40
					Total	163,40

OBSERVACIONES

Limpieza y lavado de pisos en concreto, ceramica, granito, arcilla, marmol, piedra, con acido muriatico	Unidad	m²	TOTAL	163,40

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PAZ DE ARIPORO


OBJETO: "ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLICTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS			**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA			
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS			**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024			
ACTIVIDAD:	Limpieza y desmanchado superficies de concreto, mortero, arcilla, piedra con sikalimpiador rinse proporc 1:2 con agua			**Unidad :**	m²	*CAPITULO*	*10*	*ESTRUCTURA*			
ITEM :	10,1	**ESP:**	PART 10.01	**CANT. CONTRACTUAL**	322,95	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	322,95	m²		Fecha:	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA



DIMENSIONES

LOCALIZACIÓN	Longitud(m)	ancho (m)	Alto (m)	Area/ Unidad	REPETICIONES	TOTAL
Edif. Auditorio	3,85	0,30	0,60	6,93	11,00	76,23
Edif. Auditorio	4,40	0,30	0,60	7,92	16,00	126,72
Edif. Lecturas	4,00			4,00	6,00	24,00
Edif. Lecturas	4,50			4,50	8,00	36,00
Edif. Lecturas	5,00			5,00	12,00	60,00
					SubTotal	**322,95**
Pasan			0		0	**322,95**
					Total	**322,95**

OBSERVACIONES

Limpieza y desmanchado superficies de concreto, mortero, arcilla, piedra con sikalimpiador rinse proporc 1:2 con agua	**Unidad**	**m²**	**TOTAL**	**322,95**

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ:
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PAZ DE ARIPORO

OBJETO: "ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS			**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA			
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS			**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024			
ACTIVIDAD:	Muro en bloque concreto 0.12 m			**Unidad :**	m²	*CAPITULO*	*13*	*MAMPOSTERIA*			
ITEM :	13,1	**ESP:**	PART 13.01	**CANT. CONTRACTUAL**	579,83	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	579,83	m²		Fecha:	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA






DIMENSIONES

LOCALIZACIÓN	Longitud(m)	ancho (m)	Alto (m)	Area/ Unidad	REPETICIONES	TOTAL
Auditorio	25,88	0,12	2,40	62,11	1,00	62,11
Auditorio	8,60	0,12	2,01	17,29	2,00	34,57
Auditorio	1,00	0,12	2,50	2,50	1,00	2,50
Auditorio	0,93	0,12	2,50	2,33	1,00	2,33
Auditorio	2,50	0,12	2,80	7,00	1,00	7,00
Auditorio	7,95	0,12	2,80	22,26	1,00	22,26
Auditorio	4,00	0,12	2,75	11,00	1,00	11,00
Auditorio	5,00	0,12	1,20	6,00	2,00	12,00
Auditorio	4,50	0,12	2,50	11,25	1,00	11,25
Auditorio	3,00	0,12	3,00	9,00	1,00	9,00
Auditorio	53,89	0,12	3,00	161,66	1,00	161,66
					SubTotal	335,68
Pasan			0		0	335,68
					Total	335,68

OBSERVACIONES

Muro en bloque concreto 0.12 m	**Unidad**	**m²**	**TOTAL**	**335,68**

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

BIBLIOTECA

PAZ DE ARIPORO

OBJETO: "ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONSORCIO INTERBIBLIOTECA

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS		**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA		
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS		**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024		
ACTIVIDAD:	Muro en ladrillo tolete comun 0.06 m (6 x 24.5 x 12 pandereta)		**Unidad :**	m²	*CAPITULO*	*13*	*MAMPOSTERÍA*		
ITEM : 13,2	**ESP:**	PART 13.02	**CANT. CONTRACTUAL**	162,56	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	162,56	m²	Fecha:	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA



OBSERVACIONES

DIMENSIONES

LOCALIZACIÓN	Longitud(m)	ancho (m)	Alto (m)	Area/ Unidad	REPETICIONES	TOTAL
Auditorio	19,30	0,12	3,17	61,18	2,00	122,36
Auditorio	7,22	0,12	3,00	21,66	1,00	21,66
Auditorio	4,63	0,12	3,00	13,89	2,00	27,78
Auditorio accesos	2,10	0,12	2,20	4,62	2,00	9,24
					SubTotal	162,56
Pasan			0		0	162,56
					Total	162,56

Muro en ladrillo tolete comun 0.06 m (6 x 24.5 x 12 pandereta)	**Unidad**	**m²**	**TOTAL**	**162,56**

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PAZ DE ARIPORO


OBJETO: "ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS			**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA			
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS			**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024			
ACTIVIDAD:	Muro en bloque concreto estructural calado persiana 10 x 20 x 20			**Unidad :**	m²	*CAPITULO*	*13*	*MAMPOSTERIA*			
ITEM :	13,3	**ESP:**	PART 13.03	**CANT. CONTRACTUAL**	70,96	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	70,96	m²		Fecha:	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA



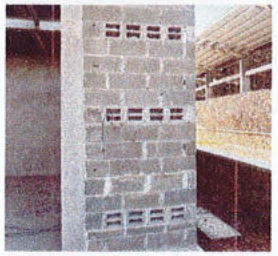


DIMENSIONES

LOCALIZACIÓN	Longitud(m)	ancho (m)	Alto (m)	Area/ Unidad	REPETICIONES	TOTAL
Auditorio	7,25	2,00		14,50	1,00	14,50
Auditorio	26,74	2,00		53,48	1,00	53,48
Auditorio	2,98	1,00		2,98	1,00	2,98
					SubTotal	70,96
Pasan			0		0	70,96
					Total	70,96

OBSERVACIONES

Muro en bloque concreto estructural calado persiana 10 x 20 x 20	Unidad	m³	TOTAL	70,96

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PAZ DE ARIPORO

OBJETO: "ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS			**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA			
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS			**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024			
ACTIVIDAD:	Dovela sencilla en concreto 0.09*0.09 m con anclaje en varilla 1/2" con epoxico para muro estructural			**Unidad :**	m	*CAPITULO*	*13*	*MAMPOSTERIA*			
ITEM :	N.P. 13,4	**ESP:**	INV 630 - 22	**CANT. CONTRACTUAL**	576,49	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	576,49	m		Fecha:	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA






DIMENSIONES

LOCALIZACIÓN	Longitud muro(m)	ancho (m)	Alto (m)	Volumen	REPETICIONES	TOTAL
Auditorio	25,88	0,12	2,40		25,88	62,11
Auditorio	8,60	0,12	2,01		8,60	17,29
Auditorio	1,00	0,12	2,50		1,00	2,50
Auditorio	0,93	0,12	2,50		0,93	2,33
Auditorio	2,50	0,12	2,80		2,50	7,00
Auditorio	7,95	0,12	2,80		7,95	22,26
Auditorio	4,00	0,12	2,75		4,00	11,00
Auditorio	5,00	0,12	1,20		5,00	6,00
Auditorio	4,50	0,12	2,50		4,50	11,25
Auditorio	3,00	0,12	3,00		3,00	9,00
Auditorio	46,55	0,12	3,00		46,55	139,66
					SubTotal	290,39
Pasan			0		0	290,39
					Total	290,39
Dovela sencilla en concreto 0.09*0.09 m con anclaje en varilla 1/2" con epoxico para muro estructural			Unidad	m	TOTAL	290,39

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


PAZ DE ARIPORO

OBJETO: "ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS			**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA			
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS			**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024			
ACTIVIDAD:	Pañete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y dila:aciones			**Unidad :**	m²	*CAPITULO*	*14*	*PAÑETE*			
ITEM :	14,1	**ESP:**	PART 14.01	**CANT. CONTRACTUAL**	1278,62	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	1278,62	m²		Fecha:	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA

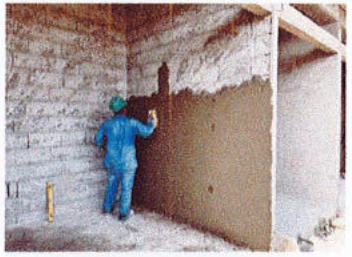

DIMENSIONES

LOCALIZACIÓN	Longitud(m)	Alto (m)	Caras	Area/ Unidad	REPETICIONES	TOTAL
Muro Concreto	25,88	2,40	2	62,11	1,00	124,22
Muro Concreto	8,60	2,01	1	17,29	2,00	34,57
Muro Concreto	1,00	2,50	1	2,50	1,00	2,50
Muro Concreto	0,93	2,50	1	2,33	1,00	2,33
Muro Concreto	2,50	2,80	1	7,00	1,00	7,00
Muro Concreto	7,95	2,80	1	22,26	1,00	22,26
Muro Concreto	4,00	2,75	1	11,00	1,00	11,00
Muro Concreto	5,00	1,20	2	6,00	2,00	24,00
Muro Concreto	4,50	2,50	2	11,25	1,00	22,50
Muro Concreto	3,00	3,00	2	9,00	1,00	18,00
Muro Concreto	83,90	3,00	2	251,70	1,00	503,40
Muro Concreto	9,95	3,00	2	29,85	1,00	59,70
Muro Concreto	13,70	3,00	1	41,10	1,00	41,10
Muro Concreto	2,35	3,00	2	7,05	4,00	56,40
Muro Concreto	0,90	3,00	2	2,70	1,00	5,40
Muro Concreto	1,55	3,00	2	4,65	1,00	9,30
Muro Concreto	2,37	3,00	2	7,11	1,00	14,22
Muro Concreto	1,15	3,00	2	3,45	1,00	6,90
Muro Concreto	2,40	3,00	2	7,20	1,00	14,40
Muro Concreto	9,95	3,00	2	29,85	1,00	59,70
Muro Tolete	7,56	3,17	1	23,97	2,00	47,93
Muro Tolete	7,22	3,00	2	21,66	1,00	43,32
Muro Tolete	4,63	3,00	2	13,89	2,00	55,56
Muro Tolete	2,10	2,20	2	4,62	2,00	18,48
					SubTotal	1204,19
Pasan			0		0	1204,19
					Total	1204,19

OBSERVACIONES

Pañete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones	Unidad	m²	TOTAL	1204,19

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PAZ DE ARIPORO

OBJETO: "ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS		**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA		
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS		**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024		
ACTIVIDAD:	Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:3		**Unidad :**	m²	*CAPITULO*	*15*	*ENCHAPES BASES Y PISOS*		
ITEM : 15,6	**ESP:**	PART 15.06	**CANT. CONTRACTUAL**	561,74	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	561,74	m²	Fecha:	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA






DIMENSIONES

LOCALIZACIÓN	Longitud(m)	Alto (m)	Ancho (m)	Area/ Unidad	REPETICIONES	TOTAL
A-10 Auditorio	9,10		2,37	21,57	1,00	21,57
A-11 Cocina	5,12		2,32	11,88	1,00	11,88
A-12 Deposito auditorio	2,47		2,74	6,77	1,00	6,77
A-13 Basuras	2,00		2,50	5,00	1,00	5,00
A-14 Cuarto de Voz y Datos	2,72		2,32	6,31	1,00	6,31
A-15 Cuarto Tecnico	2,02		2,36	4,77	1,00	4,77
A-16 Planta de Emergencia	2,38		3,65	8,69	1,00	8,69
A-17 Cuarto de Aseo y Baños E	2,54		7,60	19,30	1,00	19,30
A-18 Baños Mujeres y Hombres	9,25		4,06	37,56	1,00	37,56
A-19 Camara de Aire	9,22		1,00	9,22	1,00	9,22
A-20 Salon Multiple	9,82		9,70	95,25	1,00	95,25
A-21 Hall	9,07		1,86	16,87	1,00	16,87
AREA COLUMNAS				3,86	1,00	3,86
					SubTotal	243,18
Descuento			0		0	3,86
					Total	239,32

OBSERVACIONES

Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:3	Unidad	m²	TOTAL	239,32

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PAZ DE ARIPORO

OBJETO: "ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS			**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA			
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS			**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024			
ACTIVIDAD:	Muro en bloque concreto 0.12 m			**Unidad :**	m²	*CAPITULO*	*27*	*MAMPOSTERIA*			
ITEM : 27,1	**ESP:**	PART 27.01		**CANT. CONTRACTUAL**	367,19	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	367,19	m²		Fecha:	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA






DIMENSIONES

LOCALIZACIÓN	Longitud(m)	ancho (m)	Alto (m)	Area/ Unidad	REPETICIONES	TOTAL
Edif. Lecturas	2,22	0,12	2,50	5,55	1,00	5,55
Edif. Lecturas	2,20	0,12	2,50	5,50	1,00	5,50
Edif. Lecturas	3,22	0,12	2,50	8,05	1,00	8,05
Edif. Lecturas	2,13	0,12	2,50	5,33	2,00	10,65
Edif. Lecturas	0,40	0,12	2,50	1,00	2,00	2,00
Edif. Lecturas	7,45	0,12	2,50	18,63	1,00	18,63
Edif. Lecturas	5,20	0,12	2,50	13,00	1,00	13,00
					SubTotal	63,38
Pasan			0		0	63,38
					Total	63,38

OBSERVACIONES

Muro en bloque concreto 0.12 m	Unidad	m²	TOTAL	63,38

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

BIBLIOTECA

PAZ DE ARIPORO

OBJETO: "ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONSORCIO INTERBIBLIOTECA

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS			**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA			
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS			**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024			
ACTIVIDAD:	Muro en bloque concreto estructural calado persiana 10 x 20 x 20			**Unidad :**	m²	*CAPITULO*	*27*	*MAMPOSTERIA*			
ITEM :	27,2	**ESP:**	PART 27.02	**CANT. CONTRACTUAL**	79,61	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	79,61	m²		Fecha:	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA






DIMENSIONES

LOCALIZACIÓN	Longitud(m)	ancho (m)	Alto (m)	Area/ Unidad	REPETICIONES	TOTAL
Edif. Lecturas	2,37		1,08	2,56	4,00	10,24
Edif. Lecturas	2,27		1,08	2,45	3,00	7,35
Edif. Lecturas	2,37		0,61	1,45	5,00	7,23
Pasan			0		SubTotal	24,82
					0	24,82
					Total	24,82

OBSERVACIONES

Muro en bloque concreto estructural calado persiana 10 x 20 x 20	Unidad	m²	TOTAL	24,82

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

BIBLIOTECA

PAZ DE ARIPORO

OBJETO: "ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONSORCIO INTERBIBLIOTECA

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS			**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA			
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS			**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024			
ACTIVIDAD:	Pañete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones			**Unidad :**	m²	*CAPITULO*	*27*	*MAMPOSTERIA*			
ITEM :	27.3	**ESP:**	PART 27.03	**CANT. CONTRACTUAL**	649,29	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	649,29	m²		Fecha:	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA






DIMENSIONES

LOCALIZACIÓN	Longitud(m)	Alto (m)	Caras	Area/ Unidad	REPETICIONES	TOTAL
Edif. Lecturas	2,22	2,50	2	5,55	1,00	11,1
Edif. Lecturas	2,20	2,50	2	5,5	1,00	11
Edif. Lecturas	3,22	2,50	1	8,05	1,00	8,05
Edif. Lecturas	2,13	2,50	2	5,325	2,00	21,3
Edif. Lecturas	0,40	2,50	2	1	2,00	4
Edif. Lecturas	7,45	2,50	2	18,625	1,00	37,25
Edif. Lecturas	5,20	2,50	1	13	1,00	13
Edif. Lecturas	9,84	2,50	2	24,6	2,00	98,4
Edif. Lecturas	5,24	2,50	2	13,1	2,00	52,4
Edif. Lecturas	4,63	2,50	1	11,575	4,00	46,3
Edif. Lecturas	5,95	2,50	2	14,875	2,00	59,5
Edif. Lecturas	1,60	2,50	1	4	2,00	8
Edif. Lecturas	1,73	2,50	1	4,325	1,00	4,325
Edif. Lecturas	2,17	2,50	1	5,425	1,00	5,425
Edif. Lecturas	2,05	2,50	2	5,125	1,00	10,25
Edif. Lecturas	30,05	0,50	2	15,025	1,00	30,05
Edif. Lecturas	1,51	0,65	2	0,9815	1,00	1,963
Edif. Lecturas	1,80	0,70	2	1,26	1,00	2,52
Edif. Lecturas	1,67	0,74	2	1,2358	1,00	2,4716
Edif. Lecturas	1,75	0,79	2	1,3825	1,00	2,765
Edif. Lecturas	1,83	0,49	2	0,8967	1,00	1,7934
Edif. Lecturas	1,90	0,53	2	1,007	1,00	2,014
Edif. Lecturas	1,98	0,70	2	1,386	1,00	2,772
Edif. Lecturas	2,04	0,95	2	1,938	1,00	3,876
Edif. Lecturas	2,11	0,95	2	2,0045	1,00	4,009
					SubTotal	444,53
Pasan			0		0	444,53
					Total	444,53

OBSERVACIONES

Pañete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones	**Unidad**	**m²**	**TOTAL**	**444,53**

BIBLIOTECA	PAZ DE ARIPORO									CONSORCIO INTERBIBLIOTECA	
	OBJETO: "ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"										
	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES										
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS			**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA			
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS			**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024			
ACTIVIDAD:	Pañete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones			**Unidad :**	m²	*CAPITULO*	*27*	*MAMPOSTERIA*			
ITEM :	27,3	**ESP:**	PART 27.03	**CANT. CONTRACTUAL**	649,29	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	649,29	m²		Fecha:	12/12/2025
FOTO O ESQUEMA					**DIMENSIONES**						

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

BIBLIOTECA

PAZ DE ARIPORO

OBJETO: "ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONSORCIO INTERBIBLIOTECA

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS			**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA	
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS			**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024	
ACTIVIDAD:	Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:3			**Unidad :**	m²	*CAPITULO*	*28,4*	*ENCHAPES BASES Y PISOS*	
ITEM	28,4	**ESP:**	PART 28.04	**CANT. CONTRACTUAL**	830,3	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	830,30	m²	Fecha: 12/12/2025

FOTO O ESQUEMA



DIMENSIONES

LOCALIZACIÓN	Longitud(m)	Alto (m)	Ancho	Area/ Unidad	REPETICIONES	TOTAL
A1 - Sala de Lectura	21,25		7,40	157,25	1,00	157,25
A2 - Hemeroteca	10,64		7,40	78,74	1,00	78,74
A3 - Terraza	4,40		4,10	18,04	1,00	18,04
A4 - Sala de Informatica	23,10		4,97	114,81	1,00	114,81
A5 - Baños Hombres y Mujeres	11,20		4,67	52,30	1,00	52,30
A6 - Acceso/Recepcion/Informa	16,50		12,60	207,90	1,00	207,90
A7 - Sala Infantil Ludoteca/Sala	12,60		13,60	171,36	1,00	171,36
A8 - Baños Niños/Sanitarios	7,20		2,30	16,56	1,00	16,56
A9 - Baños Niños/Lavamanos	12,60		2,75	34,65	1,00	34,65
AREA COLUMNAS				21,31	1,00	21,31
					SubTotal	851,61
Descuento			0		0	21,31
					Total	830,30

OBSERVACIONES

Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:3	Unidad	m²	TOTAL	830,30

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

BIBLIOTECA

PAZ DE ARIPORO

OBJETO: "ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONSORCIO INTERBIBLIOTECA

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS		**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA		
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS		**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024		
ACTIVIDAD:	Alfajia en concreto de 3000 psi 0.34 x 0.05 m incluye refuerzo		**Unidad :**	m	*CAPITULO*	*35*	*PRELIMINARES*		
ITEM :	N.P. 35,17	**ESP:** INV 630 - 22	**CANT. CONTRACTUAL**	95,4	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	95,40	m	Fecha:	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA






DIMENSIONES

LOCALIZACIÓN	Longitud(m)	Alto (m)	Ancho (m)	Area/ Unidad	REPETICIONES	TOTAL
Entrada izq	10,00				1,00	10,00
Auditorio Entrada	37,00				1,00	37,00
Antepecho Muro Entrada biblio	13,00				1,00	13,00
Entrada Acceso de	20,00				1,00	20,00
Fachada principal	15,40				1,00	15,40
					SubTotal	95,40
Pasan			0		0	95,40
					Total	95,40

OBSERVACIONES

Alfajia en concreto de 3000 psi 0.34 x 0.05 m incluye refuerzo	Unidad	m	TOTAL	95,40

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


PAZ DE ARIPORO

OBJETO: "ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS		**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA		
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS		**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024		
ACTIVIDAD:	Alfajia en concreto de 3000 psi 0.30 x 0.05 m incluye refuerzo		**Unidad :**	m	*CAPITULO*	*35*	*PRELIMINARES*		
ITEM : N.P. 35,18	**ESP:**	INV 630 - 22	**CANT. CONTRACTUAL**	36,41	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	36,41	m	Fecha:	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA

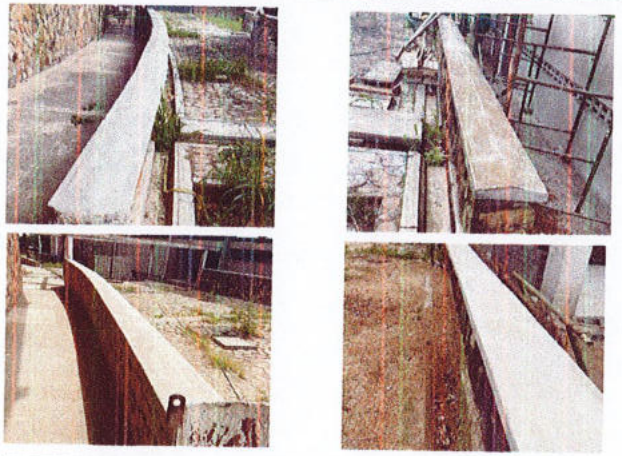

DIMENSIONES

LOCALIZACIÓN	Longitud(m)	Alto (m)	Ancho (m)	Area/ Unidad	REPETICIONES	TOTAL
Biblioteca muro	8,41				1,00	8,41
					SubTotal	8,41
Pasan			0		0	8,41
					Total	8,41

OBSERVACIONES

Alfajia en concreto de 3000 psi 0.30 x 0.05 m incluye refuerzo	Unidad	m	TOTAL	8,41

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PAZ DE ARIPORO


OBJETO: "ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS		**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA		
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS		**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024		
ACTIVIDAD:	Alfajia en concreto de 3000 psi 0.5 x 0.05 m incluye refuerzo		**Unidad :**	m	*CAPITULO*	*35*	*PRELIMINARES*		
ITEM : N.P. 35,19	**ESP:**	INV 630 - 22	**CANT. CONTRACTUAL**	70	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	70,00	m	Fecha:	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA






DIMENSIONES

LOCALIZACIÓN	Longitud(m)	Alto (m)	Ancho (m)	Area/ Unidad	REPETICIONES	TOTAL
Entrada	22,00				1,00	22,00
Biblioteca muro	12,00				1,00	12,00
Muro costado izquierdo	36,00				1,00	36,00
					SubTotal	70,00
Pasan			0		0	70,00
					Total	70,00

OBSERVACIONES

Alfajia en concreto de 3000 psi 0.5 x 0.05 m incluye refuerzo	**Unidad**	**m**	**TOTAL**	**70,00**

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


PAZ DE ARIPORO


OBJETO: "ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS			**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA	
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS			**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024	
ACTIVIDAD:	Demolicion manual placa de piso 0.10 m prom, con retiro			**Unidad :**	m²	*CAPITULO*	*36*	*ENCHAPES BASES Y PISOS*	
ITEM :	36,1	**ESP:**	PART 36.01	**CANT. CONTRACTUAL**	472,03	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	472,03 m²	Fecha:	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA



DIMENSIONES

LOCALIZACIÓN	Longitud(m)	Alto (m)	Ancho (m)	Area/ Unidad	REPETICIONES	TOTAL
Hall auditorio	4,60		9,59	44,13	1,00	44,13
					SubTotal	44,13
Pasan			0		0	44,13
					Total	44,13
Demolicion manual placa de piso 0.10 m prom. con retiro		Unidad			m²	44,13

OBSERVACIONES

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PAZ DE ARIPORO

OBJETO: "ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS			**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA	
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS			**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024	
ACTIVIDAD:	Excavacion mecanica en material conglomerado hasta 4 m (oruga)			**Unidad :**	m³	*CAPITULO*	*44*	*INSTALACIONES HIDRÁULICAS*	
ITEM :	NP 44,44	**ESP:**	INV 600 - 22	**CANT. CONTRACTUAL**	682	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	682,00	m³	Fecha: 12/12/2025

FOTO O ESQUEMA






DIMENSIONES

LOCALIZACIÓN	Longitud(m)	ancho (m)	Alto (m)	Volumen	REPETICIONES	TOTAL
Excavación Tanque	15,50	11,00	4,00	682,00	1,00	682,00
					SubTotal	682,00
Pasan			0		0	682,00
					Total	682,00

OBSERVACIONES

VER ANEXO TOPOGRAFÍA - reporte de volúmenes - secciones transversales

Excavacion mecanica en material conglomerado hasta 4 m (oruga)	Unidad	m³	TOTAL	682,00

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PAZ DE ARIPORO

OBJETO: "ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS			**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA			
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS			**VALOR ACTUAL.**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024			
ACTIVIDAD:	Equipo sistema contraincendios diesel horizontal certf. UL/FM Bomba lider 500 gpm, 145 psi Øs 4" Ød 3", 125 hp sobre base flexible, Bomba Jockey 50 gpm y 160 psi Øs Ød 1 1/2", 7.5 hp, 2 tableros de control programables, acces. valv. Suministro e Inst			**Unidad :**	und	*CAPITULO*	*46*	*SISTEMA CONTRA INCENDIO*			
ITEM	44,49	**ESP:**	PART 46.49	**CANT. CONTRACTUAL**	1	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	1,00	und		Fecha:	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA



DIMENSIONES

LOCALIZACIÓN	Longitud(m)	ancho (m)	Alto (m)	Volumen	REPETICIONES	TOTAL
Tanque red contraincendios					0,50	0,50
					SubTotal	0,50
Pasan			0		0	0,50
					Total	0,50

OBSERVACIONES

Equipo sistema contraincendios diesel horizontal certf. UL/FM Bomba lider 500 gpm, 145 psi Øs 4" Ød 3", 125 hp sobre base flexible, Bomba Jockey 50 gpm y 160 psi Øs Ød 1 1/2", 7.5 hp, 2 tableros de control programables, acces. valv. Suministro e Inst	Unidad	und	TOTAL	0,50

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

882

PAZ DE ARIPORO

OBJETO: "ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS			**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA			
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS			**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024			
ACTIVIDAD:	Cargue manual y retiro de material hasta 6 Km			**Unidad :**	m³	*CAPITULO*	*47*	*APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO*			
ITEM :	47,8	**ESP:**	PART 47.08	**CANT. CONTRACTUAL**	366,51	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	366,51	m³		Fecha:	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA






DIMENSIONES

LOCALIZACIÓN	Longitud(m)	ancho (m)	Alto (m)	Volumen	REPETICIONES	TOTAL
Vol Tanque Secc 1	13,20	8,15	3,10	333,50	1,00	333,50
Vol Tanque Secc 2	8,10	8,15	0,30	19,80	1,00	19,80
Vol Tanque Secc 3	3,60	8,15	0,45	13,20	1,00	13,20
Pasan			0		SubTotal	366,51
					0	366,51
					Total	366,51

OBSERVACIONES

VER ANEXO TOPOGRAFÍA - reporte de volúmenes - secciones transversales

Cargue manual y retiro de material hasta 6 Km	Unidad	m³	TOTAL	366,51

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

BIBLIOTECA

PAZ DE ARIPORO

OBJETO: "ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONSORCIO INTERBIBLIOTECA

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS			**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA			
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS			**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024			
ACTIVIDAD:	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado			**Unidad :**	m³	*CAPITULO*	47	*APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO*			
ITEM :	47,9	**ESP:**	INV 610-22	**CANT. CONTRACTUAL**	315,49	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	315,49	m³		Fecha:	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA



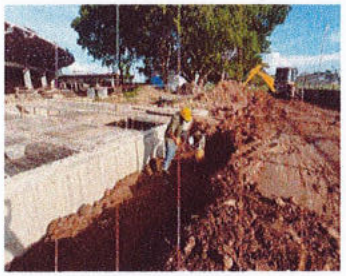

DIMENSIONES

LOCALIZACIÓN	Longitud(m)	ancho (m)	Alto (m)	Volumen	REPETICIONES	TOTAL
Excavación Tanque	15,50	11,00	4,00	682,00	1,00	682,00
Vol Tanque Secc 1	13,20	8,15	3,10	333,50	1,00	333,50
Vol Tanque Secc 2	8,10	8,15	0,30	19,80	1,00	19,80
Vol Tanque Secc 3	3,60	8,15	0,45	13,20	1,00	13,20
					SubTotal	682,00
Descuento			0		0	366,51
					Total	315,49
Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado				Unidad	m³	TOTAL 315,49

OBSERVACIONES

VER ANEXO TOPOGRAFÍA - reporte de volúmenes - secciones transversales

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PAZ DE ARIPORO

OBJETO: "ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS		**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA		
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS		**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024		
ACTIVIDAD:	Losa o placa en concreto de 4000 psi impermeabilizado para tapa en tanque semi o enterrados		**Unidad :**	m³	*CAPITULO*	*47*	*APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO*		
ITEM : 47,10	**ESP:**	INV 630-22	**CANT. CONTRACTUAL**	11,49	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	11,49	m³	Fecha:	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA









DIMENSIONES

LOCALIZACIÓN	Longitud(m)	Ancho (m)	Alto (m)	Volumen	REPETICIONES	TOTAL
Placa tapa TQ	13,00	7,95	0,10	10,34	1,00	10,34
Acceso tapa 1	1,25	2,00	0,10	0,25	1,00	0,25
Acceso tapa 2	1,30	1,35	0,10	0,18	2,00	0,35
Viga Eje A-C	5,05	0,30	0,20	0,30	3,00	0,91
Viga Eje C-E	7,05	0,30	0,20	0,42	2,00	0,85
					SubTotal	12,09
Descuento Acceso tapas			0		0	0,60
					Total	11,49
Losa o placa en concreto de 4000 psi impermeabilizado para tapa en tanque semi o enterrados			Unidad	m³	TOTAL	11,49

OBSERVACIONES

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PAZ DE ARIPORO


OBJETO: "ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS			**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA			
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS			**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024			
ACTIVIDAD:	Dilatacion en Cinta PVC-022			**Unidad :**	m	*CAPITULO*	47	*APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO*			
ITEM :	47,12	**ESP:**	PART 47.12	**CANT. CONTRACTUAL**	57,35	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	57,35	m		Fecha:	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA



DIMENSIONES

LOCALIZACIÓN	Longitud(m)	ancho (m)	Alto (m)	L parcial(m)	REPETICIONES	TOTAL
Eje A 1-3	7,95			7,95	1,00	7,95
Eje C 1-3	7,95			7,95	1,00	7,95
Eje E 1-3	7,95			7,95	1,00	7,95
Eje 1 A-E	13,00			13,00	1,00	13,00
Eje 3 A-E	13,00			13,00	1,00	13,00
Eje 2 C-E	7,50			7,50	1,00	7,50
					SubTotal	57,35
Pasan			0		0	57,35
					Total	57,35
Dilatacion en Cinta PVC-022			**Unidad**	**m**	**TOTAL**	**57,35**

OBSERVACIONES

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PAZ DE ARIPORO

OBJETO: "ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS			**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA			
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS			**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024			
ACTIVIDAD:	Placa o losa de fondo en concreto 4000 Psi impermeabilizado, resistencia 280 Kg/cm²			**Unidad :**	m³	*CAPITULO*	*47*	*APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO*			
ITEM :	47,13	**ESP:**	INV 630-22	**CANT. CONTRACTUAL**	33,62	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	33,62	m³		Fecha:	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA






OBSERVACIONES

DIMENSIONES

LOCALIZACIÓN	Longitud(m)	ancho (m)	Alto (m)	Volumen	REPETICIONES	TOTAL
Eje A1-3 - Eje E1-3	13,2	8,15	0,30	32,27	1,00	32,27
Eje B1	0,4	8,15	0,30	0,98	1,00	0,98
Eje D1	0,15	8,15	0,30	0,37	1,00	0,37
					SubTotal	33,62
Pasan			0		0	33,62
					Total	33,62
Placa o losa de fondo en concreto 4000 Psi impermeabilizado, resistencia 280 Kg/cm²			**Unidad**	**m³**	**TOTAL**	**33,62**

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PAZ DE ARIPORO


OBJETO: "ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS			**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA	
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS			**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024	
ACTIVIDAD:	Muro en concreto de 4000 psi impermeabilizado, para tanque semienterrado			**Unidad :**	m³	*CAPITULO*	*47*	*APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO*	
ITEM :	47,14	**ESP:**	INV 630-22	**CANT. CONTRACTUAL**	60,42	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	60,42	m³	Fecha: 12/12/2025

FOTO O ESQUEMA






OBSERVACIONES

DIMENSIONES

LOCALIZACIÓN	Longitud(m)	ancho (m)	Alto (m)	Volumen	REPETICIONES	TOTAL
1 D-E	4,67	0,3	3,4	4,76	1,00	4,76
3 D-E	4,67	0,3	3,4	4,76	1,00	4,76
E 1-3	7,95	0,3	3,4	8,11	1,00	8,11
2 D-E	4,87	0,3	3,4	4,97	1,00	4,97
A 1-3	7,95	0,3	3,65	8,71	1,00	8,71
1 A-B	4,1	0,3	3,65	4,49	1,00	4,49
3 A-B	4,1	0,3	3,65	4,49	1,00	4,49
1 B-D	3,63	0,3	4,1	4,46	1,00	4,46
3 B-D	3,63	0,3	4,1	4,46	1,00	4,46
C 1-3	7,14	0,3	4,1	8,78	1,00	8,78
2 C-D	1,97	0,3	4,1	2,42	1,00	2,42
					SubTotal	60,42
Pasan			0		0	60,42
					Total	60,42
Muro en concreto de 4000 psi impermeabilizado, para tanque semienterrado			**Unidad**	**m³**	**TOTAL**	**60,42**

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

BIBLIOTECA

PAZ DE ARIPORO


OBJETO: "ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONSORCIO INTERBIBLIOTECA

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS			**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA			
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS			**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024			
ACTIVIDAD:	Acero de Refuerzo Grado 60			**Unidad :**	kg	*CAPITULO*	*47*	*APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO*			
ITEM :	47,15	**ESP:**	INV 640-22	**CANT. CONTRACTUAL**	9941,42	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	9941,42	kg		Fecha:	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA





DIMENSIONES

LOCALIZACIÓN	Longitud (m)	Producto	Peso (kg)	T parcial	REPETICIONES	TOTAL
Tapa	11,60	#3	0,560	6,50	9,00	58,46
Tapa	10,00	#3	0,560	5,60	12,00	67,20
Tapa	8,15	#3	0,560	4,56	62,00	282,97
Pórtico	8,05	#3	0,560	4,51	10,00	45,08
Tapa	8,00	#3	0,560	4,48	21,00	94,08
Tapa	6,00	#3	0,560	3,36	21,00	70,56
Tapa	3,80	#3	0,560	2,13	8,00	17,02
Tapa	3,20	#3	0,560	1,79	17,00	30,46
Pórtico	2,36	#3	0,560	1,32	53,00	70,04
Tapa	2,15	#3	0,560	1,20	9,00	10,84
Pórtico	1,86	#3	0,560	1,04	52,00	54,16
Tanque	1,36	#3	0,560	0,76	714,00	543,78
Columnas	1,00	#3	0,560	0,56	178,00	99,68
Pórtico	0,96	#3	0,560	0,54	304,00	163,43
Pórtico	0,76	#3	0,560	0,43	80,00	34,05
Losa fondo	8,40	#4	0,990	8,32	146,00	1214,14
Pórtico	8,35	#4	0,994	8,30	20,00	166,00
Muros	7,80	#4	0,994	7,75	126,00	976,90
Muros	7,50	#4	0,994	7,46	126,00	939,33
Losa fondo	5,63	#4	0,994	5,60	92,00	514,85
Pórtico	5,47	#4	0,994	5,44	12,00	65,25
Losa fondo	5,05	#4	0,994	5,02	92,00	461,81
Pórtico	4,90	#4	0,994	4,87	8,00	38,96
Columnas	4,05	#4	0,994	4,03	24,00	96,62
Muros	4,00	#4	0,994	3,98	214,00	850,86

PAZ DE ARIPORO

OBJETO: "ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS			**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA			
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS			**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024			
ACTIVIDAD:	Acero de Refuerzo Grado 60			**Unidad :**	kg	*CAPITULO*	47	*APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO*			
ITEM :	47,15	**ESP:**	INV 640-22	**CANT. CONTRACTUAL**	9941,42	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	9941,42	kg		Fecha:	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA













DIMENSIONES

Losa fondo	3,88	#4	0,994	3,86	92,00	354,82
Pórtico	3,63	#4	0,994	3,61	8,00	28,87
Columnas	3,60	#4	0,994	3,58	16,00	57,25
Muros	3,55	#4	0,994	3,53	206,00	726,91
Columnas	3,35	#4	0,994	3,33	24,00	79,92
Muros	3,30	#4	0,994	3,28	280,00	918,46
Muros	2,95	#4	0,994	2,93	84,00	246,31
Pórtico	2,88	#4	0,994	2,86	4,00	11,45
Pórtico	2,69	#4	0,994	2,67	8,00	21,39
Pórtico	2,15	#4	0,994	2,14	4,00	8,55
Pórtico	2,00	#4	0,994	1,99	8,00	15,90
Pórtico	10,03	#5	1,552	15,57	2,00	31,13
Pórtico	9,58	#5	1,552	14,87	2,00	29,74
Pórtico	8,28	#5	1,552	12,85	2,00	25,70
Pórtico	7,78	#5	1,552	12,07	2,00	24,15
Pórtico	6,28	#5	1,552	9,75	2,00	19,49
Pórtico	5,98	#5	1,552	9,28	2,00	18,56
Pórtico	5,92	#5	1,552	9,19	4,00	36,75
Pórtico	4,48	#5	1,552	6,95	2,00	13,91
Pórtico	4,28	#5	1,552	6,64	2,00	13,29
Placa tapa	11,90	#3	0,560	6,66	1,00	6,66
Placa tapa	8,15	#3	0,560	4,56	8,00	36,51
Placa tapa	6,15	#3	0,560	3,44	8,00	27,55
Placa tapa	10,30	#3	0,560	5,77	1,00	5,77
Placa tapa	8,45	#3	0,560	4,73	4,00	18,93
Placa tapa	3,50	#3	0,560	1,96	6,00	11,76
Placa tapa	4,10	#3	0,560	2,30	6,00	13,78
Placa tapa	6,00	#3	0,560	3,36	51,00	171,36

PAZ DE ARIPORO

OBJETO: "ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS			**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA			
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS			**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024			
ACTIVIDAD:	Acero de Refuerzo Grado 60			**Unidad :**	kg	*CAPITULO*	*47*	*APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO*			
ITEM :	47,15	**ESP:**	INV 640-22	**CANT. CONTRACTUAL**	9941,42	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	9941,42	kg		Fecha:	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA





DIMENSIONES

					SubTotal	9941,42
Pasan			0		0	9941,42
					Total	9941,42
Acero de Refuerzo Grado 60			**Unidad**	**kg**	**TOTAL**	**9941,42**

OBSERVACIONES

VER ANEXO: Cartilla de aceros - Tanque

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


PAZ DE ARIPORO

"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS	**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO INTERBIBLIOTECA
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS	**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	020-RAPLL-2024
ACTIVIDAD:	Replanteo en media tension	**Unidad :**	km	*CAPITULO* *48*	*48. RED DE MEDIA TENSIÓN 34.5 KV COMPACTA*
ITEM : 48,01	**ESP:** PART 48.01	**CANT. CONTRACTUAL**	0,4	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2** 0,40	FECHA : 12/12/2025

FOTO O ESQUEMA

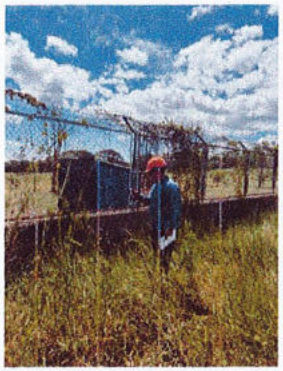



DIMENSIONES

Descripcion	LOCALIZACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Perimetro (m)	Altura(m)	Repeticiones	TOTAL
	E0-E1	47,00				1	0,047
	E1-E2	60,00				1	0,06
	E2-E3	60,00				1	0,06
	E3-E4	61,00				1	0,061
	E4-E5	62,00				1	0,062
	E5-E6	45,00				1	0,045
	E6-E7	37,00				1	0,037
	E7-E8	30,00				1	0,03
					SubTotal		0,40
	Pasan				0		0,40
					Total		0,40

OBSERVACIONES

Replanteo en media tension	Unidad	km	TOTAL	0,40

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

892

PAZ DE ARIPORO

"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS	**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA	
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS	**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024	
ACTIVIDAD:	Apertura de hueco para poste o templete en M.T. 34.5 KV	**Unidad :**	und	*CAPITULO*	*48*	*48. RED DE MEDIA TENSIÓN 34.5 KV COMPACTA*	
ITEM : 48,02	**ESP:** PART 48.02	**CANT. CONTRACTUAL**	5	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	5,00	FECHA :	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA



DIMENSIONES

Descripcion	LOCALIZACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Perimetro (m)	Altura(m)	Repeticiones	TOTAL
	E1					1	1
	E2						0
	E3						0
	E4					1	1
	E5					1	1
	E6					1	1
	E7						0
	E8					1	1
					SubTotal		5,00
	Pasan				0		5,00
					Total		5,00
	Apertura de hueco para poste o templete en M.T. 34.5 KV			Unidad	und	TOTAL	5,00

OBSERVACIONES

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


PAZ DE ARIPORO


"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS	**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA	
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS	**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024	
ACTIVIDAD:	Poste de concreto 14 m x 1050 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada	**Unidad :**	und	*CAPITULO*	*48*	*48. RED DE MEDIA TENSIÓN 34.5 KV COMPACTA*	
ITEM : 48,03	**ESP:** PART 48.03	**CANT. CONTRACTUAL**	1	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	1,00	FECHA :	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA





DIMENSIONES

Descripcion	LOCALIZACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Perimetro (m)	Altura(m)	Repeticiones	TOTAL
	E1						0
	E2						0
	E3						0
	E4						0
	E5					1	1
	E6						0
	E7						0
	E8						0
					SubTotal		1,00
	Pasan				0		1,00
					Total		1,00

OBSERVACIONES

Poste de concreto 14 m x 1050 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada	Unidad	und	TOTAL	1,00

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PAZ DE ARIPORO

"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS	**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA	
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS	**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024	
ACTIVIDAD:	Poste de concreto 14 m x 1350 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada	**Unidad :**	und	*CAPITULO*	*48*	*48. RED DE MEDIA TENSIÓN 34.5 KV COMPACTA*	
ITEM : 48,04	**ESP:** PART 48.04	**CANT. CONTRACTUAL**	4	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	4,00	FECHA :	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA





DIMENSIONES

Descripcion	LOCALIZACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Perimetro (m)	Altura(m)	Repeticiones	TOTAL
	E1					1	1
	E2						0
	E3						0
	E4					1	1
	E5						0
	E6					1	1
	E7						0
	E8					1	1
					SubTotal		4,00
	Pasan				0		4,00
					Total		4,00

OBSERVACIONES

Poste de concreto 14 m x 1350 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada	Unidad	und	TOTAL	4,00

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PAZ DE ARIPORO

"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS	**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA	
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS	**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024	
ACTIVIDAD:	Estructura la-480 para red compacta 34.5 kv, final del circuito triangular, suministro y vestida	**Unidad :**	und	*CAPITULO*	*48*	*48. RED DE MEDIA TENSIÓN 34.5 KV COMPACTA*	
ITEM 48,05	**ESP:** PART 48.05	**CANT. CONTRACTUAL**	2	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	2,00	FECHA :	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA





DIMENSIONES

Descripcion	LOCALIZACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Perimetro (m)	Altura(m)	Repeticiones	TOTAL
	E0					1	1
	E2						0
	E3						0
	E4						0
	E5						0
	E6						0
	E7						0
	E8					1	1
					SubTotal		2,00
	Pasan				0		2,00
					Total		2,00

OBSERVACIONES

Estructura la-480 para red compacta 34.5 kv, final del circuito triangular, suministro y vestida	Unidad	und	TOTAL	2,00

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


PAZ DE ARIPORO

"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS	**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA	
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS	**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024	
ACTIVIDAD:	Estructura la-481 para red compacta 34.5 kv, retencion doble triangular, suministro y vestida	**Unidad :**	und	*CAPITULO*	*48*	*48. RED DE MEDIA TENSIÓN 34.5 KV COMPACTA*	
ITEM : 48,06	**ESP:** PART 48.06	**CANT. CONTRACTUAL**	2	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	2,00	FECHA :	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA

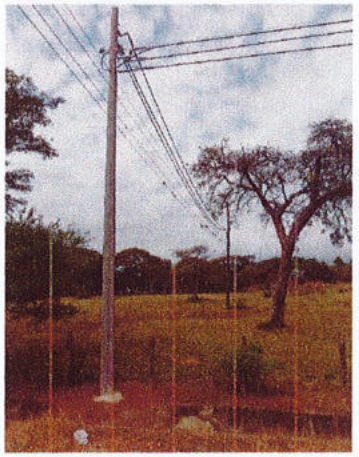

DIMENSIONES

Descripcion	LOCALIZACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Perimetro (m)	Altura(m)	Repeticiones	TOTAL
	E1					1	1
	E2						0
	E3						0
	E4						0
	E5						0
	E6					1	1
	E7						0
	E8						0
					SubTotal		2,00
	Pasan				0		2,00
					Total		2,00
	Estructura la-481 para red compacta 34.5 kv, retencion doble triangular, suministro y vestida			Unidad	und	TOTAL	2,00

OBSERVACIONES

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PAZ DE ARIPORO

"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS	**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA	
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS	**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024	
ACTIVIDAD:	Estructura la-463 para red compacta 34.5 kv, circuito tangencial, suministro y vestida	**Unidad :**	und	*CAPITULO*	*48*	*48. RED DE MEDIA TENSIÓN 34.5 KV COMPACTA*	
ITEM 48,07	**ESP:** PART 48.07	**CANT. CONTRACTUAL**	1	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	1,00	FECHA :	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA



DIMENSIONES

Descripcion	LOCALIZACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Perimetro (m)	Altura(m)	Repeticiones	TOTAL
	E1						0
	E2						0
	E3						0
	E4						0
	E5					1	1
	E6						0
	E7						0
	E8						0
					SubTotal		1,00
	Pasan				0		1,00
					Total		1,00
	Estructura la-463 para red compacta 34.5 kv, circuito tangencial, suministro y vestida			Unidad	und	TOTAL	1,00

OBSERVACIONES

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

898

PAZ DE ARIPORO

"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS	**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO INTERBIBLIOTECA
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS	**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	020-RAPLL-2024
ACTIVIDAD:	Red de media tension a 34.5 kv compacta acsr nº 4/0 AWG), suministro, tendido y tensionado	**Unidad :**	m	*CAPITULO* *48*	*48. RED DE MEDIA TENSIÓN 34.5 KV COMPACTA*
ITEM : 48,08	**ESP:** PART 48.08	**CANT. CONTRACTUAL**	402	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	402,00 FECHA : 12/12/2025

FOTO O ESQUEMA





DIMENSIONES

Descripcion	LOCALIZACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Perimetro (m)	Altura(m)	Repeticiones	TOTAL
	E0-E1	47,00				1	47
	E1-E2	60,00				1	60
	E2-E3	60,00				1	60
	E3-E4	61,00				1	61
	E4-E5	62,00				1	62
	E5-E6	45,00				1	45
	E6-E7	37,00				1	37
	E7-E8	30,00				1	30
					SubTotal		402,00
	Pasan				0		402,00
					Total		402,00

OBSERVACIONES

Red de media tension a 34.5 kv compacta acsr nº 4/0 AWG), suministro, tendido y tensionado	Unidad	m	TOTAL	402,00

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PAZ DE ARIPORO

"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS	**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA	
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS	**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024	
ACTIVIDAD:	Espaciador angular 34.5kv, suministro y colocacion	**Unidad :**	und	*CAPITULO*	*48*	*48. RED DE MEDIA TENSIÓN 34.5 KV COMPACTA*	
ITEM : 48,09	**ESP:** PART 48.09	**CANT. CONTRACTUAL**	44	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	44,00	FECHA :	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA



DIMENSIONES

Descripcion	LOCALIZACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Perimetro (m)	Altura(m)	Repeticiones	TOTAL
	E0-E1	47,00				5	5
	E1-E2	60,00				6	6
	E2-E3	60,00				7	7
	E3-E4	61,00				7	7
	E4-E5	62,00				7	7
	E5-E6	45,00				5	5
	E6-E7	37,00				4	4
	E7-E8	30,00				3	3
					SubTotal		44,00
	Pasan				0		44,00
					Total		44,00

OBSERVACIONES

Espaciador angular 34.5kv, suministro y colocacion	Unidad	und	TOTAL	44,00

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PAZ DE ARIPORO


"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS	**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO INTERBIBLIOTECA
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS	**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	020-RAPLL-2024
ACTIVIDAD:	Cable mensajero en acero extrareforzado ø 1/4" para red compacta. suministro, tendido y tensionado	**Unidad :**	m	*CAPITULO* *48*	*48. RED DE MEDIA TENSIÓN 34.5 KV COMPACTA*
ITEM : 48.10	**ESP:** PART 48.10	**CANT. CONTRACTUAL**	402.00	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	402.00 — FECHA : 12/12/2025

FOTO O ESQUEMA





DIMENSIONES

Descripcion	LOCALIZACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Perimetro (m)	Altura(m)	Repeticiones	TOTAL
	E0-E1	47,00				1	47
	E1-E2	60,00				1	60
	E2-E3	60,00				1	60
	E3-E4	61,00				1	61
	E4-E5	62,00				1	62
	E5-E6	45,00				1	45
	E6-E7	37,00				1	37
	E7-E8	30,00				1	30
					SubTotal		402,00
	Pasan				0		402,00
					Total		402,00

OBSERVACIONES

Cable mensajero en acero extrareforzado ø 1/4" para red compacta. suministro, tendido y tensionado	Unidad	m	TOTAL	402,00

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PAZ DE ARIPORO

"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS	**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA	
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS	**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024	
ACTIVIDAD:	Puesta a tierra para cable mensajero. suministro e instalacion	**Unidad :**	und	*CAPITULO*	*48*	*48. RED DE MEDIA TENSIÓN 34.5 KV COMPACTA*	
ITEM : 48,11	**ESP:** PART 48.11	**CANT. CONTRACTUAL**	2	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	2,00	FECHA :	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA



DIMENSIONES

Descripcion	LOCALIZACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Perimetro (m)	Altura(m)	Repeticiones	TOTAL
	E1					1	1
	E2						0
	E3						0
	E4						0
	E5						0
	E6						0
	E7						0
	E8					1	1
					SubTotal		2,00
	Pasan				0		2,00
					Total		2,00

OBSERVACIONES

Puesta a tierra para cable mensajero. suministro e instalacion	Unidad	und	TOTAL	2,00

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PAZ DE ARIPORO

"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS	**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO INTERBIBLIOTECA
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS	**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	020-RAPLL-2024
ACTIVIDAD:	Cimentacion para poste de 10/12 m.	**Unidad :**	und	*CAPITULO*	*48* — *48. RED DE MEDIA TENSIÓN 34.5 KV COMPACTA*
ITEM 48,12	**ESP:** PART 48.12	**CANT. CONTRACTUAL**	5	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	5,00 — FECHA : 12/12/2025

FOTO O ESQUEMA





DIMENSIONES

Descripcion	LOCALIZACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Perimetro (m)	Altura(m)	Repeticiones	TOTAL
	E1					1	1
	E2						0
	E3						0
	E4					1	1
	E5					1	1
	E6					1	1
	E7						0
	E8					1	1
					SubTotal		5,00
	Pasan				0		5,00
					Total		5,00
	Cimentacion para poste de 10/12 m.			Unidad	und	TOTAL	5,00

OBSERVACIONES

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


PAZ DE ARIPORO

"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS	**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA	
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS	**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024	
ACTIVIDAD:	Deshincada de poste de ferroconcreto	**Unidad :**	und	*CAPITULO*	*48*	*48. RED DE MEDIA TENSIÓN 34.5 KV COMPACTA*	
ITEM : 48,13	**ESP:** PART 48.13	**CANT. CONTRACTUAL**	2	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	2,00	FECHA :	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA

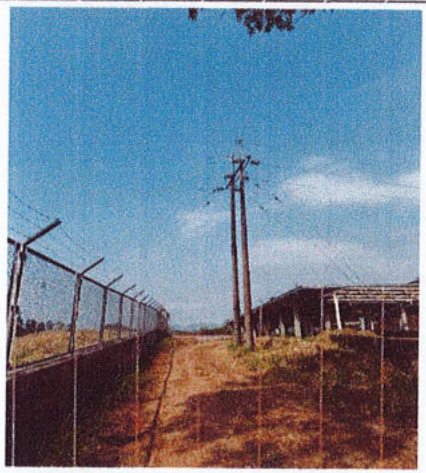

DIMENSIONES

Descripcion	LOCALIZACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Perimetro (m)	Altura(m)	Repeticiones	TOTAL
	E1						0
	E2						0
	E3						0
	E4						0
	E5						0
	E6						0
	E7						0
	E8						0
	ESTRUCTURA EXISTENTE					2	2
					SubTotal		2,00
	Pasan				0		2,00
					Total		2,00
Deshincada de poste de ferroconcreto				Unidad	und	TOTAL	2,00

OBSERVACIONES

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

BIBLIOTECA

PAZ DE ARIPORO

"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONSORCIO INTERBIBLIOTECA

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS	**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO INTERBIBLIOTECA
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS	**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	020-RAPLL-2024
ACTIVIDAD:	Desmantelada red de media tensión	**Unidad :**	m	*CAPITULO* *48*	*48. RED DE MEDIA TENSIÓN 34.5 KV COMPACTA*
ITEM : 48,14	**ESP:** PART 48.14	**CANT. CONTRACTUAL**	367	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2** 367,00	**FECHA :** 12/12/2025

FOTO O ESQUEMA





DIMENSIONES

Descripcion	LOCALIZACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Perimetro (m)	Altura(m)	Repeticiones	TOTAL
	E1						0
	E2						0
	E3						0
	E4						0
	E5						0
	E6						0
	E7						0
	E8						0
	ESTRUCTURA EXISTENTE					367	367
					SubTotal		367,00
	Pasan				0		367,00
					Total		367,00
	Desmantelada red de media tensión			Unidad	m	TOTAL	367,00

OBSERVACIONES

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PAZ DE ARIPORO

"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS		**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS		**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024
ACTIVIDAD:	Descargadores de sobre tension (jgo/3) 36 kv cambio red compacta abierta, suministro e instalacion		**Unidad :**	und	*CAPITULO*	*48*	*48. RED DE MEDIA TENSIÓN 34.5 KV COMPACTA*
ITEM : 48,15	**ESP:**	PART 48.15	**CANT. CONTRACTUAL**	2	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	2,00	FECHA : 12/12/2025

FOTO O ESQUEMA



DIMENSIONES

Descripcion	LOCALIZACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Perimetro (m)	Altura(m)	Repeticiones	TOTAL
	E0					1	1
	E2						0
	E3						0
	E4						0
	E5						0
	E6						0
	E7						0
	E8					1	1
	ESTRUCTURA EXISTENTE						0
					SubTotal		2,00
	Pasan				0		2,00
					Total		2,00

OBSERVACIONES

Descargadores de sobre tension (jgo/3) 36 kv cambio red compacta abierta, suministro e instalacion	Unidad	und	TOTAL	2,00

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


PAZ DE ARIPORO


"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS	**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA	
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS	**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024	
ACTIVIDAD:	Bayoneta de retension doble. Suministro e instalación	**Unidad :**	und	*CAPITULO*	*48*	*48. RED DE MEDIA TENSIÓN 34.5 KV COMPACTA*	
ITEM 48,16	**ESP:** PART 48.16	**CANT. CONTRACTUAL**	4	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	4,00	FECHA :	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA

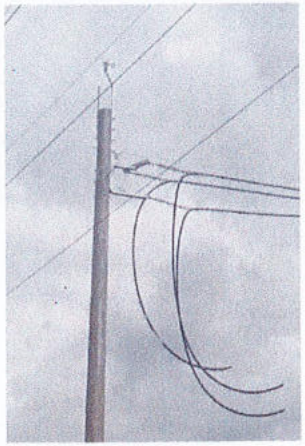

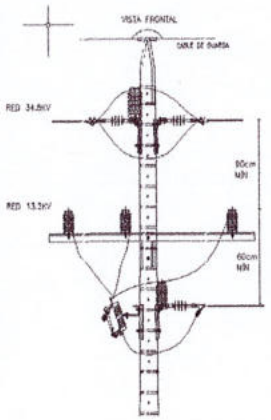

DIMENSIONES

Descripcion	LOCALIZACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Perimetro (m)	Altura(m)	Repeticiones	TOTAL
	E0					1	1
	E1					1	1
	E2						0
	E3						0
	E4						0
	E5						0
	E6						0
	E7					1	1
	E8					1	1
					SubTotal		4,00
	Pasan				0		4,00
					Total		4,00

Bayoneta de retension doble. Suministro e instalación	Unidad	und	TOTAL	4,00

OBSERVACIONES

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


PAZ DE ARIPORO

"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS	**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA	
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS	**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024	
ACTIVIDAD:	Bayoneta sencilla para alineamiento. Suministro e instalación	**Unidad :**	und	*CAPITULO*	*48*	*48. RED DE MEDIA TENSIÓN 34.5 KV COMPACTA*	
ITEM : 48,17	**ESP:** PART 48.17	**CANT. CONTRACTUAL**	1	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	1,00	FECHA :	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA

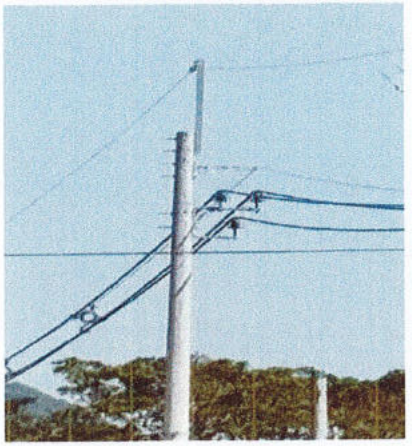

DIMENSIONES

Descripcion	LOCALIZACION	Longitud (m)	Ancho (m)	Perimetro (m)	Altura(m)	Repeticiones	TOTAL
	E0						0
	E1						0
	E2						0
	E3						0
	E4						0
	E5					1	1
	E6						0
	E7						0
	E8						0
					SubTotal		1,00
	Pasan				0		1,00
					Total		1,00

OBSERVACIONES

Bayoneta sencilla para alineamiento. Suministro e instalación	Unidad	und	TOTAL	1,00

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PAZ DE ARIPORO

"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS	**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO INTERBIBLIOTECA		
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS	**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	020-RAPLL-2024		
ACTIVIDAD:	Cable de guarda para red de 34.5 kV. Suministro e instalacion	**Unidad :**	m	*CAPITULO*	*48*	*48. RED DE MEDIA TENSIÓN 34.5 KV COMPACTA*	
ITEM : 48,18	**ESP:** PART 48.18	**CANT. CONTRACTUAL**	402	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	402,00	FECHA :	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA



DIMENSIONES

Descripcion	LOCALIZACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Perimetro (m)	Altura(m)	Repeticiones	TOTAL
	E0-E1	47,00				1	47
	E1-E2	60,00				1	60
	E2-E3	60,00				1	60
	E3-E4	61,00				1	61
	E4-E5	62,00				1	62
	E5-E6	45,00				1	45
	E6-E7	37,00				1	37
	E7-E8	30,00				1	30
	E8						0
					SubTotal		402,00
	Pasan				0		402,00
					Total		402,00

OBSERVACIONES

Cable de guarda para red de 34.5 kV. Suministro e instalacion	Unidad	m	TOTAL	402,00

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PAZ DE ARIPORO

"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS	**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA	
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS	**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024	
ACTIVIDAD:	Red primaria tres hilos 3 N° 1/0 ACSR, suministro, tendido y tensionado	**Unidad :**	m	*CAPITULO*	*49*	*49. RED DE MEDIA TENSIÓN 13.2 KV AEREA*	
ITEM : 49,01	**ESP:** PART 49.01	**CANT. CONTRACTUAL**	62	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	62,00	FECHA :	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA





DIMENSIONES

Descripcion	LOCALIZACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Perimetro (m)	Altura(m)	Repeticiones	TOTAL
	E0-E1	47,00					0
	E1-E2	60,00					0
	E2-E3	60,00					0
	E3-E4	61,00					0
	E4-E5	62,00				1	62
	E5-E6	45,00					0
	E6-E7	37,00					0
	E7-E8	30,00					0
	E8						0
					SubTotal		62,00
	Pasan				0		62,00
					Total		62,00

OBSERVACIONES

Red primaria tres hilos 3 N° 1/0 ACSR, suministro, tendido y tensionado	Unidad	m	TOTAL	62,00

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PAZ DE ARIPORO


"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS	**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA	
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS	**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024	
ACTIVIDAD:	Estructura 730 derivacion trifasica con cortacircuito, con cruceta metalica doble 2 m, aislador de suspension sintetico-polimerico para 15 kv, suministro, transporte y montaje	**Unidad :**	und	*CAPITULO*	*49*	*49. RED DE MEDIA TENSIÓN 13.2 KV AEREA*	
ITEM 49.02	**ESP:** PART 49.02	**CANT. CONTRACTUAL**	1.00	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	1.00	FECHA :	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA



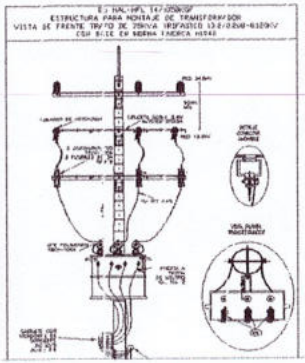

DIMENSIONES

Descripcion	LOCALIZACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Perimetro (m)	Altura(m)	Repeticiones	TOTAL
	E1						0
	E2						0
	E3						0
	E4						0
	E5					1	1
	E6						0
	E7						0
	E8						0
							0
					SubTotal		1,00
	Pasan				0		1,00
					Total		1,00

OBSERVACIONES

Estructura 730 derivacion trifasica con cortacircuito, con cruceta metalica doble 2 m, aislador de suspension sintetico- polimerico para 15 kv, suministro, transporte y montaje	Unidad	und	TOTAL	1,00

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PAZ DE ARIPORO


"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS	**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA	
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS	**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024	
ACTIVIDAD:	Estructura P-103 para 13.2 KV, suministro, transporte y montaje	**Unidad :**	und	*CAPITULO*	*49*	*49. RED DE MEDIA TENSIÓN 13.2 KV AEREA*	
ITEM : 49,03	**ESP:** PART 49.03	**CANT. CONTRACTUAL**	1	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	1,00	FECHA :	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA



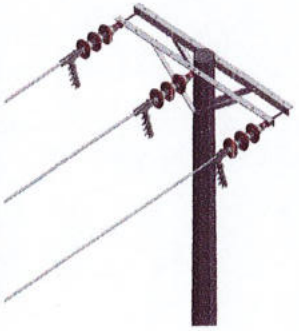

DIMENSIONES

Descripcion	LOCALIZACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Perimetro (m)	Altura(m)	Repeticiones	TOTAL
	E1						0
	E2						0
	E3						0
	E4					1	1
	E5						0
	E6						0
	E7						0
	E8						0
							0
					SubTotal		1,00
	Pasan				0		1,00
					Total		1,00

OBSERVACIONES

Estructura P-103 para 13.2 KV, suministro, transporte y montaje	Unidad	und	TOTAL	1,00

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PAZ DE ARIPORO

"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS	**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA	
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS	**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAP_L-2024	
ACTIVIDAD:	Estructura R-550, con aislador suspension sintetico-polimerico para 15 KV, suministro, transporte y montaje	**Unidad :**	und	*CAPITULO*	*49*	*49. RED DE MEDIA TENSIÓN 13.2 KV AEREA*	
ITEM : 49.04	**ESP:** PART 49.04	**CANT. CONTRACTUAL**	1.00	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	1.00	FECHA :	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA



DIMENSIONES

Descripcion	LOCALIZACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Perimetro (m)	Altura(m)	Repeticiones	TOTAL
	E1						0
	E2						0
	E3						0
	E4					1	1
	E5						0
	E6						0
	E7						0
	E8						0
							0
					SubTotal		1,00
	Pasan				0		1,00
					Total		1,00

OBSERVACIONES

Estructura R-550, con aislador suspension sintetico-polimerico para 15 KV, suministro, transporte y montaje	Unidad	und	TOTAL	1,00

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PAZ DE ARIPORO

"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS	**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO INTERBIBLIOTECA
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS	**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	020-RAPLL-2024
ACTIVIDAD:	Estructura 711 transformador trifasico 75 kva 13.2 kv/208-120v, suministro, transporte y montaje	**Unidad :**	und	*CAPITULO* *50*	*50. TRANSFORMADORES*
ITEM : 50.01	**ESP:** PART 50.01	**CANT. CONTRACTUAL**	1.00	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2** 1.00	FECHA : 12/12/2025

FOTO O ESQUEMA





DIMENSIONES

Descripcion	LOCALIZACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Perimetro (m)	Altura(m)	Repeticiones	TOTAL
	E1						0
	E2						0
	E3						0
	E4						0
	E5					1	1
	E6						0
	E7						0
	E8						0
							0
					SubTotal		1,00
	Pasan				0		1,00
					Total		1,00

OBSERVACIONES

Estructura 711 transformador trifasico 75 kva 13.2 kv/208-120v, suministro, transporte y montaje	Unidad	und	TOTAL	1,00

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PAZ DE ARIPORO

"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS	**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA	
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS	**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024	
ACTIVIDAD:	Puesta a tierra para transformador, incluye 16 varillas de cobre 2.4m x 5/8", cable de cobre desnudo 2/0 AWG (105m), soldaduras exotermicas de 115 gr, caja de inspeccion y tratamiento de terreno. suministro e instalación	**Unidad :**	und	*CAPITULO*	*50*	*50. TRANSFORMADORES*	
ITEM : 50.02	**ESP:** PART 50.02	**CANT. CONTRACTUAL**	1.00	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	1.00	FECHA :	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA



DIMENSIONES

Descripcion	LOCALIZACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Perimetro (m)	Altura(m)	Repeticiones	TOTAL
	E1						0
	E2						0
	E3						0
	E4						0
	E5					1	1
	E6						0
	E7						0
	E8						0
							0
					SubTotal		1,00
	Pasan				0		1,00
					Total		1,00

OBSERVACIONES

Puesta a tierra para transformador, incluye 16 varillas de cobre 2.4m x 5/8", cable de cobre desnudo 2/0 AWG (105m), soldaduras exotermicas de 115 gr, caja de inspeccion y tratamiento de terreno.	Unidad	und	TOTAL	1,00

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


PAZ DE ARIPORO

"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS	**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO INTERBIBLIOTECA
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS	**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	020-RAPLL-2024
ACTIVIDAD:	Puesta a tierra para descargadores de sobretensión, con varilla de cobre de 5/8" x 2.4 m. incluye: cable de cobre desnudo AWG nº 2, tubo metálico galvanizado imc 1/2", cinta bandit,hebilla cinta bandit. suministro e instalacion	**Unidad :**	und	*CAPITULO* *50*	*50. TRANSFORMADORES*
ITEM 50.03	**ESP:** PART 50.03	**CANT. CONTRACTUAL**	1.00	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2** 1.00	FECHA : 12/12/2025

FOTO O ESQUEMA

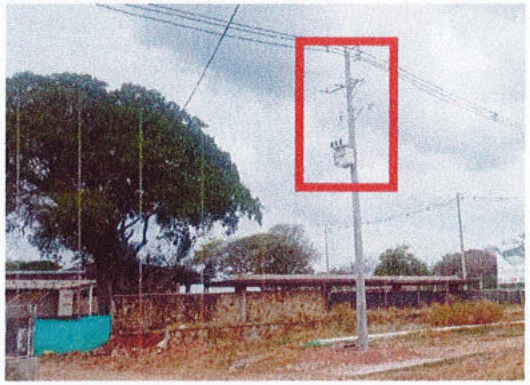

DIMENSIONES

Descripcion	LOCALIZACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Perimetro (m)	Altura(m)	Repeticiones	TOTAL
	E1						0
	E2						0
	E3						0
	E4						0
	E5					1	1
	E6						0
	E7						0
	E8						0
							0
					SubTotal		1,00
	Pasan				0		1,00
					Total		1,00

OBSERVACIONES

Puesta a tierra para descargadores de sobretensión, con varilla de cobre de 5/8" x 2.4 m. incluye: cable de cobre desnudo AWG nº 2, tubo metálico galvanizado imc 1/2", cinta bandit,hebilla cinta bandit	Unidad	und	TOTAL	1,00

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PAZ DE ARIPORO

OBJETO: "ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS			**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024		**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA		
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS			**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024		
ACTIVIDAD:	Canalizacion ducto conduit pvc db tipo pesado 2 x 3", zona blanda. incluye cinta de prevención y arena lavada de río.			**Unidad :**	m		*CAPITULO*	*51*	*TRANSFORMADORES*		
ITEM :	51,04	**ESP:**	PART 51.04	**CANT. CONTRACTUAL**	90		**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	90,00	m	Fecha:	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA






DIMENSIONES

Descripcion	LOCALIZACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Perimetro (m)	Altura(m)	Repeticiones	TOTAL
	CS274-1 TR A CS274-2 MEDIDA	12,00				1,00	12,00
	CS274-2 MEDIDA A CS274-3	21,50				1,00	21,50
					SubTotal		33,50
	Pasan				0		33,50
					Total		33,50
	Canalizacion ducto conduit pvc db tipo pesado 2 x 3", zona blanda. incluye cinta de prevención y arena lavada de río.			Unidad	m	TOTAL	33,50

OBSERVACIONES

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


PAZ DE ARIPORO


OBJETO: "ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS			**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA			
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS			**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024			
ACTIVIDAD:	Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre libre de halogenos, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.			**Unidad :**	und	*CAPITULO*	*52*	*INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS*			
ITEM :	52,12	**ESP:**	PART 52.12	**CANT. CONTRACTUAL**	34	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	34,00	und		Fecha:	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA



DIMENSIONES

Descripcion	LOCALIZACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Perimetro (m)	Altura(m)	Repeticiones	TOTAL
SALIDA INT SENCILLO	Baño niñas biblioteca					1,00	1,00
	Baño niñas biblioteca					1,00	1,00
	Baño niñas biblioteca					1,00	1,00
	Deposito muebles					2,00	2,00
	Baños empleados					1,00	1,00
	Cuarto de aseo					1,00	1,00
	Baño hombres					2,00	2,00
	Baño mujeres					2,00	2,00
	Pasillo auditorio					1,00	1,00
	Generador					1,00	1,00
	Cuarto de voz y datos					1,00	1,00
	Subestación					1,00	1,00
SALIDA INT SENCILLO	Subestación					1,00	1,00
	Deposito auditorio					2,00	2,00
	camerinos					1,00	1,00
	Baño camerinos					2,00	2,00
	Cocina					1,00	1,00
	Cuarto de proyección					1,00	1,00
	Pasillo cuarto de proyección					2,00	2,00
					SubTotal		25,00
	Pasan				0		25,00
					Total		25,00

OBSERVACIONES

Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre libre de halogenos, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	Unidad	und	TOTAL	25,00

PAZ DE ARIPORO

OBJETO: "ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS			**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA			
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS			**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024			
ACTIVIDAD:	Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre libre de halogenos, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.			**Unidad :**	und	*CAPITULO*	*52*	*INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS*			
ITEM :	52,12	**ESP:**	PART 52.12	**CANT. CONTRACTUAL**	34	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	34,00	und		Fecha:	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA | **DIMENSIONES**

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PAZ DE ARIPORO

OBJETO: "ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS			**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA			
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS			**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024			
ACTIVIDAD:	Salida para interruptor doble, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre libre de halogenos, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.			**Unidad :**	und	*und*	*52*	*INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS*			
ITEM :	52,13	**ESP:**	PART 52.13	**CANT. CONTRACTUAL**	15	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	15,00	und		Fecha:	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA





DIMENSIONES

Descripcion	LOCALIZACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Perimetro (m)	Altura(m)	Repeticiones	TOTAL
SALIDA INT DOBLE	Baños niñas					1,00	1,00
	Sala infantil					1,00	1,00
	Video Fonoteca					1,00	1,00
	Información dirección					1,00	1,00
					SubTotal		4,00
	Pasan				0		4,00
					Total		4,00

OBSERVACIONES

Salida para interruptor doble, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre libre de halogenos, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuación de	Unidad	und	TOTAL	4,00

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ:
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PAZ DE ARIPORO

OBJETO: "ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS			**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA			
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS			**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024			
ACTIVIDAD:	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra. incluye: tubo pvc tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plastica 5800 o 2400, terminales de derivación, no incluye aparato			**Unidad :**	und	*CAPITULO*	*52*	*INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS*			
ITEM	52,14	**ESP:**	PART 52.14	**CANT. CONTRACTUAL**	75	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	75,00	und		Fecha:	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA



DIMENSIONES

Descripcion	LOCALIZACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Perimetro (m)	Altura(m)	Repeticiones	TOTAL
SALIDA TOMACORRIENTE	Sala de lectura					6,00	6,00
	Información dirección					5,00	5,00
	Video y fonoteca					2,00	2,00
	Sala infantil					2,00	2,00
	Ludoteca					6,00	6,00
SALIDA TOMACORRIENTE	Deposito de muebles					3,00	3,00
	Cuarto de aseo					1,00	1,00
	Información y carteleras					3,00	3,00
	Generador					1,00	1,00
	Voz y datos					1,00	1,00
	Subestación					1,00	1,00
	Deposito auditorio					2,00	2,00
	Camerinos					2,00	2,00
	Cocina					1,00	1,00
	Cafeteria					3,00	3,00
	Auditorio					2,00	2,00
					SubTotal		41,00
	Pasan				0		41,00
					Total		41,00

OBSERVACIONES

Salida para tomacorriente doble con polo a tierra. incluye: tubo pvc tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plastica 5800 o 2400, terminales de derivación, no incluye aparato	Unidad	und	TOTAL	41,00

BIBLIOTECA			PAZ DE ARIPORO							CONSORCIO INTERBIBLIOTECA	
			OBJETO: "ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"								
			MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES								
CONTRATISTA :		UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS		**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA			
ENTIDAD CONTRATANTE		REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS		**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024			
ACTIVIDAD:		Salida para tomacorriente doble con polo a tierra. incluye: tubo pvc tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plastica 5800 o 2400, terminales de derivación, no incluye aparato		**Unidad :**	und	*CAPITULO*	*52*	*INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS*			
ITEM	52,14	**ESP:**	PART 52.14	**CANT. CONTRACTUAL**	75	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	75,00	und		Fecha:	12/12/2025
FOTO O ESQUEMA						**DIMENSIONES**					

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PAZ DE ARIPORO


OBJETO: "ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS			**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA			
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS			**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024			
ACTIVIDAD:	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra gfci 15 a - 125 v, incluye: tubo pvc tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plastica 5800 o 2400, terminales de derivación, incluye aparato			**Unidad :**	und	*CAPITULO*	*52*	*INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS*			
ITEM :	52,17	**ESP:**	PART 52.17	**CANT. CONTRACTUAL**	8	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	8,00	und		Fecha:	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA







DIMENSIONES

Descripcion	LOCALIZACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Perimetro (m)	Altura(m)	Repeticiones	TOTAL
SALIDA TOMACORRIENTE GFCI	Baños niñas Biblioteca					1,00	1,00
	Baños empleados					1,00	1,00
	deposito de muebles					1,00	1,00
	Baños hombres y mujeres					1,00	1,00
	Cocina					2,00	2,00
					SubTotal		6,00
	Pasan				0		6,00
					Total		6,00

OBSERVACIONES

Salida para tomacorriente doble con polo a tierra gfci 15 a - 125 v, incluye: tubo pvc tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plastica 5800 o 2400, terminales de derivación, incluye aparato	Unidad	und	TOTAL	6,00

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


PAZ DE ARIPORO

OBJETO: "ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS			**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024		**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA		
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS			**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024		
ACTIVIDAD:	Canalizacion ducto conduit pvc 1", zona blanda. incluye cinta de prevención y arena lavada de río.			**Unidad :**	m		*CAPITULO*	*52*	*INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS*		
ITEM :	52,32	**ESP:**	PART 52.32	**CANT. CONTRACTUAL**	650		**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	650,00	m	Fecha:	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA

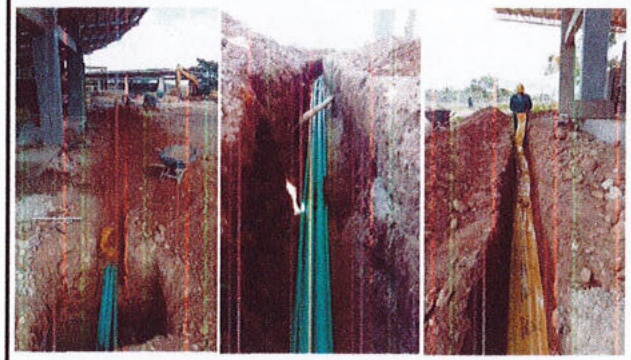

DIMENSIONES

Descripcion	LOCALIZACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Perimetro (m)	Altura(m)	Repeticiones	TOTAL
Ducto de 1x1"	CS274-4 A CS274-5 SUBESTACION	23,70					
	CS274-8 BIBLIOTECA A TABLEROS NORMAL Y REGULADO	9,00					
	CS274-9 A CS274-11 ENCERRAMIENTO	16,00					
	CS274-12 PASILLO A CS274-13 PASILLO	2,70					
Ducto de 2x1"	CS274-5 SUBESTACION A GABINETE PRINCIPAL	5,30					
	CS274-7 MURO PIEDRA A CS274-8 BIBLOTECA	21,00					
	CS274-8 BIBLIOTECA A CS274-9	24,00					
	CS274-1 TR A CS274-2 MEDIDA	12,00					
	CS274-2 MEDIDA A CS274-3	26,00					
	CS274-3 A CS274-4	17,00					
Ducto de 4x1"	CS274-5 SUBESTACION A CS274-6	9,50				4	38
	CS274-6 A CS274-7 MURO PIEDRA	18,00				4	72
					SubTotal		110,00
	Pasan				0		110,00
					Total		110,00

OBSERVACIONES

Canalizacion ducto conduit pvc 1", zona blanda. incluye cinta de prevención y arena lavada de río.	Unidad	m	TOTAL	110,00

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PAZ DE ARIPORO

OBJETO: "ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS			**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA			
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS			**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024			
ACTIVIDAD:	Caja de inspeccion cs-274			**Unidad :**	und	*CAPITULO*	*52*	*INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS*			
ITEM	52,39	**ESP:**	PART 52.39	**CANT. CONTRACTUAL**	8	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	8,00	und		Fecha:	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA



DIMENSIONES

Descripcion	LOCALIZACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Perimetro (m)	Altura(m)	Repeticiones	TOTAL
CS274	**CS274-3**					0,00	0,00
CS274	**CS274-4**					0,00	0,00
CS274	**CS274-11**					0,00	0,00
CS274	**CS274-12**					0,00	0,00
CS274	**CS274-1 TR A CS274-2 MEDIDA**					1,00	1,00
CS274	**CS274-2 MEDIDA A CS274-3**					1,00	1,00
CS274	**CS274-10**					1,00	1,00
CS274	**CS274-12**					1,00	1,00
					SubTotal		4,00
	Pasan				0		4,00
					Total		4,00
	Caja de inspeccion cs-274			Unidad	und	TOTAL	4,00

OBSERVACIONES

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


PAZ DE ARIPORO

OBJETO: "ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS			**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA			
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS			**VALOR ACTUAL**	$ 7.493.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024			
ACTIVIDAD:	Excavacion manual en material conglomerado < 1 m. (zanjas .30 >.60)			**Unidad :**	m³	*CAPITULO*	*52*	*INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS*			
ITEM :	52,45	**ESP:**	PART 52.45	**CANT. CONTRACTUAL**	256	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	256,00	m³		Fecha:	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA







DIMENSIONES

Descripcion	LOCALIZACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Perimetro (m)	Profundidad (m)	Repeticiones	TOTAL
Ducto de 1x1"		60,00	0,20		0,8	1,00	9,60
							0,00
							0,00
Ducto de 1x1 1/2"		636,00	0,20		0,8		0,00
Ducto de 1x2"		635,00	0,20		0,8	1,00	101,60
							0,00
							0,00
Ducto de 2x3"		111,50	0,40		0,8	1,00	35,68
					SubTotal		146,9
	Pasan				0		146,9
					Total		146,9

OBSERVACIONES

Excavacion manual en material conglomerado < 1 m. (zanjas .30 >.60)	Unidad	m³	TOTAL	146,9

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


PAZ DE ARIPORO

OBJETO: "ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS	**CONTRATO:**	009-RAPLL-2024	**INTERVENTORIA:**		CONSORCIO INTERBIBLIOTECA			
ENTIDAD CONTRATANTE	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS	**VALOR ACTUAL**	$ 7.496.291.404	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		020-RAPLL-2024			
ACTIVIDAD:	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	**Unidad :**	m³	*CAPITULO*	*52*	*INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS*			
ITEM : 52,46	**ESP:** PART 52.46	**CANT. CONTRACTUAL**	224,64	**CANT. ACTUALIZADA SEGÚN MOD 2**	224,64	m³		Fecha:	12/12/2025

FOTO O ESQUEMA


DIMENSIONES

Descripcion	LOCALIZACIÓN	Longitud (m)	Ancho (m)	Perimetro (m)	Profundidad (m)	Repeticiones	TOTAL
Ducto de 1x1"		60,00	0,20		0,8	1	9,6
							0
							0
Ducto de 1x1 1/2"		636,00	0,20		0,8		0
Ducto de 1x2"		635,00	0,20		0,8	1	101,6
							0
							0
Ducto de 2x3"		13,56	0,40		0,8	1	4,3392
					SubTotal		115,54
	Pasan				0		115,54
					Total		115,54

OBSERVACIONES

Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	Unidad	m³	TOTAL	115,54

ELABORÓ:
Ing Julian Felipe Pedraza M.
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ:
Ing. Martha Camargo
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ :
Ing. Marcela Carolina Perez
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

927

TUBOREP
BOMBAS Y REPARACIONES
NIT: 901.495.894

NOVIEMBRE 20 de 2025

UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAPLLANOS

YOPAL, CASANARE

Estimados

Asunto: **Constancia de pago del 50% del valor del equipo RCI Listado**

Por medio de la presente, **TUBOREP SAS**, identificada con NIT **901.495.894** certifica que la empresa **UNIÓN TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS**, **901.792.925**, realizó el pago correspondiente al **cincuenta por ciento (50%)** del valor total del **equipo RCI LISTADO.**

Así mismo, se deja constancia de que, una vez recibido dicho pago, **TUBOREP S.A.S. ha iniciado el proceso de adquisición, ensamble y preparación del equipo para su correspondiente importación**, cumpliendo con los tiempos y procedimientos establecidos entre ambas partes.

La presente se expide a solicitud de la parte interesada para los fines pertinentes.

Atentamente,

Tuborep S.A.S.

NIT: 901.495.894-1

Representante Legal

José del Carmen Turriago Chavarro

1015460003




UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS
NIT. 9 0 1 7 9 2 9 2 5 – 3
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 009-RAPLL-2024

CARTILLA DE ACEROS ITEM 47.15

G&J FERRETERIAS
EMPRESAS DE ACERO




TANQUE AGUA POTABLE
BIBLIOTECA PAZ DE ARIPORO
ORDEN DE DESPACHO

Lista de barras #3

DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO	UBICACION
0.15 — 11.30 — 0.15	9	#3	11.60	58.46	[9 En TAPA TK].
0.15 — 9.70 — 0.15	12	#3	10.00	67.20	[12 En TAPA TK].
0.15 — 7.85 — 0.15	62	#3	8.15	282.97	[62 En TAPA TK].
8.05	10	#3	8.05	45.08	[4 En PORTICO 5].[6 En PORTICO 7].
0.15 — 7.85	21	#3	8.00	94.08	[21 En TAPA TK].
0.15 — 5.85	21	#3	6.00	70.56	[21 En TAPA TK].
0.15 — 3.50 — 0.15	8	#3	3.80	17.02	[8 En TAPA TK].
0.15 — 2.90 — 0.15	17	#3	3.20	30.46	[17 En TAPA TK].
	53	#3	2.36	70.04	[53 En PORTICO 7].
0.15 — 1.85 — 0.15	9	#3	2.15	10.84	[9 En TAPA TK].
	52	#3	1.86	54.16	[52 En PORTICO 5].
	714	#3	1.36	543.78	[175 En PORTICO 1].[99 En PORTICO 2].[175 En PORTICO 3].[106 En PORTICO 4].[106 En PORTICO 6].[53 En PORTICO 8].








G&J®
+FERRETERIAS+
EMPRESAS DE ACERO

TANQUE AGUA POTABLE
BIBLIOTECA PAZ DE ARIPORO
ORDEN DE DESPACHO

DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO	UBICACION
 b=0.20 h=0.20 g=0.10	178	#3	1.00	99.68	[178 En COLUMNAS].
 b=0.19 h=0.19 g=0.10	304	#3	0.96	163.43	[126 En T POR 1].[52 En T POR 2].[126 En T POR 5].
 b=0.19 h=0.09 g=0.10	80	#3	0.76	34.05	[16 En T POR 4].[16 En T POR 6].[20 En T POR 7].[14 En T POR 8].[14 En T POR 9].

Peso total barras #3 =1,641.82 Kg

Lista de barras #4

	146	#4	8.40	1,226.40	[146 En LOSA FONDO].
	20	#4	8.35	167.00	[4 En PORTICO 4].[4 En PORTICO 5].[4 En PORTICO 6].[4 En PORTICO 7].[4 En PORTICO 8].
	126	#4	7.80	982.80	[126 En MUROS].
	126	#4	7.50	945.00	[126 En MUROS].
	92	#4	5.63	517.96	[92 En LOSA FONDO].
	12	#4	5.47	65.64	[4 En PORTICO 1].[4 En PORTICO 2].[4 En PORTICO 3].
	92	#4	5.05	464.60	[92 En LOSA FONDO].
	8	#4	4.90	39.20	[4 En PORTICO 1].[4 En PORTICO 3].
	24	#4	4.05	97.20	[24 En COLUMNAS].

G&J®
+FERRETERIAS+
EMPRESAS DE ACERO

TANQUE AGUA POTABLE
BIBLIOTECA PAZ DE ARIPORO
ORDEN DE DESPACHO

DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO	UBICACION
0.20 — 3.65 — 0.15	214	#4	4.00	856.00	[214 En MUROS].
0.20 — 3.48 — 0.20	92	#4	3.88	356.96	[92 En LOSA FONDO].
0.15 — 3.33 — 0.15	8	#4	3.63	29.04	[4 En PORTICO 1].[4 En PORTICO 3].
0.20 — 3.25 — 0.15	16	#4	3.60	57.60	[16 En COLUMNAS].
0.20 — 3.20 — 0.15	206	#4	3.55	731.30	[206 En MUROS].
0.20 — 3.00 — 0.15	24	#4	3.35	80.40	[24 En COLUMNAS].
0.20 — 2.95 — 0.15	280	#4	3.30	924.00	[280 En MUROS].
2.95	84	#4	2.95	247.80	[84 En MUROS].
0.15 — 2.58 — 0.15	4	#4	2.88	11.52	[4 En PORTICO 2].
0.15 — 2.39 — 0.15	8	#4	2.69	21.52	[4 En T POR 6].[4 En T POR 7].
0.15 — 1.85 — 0.15	4	#4	2.15	8.60	[4 En T POR 8].
0.15 — 1.70 — 0.15	8	#4	2.00	16.00	[4 En T POR 4].[4 En T POR 9].

Peso total barras #4 =7,846.54 Kg

Lista de barras #5

0.18 — 9.85	2	#5	10.03	31.29	[2 En T POR 1].
0.18 — 9.40	2	#5	9.58	29.89	[2 En T POR 5].
0.18 — 8.10	2	#5	8.28	25.83	[2 En T POR 5].
0.18 — 7.60	2	#5	7.78	24.27	[2 En T POR 1].
0.18 — 6.10	2	#5	6.28	19.59	[2 En T POR 1].
0.18 — 5.80	2	#5	5.98	18.66	[2 En T POR 5].
0.18 — 5.56 — 0.18	4	#5	5.92	36.94	[4 En T POR 2].
0.18 — 4.30	2	#5	4.48	13.98	[2 En T POR 5].
0.18 — 4.10	2	#5	4.28	13.35	[2 En T POR 1].

Peso total barras #5 =213.61 Kg
PESO TOTAL = 9,702.18 Kg

CARTERA DE DESPIECE - PLACA TANQUE

TIPO	FIGURA	LONGITUD DE CORTE	CANTIDAD EN UN ELEMENTO	CANTIDAD DE ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL	LONGITUD PARCIAL SEGÚN DIAMETRO DE LA VARILLA						No 3	No 4
						No 3 3/8"	No 4 1/2"	No 5 5/8"	No 6 3/4"	No 7 7/8"	No 8 1"	0.56 1/2"	1.56 5/8"
CORTE DESPIECE PLACA DE TANQUE													
PLACA DE TANQUE	0.15 — 11.30 — 0.15	11.90	1.00	1.00	1.00	11.90						6.66	
PLACA DE TANQUE	0.15 — 8.00	8.15	1.00	8.00	8.00	65.20						36.51	
PLACA DE TANQUE	0.15 — 6.00	6.15	1.00	8.00	8.00	49.20						27.55	
PLACA DE TANQUE	0.15 — 10.30 — 0.15	10.30	1.00	1.00	1.00	10.30						5.77	
PLACA DE TANQUE	0.15 — 8.46 — 0.15	8.76	1.00	4.00	4.00	35.04						19.61	
PLACA DE TANQUE	0.15 — 3.50 — 0.15	3.80	1.00	6.00	6.00	21.00						11.76	
PLACA DE TANQUE	0.15 — 3.80 — 0.15	4.10	1.00	6.00	6.00	24.60						13.78	
PLACA DE TANQUE	6.00	6.00	1.00	35.00	35.00	210.00						117.60	
												239.24	
												No 3	
												239.24	

PESO TOTAL DE ACERO KG		239.24
PESO TOTAL ALAMBRE KG		21.00

Victor Avila Fonseca
Contratista obra

Rafael Andres Bohorquez
RIL Interventoria

9702.18 Kg
239.24 Kg
Σ 9941.42 Kg

PRUEBAS DE LABORATORIO

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	COD: F-GO-079
Ingeniería, Bienes & Servicios de Colombia	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CONCRETOS	VERSION: 0
		Fecha de Aprobación: 10/01/2022
	LABORATORIO DE SUELOS CONCRETOS MATERIALES & ASFALTOS	Pagina 1 de 1

PROYECTO	ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE						
EMPRESA	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS						
FECHA REPORTE	11-nov.-25	NORMA	INVIAS 410 - 22 / NTC 1377	REFERENCIA	-	F´c (P.S.I)	3000 - 4000

MUESTRA Nº	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL ABSCISA MUESTRA	FECHA DE TOMA	BRIQUETA Nº	EDAD EN DIAS	FECHA PROGRAMADA PARA ROTURA	FECHA DE ROTURA	CARGA EN KG/CM2	RESISTENCIA EN PSI	DIAMETRO (cm)	% DE RESISTENCIA	SLUMP (Plg)	F´c DE DISEÑO
7*	RESALTO TRAPEZOIDAL TIPO POMPEYANO	RESALTO	19-may-25	7*	7	26-may-25	26-may-25	217	3101	15,1	77,5	5"	4000
				7*	14	2-jun-25	2-jun-25	252	3597	15,0	89,9		
				7*	28	16-jun-25	16-jun-25	283	4044	15,1	101,1		
				7*	28	16-jun-25	16-jun-25	284	4058	15,1	101,5		
8*	RESALTO TRAPEZOIDAL TIPO POMPEYANO	RESALTO	24-may-25	8*	7	31-may-25	31-may-25	222	3178	15,0	79,4	5"	4000
				8*	14	7-jun-25	7-jun-25	246	3511	15,0	87,8		
				8*	28	21-jun-25	21-jun-25	288	4120	15,0	103,0		
				8*	28	21-jun-25	21-jun-25	289	4132	15,0	103,3		
9*	MURO EN CONRETO REFORZADO	MURO REFORZADO	12-jun-25	9*	7	19-jun-25	19-jun-25	159	2274	15,0	75,8	5"	3000
				9*	14	26-jun-25	26-jun-25	188	2683	15,0	89,4		
				9*	28	10-jul-25	10-jul-25	224	3203	15,0	106,8		
				9*	28	10-jul-25	10-jul-25	222	3177	15,1	105,9		
10*	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS	RAMPAS	13-jun-25	10*	7	20-jun-25	20-jun-25	154	2195	15,1	73,2	5"	3000
				10*	14	27-jun-25	27-jun-25	183	2615	15,1	87,2		
				10*	28	11-jul-25	11-jul-25	224	3195	15,1	106,5		
				10*	28	11-jul-25	11-jul-25	228	3264	15,1	108,8		
11*	PLACA BASE	PLACA BASE	20-jun-25	11*	7	27-jun-25	27-jun-25	153	2189	15,0	73,0	5"	3000
				11*	14	4-jul-25	4-jul-25	185	2636	15,0	87,9		
				11*	28	18-jul-25	18-jul-25	226	3227	15,0	107,6		
				11*	28	18-jul-25	18-jul-25	230	3279	15,0	109,3		
12*	PLACA TARIMA METALDEK	PLACA TARIMA	6-ago-25	12*	7	13-ago-25	13-ago-25	161	2297	15,0	76,6	4"	3000
				12*	14	20-ago-25	20-ago-25	174	2490	15,0	83,0		
				12*	28	3-sep-25	3-sep-25	210	3005	15,0	100,2		
				12*	28	3-sep-25	3-sep-25	213	3041	15,0	101,4		

OBSERVACIONES * MUESTRAS TOMADAS Y TRANSPORTADAS POR EL CONTRATISTA.

APROBÓ

JULIAN ALBERTO IBARRA OJEDA - GEOTÉCNOLOGO UNIVERSIDAD DEL CAUCA - MP N° 19516-025263.

*Los resultados presentados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo

*El laboratorio no asume responsabilidad alguna por la reproducción parcial o total de éste documento sin la debida autorización escrita de la organización.

Dirección: Calle 20 N° 26 - 30
Tel: (+57) (8) 6349552 - 314 320 0284
E-mail: ibservicios2004@hotmail.com
Yopal – Casanare

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	COD: F-GO-079
IBS LAB Ingeniería, Bienes & Servicios de Colombia	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CONCRETOS	VERSION: 0
		Fecha de Aprobación: 10/01/2022
	LABORATORIO DE SUELOS CONCRETOS MATERIALES & ASFALTOS	Pagina 1 de 1

PROYECTO	ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE						
EMPRESA	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS						
FECHA REPORTE	11-nov.-25	NORMA	INVIAS 410 - 22 / NTC 1377	REFERENCIA	-	F´c (P.S.I)	3000 - 4000

MUESTRA Nº	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL ABSCISA MUESTRA	FECHA DE TOMA	BRIQUETA Nº	EDAD EN DIAS	FECHA PROGRAMADA PARA ROTURA	FECHA DE ROTURA	CARGA EN KG/CM2	RESISTENCIA EN PSI	DIAMETRO (cm)	% DE RESISTENCIA	SLUMP (Plg)	F´c DE DISEÑO
13*	PLACA PISO TANQUE	PLACA PISO	22-ago-25	13*	7	29-ago-25	29-ago-25	223	3182	15,1	79,6	5"	4000
				13*	14	5-sep-25	5-sep-25	248	3543	15,0	88,6		
				13*	28	19-sep-25	19-sep-25	283	4049	15,1	101,2		
				13*	28	19-sep-25	19-sep-25	284	4062	15,1	101,5		
14*	MUROS Y VIGAS TANQUE	MUROS Y VIGAS	11-sep-25	14*	7	18-sep-25	18-sep-25	222	3167	15,0	79,2	4"	4000
				14*	14	25-sep-25	25-sep-25	242	3461	15,0	86,5		
				14*	28	9-oct-25	9-oct-25	285	4075	15,0	101,9		
				14*	28	9-oct-25	9-oct-25	288	4118	15,0	103,0		
15*	PLACA TAPA TANQUE	PLACA TAPA	25-sep-25	15*	7	2-oct-25	2-oct-25	226	3230	15,0	80,7	5"	4000
				15*	14	9-oct-25	9-oct-25	244	3492	15,0	87,3		
				15*	28	23-oct-25	23-oct-25	289	4132	15,0	103,3		
				15*	28	23-oct-25	23-oct-25	287	4097	15,1	102,4		
16*	VIGA AEREA AUDITORIO	VIGA AEREA	29-sep-25	16*	7	6-oct-25	6-oct-25	216	3082	15,1	77,1	5"	4000
				16*	14	13-oct-25	13-oct-25	237	3380	15,1	84,5		
				16*	28	27-oct-25	27-oct-25	284	4058	15,1	101,5		
				16*	28	27-oct-25	27-oct-25	285	4070	15,1	101,7		
17*	VIGA AEREA AUDITORIO	VIGA AEREA	1-oct-25	17*	7	8-oct-25	8-oct-25	223	3181	15,0	79,5	4"	4000
				17*	14	15-oct-25	15-oct-25	268	3835	15,0	95,9		
				17*	28	29-oct-25	29-oct-25	296	4222	15,0	105,6		
				17*	28	29-oct-25	29-oct-25	295	4211	15,0	105,3		
18*	SOBRE PISO BAÑOS AUDITORIO	SOBRE PISO	8-oct-25	18*	7	15-oct-25	15-oct-25	174	2491	15,0	83,0	4"	3000
				18*	14	22-oct-25	22-oct-25	199	2848	15,0	94,9		
				18*	28	5-nov-25	5-nov-25	226	3228	15,0	107,6		
				18*	28	5-nov-25	5-nov-25	225	3219	15,0	107,3		

OBSERVACIONES * MUESTRAS TOMADAS Y TRANSPORTADAS POR EL CONTRATISTA.

APROBÓ

JULIAN ALBERTO IBARRA OJEDA - GEOTÉCNOLOGO UNIVERSIDAD DEL CAUCA - MP N° 19516-025263.

*Los resultados presentados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo

*El laboratorio no asume responsabilidad alguna por la reproducción parcial o total de éste documento sin la debida autorización escrita de la organización.

Dirección: Calle 20 N° 26 - 30
Tel: (+57) (8) 6349552 - 314 320 0284
E-mail: ibservicios2004@hotmail.com
Yopal – Casanare

IBSLAB Ingeniería, Bienes & Servicios de Colombia	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	COD: F-GO-079
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CONCRETOS	VERSION: 0
		Fecha de Aprobación: 10/01/2022
	LABORATORIO DE SUELOS CONCRETOS MATERIALES & ASFALTOS	Pagina 1 de 1

PROYECTO	ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE						
EMPRESA	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS						
FECHA REPORTE	11-nov.-25	**NORMA**	INVIAS 410 - 22 / NTC 1377	**REFERENCIA**	-	**F´c (P.S.I)**	3000 - 4000

MUESTRA Nº	ESTRUCTURA	ELEMENTO ESTRUCTURAL ABSCISA MUESTRA	FECHA DE TOMA	BRIQUETA Nº	EDAD EN DIAS	FECHA PROGRAMADA PARA ROTURA	FECHA DE ROTURA	CARGA EN KG/CM2	RESISTENCIA EN PSI	DIAMETRO (cm)	% DE RESISTENCIA	SLUMP (Plg)	F´c DE DISEÑO
19*	SOBRE PISO AUDITORIO	SOBRE PISO	9-nov-25	19*	7	16-nov-25	16-nov-25	157	2239	15,1	74,6	5"	3000
				19*	14	23-nov-25	23-nov-25	174	2483	15,0	82,8		
				19*	28	7-dic-25	7-dic-25	212	3033	15,1	101,1		
				19*	28	7-dic-25	7-dic-25	213	3046	15,1	101,5		
20*	PLACA PISO HALL AUDITORIO	PLACA PISO HALL AUDITORIO	14-oct-25	20*	7	21-oct-25	21-oct-25	162	2318	15,0	77,3	5"	3000
				20*	14	28-oct-25	28-oct-25	182	2602	15,0	86,7		
				20*	28	11-nov-25	11-nov-25	217	3104	15,0	103,5		
				20*	28	11-nov-25	11-nov-25	217	3099	15,0	103,3		

OBSERVACIONES * MUESTRAS TOMADAS Y TRANSPORTADAS POR EL CONTRATISTA.

APROBÓ

JULIAN ALBERTO IBARRA OJEDA - GEOTÉCNOLOGO UNIVERSIDAD DEL CAUCA - MP N° 19516-025263.

*Los resultados presentados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo

*El laboratorio no asume responsabilidad alguna por la reproducción parcial o total de éste documento sin la debida autorización escrita de la organización.

Dirección: Calle 20 N° 26 - 30
Tel: (+57) (8) 6349552 - 314 320 0284
E-mail: ibservicios2004@hotmail.com
Yopal – Casanare

UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS
NIT. 9 0 1 7 9 2 9 2 5 – 3
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 009-RAPLL-2024

CARTERAS TOPOGRAFICAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.118.554.264**
GAITAN FERNANDEZ

APELLIDOS
JOLMAR YESID

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **05-MAR-1993**
YOPAL
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA | **B+** G.S. RH | **M** SEXO

27-MAY-2011 YOPAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE IZQUIERDO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-4600100-00307588-M-1118554264-20110613 0027205001A 1 36950302

República de Colombia

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFIA

Nombre: JOLMAR YESID GAITAN FERNANDEZ
Cédula: 1118554264
Licencia Profesional No: 01-21688
De Fecha: 11 de marzo de 2022



TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA
SENA

Presidente

R: 02-11689

Validar la autenticidad de esta licencia mediante el Código QR anexo en la imagen
Recuerde que en el Registro Único de Topógrafos -RUTOPO, mediante la página Web www.cpnt.gov.co, también puede verificar esta licencia y su vigencia

939

República de Colombia

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

Ley 70 / 79

CERTIFICADO DE VIGENCIA No: 536617/2025

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

HACE CONSTAR

Que el(la) Señor(a) **JOLMAR YESID GAITAN FERNANDEZ** , identificado(a) con cédula de ciudadanía **No. 1118554264** , se encuentra inscrito(a) en el Registro Único de Topógrafos RUTOPO del CPNT como **TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA** de la Institución de Educación Superior **SENA** , bajo la Licencia Profesional **No. 01-21688** con fecha de expedición del **11 de Marzo de 2022.**

Que el(la) Señor(a) **JOLMAR YESID GAITAN FERNANDEZ**, tiene vigente su Licencia Profesional No. **01-21688** y a la fecha **NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** , que lo (la) inhabiliten en el ejercicio de su profesión.

Dada en Bogotá, D.C. a los **5 días del mes de Abril de 2025.**

LUIS ALEJANDRO ZAFRA JARAMILLO
Director Ejecutivo

***Firma del profesional**

*La firma del profesional es requerida para comprobar la anuencia de su participación en procesos contractuales. La falta de la firma del profesional NO invalida el certificado.

Notas 1- El anterior certificado no suple la Licencia Profesional para ejercer un cargo.
2- La validez del documento se puede verificar en la página web www.cpnt.gov.co a través del número de certificado de Vigencia.
3- Este certificado digital tiene plena validez de conformidad con lo establecido en el Art. 2 de la Ley 527 de 1999, decreto 1747 de 2000 y Art. 6 Parágrafo 3 de la Ley 962 de 2005.

INFORME DE MATERIALES - TANQUE

Alineación: EJE_TANQUE
Grupo de líneas de muestreo: LM_TANQUE
P.K. inicial: 0+000.000
P.K. final: 0+020.000

	Tipo de área	Área Metros cuadrados	Vol. incremental Metros cúbicos	Vol. acumul. Metros cúbicos
P.K.: 0+000.000				
	EXCAVACIÓN	0,00	0,00	0,00
P.K.: 0+002.000				
	EXCAVACIÓN	25,85	25,85	25,85
P.K.: 0+004.000				
	EXCAVACIÓN	35,53	61,38	87,22
P.K.: 0+006.000				
	EXCAVACIÓN	35,95	71,48	158,71
P.K.: 0+008.000				
	EXCAVACIÓN	36,44	72,39	231,09
P.K.: 0+010.000				
	EXCAVACIÓN	44,57	81,00	312,09
P.K.: 0+012.000				
	EXCAVACIÓN	45,71	90,27	402,37
P.K.: 0+014.000				
	EXCAVACIÓN	41,97	87,68	490,04
P.K.: 0+016.000				
	EXCAVACIÓN	42,75	84,73	574,77
P.K.: 0+018.000				
	EXCAVACIÓN	33,23	75,99	650,76
P.K.: 0+020.000				
	EXCAVACIÓN	0,00	31,24	682,00

JOLMAR YESID GAITAN FERNANDEZ
TOPOGRAFO
L.P. 01-21688 CPNT

UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS
NIT. 901792925-3
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 009-RAPLL-2024

NOMINA JULIO - NOVIEMBRE

RELACION DE DIAS LABORADOS

CODIGO:ATO-S FOR 05
Version: 1
FECHA: 26/05/2023

01 AL 15 DE JULIO DEL 2026

#	NOTAS	NOMBRE	CEDULA	CUENTA BANCARIA	CARGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	DIAS LABORADOS	SUELDOS	VALOR DIA	RETENCION SALUD 4%	RETENCION PENSION 4%	TOTAL A GIRAR	FIRMAS
1	[redacted]	NELSON ALBERTO ALVARADO VEGA	9,431,143	BANCOLOMBIA AHORROS 502000018611	INGRESIDENTE	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.0	$ 5,000,000.00	$ 166,666.67	$ 65,700.00	$ 65,700.00	$ 834,000.00	Nelson Alvarado
2		JAIME SANCHEZ	6,716,656	NEQUI 320 813 6983	MAESTRO DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.0	$ 4,000,000.00	$ 133,333.33	$ 65,700.00	$ 65,700.00	$ 1,834,300.00	Jaime Sanchez
3		HECTOR RODRIGUEZ	78,187,222	BANCOLOMBIA AHORROS 58569325453	VARIOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.0	$ 1,642,500.00	$ 54,750.00	$ 65,700.00	$ 65,700.00	$ 755,550.00	
4		DARWIN ALBERTO TORRES	1,116,850,994	NEQUI 311 474 7710	AYUDANTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.0	$ 1,642,500.00	$ 54,750.00	$ 65,700.00	$ 65,700.00	$ 755,550.00	
5		ERNEY VIAZUS OROZCO	9,430,738	NEQUI 3124030459	AYUDANTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.0	$ 1,642,500.00	$ 54,750.00	$ 65,700.00	$ 65,700.00	$ 755,550.00	
6		HELIBARDO CEPEDA MANCO	7,392,826	BANCOLOMBIA AHORROS 84007376544	AYUDANTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.0	$ 1,642,500.00	$ 54,750.00	$ 65,700.00	$ 65,700.00	$ 755,550.00	
7		YEISON CAMILO BARCHILON	1,007,375,134	NEQUI 314 215 6874	AYUDANTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.0	$ 1,642,500.00	$ 54,750.00	$ 65,700.00	$ 65,700.00	$ 755,550.00	Barchilon
8		NEOMAR JOSE TIMAURE BIRA	6,687,274	CUENTA DE AHORRO A LA MANO No. 84000001954	MAMPOSTERO-PAÑETADOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.0	$ 2,000,000.00	$ 66,666.67	$ 65,700.00	$ 65,700.00	$ 934,300.00	Neomar
9		YIMIN FERNELY PINZON JASPE	1,115,842,050	BANCOLOMBIA AHORROS 840530600-98	AYUDANTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.0	$ 1,642,500.00	$ 54,750.00	$ 65,700.00	$ 65,700.00	$ 755,550.00	Yimin
10		CESAR AUGUSTO CAHUEÑO GOYENECHE	1,116,814,476	BANCOLOMBIA AHORROS 84059358277	AYUDANTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.0	$ 1,642,500.00	$ 54,750.00	$ 65,700.00	$ 65,700.00	$ 755,550.00	Cesar
11		YEISON ORLANDO CARDONA	1,116,857,662	NEQUI 3142686418	MAMPOSTERO-PAÑETADOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.0	$ 2,000,000.00	$ 66,666.67	$ 65,700.00	$ 65,700.00	$ 934,300.00	Yeison
12		EDWAR YESID GONZALES	1,116,526,316	NEQUI 3013872076	AYUDANTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.0	$ 1,642,500.00	$ 54,750.00	$ 65,700.00	$ 65,700.00	$ 755,550.00	Edwar Gonzales

TOTAL NOMINA	$ 10,681,300.00

NOTA: [redacted]
[redacted] RETIRO

Elaboro:

Profesional en SST

Autorizo:
JULIAN PEDRAZA
Residente de obra

		INCAPACIDAD POR MEDICINA GENERAL	
		RECUPERO TIEMPO	

PERMISOS AUTORIZADO

OBSERVACIONES:

[redacted]	RETIRO
	DIA NO LABORADO
	DIAS LABORADOS

		RELACION DE DIAS LABORADOS																										CODIGO:ATO-S FOR 03 Version: 1 FECHA: 30/09/2023					
						16 AL 30 DE JULIO DEL 2025																										
#	NOTAS	NOMBRE	CEDULA	CUENTA BANCARIA	CARGO	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	DIAS LABORADOS	SUELDOS	VALOR DIA	RETENCION		TOTAL A GIRAR	FIRMAS
																								SALUD 4%	PENSION 4%		
1		JAIME SANCHEZ	6,716,656	NEQUI 320 813 6983	MAESTRO DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.0	$ 4,000,000.00	$ 133,333.33	$ 65,700.00	$ 65,700.00	$ 1,934,300.00	Jaime. Sanchez
2		HECTOR RODRIGUEZ	79,187,222	BANCOLOMBIA AHORROS 58569325453	VARIOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.0	$ 1,642,500.00	$ 54,750.00	$ 65,700.00	$ 65,700.00	$ 755,550.00	
3		DARWIN ALBERTO TORRES	1,115,850,994	NEQUI 311 474 7710	AYUDANTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.0	$ 1,642,500.00	$ 54,750.00	$ 65,700.00	$ 65,700.00	$ 850,000.00	
4		ERNEY VIAZUS OROZCO	9,430,738	NEQUI 3124030459	AYUDANTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.0	$ 1,642,500.00	$ 54,750.00	$ 65,700.00	$ 65,700.00	$ 755,550.00	
5		HELIBARDO CEPEDA MANCO	7,362,826	BANCOLOMBIA AHORROS 84007376544	AYUDANTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.0	$ 1,642,500.00	$ 54,750.00	$ 65,700.00	$ 65,700.00	$ 755,550.00	
6		YEISON CAMILO BARCHILON	1,007,375,134	NEQUI 314 215 8874	AYUDANTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.0	$ 1,642,500.00	$ 54,750.00	$ 65,700.00	$ 65,700.00	$ 755,550.00	
7		NEOMAR JOSE TIMAURE SIRA	6,687,274	CUENTA DE AHORRO A LA MANO No. 84000001954	MAMPOSTERO-PAÑETADOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.0	$ 2,000,000.00	$ 66,666.67	$ 65,700.00	$ 65,700.00	$ 934,300.00	Yeison
8		YIMIN FERNELY PINZON JASPE	1,115,862,050	BANCOLOMBIA AHORROS 840530600-98	AYUDANTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.0	$ 1,642,500.00	$ 54,750.00	$ 65,700.00	$ 65,700.00	$ 755,550.00	Yimin
9		CESAR AUGUSTO CAHUEÑO GOYENECHE	1,115,854,475	BANCOLOMBIA AHORROS 84059358277	AYUDANTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.0	$ 1,642,500.00	$ 54,750.00	$ 65,700.00	$ 65,700.00	$ 755,550.00	
10		YEISON ORLANDO CARDONA	1,115,857,692	NEQUI 3142688418	MAMPOSTERO-PAÑETADOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.0	$ 2,000,000.00	$ 66,666.67	$ 65,700.00	$ 65,700.00	$ 934,300.00	Yeison
11		EDWAR YESID CONZALES	1,118,529,318	NEQUI 3013872076	AYUDANTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.0	$ 1,642,500.00	$ 54,750.00	$ 65,700.00	$ 65,700.00	$ 755,550.00	Edwar Gonzalez
12		ROBINSON VARGAS ARIAS	4,214,749	BANCOLOMBIA AHORROS 36535628224	OFICIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3.0	$ 3,000,000.00	$ 100,000.00	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 300,000.00	
																								TOTAL NOMINA		$ 10,241,750.00	

NOTA.

Elaboro:

Profesional en SST

Autorizo:

JULIAN PEDRAZA

Residente de obra

		INCAPACIDAD POR MEDICINA GENERAL		RECUPERO TIEMPO		CITA MEDICA		INASISTENCIA	PERMISOS AUTORIZADO		RETIRO
											DIA NO LABORADO
											DIAS LABORADOS

OBSERVACIONES:

RELACION DE DIAS LABORADOS

CODIGO:ATO-5 FOR 03
Versión: 1
FECHA: 30/05/2023

01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025

#	NOTAS	NOMBRE	CEDULA	CUENTA BANCARIA	CARGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	DIAS LABORADOS	SUELDOS	VALOR DIA	RETENCION SALUD 4%	RETENCION PENSION 4%	TOTAL A GIRAR	FIRMAS
1		HENRRY SOLER RUBIO	96,195,553	NEQUI 3233982827	MAESTRO DE CONSTRUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	5.0	$ 4,000,000.00	$ 133,333.33	$ 65,700.00	$ 65,700.00	$ 666,666.67	
2		ARIALDO MOTTAS SALCEDO	116,663,340	BANCOLOMBIA AHORROS 01100022865	OFICIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	4.0	$ 3,500,000.00	$ 116,666.67	$ 65,700.00	$ 65,700.00	$ 466,666.67	
3		JAIME SANCHEZ	6,716,656	NEQUI 320 813 6983	MAESTRO DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	10.0	$ 4,000,000.00	$ 133,333.33	$ 65,700.00	$ 65,700.00	$ 1,267,633.33	
4		HECTOR RODRIGUEZ	79,187,222	BANCOLOMBIA AHORROS 58569325453	VARIOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.0	$ 1,642,500.00	$ 54,750.00	$ 65,700.00	$ 65,700.00	$ 755,650.00	
5		DARWIN ALBERTO TORRES	##########	NEQUI 311 474 7710	AYUDANTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.0	$ 1,642,500.00	$ 54,750.00	$ 65,700.00	$ 65,700.00	$ 755,550.00	
6		ERNEY VIAZUS OROZCO	9,430,738	NEQUI 3124030459	AYUDANTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.0	$ 1,642,500.00	$ 54,750.00	$ 65,700.00	$ 65,700.00	$ 805,550.00	
7		HELIBARDO CEPEDA MANCO	7,362,826	BANCOLOMBIA AHORROS 84007376544	AYUDANTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.0	$ 1,642,500.00	$ 54,750.00	$ 65,700.00	$ 65,700.00	$ 755,650.00	
8		YEISON CAMILO BARCHILON	##########	NEQUI 314 215 8874	AYUDANTE	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.0	$ 1,642,500.00	$ 54,750.00	$ 65,700.00	$ 65,700.00	$ 164,250.00	
9		NEOMAR JOSE TIMAURE SIRA	6,687,274	CUENTA DE AHORRO A LA MANO No. 84000001954	MAMPOSTERO-PAÑETADOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.0	$ 2,000,000.00	$ 66,666.67	$ 65,700.00	$ 65,700.00	$ 934,300.00	
10		YIMIN FERNELY PINZON JASPE	##########	BANCOLOMBIA AHORROS 840530600-98	AYUDANTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.0	$ 1,642,500.00	$ 54,750.00	$ 65,700.00	$ 65,700.00	$ 755,550.00	
11		CESAR AUGUSTO CAHUEÑO GOYENECHE	##########	BANCOLOMBIA AHORROS 84059358277	AYUDANTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.0	$ 1,642,500.00	$ 54,750.00	$ 65,700.00	$ 65,700.00	$ 755,550.00	
12		YEISON ORLANDO CARDONA	##########	NEQUI 3142688418	MAMPOSTERO-PAÑETADOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.0	$ 1,642,500.00	$ 54,750.00	$ 65,700.00	$ 65,700.00	$ 755,550.00	
13		EDWAR YESID GONZALES	##########	NEQUI 3013872076	AYUDANTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.0	$ 1,642,500.00	$ 54,750.00	$ 65,700.00	$ 65,700.00	$ 755,550.00	
14		ROBINSON VARGAS ARIAS	4,214,749	BANCOLOMBIA AHORROS 36535628224	OFICIAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.0	$ 3,000,000.00	$ 100,000.00	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 1,434,300.00	
15		CLELIA CRISTIANO BENAVIDEZ	23,794,076	NEQUI 3142336561	CELADORA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.0	$ 1,800,000.00	$ 60,000.00	$ 65,700.00	$ 65,700.00	$ 834,300.00	

TOTAL NOMINA ##########

A.

ora:

Autorizo:

JULIAN PEDRAZA
Residente de obra

Profesional en SST

INCAPACIDAD POR MEDICINA GENERAL

RECUPERO TIEMPO

PERMISOS AUTORIZADO

RETIRO

DIA NO LABORADO

DIAS LABORADOS

OBSERVACIONES:

RELACION DE DIAS LABORADOS

CODIGO:ATO-5 FOR 03
Version: 1
FECHA: 30/05/2023

16 AL 30 DE AGOSTO DEL 2025

#	NOTAS	NOMBRE	CEDULA	CUENTA BANCARIA	CARGO	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	DIAS LABORADOS	SUELDOS	VALOR DIA	RETENCION SALUD 4%	RETENCION PENSION 4%	TOTAL A GIRAR	FIRMAS
4		HENRRY SOLER RUBIO	96,195,553	NEQUI 3233982827	MAESTRO DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.0	$ 4,000,000.00	$ 133,333.33	$ 65,700.00	$ 65,700.00	$ 2,046,600.00	
5		ARIALDO MOTTAS SALCEDO	116,663,340	BANCOLOMBIA AHORROS 01100022865	OFICIAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.0	$ 3,500,000.00	$ 116,666.67	$ 65,700.00	$ 65,700.00	$ 1,782,737.00	
9		HECTOR RODRIGUEZ	79,187,222	BANCOLOMBIA AHORROS 58569325453	VARIOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.0	$ 1,642,500.00	$ 54,750.00	$ 65,700.00	$ 65,700.00	$ 801,745.00	
10		DARWIN ALBERTO TORRES	1,115,850,994	NEQUI 311 474 7710	AYUDANTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.0	$ 1,642,500.00	$ 54,750.00	$ 65,700.00	$ 65,700.00	$ 805,550.00	
11		ERNEY VIAZUS OROZCO	9,430,738	NEQUI 3124030459	AYUDANTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.0	$ 1,642,500.00	$ 54,750.00	$ 65,700.00	$ 65,700.00	$ 801,745.00	
12		HELIBARDO CEPEDA MANCO	7,362,826	BANCOLOMBIA AHORROS 84007376544	AYUDANTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.0	$ 1,642,500.00	$ 54,750.00	$ 65,700.00	$ 65,700.00	$ 801,745.00	
14		NEOMAR JOSE TIMAURE SIRA	6,887,274	CUENTA DE AHORRO A LA MANO No. 84000001954	MAMPOSTERO-PAÑETADOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.0	$ 2,000,000.00	$ 66,666.67	$ 65,700.00	$ 65,700.00	$ 801,745.00	
15		YIMIN FERNELY PINZON JASPE	1,115,862,050	BANCOLOMBIA AHORROS 840530600-98	AYUDANTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.0	$ 1,642,500.00	$ 54,750.00	$ 65,700.00	$ 65,700.00	$ 801,745.00	
16		CESAR AUGUSTO CAHUEÑO GOYENECHE	1,115,854,475	BANCOLOMBIA AHORROS 84059358277	AYUDANTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.0	$ 1,642,500.00	$ 54,750.00	$ 65,700.00	$ 65,700.00	$ 801,745.00	
17		YEISON ORLANDO CARDONA	1,115,857,692	NEQUI 3142688418	MAMPOSTERO-PAÑETADOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.0	$ 1,642,500.00	$ 54,750.00	$ 65,700.00	$ 65,700.00	$ 793,190.00	
18		EDWAR YESID GONZALES	1,118,529,316	NEQUI 3013872076	AYUDANTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.0	$ 1,642,500.00	$ 54,750.00	$ 65,700.00	$ 65,700.00	$ 793,190.00	
19		ROBINSON VARGAS ARIAS	4,214,749	BANCOLOMBIA AHORROS 36535628224	OFICIAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.0	$ 3,000,000.00	$ 100,000.00	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 1,506,050.00	
20		CLELIA CRISTIANO BENAVIDEZ	23,784,076	NEQUI 3142336561	CELADORA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.0	$ 1,800,000.00	$ 60,000.00	$ 65,700.00	$ 65,700.00	$ 834,300.00	

TA.

TOTAL NOMINA	$ 13,372,287.00

bora:

Autorizo:
NELSON ALVARADO
Residente de obra

Profesional en SST

		INCAPACIDAD POR MEDICINA GENERAL		RECUPERO TIEMPO		CITA MEDICA		INASISTENCIA		PERMISOS AUTORIZADO	

	RETIRO
	DIA NO LABORADO
	DIAS LABORADOS

OBSERVACIONES:

3082 6064 5387

946

RELACION DE DIAS LABORADOS

CODIGO:ATO-5 FOR 03
Version: 1
FECHA: 25/05/2023

01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

#	NOTAS	NOMBRE	CEDULA	CUENTA BANCARIA	CARGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	DIAS LABORADOS	FECHA INGRESO/RETIRO	SUELDOS	VALOR DIA	RETENCION SALUD 4%	RETENCION PENSION 4%	TOTAL A GIRAR	FIRMAS
1		HENRRY SOLER RUBIO	96.155.553	NEQUI 3233982827	MAESTRO DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,0	11/08/2025	$ 4.000.000,00	$ 133.333,33	$ 65.700,00	$ 65.700,00	$ 1.934.300,00	
2		ARIALDO MOTTAS SALCEDO	116.663.349	BANCOLOMBIA AHORROS 01100022865	OFICIAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,0	12/08/2025	$ 3.500.000,00	$ 116.666,67	$ 65.700,00	$ 65.700,00	$ 1.684.300,00	
3		HECTOR RODRIGUEZ	79.167.222	BANCOLOMBIA AHORROS 58569325453	VARIOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,0	#¡REF!	$ 1.642.500,00	$ 54.750,00	$ 65.700,00	$ 65.700,00	$ 755.550,00	
4		DARWIN ALBERTO TORRES	1.115.850.994	NEQUI 311 474 7710	AYUDANTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,0	01/01/2025	$ 1.642.500,00	$ 54.750,00	$ 65.700,00	$ 65.700,00	$ 755.550,00	
5		ERNEY VIAZUS OROZCO	9.430.738	NEQUI 3124030459	AYUDANTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,0	01/01/2025	$ 1.642.500,00	$ 54.750,00	$ 65.700,00	$ 65.700,00	$ 755.550,00	
6		HELIBARDO CEPEDA MANCO	7.362.826	BANCOLOMBIA AHORROS 84007376544	AYUDANTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,0	22/01/2025	$ 1.642.500,00	$ 54.750,00	$ 65.700,00	$ 65.700,00	$ 755.550,00	
7		NEOMAR JOSE TIMAURE SIRA	6.687.274	CUENTA DE AHORRO A LA MANO No. 84000001954	MAMPOSTERIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,0	27/01/2025	$ 2.000.000,00	$ 66.666,67	$ 65.700,00	$ 65.700,00	$ 934.300,00	
8		YIMN FERNELY PINZON JASPE	1.115.862.050	BANCOLOMBIA AHORROS 840530600-98	MAMPOSTERIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,0	06/02/2025	$ 2.000.000,00	$ 66.666,67	$ 65.700,00	$ 65.700,00	$ 934.300,00	
9		CESAR AUGUSTO CAHUEÑO GOYENECHE	1.115.854.475	BANCOLOMBIA AHORROS 84059358277	AYUDANTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,0	06/02/2025	$ 1.642.500,00	$ 54.750,00	$ 65.700,00	$ 65.700,00	$ 755.550,00	
10		YEISON ORLANDO CARDONA	1.115.857.692	NEQUI 3142688418	AYUDANTE	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,0	18/03/2025	$ 1.642.500,00	$ 54.750,00	$ 65.700,00	$ 65.700,00	$ 646.050,00	
11		EDWAR YESID GONZALES	1.118.529.318	NEQUI 3013872076	AYUDANTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,0	18/03/2025	$ 1.642.500,00	$ 54.750,00	$ 65.700,00	$ 65.700,00	$ 755.550,00	
12		ROBINSON VARGAS ARIAS	4.214.749	BANCOLOMBIA AHORROS 36535628224	OFICIAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,0	28/07/2025	$ 3.000.000,00	$ 100.000,00	$ 50.000,00	$ 50.000,00	$ 1.450.000,00	
13		CLELIA CRISTIANO BENAVIDEZ	23.794.076	NEQUI 3142338561	CELADORA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,0	01/01/2025	$ 1.800.000,00	$ 60.000,00	$ 65.700,00	$ 65.700,00	$ 834.300,00	

NOTA, [redacted] SE LE DESCUENTA SEGURIDAD PUES FUE LO ACORDADO CON EL ING. VICTOR *OFICIAL ROBINSON

TOTAL NOMINA $ 12.950.850,00

Elaboro:

Profesional en SST

Autorizo:
NELSON ALVARADO
Residente de obra

[redacted] INCAPACIDAD POR MEDICINA GENERAL | RECUPERO TIEMPO | CITA MEDICA | INASISTENCIA | PERMISOS AUTORIZADO

[redacted] RETIRO
DIA NO LABORADO
DIAS LABORADOS

OBSERVACIONES:

RELACION DE DIAS LABORADOS

CODIGO:ATO-3 FOR 03
Version: 1
FECHA: 30/05/2023

16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

#	NOTAS	NOMBRE	CEDULA	CUENTA BANCARIA	CARGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	DIAS LABORADOS	FECHA INGRESO/RETIRO	SUELDOS	VALOR DIA	RETENCION SALUD 4%	RETENCION PENSION 4%	TOTAL A GIRAR
1		HENRRY SOLER RUBIO	96.195.553	NEQUI 3233982827	MAESTRO DE CONSTRUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0	11/08/2025	$ 4.000.000,00	$ 133.333,33	$ 67.500,00	$ 67.500,00	$ 2.000.000,00
2		ARIALDO MOTTAS SALCEDO	116.863.340	BANCOLOMBIA AHORROS 01100022665	OFICIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0	12/08/2025	$ 3.500.000,00	$ 116.666,67	$ 67.500,00	$ 67.500,00	$ 1.750.000,00
3		HECTOR RODRIGUEZ	79.187.223	BANCOLOMBIA AHORROS 58569325453	VARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0	#¡REF!	$ 1.642.500,00	$ 54.750,00	$ 65.700,00	$ 65.700,00	$ 755.550,00
4		DARWIN ALBERTO TORRES	1.115.850.954	NEQUI 311 474 7710	AYUDANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0	01/01/2025	$ 1.642.500,00	$ 54.750,00	$ 65.700,00	$ 65.700,00	$ 755.550,00
5		ERNEY VIAZUS OROZCO	9.430.736	NEQUI 3124030459	AYUDANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0	01/01/2025	$ 1.642.500,00	$ 54.750,00	$ 65.700,00	$ 65.700,00	$ 755.550,00
6		HELIBARDO CEPEDA MANCO	7.362.826	BANCOLOMBIA AHORROS 84007376544	AYUDANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0	22/01/2025	$ 1.642.500,00	$ 54.750,00	$ 65.700,00	$ 65.700,00	$ 755.550,00
7		NEOMAR JOSE TIMAURE SIRA	8.687.274	CUENTA DE AHORRO A LA MANO No. 84000001954	MAMPOSTERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0	27/01/2025	$ 2.000.000,00	$ 66.666,67	$ 65.700,00	$ 65.700,00	~~$ 934.300,00~~
8		YIMIN FERNELY PINZON JASPE	1.115.862.050	BANCOLOMBIA AHORROS 840530600-98	MAMPOSTERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0	06/02/2025	$ 2.000.000,00	$ 66.666,67	$ 65.700,00	$ 65.700,00	$ 934.300,00
9		CESAR AUGUSTO CAHUEÑO GOYENECHE	1.115.854.475	BANCOLOMBIA AHORROS 84059358277	AYUDANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0	06/02/2025	$ 1.642.500,00	$ 54.750,00	$ 65.700,00	$ 65.700,00	$ 755.550,00
10		YEISON ORLANDO CARDONA	1.115.857.692	NEQUI 3142688418	MAMPOSTERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0	18/03/2025	$ 1.642.500,00	$ 54.750,00	$ 65.700,00	$ 65.700,00	$ 755.550,00
11		EDWAR YESID GONZALES	1.118.525.318	NEQUI 3013872076	AYUDANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0	18/03/2025	$ 1.642.500,00	$ 54.750,00	$ 65.700,00	$ 65.700,00	$ 755.550,00
12		ROBINSON VARGAS ARIAS	4.214.749	BANCOLOMBIA AHORROS 36535628224	OFICIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0	28/07/2025	$ 3.000.000,00	$ 100.000,00	$ 50.000,00	$ 50.000,00	$ 1.450.000,00
13		CLELIA CRISTIANO BENAVIDEZ	23.784.076	NEQUI 3142336561	CELADORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0	01/01/2025	$ 1.800.000,00	$ 60.000,00	$ 65.700,00	$ 65.700,00	$ 834.300,00

TOTAL NOMINA $ 13.191.750,00

NOTA,
SE LE DESCUENTA SEGURIDAD PUES FUE LO ACORDADO CON EL ING. VÍCTOR *OFICIAL ROBINSON
2 HORAS EXTRESAS DIA DEL PAUTO *ERNEY VIAZUS
EMPEZO A REALIZAR PAÑETE DESDE EL 23 DE SEPTIEMBRE Y 2 HORAS EXTRESAS DIA DEL PAUTO *YEISON CARDONA

Elaboro:
Profesional en SST

Autorizo:
NELSON ALVARADO
Residente de obra

RETIRO
DIA NO LABORADO
DIAS LABORADOS

INCAPACIDAD POR MEDICINA GENERAL | RECUPERO TIEMPO | CITA MEDICA | INASISTENCIA | PERMISOS AUTORIZADO

OBSERVACIONES:

RELACION DE DIAS LABORADOS

CODIGO:ATO-S FOR 03
Version: 1
FECHA: 30/05/2023

01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025

#	NOTAS	NOMBRE	CEDULA	CUENTA BANCARIA	CARGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	DIAS LABORADOS	FECHA INGRESO/RETIRO	SUELDOS	VALOR DIA	RETENCION SALUD 4%	RETENCION PENSION 4%	TOTAL A GIRAR	FIRMAS
1		HENRRY SOLER RUBIO	96.195.553	NEQUI 3233982827	MAESTRO DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0	11/08/2025	$ 4.000.000,00	$ 133.333,33	$ 67.700,00	$ 67.700,00	$ 2.000.000,00	
2		ARIALDO MOTTAS SALCEDO	116.663.340	BANCOLOMBIA AHORROS 01100022865	OFICIAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0	12/08/2025	$ 3.500.000,00	$ 116.666,67	$ 67.700,00	$ 67.700,00	$ 1.750.000,00	
3		HECTOR RODRIGUEZ	79.187.222	BANCOLOMBIA AHORROS 58569325453	VARIOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0	#¡REF!	$ 1.642.500,00	$ 54.750,00	$ 65.700,00	$ 65.700,00	$ 755.550,00	
4		DARWIN ALBERTO TORRES	1.115.850.994	NEQUI 311 474 7710	AYUDANTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0	01/01/2025	$ 1.642.500,00	$ 54.750,00	$ 65.700,00	$ 65.700,00	$ 755.550,00	
5		ERNEY VIAZUS OROZCO	9.430.736	NEQUI 3124030459	AYUDANTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0	01/01/2025	$ 1.642.500,00	$ 54.750,00	$ 65.700,00	$ 65.700,00	$ 755.550,00	
6		HELIBARDO CEPEDA MANCO	7.362.826	BANCOLOMBIA AHORROS 84007376544	AYUDANTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0	22/01/2025	$ 1.642.500,00	$ 54.750,00	$ 65.700,00	$ 65.700,00	$ 755.550,00	
7		NEOMAR JOSE TIMAURE SIRA	6.687.274	CUENTA DE AHORRO A LA MANO No. 84000001954	MAMPOSTERIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0	27/01/2025	$ 2.000.000,00	$ 66.666,67	$ 65.700,00	$ 65.700,00	$ 934.300,00	
8		YIMIN FERNELY PINZON JASPE	1.115.862.050	BANCOLOMBIA AHORROS 840530600-98	MAMPOSTERIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0	06/02/2025	$ 2.000.000,00	$ 66.666,67	$ 65.700,00	$ 65.700,00	$ 934.300,00	
9		CESAR AUGUSTO CAHUEÑO GOYENECHE	1.115.854.475	BANCOLOMBIA AHORROS 84059358277	AYUDANTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0	06/02/2025	$ 1.642.500,00	$ 54.750,00	$ 65.700,00	$ 65.700,00	$ 755.550,00	
10		YEISON ORLANDO CARDONA	1.115.857.692	NEQUI 3142688418	PAÑETE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	13,0	18/03/2025	$ 2.000.000,00	$ 66.666,67	$ 65.700,00	$ 65.700,00	$ 800.966,67	
11		EDWAR YESID GONZALES	1.118.529.318	NEQUI 3013872076	AYUDANTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0	18/03/2025	$ 1.642.500,00	$ 54.750,00	$ 65.700,00	$ 65.700,00	$ 755.550,00	
12		ROBINSON VARGAS ARIAS	4.214.745	BANCOLOMBIA AHORROS 36535628224	OFICIAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0	28/07/2025	$ 3.000.000,00	$ 100.000,00	$ 50.000,00	$ 50.000,00	$ 1.450.000,00	
13		CLELIA CRISTIANO BENAVIDEZ	23.794.076	NEQUI 3142336561	CELADORA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0	01/01/2025	$ 1.800.000,00	$ 60.000,00	$ 65.700,00	$ 65.700,00	$ 834.300,00	

| | | |

RELACION DE DIAS LABORADOS

CODIGO:ATO-5 FOR 03
Version: 1
FECHA: 30/05/2023

16 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2025

#	NOTAS	NOMBRE	CEDULA	CUENTA BANCARIA	CARGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	DIAS LABORADOS	FECHA INGRESO/RETIRO	SUELDOS	VALOR DIA	RETENCION SALUD 4%	RETENCION PENSION 4%	TOTAL A GIRAR	FIRMAS
1		HENRRY SOLER RUBIO	96.195.553	NEQUI 3233982827	MAESTRO DE CONSTRUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0	11/08/2025	$ 4.000.000,00	$ 133.333,33	$ 67.700,00	$ 67.700,00	$ 2.000.000,00	
2		ARIALDO MOTTAS SALCEDO	116.663.340	BANCOLOMBIA AHORROS 01100022865	OFICIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0	12/08/2025	$ 3.500.000,00	$ 116.666,67	$ 67.700,00	$ 67.700,00	$ 1.760.000,00	
3		HECTOR RODRIGUEZ	79.187.222	BANCOLOMBIA AHORROS 58569325453	VARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0	#¡REF!	$ 1.642.500,00	$ 54.750,00	$ 65.700,00	$ 65.700,00	$ 755.550,00	
4		DARWIN ALBERTO TORRES	1.115.850.994	NEQUI 311 474 7710	AYUDANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0	01/01/2025	$ 1.642.500,00	$ 54.750,00	$ 65.700,00	$ 65.700,00	$ 755.550,00	
5		ERNEY VIAZUS OROZCO	9.430.738	NEQUI 3124030459	AYUDANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0	01/01/2025	$ 1.642.500,00	$ 54.750,00	$ 65.700,00	$ 65.700,00	$ 755.550,00	
6		HELIBARDO CEPEDA MANCO	7.362.826	BANCOLOMBIA AHORROS 84007376544	AYUDANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0	22/01/2025	$ 1.642.500,00	$ 54.750,00	$ 65.700,00	$ 65.700,00	$ 755.550,00	
7		NEOMAR JOSE TIMAURE SIRA	6.667.274	CUENTA DE AHORRO A LA MANO No. 84000001954	MAMPOSTERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0	27/01/2025	$ 2.000.000,00	$ 66.666,67	$ 65.700,00	$ 65.700,00	$ 934.300,00	
8		YIMIN FERNELY PINZON JASPE	1.115.862.050	BANCOLOMBIA AHORROS 840530600-96	MAMPOSTERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0	06/02/2025	$ 2.000.000,00	$ 66.666,67	$ 65.700,00	$ 65.700,00	$ 934.300,00	
9		CESAR AUGUSTO CAHUEÑO GOYENECHE	1.115.854.475	BANCOLOMBIA AHORROS 84059358277	AYUDANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0	06/02/2025	$ 1.642.500,00	$ 54.750,00	$ 65.700,00	$ 65.700,00	$ 755.550,00	
10		YEISON ORLANDO CARDONA	1.115.857.692	NEQUI 3142688418	PAÑETE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0	18/03/2025	$ 2.000.000,00	$ 66.666,67	$ 65.700,00	$ 65.700,00	$ 934.300,00	
11		EDWAR YESID GONZALES	1.118.529.318	NEQUI 3013872076	AYUDANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0	18/03/2025	$ 1.642.500,00	$ 54.750,00	$ 65.700,00	$ 65.700,00	$ 755.550,00	
12		ROBINSON VARGAS ARIAS	4.214.749	BANCOLOMBIA AHORROS 36535628224	OFICIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0	28/07/2025	$ 3.000.000,00	$ 100.000,00	$ 50.000,00	$ 50.000,00	$ 1.450.000,00	
13		CLELIA CRISTIANO BENAVIDEZ	23.794.076	NEQUI 3142336561	CELADORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0	01/01/2025	$ 1.800.000,00	$ 60.000,00	$ 65.700,00	$ 65.700,00	$ 834.300,00	

NOTA. [redacted] SE LE DESCUENTA SEGURIDAD PUES FUE LO ACORDADO CON EL ING. VÍCTOR *OFICIAL ROBINSON

TOTAL NOMINA	$ 13.370.500,00

Elaborn:
Profesional en SST

Autorizo:
NELSON ALVARADO
Residente de obra

[redacted] RETIRO
[redacted] DIA NO LABORADO
DIAS LABORADOS

[redacted] INCAPACIDAD POR MEDICINA GENERAL | [redacted] RECUPERO TIEMPO | CITA MEDICA | INASISTENCIA | PERMISOS AUTORIZADO

OBSERVACIONES:

RELACION DE DIAS LABORADOS

CODIGO:ATO-S FOR 03
Versión: 1
FECHA: 30/05/2023

01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025

#	NOTAS	NOMBRE	CEDULA	CUENTA BANCARIA	CARGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	DIAS LABORADOS	FECHA INGRESO/RETIRO	SUELDOS	VALOR DIA	RETENCION SALUD 4%	RETENCION PENSION 4%	TOTAL A GIRAR	FIRMAS
1		HENRRY SOLER RUBIO	96.195.553	NEQUI 3233982827	MAESTRO DE CONSTRUCCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,0	11/08/2025	$ 4.000.000	$ 133.333	$ 67.700,00	$ 67.700,00	$ 2.529.420	
2		ARIALDO MOTTAS SALCEDO	116.663.345	BANCOLOMBIA AHORROS 01100022865	OFICIAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,0	12/08/2025	$ 2.500.000	$ 116.667	$ 67.700,00	$ 67.700,00	$ 1.750.000	
3		DARWIN ALBERTO TORRES	1.115.850.994	NEQUI 311 474 7710	AYUDANTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,0	01/01/2025	$ 1.642.500	$ 54.750	$ 65.700	$ 65.700	$ 755.550	
4		ERNEY VIAZUS OROZCO	9.430.738	NEQUI 3124030459	AYUDANTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,0	01/01/2025	$ 1.642.500	$ 54.750	$ 65.700	$ 65.700	$ 755.550	
5		HELIBARDO CEPEDA MANCO	7.362.836	BANCOLOMBIA AHORROS 84007376544	AYUDANTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,0	22/01/2025	$ 1.642.500	$ 54.750	$ 65.700	$ 65.700	$ 755.550	
6		NEOMAR JOSE TIMAURE SIRA	6.687.274	CUENTA DE AHORRO A LA MANO No. 84000001954	MAMPOSTERIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,0	27/01/2025	$ 2.000.000	$ 66.667	$ 65.700	$ 65.700	$ 934.300	
7		YIMIN FERNELY PINZON JASPE	1.115.862.050	BANCOLOMBIA AHORROS 840530600-98	MAMPOSTERIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,0	06/02/2025	$ 2.000.000	$ 66.667	$ 65.700	$ 65.700	$ 934.300	
8		CESAR AUGUSTO CAHUEÑO GOYENECHE	1.115.854.475	BANCOLOMBIA AHORROS 84059358277	AYUDANTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,0	06/02/2025	$ 1.642.500	$ 54.750	$ 65.700	$ 65.700	$ 755.550	
9		YEISON ORLANDO CARDONA	1.115.857.892	NEQUI 3142688418	PAÑETE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,0	18/03/2025	$ 2.000.000	$ 66.667	$ 65.700	$ 65.700	$ 934.300	
10		EDWAR YESID GONZALES	1.116.529.318	NEQUI 3013872076	AYUDANTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,0	18/03/2025	$ 1.642.500	$ 54.750	$ 65.700	$ 65.700	$ 755.550	
11		ROBINSON VARGAS ARIAS	4.214.749	BANCOLOMBIA AHORROS 36535628224	OFICIAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,0	28/07/2025	$ 3.000.000	$ 100.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 1.450.000	
12		CLELIA CRISTIANO BENAVIDEZ	23.794.676	NEQUI 3142336561	CELADORA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,0	01/01/2025	$ 1.800.000	$ 60.000	$ 65.700	$ 65.700	$ 834.300	

TOTAL NOMINA	$ 13.144.370,00

NOTA. SE LE DESCUENTA SEGURIDAD PUES FUE LO ACORDADO CON EL ING. VICTOR *OFICIAL ROBINSON

Elaboro:

Profesional en SST

Autorizo:

Residente de obra

| | | |

RELACION DE DIAS LABORADOS

CODIGO:ATO-S FOR 03
Version: 1
FECHA: 30/05/2023

16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

#	NOTAS	NOMBRE	CEDULA	CUENTA BANCARIA	CARGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	DIAS LABORADOS	FECHA INGRESO/RETIRO	SUELDOS	VALOR DIA	RETENCION SALUD 4%	RETENCION PENSION 4%	TOTAL A GIRAR	FIRMAS
1		HENRRY SOLER RUBIO	96.195.553	NEQUI 3233982827	MAESTRO DE CONSTRUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0	11/08/2025	$ 4.000.000	$ 133.333	$ 67.700	$ 67.700	$ 2.189.240	
2		ARIALDO MOTTAS SALCEDO	116.663.340	BANCOLOMBIA AHORROS 01100022865	OFICIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0	12/08/2025	$ 3.500.000	$ 116.667	$ 67.700	$ 67.700	$ 1.750.000	
3		DARWIN ALBERTO TORRES	1.115.850.994	NEQUI 311 474 7710	AYUDANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0	01/01/2025	$ 1.642.500	$ 54.750	$ 65.700	$ 65.700	$ 755.550	
4		ERNEY VIAZUS OROZCO	9.430.736	NEQUI 3124030459	AYUDANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0	01/01/2025	$ 1.642.500	$ 54.750	$ 65.700	$ 65.700	$ 755.550	
5		HELIBARDO CEPEDA MANCO	7.362.826	BANCOLOMBIA AHORROS 84007376544	AYUDANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0	22/01/2025	$ 1.642.500	$ 54.750	$ 65.700	$ 65.700	$ 755.550	
6		NEOMAR JOSE TIMAURE SIRA	6.667.274	CUENTA DE AHORRO A LA MANO No. 84000001954	MAMPOSTERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0	27/01/2025	$ 2.000.000	$ 66.667	$ 65.700	$ 65.700	$ 934.300	
7		YIMIN FERNELY PINZON JASPE	1.115.862.050	BANCOLOMBIA AHORROS 840530600-96	MAMPOSTERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0	06/02/2025	$ 2.000.000	$ 66.667	$ 65.700	$ 65.700	$ 934.300	
8		CESAR AUGUSTO CAHUEÑO GOYENECHE	1.115.854.475	BANCOLOMBIA AHORROS 84059358277	AYUDANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0	06/02/2025	$ 1.642.500	$ 54.750	$ 65.700	$ 65.700	$ 755.550	
9		YEISON ORLANDO CARDONA	1.115.857.692	NEQUI 3142688418	PAÑETE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	[redacted]	1	1	[redacted]	1	1	1	1	1	1	1	13,0	18/03/2025	$ 2.000.000	$ 66.667	$ 65.700	$ 65.700	$ 800.967	
10		EDWAR YESID GONZALES	1.118.529.318	NEQUI 3013872076	AYUDANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0	18/03/2025	$ 1.642.500	$ 54.750	$ 65.700	$ 65.700	$ 755.550	
11	[redacted]	ROBINSON VARGAS ARIAS	4.214.749	BANCOLOMBIA AHORROS 36535628224	OFICIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0	28/07/2025	$ 3.000.000	$ 100.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 1.450.000	
12		CLELIA CRISTIANO BENAVIDEZ	23.794.076	NEQUI 3142336561	CELADORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15,0	01/01/2025	$ 1.800.000	$ 60.000	$ 65.700	$ 65.700	$ 834.300	

NOTA. [redacted] SE LE DESCUENTA SEGURIDAD PUES FUE LO ACORDADO CON EL ING. VICTOR *OFICIAL ROBINSON

TOTAL NOMINA	$ 12.670.856,67

Elaboro:

Autorizo:

Profesional en SST

Residente de obra

[redacted]	INCAPACIDAD POR MEDICINA GENERAL	[redacted]	RECUPERO TIEMPO		CITA MEDICA		INASISTENCIA		PERMISOS AUTORIZADO	[redacted]	RETIRO
											DIA NO LABORADO
											DIAS LABORADOS

OBSERVACIONES:

UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS
NIT. 9 0 1 7 9 2 9 2 5 – 3
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 009-RAPLL-2024

SEGURIDAD JULIO - NOVIEMBRE



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 23434187

ESPINOSA CEPEDA
APELLIDOS

JENNY MARIBEL
NOMBRES

Jenny Espinosa
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-FEB-1984
CIENEGA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

15-MAR-2002 CIENEGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-0704600-33103741-F-0023434187-20020627 02122 02178O 02 107599424

954

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

165295-T



JENNY MARIBEL
ESPINOSA CEPEDA
C.C. 23434187
RESOLUCION INSCRIPCION 012 FECHA 16/02/2012
UNIVERSIDAD U.P.T.C.

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 176893

PARA USO DE: VIMAN INGENIERIA Y SEÑALIZACION VIAL S.A.S.

FIRMA DEL TITULAR 92183

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

95

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 7 C 4 6 F 6 C C A 9 C B B C 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JENNY MARIBEL ESPINOSA CEPEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 23434187 de CIENEGA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 165295-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 29 dias del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DEL CASANARE.

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICAN:

VICTOR MANUEL ÁVILA FONSECA, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.775.413 expedida en Tunja, Boyacá, en mi condición de Representante legal y **JENNY MARIBEL ESPINOSA CEPEDA** identificada con cedula de ciudadanía No. 23.434.187 de Ciénega, Boyacá, con tarjeta profesional No. 165295-T inscrita a la Junta Central de Contadores de Colombia en condición de contadora pública de la **UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAPLLANOS**, identificado con Nit. 901.792.925-3 luego de examinar la contabilidad y de más documentación de la **UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAPLLANOS** de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, basado en pruebas selectivas de las evidencias que soportan hechos y revelaciones, ha realizado el pago de los siguientes aportes: salud, pensión, riesgos laborales, Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, según se indica en las planillas soporte, los cuales corresponden a los montos contabilizados y pagados por las mismas durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2025 al 31 de julio de 2025 en relación con el personal requerido para el desarrollo del CONTRATO DE OBRA No. 009-RAPLL-2024, cuyo objeto es "ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DEL CASANARE." Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003.

RELACION PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO DE 2025

PERIODO	PLANILLA N°	IBC PENSION	PENSION		IBC SALUD	SALUD		CCF	RIESGOS		PARAFISCALES		TOTAL
								COMFACASANARE			ICBF	SENA	
			VLR PAGADO	AFP		VLR PAGADO	EPS	VLR PAGADO	IBC	VLR PAGADO			
JULIO 2025	73610113152	$ 13.975.750	$ 2.240.200	PORVENIR COLPENSIONES	$ 13.975.750	$ 1.750.500	CAPRESOCA EPS NUEVA EPS SANITAS	$ 551.000	$ 13.975.750	$ 948.400	$ 413.900	$ 275.700	$ 6.179.700
TOTAL		$ 13.975.750	$ 2.240.200		$ 13.975.750	$ 1.750.500		$ 551.000	$ 13.975.750	$ 948.400	$ 413.900	$ 275.700	$ 6.179.700

Para constancia se firma en Yopal, a los once (11) días del mes de diciembre de 2025.

VICTOR MANUEL ÁVILA FONSECA
CC. 6.775.413 DE TUNJA, BOYACÁ
REPRESENTANTE LEGAL

JENNY MARIBEL ESPINOSA CEPEDA
CC. 23.434.187 de Ciénega, Boyacá
CONTADORA PÚBLICA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901792925
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAPPLANOS BOYACA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	3143362
DIRECCIÓN:	CRA 1 # 40 149 OF 502	TELÉFONO:	
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7981013152	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			6				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/08/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1703528891

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 455.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 0	$ 455.600	$ 1.800	$ 457.400
230301	230301-PORVENIR	11	$ 1.784.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.800	$ 0	$ 1.784.600	$ 6.800	$ 1.791.400
SUBTOTALES:										**$ 2.240.200**	**$ 8.600**	**$ 2.248.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR AJUSTES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR AJUSTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 818.900	$ 0	$ 3.200	$ 0	$ 818.900	$ 3.200	$ 0	$ 822.100
EPS041	NUEVA EPS CM	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 362.000	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 362.000	$ 1.400	$ 0	$ 363.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 213.600	$ 0	$ 900	$ 0	$ 213.600	$ 900	$ 0	$ 214.500
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 356.000	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 356.000	$ 1.400	$ 0	$ 357.400
SUBTOTALES:													**$ 1.750.500**	**$ 6.900**	**$ 0**	**$ 1.757.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	13		$ 0	$ 0		$ 0	$ 948.400	$ 948.400	$ 3.700	$ 0	$ 952.100
SUBTOTALES:									**$ 948.400**	**$ 3.700**	**$ 0**	**$ 952.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF59	CCF59-COMFACASANARE	13	$ 551.000	$ 2.100	$ 553.100
SUBTOTALES:			**$ 551.000**	**$ 2.100**	**$ 553.100**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	13	$ 413.900	$ 1.600	$ 415.500
PASENA	PASENA - SENA	13	$ 275.700	$ 1.100	$ 276.800
SUBTOTALES:			**$ 689.600**	**$ 2.700**	**$ 692.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD							ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AJUSTES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 1007375134	BURCHILON MILLAN YESSON CAMILO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF59-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1115850994	TORRES DIAZON DARWIN RICARDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF59-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1115854475	CABRERO CHVENECH EDGAR CESAR AUGUSTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF59-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1115897692	CARDONA RUIZ YESSON ORLANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF59-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1115862065	PINZON ESPE YWIN FRENLEY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS041-NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF59-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1115863807	CUCHERO COCOMA ANDERZON DAVIDES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																01-06	230301-PORVENIR	5	$ 237.250	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 38.000	EPSC25-CAPRESOCA EPS	6	$ 237.250	$ 29.700	$ 0	$ 29.700	14-11 - ARL SURA	6	$ 237.250		$ 0	5	$ 158.167	SCCF59-COMFACASANARE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1115863807	CUCHERO COCOMA ANDERZON DAVIDES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO	14																230301-PORVENIR	9	$ 427.050	$ 68.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 68.400	EPSC25-CAPRESOCA EPS	9	$ 427.050	$ 53.400	$ 0	$ 53.400	14-11 - ARL SURA	8	$ 427.050		$ 29.800	9	$ 427.050	SCCF59-COMFACASANARE	$ 17.100	$ 8.600	$ 12.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1116529318	GONZALEZ ARIL EDWARD DAVID	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																	230301-PORVENIR	3	$ 142.350	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 22.800	EPSC25-CAPRESOCA EPS	3	$ 142.350	$ 17.800	$ 0	$ 17.800	14-11 - ARL SURA	3	$ 142.350		$ 0	3	$ 142.350	SCCF59-COMFACASANARE	$ 5.700	$ 2.900	$ 4.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1116529318	GONZALEZ ARIL EDWARD DAVID	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																	230301-PORVENIR	27	$ 1.281.150	$ 205.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 205.000	EPSC25-CAPRESOCA EPS	27	$ 1.281.150	$ 160.200	$ 0	$ 160.200	14-11 - ARL SURA	27	$ 1.281.150		$ 89.200	27	$ 1.281.150	SCCF59-COMFACASANARE	$ 51.300	$ 25.700	$ 38.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1119511727	TORRES PICLOZA YESID ALBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO	CT																230301-PORVENIR	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	EPS041-NUEVA EPS CM	1	$ 47.450	$ 6.000	$ 0	$ 6.000	14-11 - ARL SURA	1	$ 47.450		$ 3.400	1	$ 47.450	SCCF59-COMFACASANARE	$ 1.900	$ 1.000	$ 1.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 6716650	SANCHEZ MANYA JAIME	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO	CA																230301-PORVENIR	4	$ 189.800	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 30.400	EPSC25-CAPRESOCA EPS	4	$ 189.800	$ 23.800	$ 0	$ 23.800	14-11 - ARL SURA	4	$ 189.800		$ 13.300	4	$ 189.800	SCCF59-COMFACASANARE	$ 7.600	$ 3.800	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901792925
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAPLLANOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 1ª 40 149 OF 502	TELÉFONO:	3143362
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7981013152	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		6			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/08/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1703528891

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD							ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AJUSTES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
12	CC 7382828	CAPEDA RANCO HILDEBARDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.590		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF59-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
13	CC 9430738	VAZQUEZ OROZCO SIDNEY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	230501-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.590		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF59-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
14	CC 9431143	ALVARADO MOSQUERA NELSON ALBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO	C3																230501-PORVENIR	6	$ 284.700	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 45.600	EPS037-NUEVA EPS	6	$ 284.700	$ 35.600	$ 0	$ 35.600	14-11 - ARL SURA	6	$ 284.730		$ 19.900	6	$ 284.700	CCF59-COMFACASANARE	$ 11.400	$ 5.700	$ 8.600	$ 0	$ 0
15	PT 6687274	PEÑALOZA SIERA HERNAN OMAR ENRIQUE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	230501-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.590		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF59-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 6.203.700

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ART. 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURIDICAS)

VICTOR MANUEL AVILA FONSECA identificado con C.C. Nº 6.775.413 de Tunja en mi condición de representante legal de UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAPLLANOS y **JENNY MARIBEL ESPINOSA CEPEDA** identificado con C.C. Nº 23.434.187 de Ciénega y con tarjeta profesional Nº 165295-T de la junta central de contadores de Colombia en mi condición de contador público de **UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAPLLANOS** con Nit: 901.792.925 - 3.

Nos permitimos certificar el pago realizado por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales de los periodos comprendidos entre el 01 del mes de julio de 2025 hasta el 31 del mes de julio de 2025 ; lo anterior teniendo en cuenta que **VICTOR MANUEL AVILA FONSECA** presta los servicios profesionales como **GERENTE DE PROYECTOS** con una dedicación del 50%, **JULIAN FELIPE PEDRAZA MONSALVE** presta los servicios profesionales como **RESIDENE DE OBRA** con una dedicación del 100%, **MARTHA ERAIMA CAMARGO CHAPARRO** presta los servicios profesionales como **DIRECTOR DE OBRA** con una dedicación del 50%, **EDBIN GUILLERMO AVILA FONSECA** presta los servicios profesionales como **INGENIERO AMBIENTAL** con una dedicación del 50% y **FREDDY PEREZ TOVAR** presta los servicios profesionales como **PROFESIONAL SISOMA** con una dedicación del 100%, en el desarrollo del contrato de obra Nº **009-RAPLL-2024** cuyo objeto es **"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE"**. En constancia se relacionan las planillas.

PERIODO	NOMBRE	PLANILLA N°	IBC	SALUD	PENSION	ARL
JULIO 2025	VICTOR MANUEL AVILA FONSECA	7980053037	$ 1.500.000,00	$ 187.500,00	$ 240.000,00	$ 104.400,00
	JULIAN FELIPE PEDRAZA MONSALVE		$ 1.423.500,00	$ 178.000,00	$ 227.800,00	$ -
	MARTHA ERAIMA CAMARGO CHAPARRO	7979643769	$ 1.500.000,00	$ 187.500,00	$ 240.000,00	$ -
	EDBIN GUILLERMO AVILA FONSECA	9490182637	$ 2.847.000,00	$ 355.900,00	$ 455.600,00	$ 198.200,00
	FREDDY PEREZ TOVAR	7998905480	$ 474.500,00	$ 19.000,00	$ 76.000,00	$ 33.100,00

Dada en Yopal a los once (11) días del mes de diciembre de 2025

VICTOR MANUEL AVILA FONSECA
C.C. 6.775.413 de Tunja
Representante Legal

JENNY MARIBEL ESPINOSA CEPEDA
C.C. 23.434.187 de Ciénega
TP 165295-T
CONTADOR PUBLICO

967

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	6775413
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			VICTOR MANUEL AVILA FONSECA
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 25 - 13 - 20 YOPAL CASANARE	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	8010
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			79800530 37
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO 2025	TIPO DE PLANILLA:
DÍAS DE MORA:			77
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/10/21
PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio	AÑO 2025	I-INDEPENDIENTES
NÚMERO AUTORIZACIÓN:			186088290

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.600	$ 0	$ 240.000	$ 11.600	$ 251.600
SUBTOTALES:										$ 240.000	$ 11.600	$ 251.600

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR APORTES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR APORTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 187.500	$ 0	$ 9.100	$ 0	$ 187.500	$ 9.100	$ 0	$ 196.600
SUBTOTALES:													$ 187.500	$ 9.100	$ 0	$ 196.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR APORTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 104.400	$ 0	$ 104.400	$ 5.100	$ 0	$ 109.500
SUBTOTALES:										$ 104.400	$ 5.100	$ 0	$ 109.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

N°	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	NOVEDADES: COLOMBIANO EN EXTERIOR	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 6775413	VICTOR MANUEL AVILA FONSECA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.500.000			NO															

N°	PENSIÓN: ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD: ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	TOTAL APORTE	ARP: ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES: DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.500.000	$ 187.500	$ 0	$ 187.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.500.000	6775413	$ 104.400	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 557.700

Planilla Pagada

962

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	52559143
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MARTHA ERAIMA CAMARGO CAPARRO
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 15 40 149 OF 502	TELÉFONO:	3144148
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7979643769	TIPO DE PLANILLA:		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO	I-INDEPENDIENTES 2025
DIAS DE MORA:		68			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		180 2061675

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.200	$ 0	$ 240.000	$ 10.200	$ 250.200
SUBTOTALES:										$ 240.000	$ 10.200	$ 250.200

TOTAL APORTE A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 187.500	$ 0	$ 8.000	$ 0	$ 187.500	$ 8.000	$ 0	$ 195.500
SUBTOTALES:													$ 187.500	$ 8.000	$ 0	$ 195.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF10	CCF10 COMFABOY	1	$ 9.000	$ 400	$ 9.400
SUBTOTALES:			$ 9.000	$ 400	$ 9.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

N°	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COM	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 52559143	CAMARGO CAPARRO MARTHA ERAIMA	DEPENDIENTE		$ 1.500.000			NO																

N°	PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN DÍAS COT.	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD DÍAS COT.	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP DÍAS COT.	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES DÍAS COT.	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.500.000	$ 187.500	$ 0	$ 187.500		30	$ 0		$ 0	30	$ 1.500.000	CCF10-COMFABOY	$ 9.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 455.100

Planilla Pagada

aportes en línea

Resumen General de Pago

963

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7168649		AVILA FONSECA EDBIN GUILLERMO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL BOYACA	CRA 1C 41A 27	TUNJA-BOYACA	7750406	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	692934743	94901 2637	I	2025/08/13	2025/08/11	BANCOLOMBIA	0	$504,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL BOYACA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Centro de Trabajo: BOYACA TRANSPORTE (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Ciudad: TUNJA Dpto: BOYACA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0
1	CC 7168649	AVILA FONSECA EDBIN GUILLERMO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0

2025/08/11 09:33 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7168649		AVILA FONSECA EDBIN GUILLERMO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL BOYACA	CRA 1C 41A 27	TUNJA-BOYACA	7750406	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	169293474[illegible]	94901[illegible]2637	I	2025/08/13	2025/08/11	BANCOLOMBIA	0	$504,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$0	$0	$99,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$504,900	$0	$0	$504,900

2025/08/11 09:33 AM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901792925
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RURAL PLANOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 15 40 149 OF 502	TELÉFONO:	3143362
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			79989315480	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			125		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/12/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	200 3100089

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201 - PROTECCION	1	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.000	$ 0	$ 76.000	$ 6.000	$ 82.000
SUBTOTALES:										$ 76.000	$ 6.000	$ 82.000

TOTAL APORTE A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037 - NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 19.000	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 19.000	$ 1.500	$ 0	$ 20.500
SUBTOTALES:													$ 19.000	$ 1.500	$ 0	$ 20.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 33.100	$ 33.100	$ 2.600	$ 0	$ 35.700
SUBTOTALES:									$ 33.100	$ 2.600	$ 0	$ 35.700

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF59	CCF59 - COMFACASANARE	1	$ 19.000	$ 1.500	$ 20.500
SUBTOTALES:			$ 19.000	$ 1.500	$ 20.500

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 12135551	PEREZ TOVAR FREDDY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI	21															

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230201-PROTECCION	30	$ 474.500	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 76.000

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 474.500	$ 19.000	$ 0	$ 19.000

SEGURIDAD SOCIAL – ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-11 - ARL SURA	30	$ 474.500		$ 33.100

PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
$ 474.500	CCF59-COMFACASANARE	$ 19.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 158.700

ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DEL CASANARE.

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICAN:

VICTOR MANUEL ÁVILA FONSECA, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.775.413 expedida en Tunja, Boyacá, en mi condición de Representante legal y **JENNY MARIBEL ESPINOSA CEPEDA** identificada con cedula de ciudadanía No. 23.434.187 de Ciénega, Boyacá, con tarjeta profesional No. 165295-T inscrita a la Junta Central de Contadores de Colombia en condición de contadora pública de la **UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAPLLANOS**, identificado con Nit. 901.792.925-3 luego de examinar la contabilidad y de más documentación de la **UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAPLLANOS** de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, basado en pruebas selectivas de las evidencias que soportan hechos y revelaciones, ha realizado el pago de los siguientes aportes: salud, pensión, riesgos laborales, Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, según se indica en las planillas soporte, los cuales corresponden a los montos contabilizados y pagados por las mismas durante el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2025 al 31 de agosto de 2025 en relación con el personal requerido para el desarrollo del CONTRATO DE OBRA No. 009-RAPLL-2024, cuyo objeto es "ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DEL CASANARE." Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003.

RELACION PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2025

PERIODO	PLANILLA N°	IBC PENSION	PENSION		IBC SALUD	SALUD		CCF	RIESGOS		PARAFISCALES		TOTAL
								COMFACASANARE			ICBF	SENA	
			VLR PAGADO	AFP		VLR PAGADO	EPS	VLR PAGADO	IBC	VLR PAGADO			
AGOSTO 2025	7991765421	$ 16.227.900	$ 2.597.000	PORVENIR COLPENSIONES COLFONDOS	$ 16.227.900	$ 2.029.200	CAPRESOCA EPS NUEVA EPS SANITAS	$ 649.800	$ 16.227.900	$ 1.129.900	$ 487.900	$ 325.000	$ 7.218.800
TOTAL		$ 16.227.900	$ 2.597.000		$ 16.227.900	$ 2.029.200		$ 649.800	$ 16.227.900	$ 1.129.900	$ 487.900	$ 325.000	$ 7.218.800

Para constancia se firma en Yopal, a los once (11) días del mes de diciembre de 2025.

VICTOR MANUEL ÁVILA FONSECA

CC. 6.775.413 DE TUNJA, BOYACÁ

REPRESENTANTE LEGAL

JENNY MARIBEL ESPINOSA CEPEDA

CC. 23.434.187 de Ciénega, Boyacá

CONTADORA PÚBLICA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901792925
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL B BLIOTECA RAPLLANOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 1ª 40 149 OF 502	TELÉFONO:	3143362
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			79917 5421	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			45		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/10/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1862414545

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.400	$ 0	$ 227.800	$ 6.400	$ 234.200
230301	230301-PORVENIR	10	$ 1.913.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.500	$ 0	$ 1.913.600	$ 53.500	$ 1.967.100
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 455.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.800	$ 0	$ 455.600	$ 12.800	$ 468.400
SUBTOTALES:										**$ 2.597.000**	**$ 72.700**	**$ 2.669.700**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 356.000	$ 0	$ 10.000	$ 0	$ 356.000	$ 10.000	$ 0	$ 366.000
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 664.500	$ 0	$ 16.800	$ 0	$ 664.500	$ 16.800	$ 0	$ 681.300
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 534.000	$ 0	$ 15.000	$ 0	$ 534.000	$ 15.000	$ 0	$ 549.000
EPS041	NUEVA EPS CM	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 474.700	$ 0	$ 13.300	$ 0	$ 474.700	$ 13.300	$ 0	$ 488.000
SUBTOTALES:													**$ 2.029.200**	**$ 56.900**	**$ 0**	**$ 2.086.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	13			$ 0		$ 0	$ 1.129.900	$ 1.129.900	$ 31.600	$ 0	$ 1.161.500
SUBTOTALES:									**$ 1.129.900**	**$ 31.600**	**$ 0**	**$ 1.161.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	13	$ 649.800	$ 18.200	$ 668.000
SUBTOTALES:			**$ 649.800**	**$ 18.200**	**$ 668.000**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	13	$ 487.900	$ 13.700	$ 501.600
PASENA	PASENA - SENA	13	$ 325.000	$ 9.100	$ 334.100
SUBTOTALES:			**$ 812.900**	**$ 22.800**	**$ 835.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1007375134	SANCHEZ MILLAN YERSON DAVALO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																
2	CC 1115850994	TORRES CHAGON DARWIN ALBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																
3	CC 1115854475	CAMELO DIVENSON CESAR AUGUSTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																
4	CC 1115857692	CARDONA RUIZ YERSON ORLANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																
5	CC 1116852050	PINZON LOPEZ JAIME YAIR YERNELY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																
6	CC 1116603340	MOTTA RIVERA EDGARDO ARNALDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO	12															
7	CC 1116529318	GONZALEZ PEREZ JHOAN EDWARD ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																
8	CC 23794076	CRISTIANO BENAVIDEZ CELIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO	01															
9	CC 4214749	VARGAS ARIAS ROVINSON	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO	01															
10	CC 73628283	PEDA MANCO HILBARDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																

Nº	SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN: ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD: ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP: ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES: DIAS COT	IBC	CCF: ADMIN	CCF: TOTAL APORTE	SENA: TOTAL APORTE	ICBF: TOTAL APORTE	ESAP: TOTAL APORTE	MINEDU: TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	3	$ 142.350	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 22.800	EPSC25-CAPRESOCA EPS	3	$ 142.350	$ 17.800	$ 0	$ 17.800	14-11 - ARL SURA	3	$ 142.350		$ 10.000	3	$ 142.350	CCF69-COMFACASANARE	$ 5.700	$ 2.900	$ 4.300	$ 0	$ 0
2	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.590		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.600	$ 0	$ 0
3	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.590		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.600	$ 0	$ 0
4	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.590		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.600	$ 0	$ 0
5	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.590		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.600	$ 0	$ 0
6	230301-PORVENIR	18	$ 901.550	$ 144.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 144.300	EPSC25-CAPRESOCA EPS	18	$ 901.550	$ 112.700	$ 0	$ 112.700	14-11 - ARL SURA	18	$ 901.550		$ 62.800	18	$ 901.550	CCF69-COMFACASANARE	$ 36.100	$ 18.100	$ 27.100	$ 0	$ 0
7	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.590		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.600	$ 0	$ 0
8	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.590		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.600	$ 0	$ 0
9	231001-COLFONDOS	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.590		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.600	$ 0	$ 0
10	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.590		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.600	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901792925
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL B BLIOTECA R/PLLANOS BOYACA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	3143362
DIRECCIÓN:	CRA 1ª 40 149 OF 502	TELÉFONO:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7991785421	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			45				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/10/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			186241454S

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AJUSTES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 94307383	NAZUE DIDUZCO EFINEY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	230501-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF39-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
2	CC 96186853	SOLER RUBIO HENRRY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO	11																230501-PORVENIR	20	$ 949.000	$ 151.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 151.900	NUEVA EPS CM	20	$ 949.000	$ 118.700	$ 0	$ 118.700	14-11 - ARL SURA	20	$ 949.000		$ 66.100	20	$ 949.000	CCF39-COMFACASANARE	$ 38.000	$ 19.000	$ 28.500	$ 0	$ 0
3	PT 6687274	TAMURE ERA HOMAR O DE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	230501-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF39-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 7.421.000

Planilla Pagada
Planilla Pagada

969

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ART. 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURIDICAS)

VICTOR MANUEL AVILA FONSECA identificado con C.C. Nº 6.775.413 de Tunja en mi condición de representante legal de UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAPLLANOS y **JENNY MARIBEL ESPINOSA CEPEDA** identificado con C.C. Nº 23.434.187 de Ciénega y con tarjeta profesional Nº 165295-T de la junta central de contadores de Colombia en mi condición de contador público de **UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAPLLANOS** con Nit: 901.792.925 - 3.

Nos permitimos certificar el pago realizado por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales de los periodos comprendidos entre el 01 del mes de agosto de 2025 hasta el 31 del mes de agosto de 2025 ; lo anterior teniendo en cuenta que **VICTOR MANUEL AVILA FONSECA** presta los servicios profesionales como **GERENTE DE PROYECTOS** con una dedicación del 50%, **JULIAN FELIPE PEDRAZA MONSALVE** presta los servicios profesionales como **RESIDENE DE OBRA** con una dedicación del 100%, **MARTHA ERAIMA CAMARGO CHAPARRO** presta los servicios profesionales como **DIRECTOR DE OBRA** con una dedicación del 50%, **EDBIN GUILLERMO AVILA FONSECA** presta los servicios profesionales como **INGENIERO AMBIENTAL** con una dedicación del 50% y **FREDDY PEREZ TOVAR** presta los servicios profesionales como **PROFESIONAL SISOMA** con una dedicación del 100%, en el desarrollo del contrato de obra Nº **009-RAPLL-2024** cuyo objeto es **"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE"**. En constancia se relacionan las planillas.

PERIODO	NOMBRE	PLANILLA N°	IBC	SALUD	PENSION	ARL
AGOSTO 2025	VICTOR MANUEL AVILA FONSECA	7987299945	$ 1.500.000,00	$ 187.500,00	$ 240.000,00	$ 104.400,00
	JULIAN FELIPE PEDRAZA MONSALVE	9496308265	$ 1.423.500,00	$ 178.000,00	$ 227.800,00	$ -
	MARTHA ERAIMA CAMARGO CHAPARRO	7991747197	$ 1.500.000,00	$ 187.500,00	$ 240.000,00	$ -
	EDBIN GUILLERMO AVILA FONSECA	9491402968	$ 2.847.000,00	$ 355.900,00	$ 455.600,00	$ 198.200,00
	FREDDY PEREZ TOVAR	7998906061	$ 474.500,00	$ 19.000,00	$ 76.000,00	$ 33.100,00

Dada en Yopal a los once (11) días del mes de diciembre de 2025

VICTOR MANUEL AVILA FONSECA
C.C. 6.775.413 de Tunja
Representante Legal

JENNY MARIBEL ESPINOSA CEPEDA
C.C. 23.434.187 de Ciénega
TP 165295-T
CONTADOR PUBLICO

977

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	6775413
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			VICTOR MANUEL AVILA FONSECA
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 25 - 13 - 20	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7987239945	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		48			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/10/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		186094352

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.200	$ 0	$ 240.000	$ 7.200	$ 247.200
SUI TOTALES:										$ 240.000	$ 7.200	$ 247.200

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDADES POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDADES POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 187.500	$ 0	$ 5.600	$ 0	$ 187.500	$ 5.600	$ 0	$ 193.100
SUI TOTALES:													$ 187.500	$ 5.600	$ 0	$ 193.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 104.400	$ 104.400	$ 3.200	$ 0	$ 107.600
SUI TOTALES:									$ 104.400	$ 3.200	$ 0	$ 107.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO NO RESIDENTE	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 6775413	AVILA FONSECA VICTOR MANUEL	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.500.000			NO															

SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000

SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.500.000	$ 187.500	$ 0	$ 187.500

ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.500.000	6775413	$ 104.400

PARAFISCALES DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 547.900

Planilla Pagada SOI Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	52559143
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MARTHA ERAIMA CAMARGO CAPARRO
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 15 40 149 OF 502	TELÉFONO:	3144148
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo por
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			79917147197	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			40		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/10/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	186 3970411

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.000	$ 0	$ 240.000	$ 6.000	$ 246.000
SUI TOTALES:										$ 240.000	$ 6.000	$ 246.000

TOTAL APORTE A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 187.500	$ 0	$ 4.700	$ 0	$ 187.500	$ 4.700	$ 0	$ 192.200
SUI TOTALES:													$ 187.500	$ 4.700	$ 0	$ 192.200

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10 COMFABOY	1	$ 9.000	$ 300	$ 9.300
SUI TOTALES:			$ 9.000	$ 300	$ 9.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049622351		JULIAN FELIPE PEDRAZA MONSALVE	INDEPENDIENTE	Principal	transversal 3 n 60a-41 torre 2 apto 705	TUNJA-BOYACA	7461113	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	irl ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct ir vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$0**		**$0**		**$0**	**$0**		**$405,800**
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$0**		**$0**		**$0**	**$0**		**$405,800**
1	CC	1049622351	PEDRAZA JULIAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$405,800
Total Afiliados(1)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800

Si tiene una deducción 1001 Ver lada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1999593164	9496308265	I	2025/09/11	2025/12/11	BANCOLOMBIA	91	$428,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$13,000	$0	$240,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$13,000	$0	$240,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$10,100	$0	$188,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$10,100	$0	$188,100
TOTAL				1	$405,800	$23,100	$0	$428,900

aportes en línea

Resumen General de Pago

975

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7168649		AVILA FONSECA EDBIN GUILLERMO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL BOYACA	CRA 1C 41A 27	TUNJA-BOYACA	7750406	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	874876062	94914 32968	I	2025/09/10	2025/09/03	BANCOLOMBIA	0	$1,009,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL BOYACA (1 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$355,900			$0	$0			$2,847,000	$198,200		$0	$0
Centro de Trabajo: BOYACA TRANSPORTE (1 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$355,900			$0	$0			$2,847,000	$198,100		$0	$0
Ciudad: TUNJA Dpto: BOYACA (1 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$355,900			$0	$0			$2,847,000	$198,100		$0	$0
1	CC	71686 9	AVILA FONSECA EDBIN GUILLERMO	25-14	30	$2,847,000	$455,600	EPS005	30	$2,847,000	$355,900		0	$0	$0	14-23	30	$2,847,000	$198,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$355,900			$0	$0			$2,847,000	$198,100		$0	$0

2025/09/03 09:33 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

976

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7168649		AVILA FONSECA EDBIN GUILLERMO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL BOYACA	CRA 1C 41A 27	TUNJA-BOYACA	7750406	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1748760623	94914032968	I	2025/09/10	2025/09/03	BANCOLOMBIA	0	$1,009,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$455,600	$0	$0	$455,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$455,600	$0	$0	$455,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$198,200	$0	$0	$198,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$198,200	$0	$0	$198,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$355,900	$0	$0	$355,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$355,900	$0	$0	$355,900
TOTAL				1	$1,009,700	$0	$0	$1,009,700

2025/09/03 09:33 AM

977

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901792925
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAPLLANOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 15 40 149 OF 502	TELÉFONO:	3143362
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		79989 36061	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		97			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		200 9093493

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230101	230201 - PROTECCION	1	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.600	$ 0	$ 76.000	$ 4.600	$ 80.600
SUI TOTALES:										$ 76.000	$ 4.600	$ 80.600

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037 - NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 19.000	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 19.000	$ 1.200	$ 0	$ 20.200
SUI TOTALES:													$ 19.000	$ 1.200	$ 0	$ 20.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 33.100	$ 33.100	$ 2.000	$ 0	$ 35.100
SUI TOTALES:									$ 33.100	$ 2.000	$ 0	$ 35.100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF69	CCF69 - COMFACASANARE	1	$ 19.000	$ 1.200	$ 20.200
SUI TOTALES:			$ 19.000	$ 1.200	$ 20.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 12135551	PEREZ RIVAR FREDDY	DEPE 20		$ 1.423.50	FIJO		SI	13														

SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
230-01-PROTECCION	10	$ 474.500	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 76.000	EPS037-NUEVA EPS	10	$ 474.500	$ 19.000	$ 0	$ 19.000	14-11 - ARL SURA	10	$ 474.500		$ 33.100

PARAFISCALES DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
10	$ 474.500	CCF69-COMFACASANARE	$ 19.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 156.100

ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DEL CASANARE.

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICAN:

VICTOR MANUEL ÁVILA FONSECA, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.775.413 expedida en Tunja, Boyacá, en mi condición de Representante legal y **JENNY MARIBEL ESPINOSA CEPEDA** identificada con cedula de ciudadanía No. 23.434.187 de Ciénega, Boyacá, con tarjeta profesional No. 165295-T inscrita a la Junta Central de Contadores de Colombia en condición de contadora pública de la **UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAPLLANOS**, identificado con Nit. 901.792.925-3 luego de examinar la contabilidad y de más documentación de la **UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAPLLANOS** de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, basado en pruebas selectivas de las evidencias que soportan hechos y revelaciones, ha realizado el pago de los siguientes aportes: salud, pensión, riesgos laborales, Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, según se indica en las planillas soporte, los cuales corresponden a los montos contabilizados y pagados por las mismas durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2025 al 30 de septiembre de 2025 en relación con el personal requerido para el desarrollo del CONTRATO DE OBRA No. 009-RAPLL-2024, cuyo objeto es "ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DEL CASANARE." Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003.

RELACION PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

PERIODO	PLANILLA N°	IBC PENSION	PENSION		IBC SALUD	SALUD		CCF	RIESGOS		PARAFISCALES		TOTAL
								COMFACASANARE			ICBF	SENA	
			VLR PAGADO	AFP		VLR PAGADO	EPS	VLR PAGADO	IBC	VLR PAGADO			
SEPTIEMBRE 2025	7991767597	$ 17.082.000	$ 2.733.600	PORVENIR COLPENSIONES COLFONDOS	$ 17.082.000	$ 2.136.000	CAPRESOCA EPS NUEVA EPS SANITAS	$ 684.000	$ 17.082.000	$ 1.189.200	$ 513.600	$ 342.000	$ 7.598.400
TOTAL		$ 17.082.000	$ 2.733.600		$ 17.082.000	$ 2.136.000		$ 684.000	$ 17.082.000	$ 1.189.200	$ 513.600	$ 342.000	$ 7.598.400

Para constancia se firma en Yopal, a los once (11) días del mes de diciembre de 2025.

VICTOR MANUEL ÁVILA FONSECA

CC. 6.775.413 DE TUNJA, BOYACÁ

REPRESENTANTE LEGAL

JENNY MARIBEL ESPINOSA CEPEDA

CC. 23.434.187 de Ciénega, Boyacá

CONTADORA PÚBLICA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901792925
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAPLLANOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 1 # 40 149 OF 502	TELÉFONO:	3143362
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7991737597	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			13				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/10/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1862424362

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	9	$ 2.050.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.300	$ 0	$ 2.050.200	$ 16.300	$ 2.066.500
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 0	$ 227.800	$ 1.900	$ 229.700
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 455.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.700	$ 0	$ 455.600	$ 3.700	$ 459.300
SUBTOTALES:										**$ 2.733.600**	**$ 21.900**	**$ 2.755.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 534.000	$ 0	$ 4.300	$ 0	$ 534.000	$ 4.300	$ 0	$ 538.300
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 534.000	$ 0	$ 4.300	$ 0	$ 534.000	$ 4.300	$ 0	$ 538.300
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 356.000	$ 0	$ 2.900	$ 0	$ 356.000	$ 2.900	$ 0	$ 358.900
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 712.000	$ 0	$ 5.700	$ 0	$ 712.000	$ 5.700	$ 0	$ 717.700
SUBTOTALES:													**$ 2.136.000**	**$ 17.200**	**$ 0**	**$ 2.153.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	12		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.189.200	$ 1.189.200	$ 9.500	$ 0	$ 1.198.700
SUBTOTALES:									**$ 1.189.200**	**$ 9.500**	**$ 0**	**$ 1.198.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	12	$ 684.000	$ 5.500	$ 689.500
SUBTOTALES:			**$ 684.000**	**$ 5.500**	**$ 689.500**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	12	$ 513.600	$ 4.100	$ 517.700
PASENA	PASENA - SENA	12	$ 342.000	$ 2.800	$ 344.800
SUBTOTALES:			**$ 855.600**	**$ 6.900**	**$ 862.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1118850994	TORRES CARDON DARWIN ALBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																
2	CC 1118854475	CARREÑO QUIVENECH JESUS CESAR ALBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																
3	CC 1118857692	CARDONA RUIZ YARDIN ORLANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																
4	CC 1118862050	PINZON ESPEYMIN FERNELY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																
5	CC 1118663340	MOTTA SALCEDO MIGUELDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																
6	CC 1118529318	GONZALEZ ABRIL EDWARD DARIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																
7	CC 23794076	CRISTIANO BENAVIDEZ OLEVIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																
8	CC 4214745	MARSAB MIMS ROBINSON	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																
9	CC 7382820	CEPEDA MINCO HELIBARDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																
10	CC 9430738	VANZUZ OROZCO EITNEY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.600	$ 0	$ 0
2	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.600	$ 0	$ 0
3	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.600	$ 0	$ 0
4	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.600	$ 0	$ 0
5	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.600	$ 0	$ 0
6	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.600	$ 0	$ 0
7	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.600	$ 0	$ 0
8	231001-COLFONDOS	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.600	$ 0	$ 0
9	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.600	$ 0	$ 0
10	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.600	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901792925
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAPLLANOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 1F 40 149 OF 302	TELÉFONO:	3143362
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7991787597	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			13				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/10/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1862424362

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																											PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
11	CC 9619553	SOLER BLANCO HENRRY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	55CCF59-COMFACA SANARE	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
12	PT 6687274	MAURE BRA HEDWAR JOSE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	55CCF59-COMFACA SANARE	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 7.659.400

Planilla Pagada
sch SOI
Planilla Pagada

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ART. 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURIDICAS)

VICTOR MANUEL AVILA FONSECA identificado con C.C. Nº 6.775.413 de Tunja en mi condición de representante legal de UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAPLLANOS y **JENNY MARIBEL ESPINOSA CEPEDA** identificado con C.C. Nº 23.434.187 de Ciénega y con tarjeta profesional Nº 165295-T de la junta central de contadores de Colombia en mi condición de contador público de **UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAPLLANOS** con Nit: 901.792.925 - 3.

Nos permitimos certificar el pago realizado por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales de los periodos comprendidos entre el 01 del mes de septiembre de 2025 hasta el 30 del mes de septiembre de 2025 ; lo anterior teniendo en cuenta que **VICTOR MANUEL AVILA FONSECA** presta los servicios profesionales como **GERENTE DE PROYECTOS** con una dedicación del 50%, **JULIAN FELIPE PEDRAZA MONSALVE** presta los servicios profesionales como **RESIDENE DE OBRA** con una dedicación del 100%, **MARTHA ERAIMA CAMARGO CHAPARRO** presta los servicios profesionales como **DIRECTOR DE OBRA** con una dedicación del 50%, **EDBIN GUILLERMO AVILA FONSECA** presta los servicios profesionales como **INGENIERO AMBIENTAL** con una dedicación del 50% y **FREDDY PEREZ TOVAR** presta los servicios profesionales como **PROFESIONAL SISOMA** con una dedicación del 100%, en el desarrollo del contrato de obra Nº **009-RAPLL-2024** cuyo objeto es **"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE"**. En constancia se relacionan las planillas.

PERIODO	NOMBRE	PLANILLA N°	IBC	SALUD	PENSION	ARL
SEPTIEMBRE 2025	VICTOR MANUEL AVILA FONSECA	7991264447	$ 1.500.000,00	$ 187.500,00	$ 240.000,00	$ 104.400,00
	JULIAN FELIPE PEDRAZA MONSALVE	9496308521	$ 1.423.500,00	$ 178.000,00	$ 227.800,00	$ -
	MARTHA ERAIMA CAMARGO CHAPARRO	7991747448	$ 1.500.000,00	$ 187.500,00	$ 240.000,00	$ -
	EDBIN GUILLERMO AVILA FONSECA	9492843273	$ 2.847.000,00	$ 355.900,00	$ 455.600,00	$ 198.200,00
	FREDDY PEREZ TOVAR	7998906444	$ 474.500,00	$ 19.000,00	$ 76.000,00	$ 33.100,00

Dada en Yopal a los once (11) días del mes de diciembre de 2025

VICTOR MANUEL AVILA FONSECA
C.C. 6.775.413 de Tunja
Representante Legal

JENNY MARIBEL ESPINOSA CEPEDA
C.C. 23.434.187 de Ciénega
TP 165295-T
CONTADOR PUBLICO

983

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	6775413
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			VICTOR MANUEL AVILA FONSECA
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 25 - 13 - 20 YOPAL CASANARE	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			79912544447	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			18				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/10/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			186101238

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.700	$ 0	$ 240.000	$ 2.700	$ 242.700
SUBTOTALES:										$ 240.000	$ 2.700	$ 242.700

TOTAL APORTE A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 187.500	$ 0	$ 2.100	$ 0	$ 187.500	$ 2.100	$ 0	$ 189.600
SUBTOTALES:													$ 187.500	$ 2.100	$ 0	$ 189.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 104.400	$ 104.400	$ 1.200	$ 0	$ 105.600
SUBTOTALES:									$ 104.400	$ 1.200	$ 0	$ 105.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	52559143
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARTHA ERAIMA CAMARGO CAPARRO
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 17 40 149 OF 302	TELÉFONO:	3144148
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadoras, equipo por
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7991747448	TIPO DE PLANILLA:		INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		10			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		186 9974962

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 240.000	$ 1.500	$ 241.500
SUBTOTALES:										$ 240.000	$ 1.500	$ 241.500

TOTAL APORTE A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 187.500	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 187.500	$ 1.200	$ 0	$ 188.700
SUBTOTALES:													$ 187.500	$ 1.200	$ 0	$ 188.700

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10 COMFABOY	1	$ 9.000	$ 100	$ 9.100
SUBTOTALES:			$ 9.000	$ 100	$ 9.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049622351		JULIAN FELIPE PEDRAZA MONSALVE	INDEPENDIENTE	Principal	transversal 3 n 60a-41 torre 2 apto 705	TUNJA-BOYACA	7461113	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800
1	CC	1049622351	PEDRAZA JULIAN																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$405,800
Total		**Afiliados(1)**																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800
