DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	diciembre de 2025	Numero de contrato:	CD-12-2025-1111
Datos del Contratista (nombres y apellidos-número de identificación)	**MERCEDES CANDELARIA CRUZ CORREA** **CC. 64588159**		
Periodo del informe:	Informe comprendido al pago final mes de diciembre de 2025	Informe número:	11
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.		
Valor del contrato	SON: NOVENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/L ($99.000.000)		
Supervisor	RAFAEL LAFONT DE SALES C.C. 8.662.605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

ACTIVIDADES:

Se continua con las siguientes actividades:

Coordinación durante la revisión en la base de datos del Sisbén, conceptos de amenazas del predio y avaluó catastral para verificar que los postulantes de las viviendas cumplan con los requisitos y puntajes requeridos, correspondiente a los barrios: **LA CHINITA, VILLA SAN CARLOS, LAS GRANJAS, VILLA BLANCA, LOS OLIVOS I, LOS OLIVOS II, CARRIZAL, JOSE ANTONIO GALAN, BARLOVENTO, CIUDAD MODESTO, LA PAZ, EVARISTO SOURDIS, LIPAYA, SANTO DOMINGO DE GUZMAN, LA MANGA, LAS AMERICAS, LA PLAYA, SANTUARIO, EL BOSQUE, LAS MALVINAS, EL ROMANCE, SIETE DE ABRIL, CIUDADELA VEINTE DE JULIO, LAS FLOR ES, LA SIERRITA, KENEDY, LA PRADERA, EL PUEBLO, SANTA MARIA, EL POR FIN, VILLA FLOR, LA ESMERALDA, BELLARENA, SAN ROQUE, LA LUZ Y VILLA SAN PEDRO 1 Y 2.**

Coordinación de nuevas visitas posterior a las entregas de mejoramientos de viviendas para aplicación de encuestas, colocando como punto de encuentro el relacionado, así:

DIRECCION	BARRIO	EVENTO
Punto de encuentro Calle 8 #10 - 69	CORREGIMIENTO DE LA PLAYA	Entrega de diez (10) Mejoramientos de Vivienda barrio REBOLO

Coordinación posterior a la entrega de tramos de vías (Programa Barrios a la Obra) para la aplicación de encuestas, en las siguientes direcciones:

DIRECCION	BARRIO	EVENTO
Punto de encuentro **Carrera 26 con calle 57**	LOS PINOS	Entrega de tres (3) nuevos tramos de vías en las siguientes direcciones: Carrera 25 entre calles 53d y 57. Carrera 25b entre calles 53d y 56. Carrera 26 entre calles 53d y 57. El alcalde entrega **960 ML** de vía en Los Pinos, donde se ejecutó la pavimentación de la vía en concreto rígido, sumado a reposición de redes de acueducto y alcantarillado.
Punto de encuentro **Carrera 23C con calle 74b**	CARLOS MEISEL	Entrega de dos (2) nuevos tramos de vías en las siguientes direcciones: Carrera 23C entre calles 74B y 74C – 130 ML. Carrera 24 entre calles 74C y 75 A – 60ML El alcalde entrega **190 ML** de vía en Carlos Meisel, donde se ejecutaron reposición de redes de acueducto y alcantarillado, bordillos y andenes.

Punto de encuentro **Vía 40 con calle 69.**	SAN FRANCISCO	Entrega de un (1) nuevo tramo de vías en las siguientes direcciones: Calle 69 entre Vía 40 y Gran Malecón El alcalde Alejandro Char realiza la entrega de **910 metros lineales** de vía en el barrio San Francisco.
Punto de encuentro **Calle 26 con Carrera 21D**	REBOLO Y MONTES	Entrega de tres (3) nuevos tramos de vías en las siguientes direcciones: • Calle 26 entre Carreras 21D y 23 - Montes - 110 ml. • Calle 19 entre Carreras 26 y 28 - Rebolo - 37ml. • Calle 20 entre Carreras 26 y 28 - Rebolo - 58ml. El alcalde Alejandro Char realiza la entrega de **205 metros lineales** de vía en los barrios **Montes** y **Rebolo**.

Coordinación de visitas posterior a la socialización y entrega de vías terminadas en el Barrio Los pinos, las cuales corresponden al Programa Barrios a la Obra. Durante la socialización se dialoga con la comunidad y se toman los registros fotográficos.

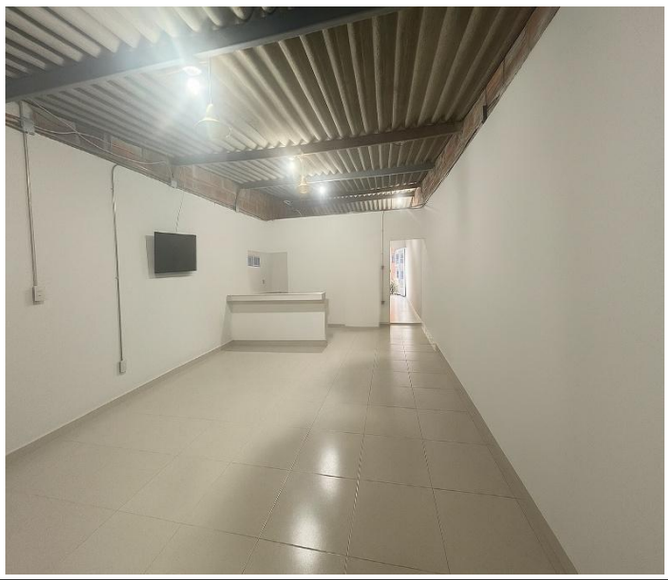
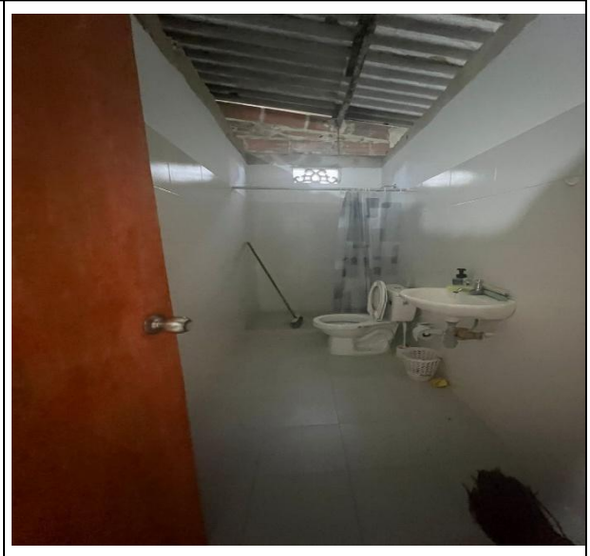








Coordinación de visitas posterior a los recorridos a las viviendas entregados por intermedio del Programa de Miramiento de Vivienda Saludable, de acuerdo con la información obtenida anteriormente de cada vivienda así:

<table>
<tr><th>#</th><th>Postulante</th><th>Barrio</th><th>Dirección</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Juana Dianora Contreras Barrios</td><td>La Playa</td><td>C 17 10 25</td></tr>
<tr><td colspan="4">REGISTRO FOTOGRÁFICO</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">SALA-: Demolición de piso pulido, plantilla de nivelación para piso, enchape para piso y zócalos, estuco y pintura, instalaciones eléctricas, sistema puesta a tierra.</td><td colspan="2">HALL: Demolición de piso pulido, plantilla de nivelación para piso, enchape para piso y zócalos, estuco y pintura, instalaciones eléctricas en tubería EMT.</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">COCINA: Demolición de piso existente en cerámica, Plantilla de nivelación, enchape de piso, pañete y enchape muros salpicadero, estuco sobre muros y pintura. Construcción de mesón en concreto con enchape incluye lavaplatos y accesorios, Instalaciones eléctricas en tubería EMT, tomacorriente doble GFCI.</td><td colspan="2">BAÑO: Demolición de pisos, Plantilla de nivelación, pañete de muros, enchape de piso y muros, estuco sobre muros y pintura. Instalaciones eléctricas en tubería EMT, tomacorriente doble GFCI.</td></tr>
</table>

#	Postulante	Barrio	Dirección
2	María Eugenia Pájaro Gonzales	La Playa	K 17A 18 19

REGISTRO FOTOGRÁFICO





SALA: Demolición de plantilla existente, plantilla de nivelación, resane de muros a 1 mt de altura, enchape de piso, estuco y pintura, instalaciones eléctricas, sistema polo a tierra.

COCINA: Instalación de tubería hidrosanitaria, Demolición de piso en baldosa cemento y plantilla, plantilla de nivelación, enchape de piso, estuco, pintura, enchape de muro salpicadero, mesón en concreto, suministro de lavaplatos y accesorios, instalaciones eléctricas, toma doble GFCI.





BAÑO: Levantes de muros, Cubierta en laminas Demolición de piso y enchape muros, plantilla, enchape de piso, enchape de muro, pañete, instalación de ducha, desmonte de sanitario, instalación de combo sanitario, estuco, pintura, puerta en madera, instalaciones eléctricas, toma doble GFCI y espejo.

ALCOBA 1: Pañete de muros, instalaciones eléctricas en tubería EMT, puerta en madera.

#	Postulante	Barrio	Dirección
3	Karen Edanis Vásquez Prent	La Playa	K 17A 18 12

REGISTRO FOTOGRÁFICO



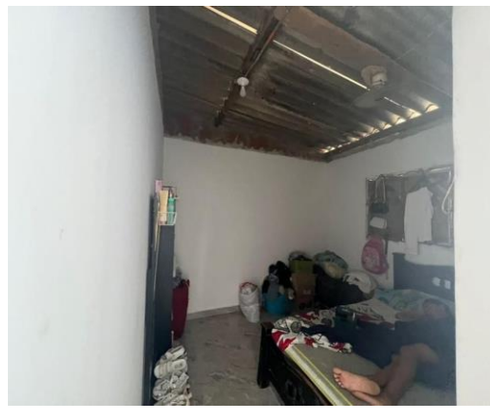




SALA: Demolición de piso en cemento pulido existente, plantilla de nivelación, enchape de piso, estuco y pintura, instalaciones eléctricas, sistema puesta a tierra.

COCINA: Demolición de plantilla, plantilla de nivelación, enchape de piso, estuco, pintura, enchape de muro salpicadero, mesón en concreto, enchape de mesón existente, suministro de lavaplatos y accesorios, instalaciones eléctricas, toma doble GFCI.





BAÑO: Demolición de piso y enchape muros, plantilla, enchape de piso, enchape de muro, pañete, instalación de ducha, desmonte de sanitario, instalación de combo sanitario, estuco, pintura, puerta en madera, instalaciones eléctricas, toma doble GFCI y espejo.

ALCOBA 2: Demolición de piso cemento pulido, plantilla de nivelación, instalaciones eléctricas en tubería EMT.

Atentamente,

Mercedes Cruz Correa

MERCEDES CANDELARIA CRUZ CORREA
C.C No. 64588159
