DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	DICIEMBRE / 2025	Numero de contrato:	CD-12-2025-1083
Datos del Contratista (nombres y apellidos-número de identificación)	**STEFANNY CECILIA SILVERA VASQUEZ** **CC. 1048321272**		
Periodo del informe:	Informe comprendido al pago final mes de diciembre de 2025	Informe número:	11
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.		
Valor del contrato	SON: SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L ($63.800.000)		
Supervisor	RAFAEL LAFONT DE SALES C.C: 8.662.605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

INFORME DE ACTIVIDADES

Coordinación posterior a las visitas de la socialización y entrega de vías terminadas en el Barrio Los pinos, las cuales corresponden al Programa Barrios a la Obra. Durante la socialización se dialoga con la comunidad.









Coordinación posterior a las visitas posterior a la socialización y entrega de vías terminadas en el Barrio La Esmeralda, las cuales corresponden al Programa Barrios a la Obra.









Coordinación posterior a las visitas de socialización y entrega de vías terminadas en el Barrio Ciudadela 20 de Julio, las cuales corresponden al Programa Barrios a la Obra. Durante la socialización se dialoga con la comunidad.









Coordinación posterior a las visitas de socialización y entrega de vías terminadas en el Barrio Las Nieves, las cuales corresponden al Programa Barrios a la Obra. Durante la socialización se dialoga con la comunidad y se toman los registros fotográficos.










Se realiza visita posterior a la socialización a los beneficiarios de viviendas remodeladas por intermedio del Programa de Mejoramientos de Vivienda Saludable. En estas visitas se observa el estado de las viviendas y se comparan con las visitas realizadas anteriormente. Las viviendas beneficiadas, se encuentran ubicadas en las siguientes direcciones y se toman registros fotográficos:

#	Postulante	Barrio	Dirección
1	Juana Dianora Contreras Barrios	La Playa	C 17 10 25

REGISTRO FOTOGRÁFICO

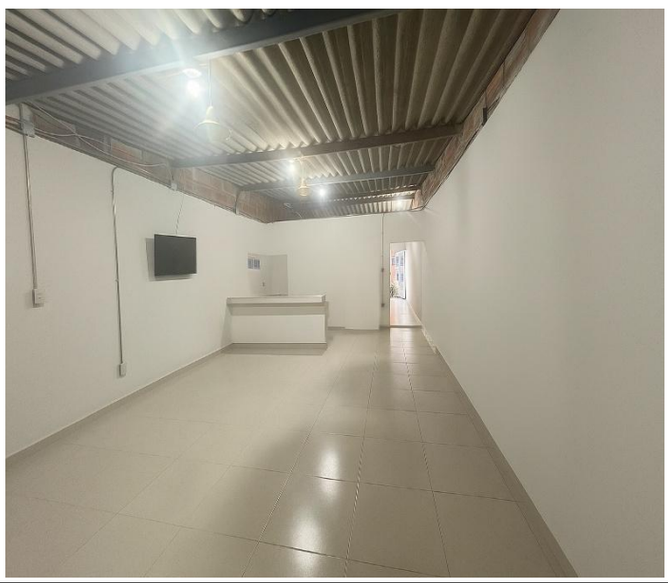


SALA-: Demolición de piso pulido, plantilla de nivelación para piso, enchape para piso y zócalos, estuco y pintura, instalaciones eléctricas, sistema puesta a tierra.



HALL: Demolición de piso pulido, plantilla de nivelación para piso, enchape para piso y zócalos, estuco y pintura, instalaciones eléctricas en tubería EMT.



COCINA: Demolición de piso existente en cerámica, Plantilla de nivelación, enchape de piso, pañete y enchape muros salpicadero, estuco sobre muros y pintura. Construcción de mesón en concreto con enchape incluye lavaplatos y accesorios, Instalaciones eléctricas en tubería EMT, tomacorriente doble GFCI.

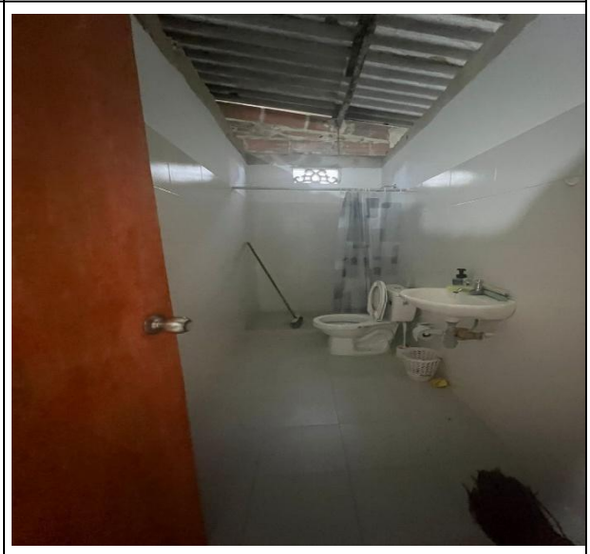

BAÑO: Demolición de pisos, Plantilla de nivelación, pañete de muros, enchape de piso y muros, estuco sobre muros y pintura. Instalaciones eléctricas en tubería EMT, tomacorriente doble GFCI.

#	Postulante	Barrio	Dirección
2	María Eugenia Pájaro Gonzales	La Playa	K 17A 18 19

REGISTRO FOTOGRÁFICO



SALA: Demolición de plantilla existente, plantilla de nivelación, resane de muros a 1 mt de altura, enchape de piso, estuco y pintura, instalaciones eléctricas, sistema polo a tierra.



COCINA: Instalación de tubería hidrosanitaria, Demolición de piso en baldosa cemento y plantilla, plantilla de nivelación, enchape de piso, estuco, pintura, enchape de muro salpicadero, mesón en concreto, suministro de lavaplatos y accesorios, instalaciones eléctricas, toma doble GFCI.




BAÑO: Levantes de muros, Cubierta en laminas Demolición de piso y enchape muros, plantilla, enchape de piso, enchape de muro, pañete, instalación de ducha, desmonte de sanitario, instalación de combo sanitario, estuco, pintura, puerta en madera, instalaciones eléctricas, toma doble GFCI y espejo.



ALCOBA 1: Pañete de muros, instalaciones eléctricas en tubería EMT, puerta en madera.

#	Postulante	Barrio	Dirección
3	Karen Edanis Vásquez Prent	La Playa	K 17A 18 12

REGISTRO FOTOGRÁFICO

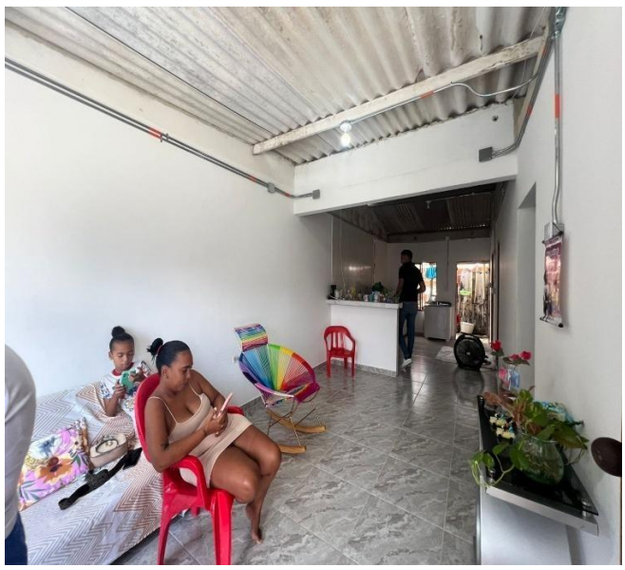

SALA: Demolición de piso en cemento pulido existente, plantilla de nivelación, enchape de piso, estuco y pintura, instalaciones eléctricas, sistema puesta a tierra.






COCINA: Demolición de plantilla, plantilla de nivelación, enchape de piso, estuco, pintura, enchape de muro salpicadero, mesón en concreto, enchape de mesón existente, suministro de lavaplatos y accesorios, instalaciones eléctricas, toma doble GFCI.



BAÑO: Demolición de piso y enchape muros, plantilla, enchape de piso, enchape de muro, pañete, instalación de ducha, desmonte de sanitario, instalación de combo sanitario, estuco, pintura, puerta en madera, instalaciones eléctricas, toma doble GFCI y espejo.

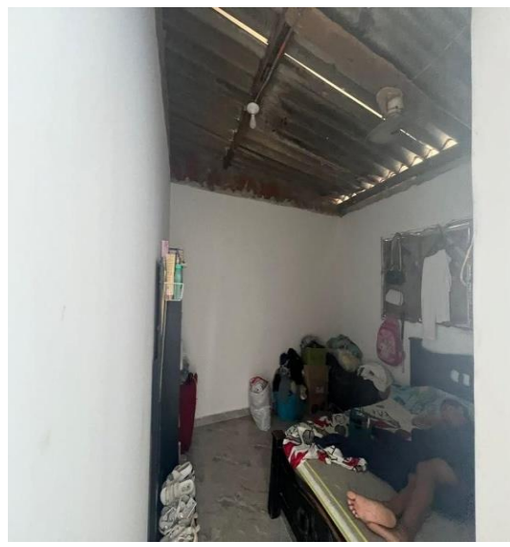

ALCOBA 2: Demolición de piso cemento pulido, plantilla de nivelación, instalaciones eléctricas en tubería EMT.

#	Postulante	Barrio	Dirección
4	María Concepción Mestra de Berona	La Playa	C 51B 2 66

REGISTRO FOTOGRÁFICO





SALA: Demolición de piso en cemento pulido existente, plantilla de nivelación, enchape de piso, estuco y pintura, instalaciones eléctricas, sistema puesta a tierra.

COCINA: Demolición de plantilla, plantilla de nivelación, enchape de piso, estuco, pintura, enchape de muro salpicadero, mesón en concreto, enchape de mesón existente, suministro de lavaplatos y accesorios, instalaciones eléctricas, toma doble GFCI.






BAÑO: Demolición de piso en cerámica, plantilla de nivelación, enchape de piso, enchape de muro, instalación de ducha, desmonte de sanitario, instalación de combo sanitario, estuco, pintura, puerta en madera, instalaciones eléctricas, toma doble GFCI y espejo.

HALL: enchape de piso, estuco y pintura, instalaciones eléctricas en tubería EMT.

ALCOBA 2: enchape de piso, estuco y pintura, instalaciones eléctricas en tubería EMT.

#	Postulante	Barrio	Dirección
5	Angela María Carbono Vanegas	La Playa	K 17A 17 65

REGISTRO FOTOGRÁFICO

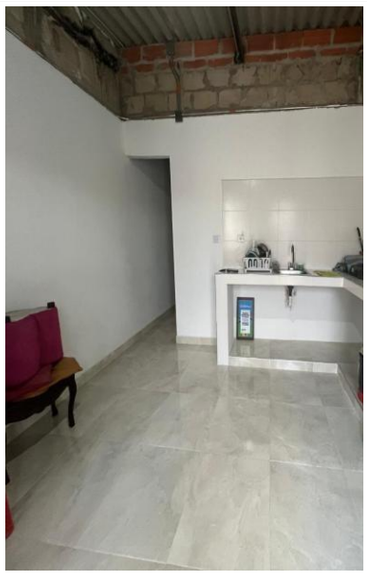



SALA Y HALL: Demolición de piso existente, plantilla de nivelación, enchape de piso, estuco y pintura, instalaciones eléctricas, sistema puesta a tierra.



COCINA: Demolición de piso, plantilla de nivelación, enchape de piso, estuco, pintura, enchape de muro salpicadero, enchape de mesón existente, suministro de lavaplatos y accesorios, instalaciones eléctricas, toma doble GFCI.




BAÑO: Demolición de piso y enchape muros, plantilla, enchape de piso, enchape de muro, pañete, instalación de ducha, desmonte de sanitario, instalación de combo sanitario, instalación de barra de seguridad, estuco, pintura, puerta en madera, instalaciones eléctricas, toma doble GFCI y espejo.



ALCOBA 1: plantilla de nivelación, levante de muro divisorio sala y alcoba 1, pañete sobre muros, enchape de piso, estuco y pintura, instalaciones eléctricas en tubería EMT.

#	Postulante	Barrio	Dirección
6	Kelly Johana Avila Prenth	La Playa	calle 19A 17B 45

REGISTRO FOTOGRÁFICO

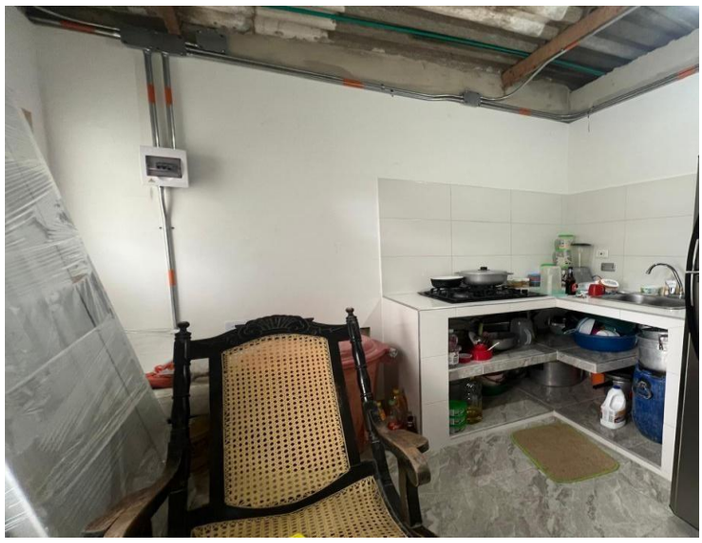




SALA Y COCINA: Demolición de piso en cerámica, Plantilla de nivelación, enchape de piso y zócalos, estuco y pintura, instalaciones eléctricas en tubería EMT, enchape de muro salpicadero, construcción y enchape de mesón existente, instalaciones hidrosanitarias, suministro de lavaplatos sistema puesta a tierra, Puerta principal.



ALCOBA 1: Demolición de piso en cemento, plantilla de nivelación, enchape de piso y zócalos, estuco y pintura, instalaciones eléctricas.



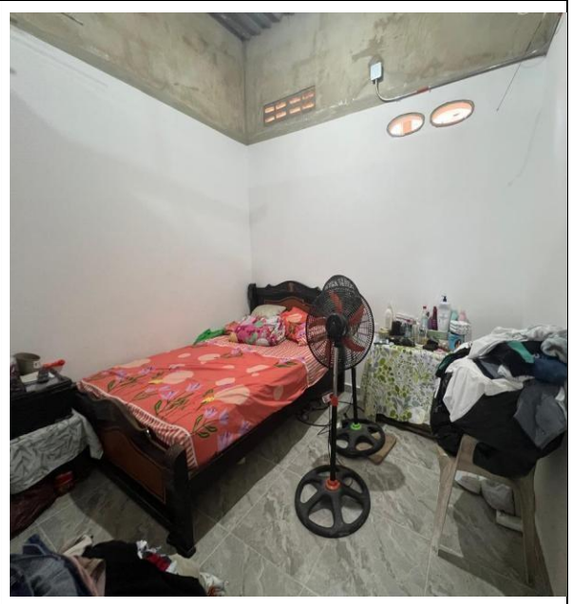


BAÑO: Pañete sobre muros, enchape de pisos y muros, estuco, pintura, puerta en madera, espejo, instalaciones eléctricas, toma doble GFCI y espejo.

ALCOBA 2: Demolición de piso en cemento, plantilla de nivelación, enchape de piso y zócalos, estuco y pintura, instalaciones eléctricas, puerta.
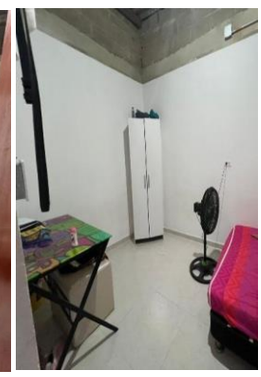
<table>
<tr><th>#</th><th>Postulante</th><th>Barrio</th><th>Dirección</th></tr>
<tr><td>7</td><td>Maida Esther Ávila Jiménez</td><td>La Playa</td><td>C 19A 17B 49</td></tr>
<tr><td colspan="4">REGISTRO FOTOGRÁFICO</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">SALA:Y HALL Demolición de piso y plantilla, plantilla de nivelación, enchape de piso, estuco, instalaciones eléctricas, sistema puesta a tierra.</td><td colspan="2">COCINA: Demolición de piso, plantilla de nivelación, enchape de piso, estuco, pintura, enchape de muro salpicadero, demolición de estructura mesón, mesón nuevo, suministro de lavaplatos, instalaciones eléctricas, toma doble GFCI.</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td colspan="2">BAÑO: Demolición de piso y enchape muros, plantilla de nivelación, enchape de piso, enchape de muro, pañete, instalación de ducha, combo sanitario, estuco, pintura, puerta, instalaciones eléctricas, toma doble GFCI y espejo.</td><td colspan="2">ALCOBA 1: Demolición de piso, plantilla de nivelación, pañete parcial, enchape de piso, estuco, instalaciones eléctricas con tubería EMT, Puerta madera.
ALCOBA 2: enchape de piso, estuco y pintura, instalaciones eléctricas en tubería EMT.</td></tr>
</table>

Atentamente,



STEFANNY CECILIA SILVERA VASQUEZ
C.C No. 1048321272
