urba caribe 24

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

ACTA DE ENTREGA

ENTIDAD CONTRATANTE	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
INTERVENTORÍA:	EDUBAR S.A
CONTRATISTA:	CONSORCIO URBACARIBE 24
No. DE CONTRATO DE OBRA:	LP-001-2024 LOTE 1
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
FECHA DEL ACTA:	23/09/2025

TRAMO 4: MALECÓN DEL REBOLO

Se hace entrega formal del tramo desde la VIGA 276 a la VIG 348 del tramo 4 del MALECÓN DEL SURORIENTE, el cual se encuentra ubicado entre las calles 14 y 17, el área intervenida total corresponde zonas con pisos estampados, mobiliario, un (1) asoleadero, barandas metálicas en la zona perimetral, baranda para rampas de acceso, jardineras, andenes, una(1) zona de juegos infantiles con acabo en piso en Caucho (TPV 1CM+SBR 1CM) de 2CM de espesor con siete (7) juegos, una (1) zona de gym biosaludable con acabado en pintura tipo sport line, que cuenta con cinco (5) maquinas, una (1) cancha de futbol tenis, una (1) pista de trote.

TRAMO 4	
LOCALIZACIÓN	**DESCRIPCIÓN**
CANCHA SINTETICA FUTBOL TENIS	Cancha de futbol- tenis, cuenta con acabado de grama sintética hibrida mono-fibrilada de 50 mm de espesor con relleno en cascarilla de coco caucho y arena de cuarzo, y base elástica de 10mm para amortiguación de bajo del césped artificial, una (1) malla de nylon con tubería de 2" y 2.
ASOLEADEROS	Un (1) Asoleadero en estructura metálica galvanizada ubicado en piso en césped artificial recreativo y decorativo–20-25mm con arena de cuarzo como relleno estabilizador.
PISTA DE TROTE	Pista de trote en concreto hidráulico, con demarcaciones en pintura.
ZONA DE JUEGOS INFANTILES	Se realizó instalación de pisos en Caucho (TPV 1CM+SBR 1CM) de 2CM de espesor, dos (2) juego panal laberinto, un (1) juego columpio múltiple, un (1) juego columpio múltiple, un (1) juego parque playa, un (1) juego parque castillo, un (1) sobe y baja inclusivo para silla de ruedas,
ZONA DE GYM BIOSALUDABLE	Placa de concreto con acabado tipo sport line, máquinas bio-saludables: dos (2) sistema calistenia capacidad para 5 personas, dos (2) sistema calistenia capacidad para 10 personas, una (1) calistenia capacidad 13 personas.
MOBILIARIO URBANO	Se realizó la instalación de tres (3) bancas corridas con espaldar, seis (6) bancas corridas sin espaldar, veinte (20) materas de fibra vidrio tipo madera, tres (3) juegos de salas urbanas, treinta y cuatro (34) materas hexagonales, veinticuatro (24) cubos, cuarenta y ocho (48) bancas hexagonales, cuatro (4) materas altas, tres (3) tótems de señalización.
ANDENES Y JARDINERAS	Andenes perimetrales con loseta guía y loseta alerta según sea el caso, para cambios de nivel, accesos a rampas y escaleras, jardineras en bloque abujardado con remate en alfajía y pañete impermeabilizado.

Scanned with CamScanner

urba caribe 24

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

EDUBAR

ACTA DE ENTREGA

CALADOS	Muro en bloque calado de 20*20 para cierre de ventanas de respiración del canal
PISOS ESTAMPADOS	Construcción de placa en concreto de 3000 psi, para pisos estampados de color no adherida, de 10 cm de espesor, reforzada con fibras macrosinteteticas, reforzadas con malla en paños irregulares, incluye suministro e instalación de plástico de 6 mm para separación.
RAMPAS Y ESCALERAS	Construcción de rampa y escaleras en concreto de acceso a parque con altura entre 0 y 3 metros y ancho libre de 1,50 m, incluye muros, placa superior y base, tipo box coulvert.
BARANDAS	Baranda en tubería galvanizada cal 14 de 2" para rodamanos, 5 refuerzos intermedios en tubería de 1", galvanizada cal.14, con apoyos en flanche de 15 cm. *25*3/8, altura 1,2 ml. Todas las piezas galvanizadas más acabado en pintura color plateado tipo buque, según diseño suministrado.
MURAL ARTISTICO	Realización de pintura mural, con imágenes pertinentes al contexto local diseños originales, elaborados con vinilo Koraza para exterior. Aplicación de sellomax, para garantizar mejor adherencia de la pintura.

En el Distrito de Barranquilla, a los (23) días del mes de Septiembre del año 2025, en el sitio de las obras, se reunieron **CARMEN IVANA RIVEIRA BARROS** quien actúa en nombre y representación de **CONSORCIO URBACARIBE 24**, en calidad de Directora de obras, con el fin de hacer entrega de las obras totalmente ejecutadas del tramo 4 desde la VIGA 276 a la VIG 348 del proyecto; y **LUIS FERNANDO GAIBAO**, asesor de despacho de la Secretaría Distrital de Obras Públicas, quien actúa en calidad de Supervisor, **DIEGO RADA** en calidad de director de interventoría quien actúa en nombre y representación de **LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. - EDUBAR S.A**, en calidad de Interventor, **CATALINA MONTOYA** quién actúa en calidad de Jefe de la Oficia de la **AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA (ADI),** con el fin de recibir a las obras totalmente ejecutadas del **TRAMO 4 DESDE VIGA 276 a la VIG 348** del presente proyecto.

ARQ. CARMEN RIVEIRA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO URBACARIBE 24

ING. DIEGO RADA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
EDUBAR

LUIS FERNANDO GAIBAO
ASESOR DE DESPACHO
ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

CATALINA MONTOYA
JEFA DE OFICINA
AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

Scanned with CamScanner

urba caribe 24


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA


NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1


EDUBAR


ACTA DE ENTREGA

REGISTRO FOTOGRAFICO

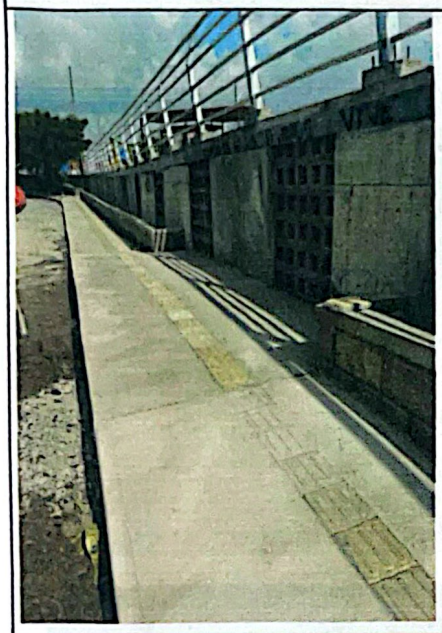

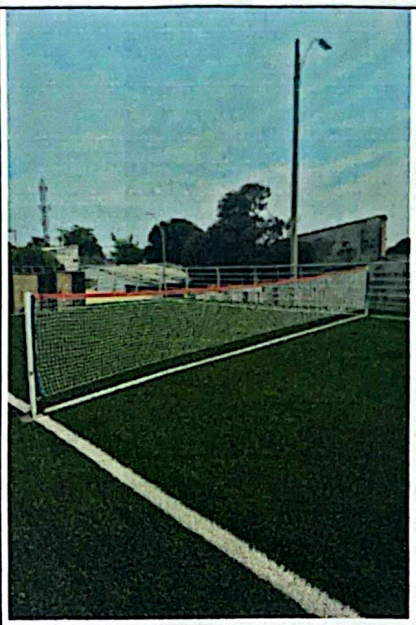

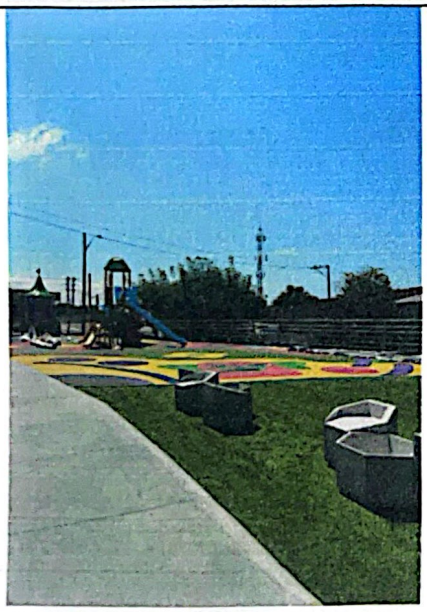

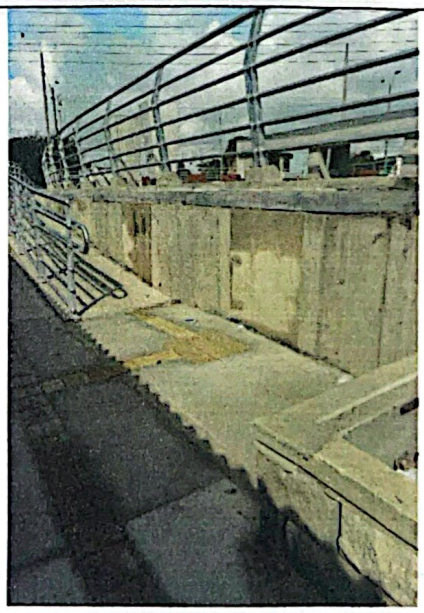

Scanned with CamScanner


urba caribe 24

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1


EDUBAR

ACTA DE ENTREGA

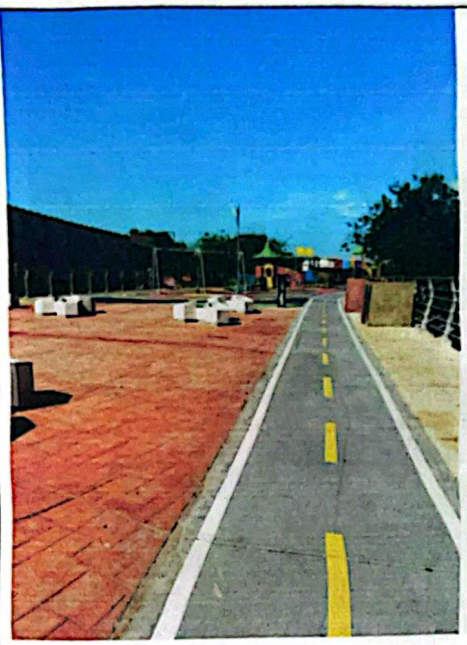





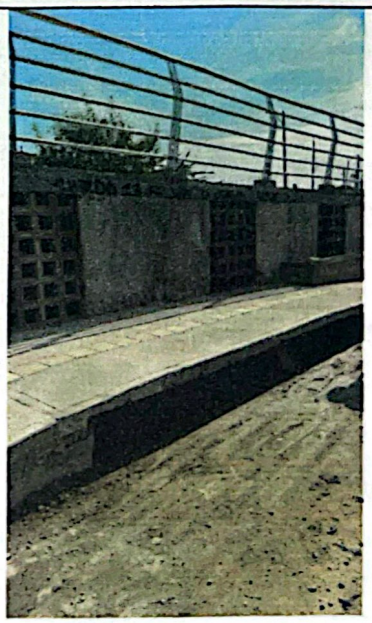

Scanned with CamScanner

urba caribe 24


ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**


NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

EDUBAR


EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

ACTA DE ENTREGA

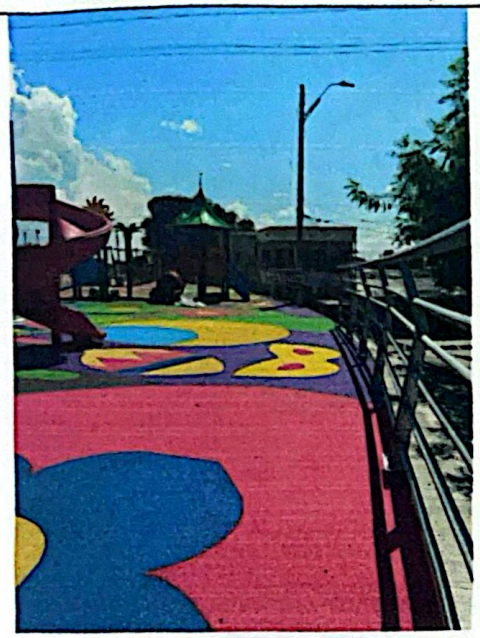

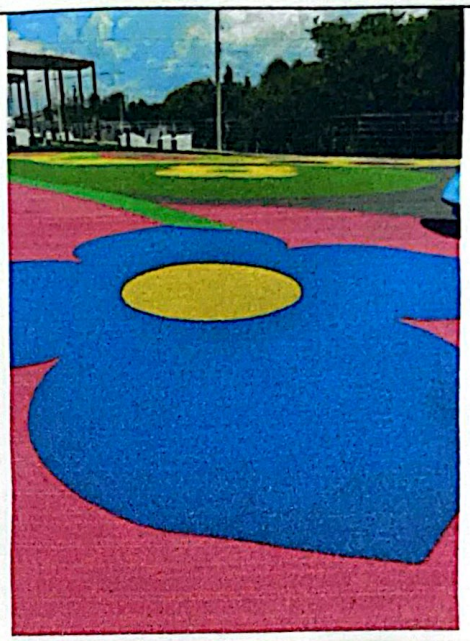



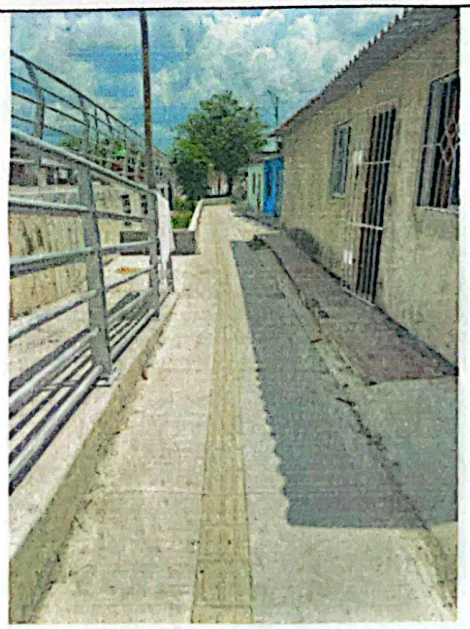

Scanned with CamScanner

urba caribe 24


ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

EDUBAR

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

ACTA DE ENTREGA

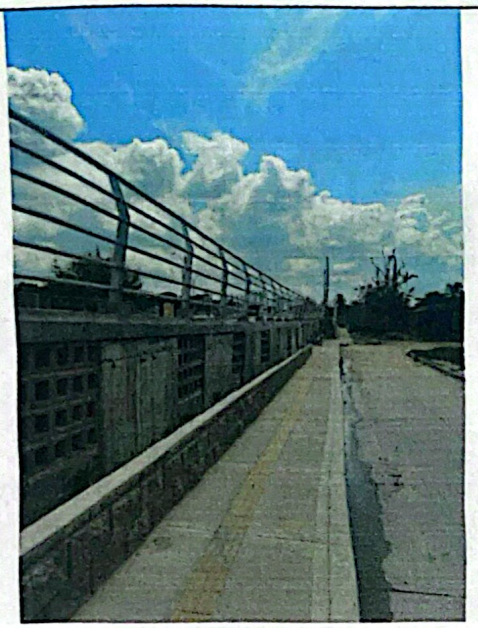







Scanned with CamScanner

urba caribe 24

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA


NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

EDUBAR

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

ACTA DE ENTREGA



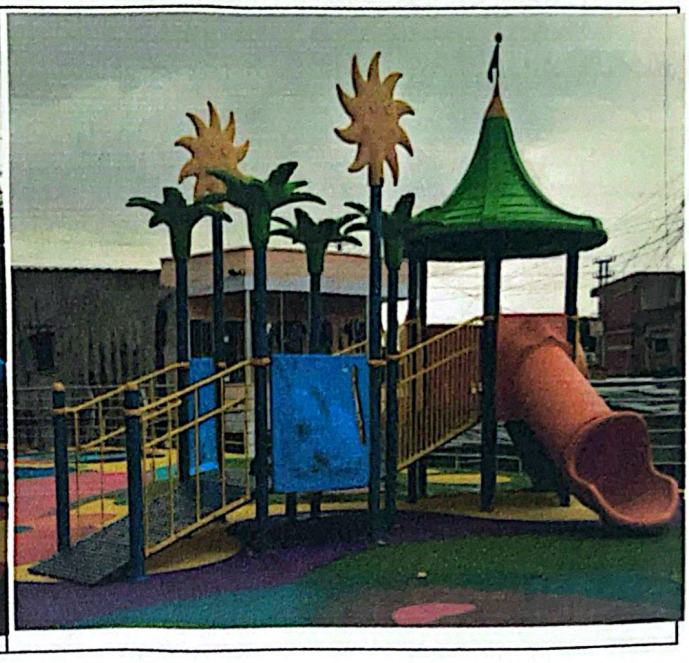

Scanned with CamScanner
