Contrato No:	942	De:	2025

ACTA DE: FINAL: x PARCIAL: ____ Fecha: 12 | 11 | 2025

NATURALEZA DEL CONTRATO: COMPRAVENTA

OBJETO: ADQUISICION E INSTALACION DE FIBRA OPTICA, EQUIPOS Y ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (CCTV) DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA LA FUERZA DEL PROGRESO 2024-2027"

En las instalaciones del Almacén Municipal se reunieron, LUZ CENELIA VEGA ALARCON , identificado con cédula de ciudadanía N° 46.368.410 expedida en SOGAMOSO Técnico Administrativo, Código 367 Grado02 nombrado mediante decreto 6 de ene-07 de 2020 y el CONTRATISTA CONECTAR JDP S.A.S , NIT 901289964-4 , R/L. DIEGO FERNANDO GAITAN AVELLA identificado (a) con cédula de ciudadanía 1.116.553.521 expedida en AGUAZUL con el fin de RECIBIR por parte del almacenista los elementos relacionados a continuación:

ITEM	CANT.	UND	NOMBRE	DESCRIPCIÓN- PAPELERIA	VALOR UNIT. IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	140	UND	Suministro e instalacion de fibra optica de 24 hilos	Suministro e instalacion de fibra optica de 24 hilos monomodo aerea tipo exterior ADS SPAN 100 Cubierta exterior: HDPE (polietiledo de alta densidad) maxima tension: 1800N temperatura de operación: -20°C ~+65°C proteccion contra rayos UV y humedad Diametro nominal: 10.1 +0.5 mm peso nominal MARCA Y REFERENCIA FIBERHOME	$ 36.928,08	$ 5.169.931,00
2	4		Suminisitro e instalacion y de punto de derivacion para fibra optica	Suminisitro e instalacion y de punto de derivacion para fibra optica, tipo mufla, para 24 hilos, material de plastico rigido resistente a los rayos UV, humedad y golpes, 4 puertos de entrada/salida (20mm) y oval para sangria, con un sistema organizador interno para el manejo y acomodo de las fibras opticas, incluye servicio de conectorizacion y empalmes de fibra optica en puntos de derivacion , incluye fusiones de fibra y certificacion de la fibra en sitio	$ 1.012.690,00	$ 4.050.760,00
3	4		Suministro de toma aerea plastica 20amp 125v amarillo - 520-CV	Suministro de toma aerea plastica 20amp 125v amarillo - 520-CV. MARCA- REFERENCIA: Leviton	$ 25.585,00	$ 102.340,00
4	4		Clavija (515PV-000) -15 amps 125v PVC	Clavija (515PV-000) -15 amps 125v PVC, Marca-refrencia: Leviton	$ 25.585,00	$ 102.340,00
5	1		Suministro de baterias estacionaria de uso solar AGM 150AH	Suministro de baterias estacionaria de uso solar AGM 150AH ciclo profundo, Marca- Referencia: Greenpoint, Serial: 037202504301215008 2	$ 2.322.880,00	$ 2.322.880,00
6	250		Cable concentrico antifraude	Cable concentrico antifraude monofasico 1 x6 +6 awg aluminio	$ 12.495,00	$ 3.123.750,00
7	6		Tensores monofasicos	Tensores monofasicos	$ 10.400,67	$ 62.404,00
8	6		conectores bimetalicos	conectores bimetalicos	$ 12.257,00	$ 73.542,00
9	2		Switch 8 puertos	* Switch 8 puertos gigabit, incluye 4 puertos SFP, Tamaño de RAM: 128 MB CANT: 2 und Tamaño de almacenamiento: 16 MB.	$ 1.762.390,00	$ 3.524.780,00

10	1		Switch administrable 24 puertos	Switch administrable 24 puertos 10/100/1000BASE-T y 4 puertos SFP+, con soporte POE+ para alimentar dispositivos. Con una velocidad de reenvio de 96mpps y capacidad de conmutacion de 128 gbits, layer 3,	$ 5.961.900,00	$ 5.961.900,00
11	4		Switch 5 puertos RJ45	Switch 5 puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps, 4 puertos soportan poe (power over ethernet). El interruptor detecta automaticamente y suministra energia a los dispositivos IEEE802.3af, camaras IP, MARCA O REFERENCIA:TP-LINK TL-SG1005P SERIAL: 2256885011989 2256885011956 2256885011996 2256885011958	$ 371.280,00	$ 1.485.120,00
12	5		Fuente de poder 24v ac 5a	Fuente de poder 24v ac 5a para cctv camaras IP PTZ MARCA : AC ADAPTADOR WG66-24V5000	$ 151.130,00	$ 755.650,00
13	4		Inyector POE pasivo 24VDC, 12W,	Inyector POE pasivo 24VDC, 12W, fast ethernet MARCA - REFERENCIA ;UBIQUITI	$ 119.000,00	$ 476.000,00
14	4		Inyector POE on IEEE 802.3af 48V	Inyector POE cumplimiento con IEEE 802.3af 48V MARCA - REFERENCIA: UBIQUITI	$ 211.225,00	$ 844.900,00
15	4		Radio enlace PTP Gen2, PBE-5AC	Radio enlace PTP Gen2, PBE-5AC - Gen 2 de largo alcance ancho de canal seleccionable PtP: 10/20/30/40/50/60/80MHz PtMP: 10/20/30/40 MHz, rendimiento de hasta 450+ mbps MARCA - REFERENCIA: UBIQUITI, SERIAL : E43883A0E851 E43883A0EA74 E43883A0E859 E43883A0F73B	$ 1.499.757,00	$ 5.999.028,00
					Total	$ 34.055.325,00

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

Con la firma de la presente acta, el Almacén Municipal de Aguazul y (el/la) supervisor (a) manifiesta que el contratista, cumplió con la calidad y obligaciones adquiridas en cuanto al (suministro/bien/CTO 942-2025). Así mismo declarándose las partes a PAZ Y SALVO.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron:

QUIEN RECIBE

LUZ CENELIA VEGA ALARCON
Técnico Administrativo Código 367, Grado 02
Almacenista Municipal

DIEGO JAVIER NIÑO FONSECA
Código 472 Grado 03
Ayudante Almacen

SONIA CONSTANZA LOZANO VARGAS
Secretaria de Despacho -Secretaria de Gobierno
Interventor o Supervisor

QUIEN ENTREGA

CONECTAR JDP S.A.S
DIEGO FERNANDO GAITAN AVELLA
1.116.553.521

KINYER MOLANO
Verificó Especificaciones Técnicas

MUNICIPIO DE AGUAZUL
Nit. 891.855.200-9
ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
AGUAZUL – CASANARE

ECO - ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE COMPRAVENTA
No. 202500152

PROVEEDOR(ES): CONECTAR JDP S.A.S	**NIT/C.C:** 901289964
MOD. SELECCIÓN: 33 - MINIMA CUANTIA	**FECHA ENTRADA:** 2025-11-12
DOC. SOPORTE:	**FECHA DOC:** 2025-11-12
No RP: 202501415	**TEL:** 3224724002
DIR: KR 28 9 18	**Objeto:** CTO DE COMPRAVENTA N° 942 - 2025 OBJETO: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA, EQUIPOS Y ELEMENTOS TÉCNOLOGICOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (CCTV) DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN INTEGRAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA LA FUERZA DEL PROGRESO 2024-2027.

CÓDIGO	NOMBRE	PLACAS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% Iva	TOTAL
010001169810032	Tensores Monofásicos		6	8.740,00	19	62.403,60
010001169810034	Switch 5 Puertos		4	312.000,00	19	1.485.120,00
010001140692	Cable De Fibra Optica		140	31.032,00	19	5.169.931,40
010001169810036	Inyector POE pasivo 24 VDC		4	100.000,00	19	476.000,00
0100011020001	Mufla de Fibra de Óptica		4	851.000,00	19	4.050.760,00
0100011020003	Clavija (515PV-000) - 15 amps 125v PVC		4	21.500,00	19	102.340,00
010001169810035	Fuente de Poder		5	127.000,00	19	755.650,00
0100011020004	Conectores Bimetálicos		6	10.300,00	19	73.542,00
010001169810033	Switch 8 Puertos Gigabit		2	1.481.000,00	19	3.524.780,00
0100011020002	Toma aérea plástica		4	21.500,00	19	102.340,00
010001140751	BATERIAS ESTACIONARIAS DE USO SOLAR AGM 15 AH CICLO PROFUNDO		1	1.952.000,00	19	2.322.880,00
010001169810038	Radio Enlace PTP		4	1.260.300,00	19	5.999.028,00
010001169810031	Cable concéntrico antifraude monofásico		250	10.500,00	19	3.123.750,00
010001169810037	Inyector POE cumplimiento con IEEE 802.3af 48V		4	177.500,00	19	844.900,00

COMPRA TOTAL	23.607.920,00
IVA	4.485.505,00
NETO A PAGAR	28.093.425,00

MUNICIPIO DE AGUAZUL

Nit. 891.855.200-9

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL

AGUAZUL – CASANARE

ECO - ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE COMPRAVENTA

No. 202500152

LUZ CENELIA VEGA ALARCON	CONECTAR JDP S.A.S	SUPERVISOR
ALMACENISTA	PROVEEDOR	

MUNICIPIO DE AGUAZUL
Nit. 891.855.200-9
ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
AGUAZUL – CASANARE

EDO - ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE COMPRAVENTA
No. 202500153

PROVEEDOR(ES): CONECTAR JDP S.A.S	**NIT/C.C:** 901289964
MOD. SELECCIÓN: 33 - MINIMA CUANTIA	**FECHA ENTRADA:** 2025-11-12
DOC. SOPORTE:	**FECHA DOC:** 2025-11-12
No RP: 202501415	**TEL:** 3224724002
DIR: KR 28 9 18	**Objeto:** CTO DE COMPRAVENTA N° 942 - 2025 OBJETO: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA, EQUIPOS Y ELEMENTOS TÉCNOLOGICOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (CCTV) DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN INTEGRAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA LA FUERZA DEL PROGRESO 2024-2027.

CÓDIGO	NOMBRE	PLACAS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% Iva	TOTAL
0302020202020004	Switch administrable 24 puertos		1	5.010.000,00	19	5.961.900,00

COMPRA TOTAL	5.010.000,00
IVA	951.900,00
NETO A PAGAR	5.961.900,00

LUZ CENELIA VEGA ALARCON
ALMACENISTA

Diego Gaitan
CONECTAR JDP S.A.S
PROVEEDOR

SUPERVISOR

MUNICIPIO DE AGUAZUL
Nit. 891855200-9
AGUAZUL – CASANARE
MUNICIPIO DE AGUAZUL

Alcaldía de Aguazul

SCA - SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 202500615

P. EMISOR: BODEGA ALMACEN	**FECHA SALIDA:** 2025-11-12
P. DESTINO: SECRETARIA DE GOBIERNO	**NIT/C.C:** 47432727
	CIUDAD: AGUAZUL

DESCRIPCIÓN	PLACAS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Cable De Fibra Optica		140	$36.928,08	$5.169.931,40
BATERIAS ESTACIONARIAS DE USO SOLAR AGM 15 AH CICLO PROFUNDO		1	$2.322.880,00	$2.322.880,00
Mufla de Fibra de Óptica		4	$1.012.690,00	$4.050.760,00
Toma aérea plástica		4	$25.585,00	$102.340,00
Clavija (515PV-000) - 15 amps 125v PVC		4	$25.585,00	$102.340,00
Cable concéntrico antifraude monofásico		250	$12.495,00	$3.123.750,00
Tensores Monofásicos		6	$10.400,60	$62.403,60
Conectores Bimetálicos		6	$12.257,00	$73.542,00
Switch 8 Puertos Gigabit		2	$1.762.390,00	$3.524.780,00
Switch 5 Puertos		4	$371.280,00	$1.485.120,00
Fuente de Poder		5	$151.130,00	$755.650,00
Inyector POE pasivo 24 VDC		4	$119.000,00	$476.000,00
Inyector POE cumplimiento con IEEE 802.3af 48V		4	$211.225,00	$844.900,00
Radio Enlace PTP		4	$1.499.757,00	$5.999.028,00

Por concepto de: CTO DE COMPRAVENTA N° 942 - 2025 OBJETO: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA, EQUIPOS Y ELEMENTOS TÉCNOLOGICOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (CCTV) DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN INTEGRAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA LA FUERZA DEL PROGRESO 2024-2027.

TOTAL	$28.093.425,00
NETO	$28.093.425,00

MUNICIPIO DE AGUAZUL
Nit. 891855200-9
AGUAZUL – CASANARE
MUNICIPIO DE AGUAZUL

Alcaldía de Aguazul

SCA - SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE COMPRAVENTA
No. 202500615

LUZ CENELIA VEGA ALARCON
TECNICO ADMINISTRATIVO
ALMACENISTA MUNICIPAL

SONIA CONSTANZA LOZANO VARGAS
SUPERVISOR

QUIÉN RECIBIO
C.C.

MUNICIPIO DE AGUAZUL
Nit. 891855200-9
AGUAZUL – CASANARE
MUNICIPIO DE AGUAZUL

Alcaldía de Aguazul

SDS - SALIDA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 202500621

P. EMISOR: BODEGA ALMACEN		**FECHA SALIDA:** 2025-11-12		
P. DESTINO: SECRETARIA DE GOBIERNO		**NIT/C.C:** 47432727		
		CIUDAD: AGUAZUL		
DESCRIPCIÓN	**PLACAS**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
Switch administrable 24 puertos		1	$5.862.535,00	$5.961.900,00
Por concepto de: CTO DE COMPRAVENTA N° 942 - 2025 OBJETO: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA, EQUIPOS Y ELEMENTOS TÉCNOLOGICOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (CCTV) DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN INTEGRAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA LA FUERZA DEL PROGRESO 2024-2027.				

TOTAL	$5.961.900,00
NETO	$5.961.900,00

LUZ CENELIA VEGA ALARCON
TECNICO ADMINISTRATIVO
ALMACENISTA MUNICIPAL

SONIA CONSTANZA LOZANO VARGAS
SUPERVISOR

QUIÉN RECIBIO
C.C.

CONECTAR JDP S.A.S ZOMAC
NIT 901.289.964-4
CR 17 13 - 26 BRR VILLA DEL RIO
Tel: (57) 3204760427
Aguazul - Colombia
conectarjdp@gmail.com

No. JDP 10631

Señores	MUNICIPIO DE AGUAZUL		
NIT	891.855.200-9	**Teléfono**	(057) 3124560780
Dirección	CL 11 11 35	**Ciudad**	Aguazul - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2025-12-05	2025-12-30

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	Suministro en instalación de fibra óptica de 24 hilos monomodo aérea tipo exterior ADS SPAN 100 Cubierta Exterior: HDPE (Polietileno de Alta Densidad) Máxima tensión: 1800 N Temperatura de operación: -20°C +65°C Protección contra rayos UVy humedad Diámetro nominal: 10.1 ± 0.5 mm Peso nominal (kg/km): 78 ± 15 kg Forro Negro	140.00		31,032.00	825,451.20	4,344,480.00
2	Suministro e instalación y de de Punto de Derivación para fibra óptica, tipo mufla, para 24 hilos, material de plástico rigido resistente a los rayos UV, humedad y golpes, 4 puertos de entrada/salida (20 mm) y oval para sangría, con un sistema organizador interno para el manejo y acomodo de las fibras ópticas, incluye Serviclo de conectorización y empalmes de fibra óptica en puntos de derivación, incluye fusiones de fibra y certificación de la fibra en sitio	4.00		851,000.00	646,760.00	3,404,000.00
3	Suministro de Toma Aérea Plástica 20Amp 125V Amarillo -520 -CV	4.00		21,500.00	16,340.00	86,000.00
4	(515PV -000) Clavija 15Amps 125V PVC	4.00		21,500.00	16,340.00	86,000.00
5	Suministro de baterías estacionaria de uso	1.00		1,952,000.00	370,880.00	1,952,000.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
	solar AGM 150 AH ciclo profundo					
6	Cable Concentrico Antifraude Monofasico 1 X6 +6 Awg Aluminiol	250.00		10,500.00	498,750.00	2,625,000.00
7	Tensores Monofásicos	6.00		8,740.00	9,963.60	52,440.00
8	CONECTORES BIMETÁLICOS	6.00		10,300.00	11,742.00	61,800.00
9	switch 8 puertos gigabit, incluye 4 puertos SFP, Tamaño de RAM: 128 MB Tamaño de almacenamlento: 16 MB	2.00		1,481,000.00	562,780.00	2,962,000.00
10	Switch administrable 24 puertos 10/100/1000BASE -T y 4 puertos SFP+, con soporte PoE+ para alimentar dispositivos. Con una velocidad de reenvio de 96 Mpps y capacidad de conmutación de 128 Gbit/s, Layer 3	1.00		5,010,000.00	951,900.00	5,010,000.00
11	Switch 5 puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps, 4 puertos soportan PoE (Power over Ethernet). El interruptor detecta automáticamente y suministra energla a los dispositivos IEEE 802.3af, cámaras IP	4.00		312,000.00	237,120.00	1,248,000.00
12	fuente de poder 24v ac 5a para cctv cámaras IP PTZ	5.00		127,000.00	120,650.00	635,000.00
13	Invector POE pasivo 24 VDC, 12W, Fast ethernet	4.00		100,000.00	76,000.00	400,000.00
14	Inyector POE cumplimiento con IEEE 802.3af 48V	4.00		177,500.00	134,900.00	710,000.00
15	Revisión y diagnostico transferencia	1.00		1,185,000.00	225,150.00	1,185,000.00
16	Radio enlace PtP Gen2, PBE-5AC□Gen2 de largo alcance Ancho de canal seleccionable PtP: 10/20/30/40/50/60/80 MHz PtMP: 10/20/30/40 MHz, Rendimlento de hasta 450+ Mbps, Frequency 5 Ghz, Memory 64 MB, procesador MIPS 74Kc, antena 25 dBi	4.00		1,260,300.00	957,828.00	5,041,200.00

Total items: 16

Total Bruto	29,802,920.00
IVA 19%	5,662,554.80
Total a Pagar	35,465,474.80

Valor en Letras:

Treinta y cinco millones cuatrocientos sesenta y cinco mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos m/cte con ochenta cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Consignación bancaria - Pago a crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-12-30 por	$	35,465,474.80

Observaciones:

Punto de pago: Carrera 17 # 13 - 26
Barrio Centro
Medio de pago: Consignar en Bancolombia cuenta ahorros No. 36500000200

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

CONTRATO DE SUMINISTRO MINIMA CUANTIA No 942

OBJECTO: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA, EQUIPOS Y ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (CCTV) DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA LA FUERZA DEL PROGRESO 2024-2027.

CONTRATISTA

CONECTAR JDP S.A.S.

SUPERVISOR
SECRETARIA GOBIERNO MUNICIPAL

INFORME FINAL
2025

INTRODUCCION

El municipio de Aguazul, firmo contrato de mínima cuantía No 0942-2025 del 23 de octubre de 2025 con la empresa CONECTAR JDP S.A.S. cuyo objeto es **"*ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA, EQUIPOS Y ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (CCTV) DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA LA FUERZA DEL PROGRESO 2024-2027.*"

Una vez firmada acta de inicio de fecha 07 de noviembre de 2025 del contrato en mención con plazo de ejecución de (10) días, a continuación, se presenta informe final de actividades realizadas.

El presente documento corresponde al informe de recibo final el cual contiene la información detallada de las actividades ejecutadas en el contrato, el cual se encuentra terminado al 100% de acuerdo con las especificaciones técnicas y demás documentos del objeto contractual.

1. **INFORME ADMINISTRATIVO**

CONTRATO DE SUMINISTRO DE MINIMA CUANTIA No	0942 del 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
CONTRATISTA	CONECTAR JDP S.A.S.
NIT No.	901289964-4
REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO FERNANDO GAITAN AVELLA
OBJETO	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA, EQUIPOS Y ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (CCTV) DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA LA FUERZA DEL PROGRESO 2024-2027.
VALOR	TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 35.465.475).
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) DIAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA ACTA DE INICIACIÓN	07 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA TERMINACION ACTUAL	16 DE NOVIEMBRE DE 2025

1.1 Control De Pólizas

Las pólizas de que ampara el Contrato de suministro de mínima cuantía No. 0942 del 28 de octubre de 2025 son:

Condiciones iniciales:

- **Póliza expedida por: aseguradora solidaria No 57-44-101008301**
- **Póliza expedida por: aseguradora solidaria No 57-40-101003815**

Pólizas aprobadas por oficina asesora jurídica el día 27 de octubre de 2025 con las siguientes garantías:

PÓLIZA	DESCRIPCION DE AMAPAROS	%	VIGENCIA		
			DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
57-44-101008301	Cumplimiento del contrato	10	23/10/2025	10/05/2026	3.546.547,5
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10	23/10/2025	10/11/2026	3.546.547,5
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	23/10/2025	10/11/2028	1.773273,75
57-40-101003815	Pedidos, labores y operaciones	10	23/10/2025	10/11/2025	284.700.000,00
	Contratistas y subcontratistas	10	23/10/2025	10/11/2025	284.700.000,00
	Vehículos propios y no propios	10	23/10/2025	10/11/2025	284.700.000,00

Las pólizas que conforman la garantía única suscrita por CONECTAR JDP S.A.S. representada legalmente por DIEGO FERNANDO GAITAN AVELLA, para el desarrollo del contrato de se encuentra vigente y aprobada por la oficina jurídica, **ver anexo 1**

1.2 Estampillas

Se realiza pago estampillas del contrato y se generan los comprobantes de ingreso por parte del municipio de acuerdo a la siguiente tabla

TRIBUTO	TARIFA	VALOR ESTAMPILLA	COMPROBANTE DE INGRESO
CULTURA	1%	$ 298.029	CIT2025015059
PRO DEPORTE	2,5%	$ 745.073	CIT2025015060
ADULTO MAYOR	4,3%	$ 1.281.526	CIT2025015058
TOTAL		$ 2.324.628	

2. **Inventario equipos almacén municipal**

Se emite documento de ingreso y salida por parte de almacén municipal respecto al contrato **de suministro mínima cuantía 0942 cuyo objeto es: *ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA, EQUIPOS Y ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (CCTV) DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA LA FUERZA DEL***

ÍTEM	DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	V/PROMEDIO UNIDAD ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DEL IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	Suministro en instalación de fibra óptica de 24 hilos monomodo aérea tipo exterior ADS SPAN 100 Cubierta Exterior: HDPE (Polietileno de Alta Densidad) Máxima tensión: 1800 N Temperatura de operación: -20ºC ~ +65ºC Protección contra rayos UV y humedad Diámetro nominal: 10.1 ± 0.5 mm Peso nominal (kg/km): 78 ± 15 kg Forro Negro.	M	140	$ 31.032	$ 4.344.480	$ 825.451	$ 5.169.931
2	Suministro e instalación y de Punto de Derivación para fibra óptica, tipo mufla, para 24 hilos, material de plástico rígido resistente a los rayos UV, humedad y golpes, 4 puertos de entrada/salida (20 mm) y oval para sangría, con un sistema organizador interno para el manejo y acomodo de las fibras ópticas, incluye Servicio de conectorización y empalmes de fibra óptica en puntos de derivación, incluye, incluye fusiones de fibra y certificación de la fibra en sitio.	Und	4	$ 851.000	$ 3.404.000	$ 646.760	$ 4.050.760
3	Suministro de Toma Aérea Plástica 20Amp 125V Amarillo - 520-CV.	Und	4	$ 21.500	$ 86.000	$ 16.340	$ 102.340
4	Clavija (515PV-000) - 15Amps 125V PVC	Und	4	$ 21.500	$ 86.000	$ 16.340	$ 102.340
5	Suministro de baterías estacionaria de uso solar AGM 150 AH ciclo profundo.	Und	1	$ 1.952.000	$ 1.952.000	$ 370.880	$ 2.322.880
6	Cable Concéntrico Antifraude Monofásico 1 X6 +6 Awg Aluminio.	M	250	$ 10.500	$ 2.625.000	$ 498.750	$ 3.123.750
7	Tensores Monofásicos.	Und	6	$ 8.740	$ 52.440	$ 9.964	$ 62.404
8	Conectores Bimetálicos	Und	6	$ 10.300	$ 61.800	$ 11.742	$ 73.542

9	Switch 8 puertos gigabit, incluye 4 puertos SFP, Tamaño de RAM: 128 MB Tamaño de almacenamiento: 16 MB.	Und	2	$ 1.481.000	$ 2.962.000	$ 562.780	$ 3.524.780
10	Switch administrable 24 puertos 10/100/1000BASE-T y 4 puertos SFP+, con soporte PoE+ para alimentar dispositivos. Con una velocidad de reenvío de 96 Mpps y capacidad de conmutación de 128 Gbit/s, Layer 3.	Und	1	$ 5.010.000	$ 5.010.000	$ 951.900	$ 5.961.900
11	Switch 5 puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps, 4 puertos soportan PoE (Power over Ethernet). El interruptor detecta automáticamente y suministra energía a los dispositivos IEEE 802.3af, cámaras IP.	Und	4	$ 312.000	$ 1.248.000	$ 237.120	$ 1.485.120
12	Fuente de poder 24v ac 5a para cctv cámaras IP PTZ.	Und	5	$ 127.000	$ 635.000	$ 120.650	$ 755.650
13	Inyector POE pasivo 24 VDC, 12W, Fast ethernet.	Und	4	$ 100.000	$ 400.000	$ 76.000	$ 476.000
14	Inyector PoE cumplimiento con IEEE 802.3af 48V	Und	4	$ 177.500	$ 710.000	$ 134.900	$ 844.900
15	Revisión y diagnostico transferencia.	Und	1	$ 1.185.000	$ 1.185.000	$ 225.150	$ 1.410.150
16	Radio enlace PtP Gen2, PBE-5AC -Gen2 de largo alcance Ancho de canal seleccionable PtP: 10/20/30/40/50/60/80 MHz PtMP: 10/20/30/40 MHz, Rendimiento de hasta 450+ Mbps, Frequency 5 Ghz, Memory 64 MB, procesador MIPS 74Kc, antena 25 dBi	Und	4	$ 1.260.300	$ 5.041.200	$ 957.828	$ 5.999.028
						Subtotal	$ 29.802.920
						IVA 19%	$ 5.662.555
						Total	**$ 35.465.475**

IDENTIFICACION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	Cant	Marca	Modelo	Serial
1	Suministro en instalación de fibra óptica de 24 hilos monomodo aérea tipo exterior ADS SPAN 100 Cubierta Exterior: HDPE (Polietileno de Alta Densidad) Máxima tensión: 1800 N Temperatura de operación: -20ºC ~ +65ºC Protección contra rayos UV y humedad Diámetro nominal: 10.1 ± 0.5 mm Peso nominal (kg/km): 78 ± 15kg Forro Negro.	Mts	140	FIBERHOME	ADSS	24 HILOS
2	Suministro e instalación y de Punto de Derivación para fibra óptica, tipo mufla, para 24 hilos, material de plástico rígido resistente a los rayos UV, humedad y golpes, 4 puertos de entrada/salida (20 mm) y oval para sangría, con un sistema organizador interno para el manejo y acomodo de las fibras ópticas, incluye Servicio de conectorización y empalmes de fibra óptica en puntos de derivación, incluye, incluye fusiones de fibra y certificación de la fibra en sitio.	UND	4			
3	Suministro de Toma Aérea Plástica 20Amp 125V Amarillo - 520-CV.	UND	4	LEVITON	2C43WG	N/A
4	Clavija (515PV-000) - 15Amps 125V PVC	UND	4	LEVITON		N/A
5	Suministro de baterías estacionaria de uso solar AGM 150 AH ciclo profundo.	UND	1	GREENPOINT	6-CNFJ-150	03720250430121500 82
6	Cable Concéntrico Antifraude Monofásico 1 X6 +6 Awg Aluminio.	Mts	250			


7	Tensores Monofásicos.	UND	6			
8	Conectores Bimetálicos	UND	6			
9	Switch 8 puertos gigabit, incluye 4 puertos SFP, Tamaño de RAM: 128 MB Tamaño de almacenamiento: 16 MB.	UND	2	MIKROTIK	CRS112-8P-4S-IN	HK40AQ91FGC HK40AZ1JTV1
10	Switch administrable 24 puertos 10/100/1000BASE-T y 4 puertos SFP+, con soporte PoE+ para alimentar dispositivos. Con una velocidad de reenvío de 96 Mpps y capacidad de conmutación de 128 Gbit/s, Layer 3.	UND	1		S310-24P4X	4E24C0021810
11	Switch 5 puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps, 4 puertos soportan PoE (Power over Ethernet). El interruptor detecta automáticamente y suministra energía a los dispositivos IEEE 802.3af, cámaras IP.	UND	4	TP-LINK	TL-SG1005P	2256885011989 2256885011956 2256885011996 2256885011958
12	Fuente de poder 24v ac 5a para cctv cámaras IP PTZ.	UND	5	AC ADAPTOR	WG66-24V5000	
13	Inyector POE pasivo 24 VDC, 12W, Fast ethernet.	UND	4	UBIQUITI NETWORKS	POE-24-12W	
14	Inyector PoE cumplimiento con IEEE 802.3af 48V	UND	4	UBIQUITI NETWORKS	POE-48-24W-G	
15	Revisión y diagnostico transferencia.	UND	1			
16	Radio enlace PtP Gen2, PBE-5AC -Gen2 de largo alcance Ancho de canal seleccionable PtP: 10/20/30/40/50/60/80 MHz PtMP: 10/20/30/40 MHz, Rendimiento de hasta 450+ Mbps, Frequency 5 Ghz, Memory 64 MB, procesador MIPS 74Kc, antena 25 dBi	UND	4		PBE-5AC-GEN2	E43883A0E861 E43883A0EA74 E43883A0E859 E43883A0E63E E43883A0F73B CK2301104836 817882020749

REGISTRO FOTOGRAFICO

1. Realizar el suministro de los elementos tecnológicos y eléctricos de acuerdo a las cantidades descritas a continuación:

ITEM	1				
DESCRIPCIÓN	Suministro en instalación de fibra óptica de 24 hilos monomodo aérea tipo exterior ADS SPAN 100 Cubierta Exterior: HDPE (Polietileno de Alta Densidad) Máxima tensión: 1800 N Temperatura de operación: -20ºC ~ +65ºC Protección contra rayos UV y humedad Diámetro nominal: 10.1 ± 0.5 mm Peso nominal (kg/km): 78 ± 15 kg Forro Negro.				
UNIDAD:	MT	**CANTIDAD CONTRATADA**	140	**CANTIDAD SUMINISTRADA**	**140**
					

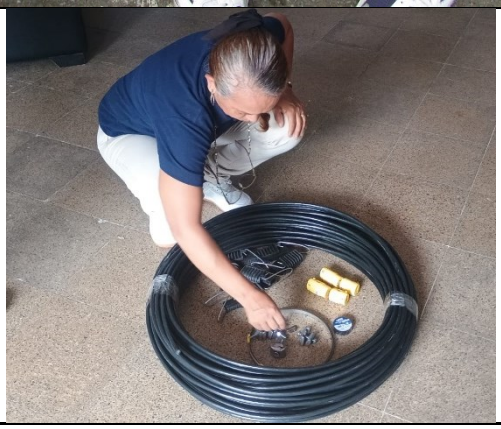

ITEM	2				
DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación y de Punto de Derivación para fibra óptica, tipo mufla, para 24 hilos, material de plástico rígido resistente a los rayos UV, humedad y golpes, 4 puertos de entrada/salida (20 mm) y oval para sangría, con un sistema organizador interno para el manejo y acomodo de las fibras ópticas, incluye Servicio de conectorización y empalmes de fibra óptica en puntos de derivación, incluye, incluye fusiones de fibra y certificación de la fibra en sitio.				
UNIDAD:	UN	**CANTIDAD CONTRATADA**	4	**CANTIDAD SUMINISTRADA**	**4**








ITEM	3				
DESCRIPCIÓN	Suministro de Toma Aérea Plástica 20Amp 125V Amarillo - 520-CV				
UNIDAD:	UN	**CANTIDAD CONTRATADA**	4	**CANTIDAD SUMINISTRADA**	**4**



ITEM	4				
DESCRIPCIÓN	Clavija (515PV-000) - 15Amps 125V PVC				
UNIDAD:	UN	**CANTIDAD CONTRATADA**	4	**CANTIDAD SUMINISTRADA**	**4**



ITEM	5				
DESCRIPCIÓN	Suministro de baterías estacionaria de uso solar AGM 150 AH ciclo profundo.				
UNIDAD:	UN	**CANTIDAD CONTRATADA**	1	**CANTIDAD SUMINISTRADA**	**1**





ITEM	6				
DESCRIPCIÓN	Cable Concéntrico Antifraude Monofásico 1 X6 +6 Awg Aluminio				
UNIDAD:	MT	**CANTIDAD CONTRATADA**	250	**CANTIDAD SUMINISTRADA**	**250**



ITEM	7				
DESCRIPCIÓN	Tensores Monofásicos				
UNIDAD:	UN	**CANTIDAD CONTRATADA**	6	**CANTIDAD SUMINISTRADA**	**6**



ITEM	8				
DESCRIPCIÓN	Conectores bimetálicos				
UNIDAD:	UN	**CANTIDAD CONTRATADA**	6	**CANTIDAD SUMINISTRADA**	**6**



ITEM	9				
DESCRIPCIÓN	switch 8 puertos gigabit, incluye 4 puertos SFP, Tamaño de RAM: 128 MB Tamaño de almacenamlento: 16 MB				
UNIDAD:	UN	**CANTIDAD CONTRATADA**	2	**CANTIDAD SUMINISTRADA**	**2**







ITEM	10				
DESCRIPCIÓN	Switch administrable 24 puertos 10/100/1000BASE-T y 4 puertos SFP+, con soporte PoE+ para alimentar dispositivos. Con una velocidad de reenvio de 96 Mpps y capacidad de conmutación de 128 Gbit/s, Layer 3				
UNIDAD:	UN	**CANTIDAD CONTRATADA**	1	**CANTIDAD SUMINISTRADA**	**1**





ITEM	11				
DESCRIPCIÓN	Switch 5 puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps, 4 puertos soportan PoE (Power over Ethernet). El interruptor detecta automáticamente y suministra energla a los dispositivos IEEE 802.3af, cámaras IP				
UNIDAD:	UN	**CANTIDAD CONTRATADA**	4	**CANTIDAD SUMINISTRADA**	**4**







ITEM	12				
DESCRIPCIÓN	fuente de poder 24vac 5a para cctv cámaras IP PTZ				
UNIDAD:	UN	**CANTIDAD CONTRATADA**	5	**CANTIDAD SUMINISTRADA**	**5**






					
ITEM	13				
DESCRIPCIÓN	Invector POE pasivo 24 VDC, 12W, Fast ethernet				
UNIDAD:	UN	**CANTIDAD CONTRATADA**	4	**CANTIDAD SUMINISTRADA**	**4**
					
ITEM	14				
DESCRIPCIÓN	Inyector POE cumplimiento con IEEE 802.3af 48V				
UNIDAD:	UN	**CANTIDAD CONTRATADA**	4	**CANTIDAD SUMINISTRADA**	**4**

					
ITEM	15				
DESCRIPCIÓN	Revisión y diagnostico transferencia				
UNIDAD:	UN	**CANTIDAD CONTRATADA**	1	**CANTIDAD SUMINISTRADA**	**1**
					
Revisión de transferencia eléctrica. Medición y pruebas			Seguimiento a pantalla indicadora de estado del electrógeno.		



seguimiento y pruebas de los relés encargados de la conmutación de pulsos binarios.

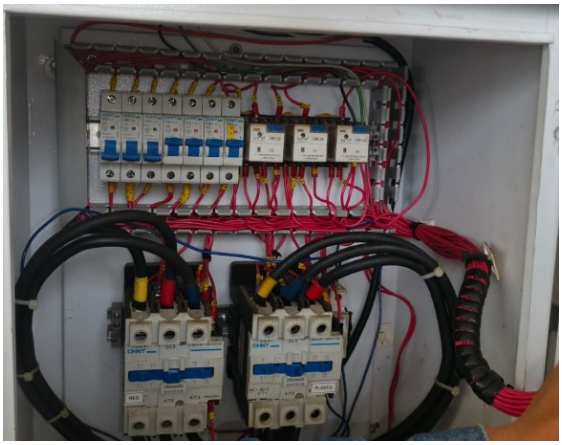

Simulación de ausencia de red pública



Revisión y diagnóstico de funcionamiento del ATS (Controlador lógico de la transferencia)



Prueba de estados lógicos en las salidas binarias del ATS



Desarme parcial del módulo ATS

Diagnostico final de la falla:

1. Especificaciones de falla:

Sistema electrógeno con transferencia ATS no enciende en modo automático

2. Evaluación técnica:

Se inicia la valoración realizando un intento de encendido en modo automático, observándose que el módulo de control (ATS) detecta la ausencia de red durante la simulación de falla.

No obstante, según las mediciones efectuadas, se evidencia que no se produce activación en las salidas binarias del controlador (BO1, BO2, BO3), encargadas de comandar las bobinas de los relés de control. Las salidas se mantienen en +24 VDC (estado de reposo) y no realizan la conmutación esperada a 0 VDC (modo active-low) durante la secuencia de transferencia.

Se efectuó posteriormente una verificación directa en el módulo controlador ATS, confirmándose que las salidas binarias no generan señal de accionamiento en ninguna de las condiciones simuladas.

Como siguiente paso, se procedió a probar individualmente los tres relés de conmutación asociados al sistema, comprobando que no presentan apertura, corto ni falsos contactos en sus bobinas ni en los terminales de contacto (NA/NC).

Finalmente, mediante una maniobra controlada, se simuló manualmente el pulso de cierre que debería ejecutar el módulo en modo automático, verificando que el sistema respondió correctamente a dicha señal, lo que permite descartar fallas en el cableado, relés o elementos de potencia asociados a la conmutación.

3. Diagnostico final de la falla: Daño en controlador lógico (ATS) de marca InteliAts, es necesario su reemplazo y configuración con base al esquema eléctrico que conforma la transferencia eléctrica instalada.

4. Sugerencias de alternativas para la corrección de la falla: Se recomienda el reemplazo del controlador principal (ATS), debido a la falla diagnosticada en sus salidas lógicas, la cual impide el funcionamiento automático del sistema.

El nuevo controlador deberá ser totalmente compatible con la configuración eléctrica existente de la transferencia, garantizando la correcta integración con los circuitos de mando, realimentación y señales de arranque del grupo electrógeno.

Una vez instalado, será necesario realizar la programación de los tiempos de arranque, estabilización y transferencia, asegurando que la secuencia de conmutación cumpla con los parámetros operativos del sistema.

Como alternativa técnica, se puede implementar una solución basada en un controlador lógico programable (PLC) Siemens S7-1200, configurado para gestionar las señales de detección de red y generador, así como la lógica de arranque, enclavamiento y transferencia. Esta opción proporciona una operación confiable, flexible y de fácil mantenimiento, representando una alternativa viable para el restablecimiento y automatización del sistema de transferencia general.

5. Costos aproximados: Al ser un modelo ATS desactualizado, se debe reemplazar por uno nuevo o en su defecto importar el mismo modelo (si se encuentra) dicho modelo tendria un costo aproximado de **$10.000.000 (diez millones de pesos)** mas costos de importacion, el tiempo de entrega varia entre 1 y 2 meses, esto dependiendo de los tramites de nacionalizacion del producto, asi mismo los costos de instalacion y configuracion seria de **$6.000.000 (seis millones de pesos),** tambien se puede hacer la actualizacion del modulo pero dicha actualizacion implica hacer cambios fisicos en el modulo de transferencia en sistema cableado, dicho modulo y actualizacion tiene un costo aproximado de **$7.500.000 (siete millones quinientos mil pesos),** adicional a esto se estiman costos de mano de obra cercanos a los **$4.5.000.000 (cuatro millones quinientos mil pesos),** dicho esto se deja a

concideracion de la entidad las dos opciones y conocimiento de los costos aproximados de solucion de la falla.					
ITEM	16				
DESCRIPCIÓN	Radio enlace PtP Gen2, PBE-5ACGen2 de largo alcance Ancho de canal seleccionable PtP: 10/20/30/40/50/60/80 MHz PtMP: 10/20/30/40 MHz, Rendimlento de hasta 450+ Mbps, Frequency 5 Ghz, Memory 64 MB, procesador MIPS 74Kc, antena 25 dBi				
UNIDAD:	UN	**CANTIDAD CONTRATADA**	4	**CANTIDAD SUMINISTRADA**	**4**
					

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

OBJETO	**ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA, EQUIPOS Y ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (CCTV) DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA LA FUERZA DEL PROGRESO 2024-2027.**					**VALOR EJECUTADO**		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANTIDAD**	**Valor unit.**	**Valor Parcial**	**CANT**	**VALOR UNIT**	**VALOR TOTAL**
1	Suministro en instalación de fibra óptica de 24 hilos monomodo aérea tipo exterior ADS SPAN 100 Cubierta Exterior: HDPE (Polietileno de Alta Densidad) Máxima tensión: 1800 N Temperatura de operación: -20ºC ~ +65ºC Protección contra rayos UV y humedad Diámetro nominal: 10.1 ± 0.5 mm Peso nominal (kg/km): 78 ± 15 kg Forro Negro.	M	140	$ 31.032	$ 4.344.480	140	$ 31.032	$ 4.344.480
2	Suministro e instalación y de Punto de Derivación para fibra óptica, tipo mufla, para 24 hilos, material de plástico rígido resistente a los rayos UV, humedad y golpes, 4 puertos de entrada/salida (20 mm) y oval para sangría, con un sistema organizador interno para el manejo y acomodo de las fibras ópticas, incluye Servicio de conectorización y empalmes de fibra	Und	4	$ 851.000	$ 3.404.000	4	$ 851.000	$ 3.404.000

	óptica en puntos de derivación, incluye, incluye fusiones de fibra y certificación de la fibra en sitio.							
3	Suministro de Toma Aérea Plástica 20Amp 125V Amarillo - 520-CV.	Und	4	$ 21.500	$ 86.000	4	$ 21.500	$ 86.000
4	Clavija (515PV-000) - 15Amps 125V PVC	Und	4	$ 21.500	$ 86.000	4	$ 21.500	$ 86.000
5	Suministro de baterías estacionaria de uso solar AGM 150 AH ciclo profundo.	Und	1	$ 1.952.000	$ 1.952.000	1	$ 1.952.000	$ 1.952.000
6	Cable Concéntrico Antifraude Monofásico 1 X6 +6 Awg Aluminio.	M	250	$ 10.500	$ 2.625.000	250	$ 10.500	$ 2.625.000
7	Tensores Monofásicos.	Und	6	$ 8.740	$ 52.440	6	$ 8.740	$ 52.440
8	Conectores Bimetálicos	Und	6	$ 10.300	$ 61.800	6	$ 10.300	$ 61.800
9	Switch 8 puertos gigabit, incluye 4 puertos SFP, Tamaño de RAM: 128 MB Tamaño de almacenamiento: 16 MB.	Und	2	$ 1.481.000	$ 2.962.000	2	$ 1.481.000	$ 2.962.000
10	Switch administrable 24 puertos 10/100/1000BASE-T y 4 puertos SFP+, con soporte PoE+ para alimentar dispositivos. Con una velocidad de reenvío de 96 Mpps y capacidad de conmutación de 128 Gbit/s, Layer 3.	Und	1	$ 5.010.000	$ 5.010.000	1	$ 5.010.000	$ 5.010.000
11	Switch 5 puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps, 4 puertos soportan PoE (Power over Ethernet). El interruptor detecta automáticamente y suministra energía a los dispositivos IEEE 802.3af, cámaras IP.	Und	4	$ 312.000	$ 1.248.000	4	$ 312.000	$ 1.248.000
12	Fuente de poder 24v ac 5a para cctv cámaras IP PTZ.	Und	5	$ 127.000	$ 635.000	5	$ 127.000	$ 635.000
13	Inyector POE pasivo 24 VDC, 12W, Fast ethernet.	Und	4	$ 100.000	$ 400.000	4	$ 100.000	$ 400.000
14	Inyector PoE cumplimiento con IEEE 802.3af 48V	Und	4	$ 177.500	$ 710.000	4	$ 177.500	$ 710.000
15	Revisión y diagnostico transferencia.	Und	1	$ 1.185.000	$ 1.185.000	1	$ 1.185.000	$ 1.185.000
16	Radio enlace PtP Gen2, PBE-5AC -Gen2 de largo alcance Ancho de canal seleccionable PtP: 10/20/30/40/50/60/80 MHz PtMP: 10/20/30/40 MHz, Rendimiento de hasta 450+ Mbps, Frequency 5 Ghz, Memory 64 MB, procesador MIPS 74Kc, antena 25 dBi	Und	4	$ 1.260.300	$ 5.041.200	4	$ 1.260.300	$ 5.041.200
	TOTAL COSTOS DIRECTO				$ 29.802.920			$ 29.802.920
	IVA			**19%**	$ 5.662.555			$ 5.662.555
	TOTAL				**$ 35.465.475**			**$ 35.465.475**

La ejecución del contrato a acta de terminación se encuentra en 100%

FORMA DE PAGO

La FORMA DE PAGO del contrato de suministro de No. 942 de 2025. “El municipio pagará al contratista el 100% del valor total del contrato mediante acta de liquidación, previa certificación de ingreso de los elementos al almacén municipal, certificación de cumplimiento emitida por el supervisor del contrato y presentación de informe de actividades, el cual deberá ir acompañado de: A). Registro Fotográfico B). Una factura con formalidades de Ley. C). Copia de la planilla del pago del mes correspondiente, de los


aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales (ICBF, SENA, CCF), cuando sea el caso.”


CONCEPTO	PORCENTAJE	VALOR
VALOR DEL CONTRATO		$ 35.465.475,00
LIQUIDACION FINAL	100%	
TOTAL	100%	$ 35.465.475,00


ACTIVIDADES DE INSTALACION ITEM 2 al 7 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE NO. 942 DE 2025

Cumpliendo con las actividades del contrato suministro 942 de 2025 firmado por Municipio de Aguazul y CONECTAR JDP S.A.S ZOMAC referente a los ítems 2 al 7, a continuación, se presenta el desarrollo de las actividades.


<table>
<tr><td colspan="6">INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA</td></tr>
<tr><td>CAPITULO</td><td colspan="2">1</td><td>ÍTEM DEL CONTRATO</td><td colspan="2">2-7</td></tr>
<tr><td>DESCRIPCIÓN</td><td colspan="5">- Realizar la instalación de la fibra óptica teniendo en cuenta el plano del tendido de la red de fibra óptica del sistema de video vigilancia “CCTV” existente, de los tramos afectados por el corte, para esta actividad el contratista deberá utilizar la red de posteria del alumbrado público instalar los elementos de fijación para fibra óptica mediante cinta bandith.
- Realizar la instalación de las derivaciones para fibra óptica tipo mufla para 24 hilos, para fusión de la fibra óptica afectada por el corte de fibra óptica, de acuerdo a los estándares de la norma NORMA TIA/EIA 568
- Realizar las fusiones y empalme de los 24 hilos de fibra óptica existente con el nuevo tramo de fibra óptica que se reemplaza de acuerdo a topología de red de fibra óptica actual, el cual se debe garantizar los anillos No. 1, Anillo, 2, anillo No. 3 y Anillo No. 4
- Realizar las respectivas pruebas de conexión de la red de fibra una vez realizada las respectivas fusiones, conscientes de que los puntos de cámaras de seguridad afectadas por el corte de fibra queden conectadas al centro de monitoreo.
- Realizar la instalación de la batería al inverso de 1 Kva en el nodo de comunicaciones de bellavista para esta actividad el contratista deberá seguir el manual del fabricante, conectar las baterías en paralelo, conectar la fuente de energía comercial, una vez terminado el proceso de conexión se procederá a encender el inversor se realizar la configuración del inversor el cual deberá quedar como fuente de energía primaria los paneles solares y fuente de energía segundaria la comercial y las baterías como fuente de respaldo, terminado el proceso se realizaran las pruebas de voltaje de entrada y salida, pruebas de funcionamiento desconectando la fuente de paneles solares y debe entrar la fuente de energía comercial, desconexión de las dos fuentes de entrada de energía y debe entrar a modo de baterías para lo cual el contratista deberá entregar documentado
- Realizar la Instalación y Configuración de 4 radios enlaces</td></tr>
<tr><td>UNIDAD:</td><td>ML</td><td>CANTIDAD CONTRATADA</td><td>200</td><td>CANTIDAD INSTALADA</td><td>200</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

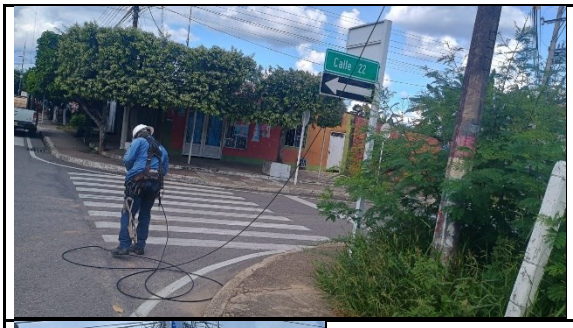
Calle 22

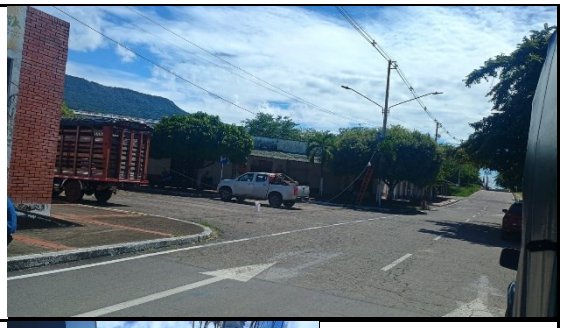

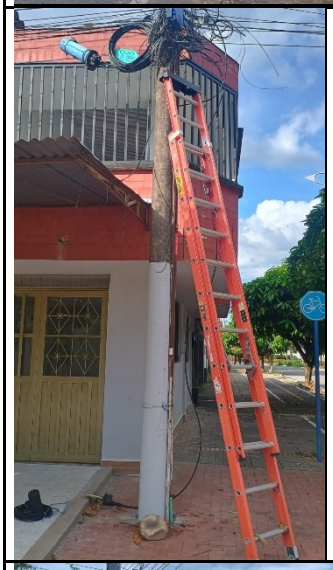




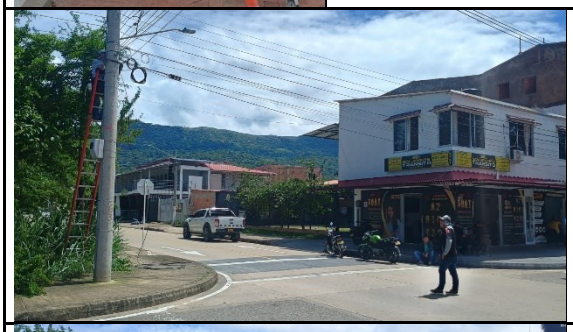





TRANSITO
SOAT

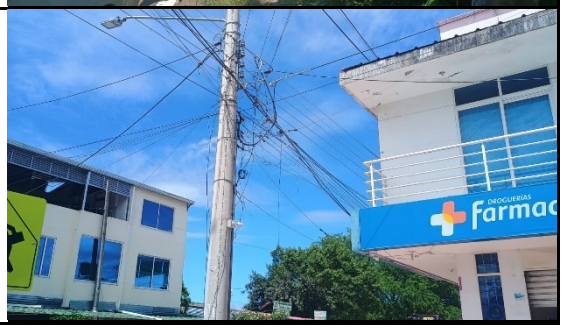
DROGUERIAS
farma



Una vez realizada entrada almacén de fibra óptica, se procede a verificar el daño de fibra óptica el cual es producido por corte limpio entre la carrera 18 y 17 con calle 20, afectando red de fibra óptica principal, una vez identificado el daño, se procede a retirar y cambiar por fibra óptica tipo ADSS de 24 hilos, desde carrera 17 calle 20-45 hasta carrera 18 calle 19, se realiza intervención en mufla existente para llevar conexión a cámara parque CE 3 e instal mufla nueva en carrera 18 calle 19.

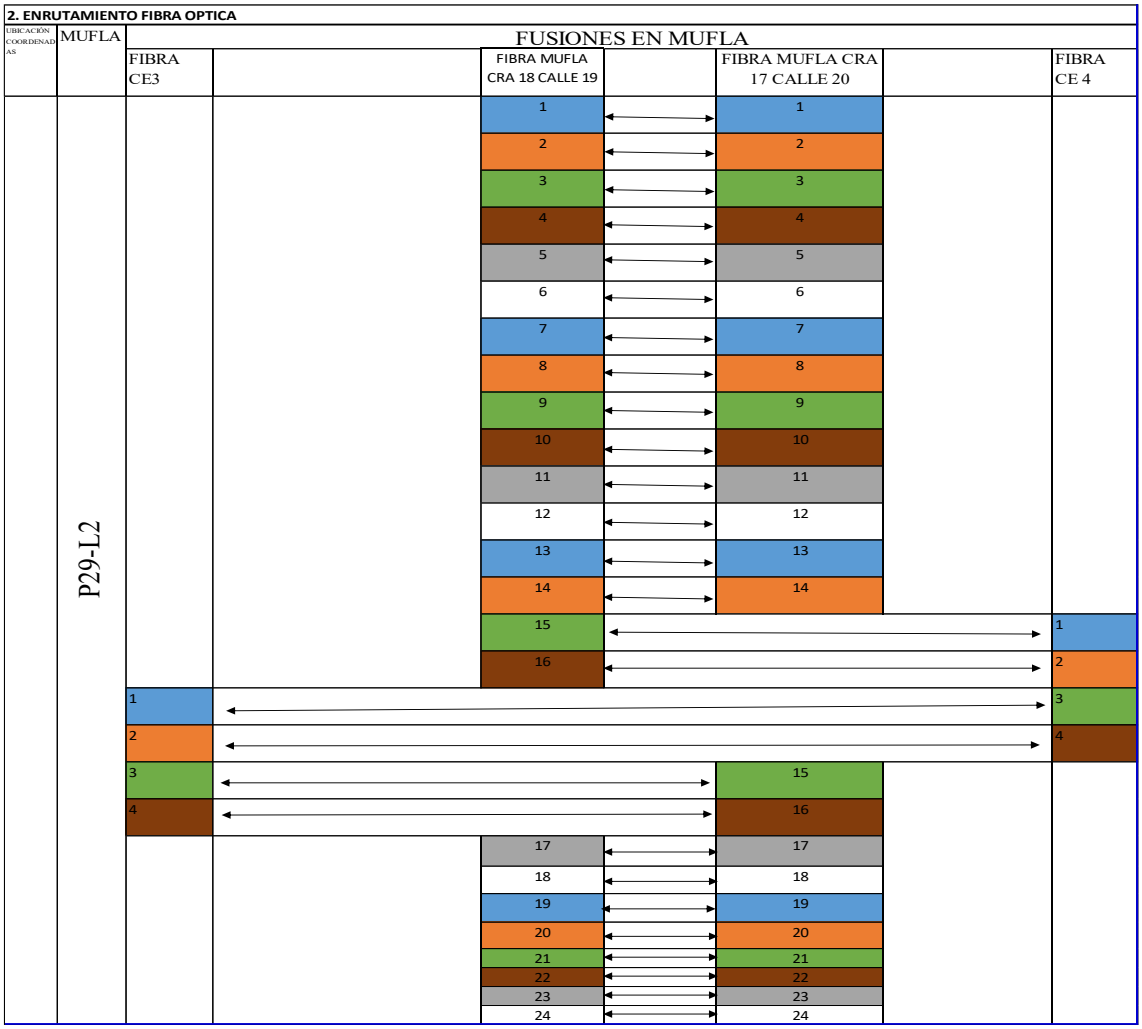
2. ENRUTAMIENTO FIBRA OPTICA
UBICACIÓN COORDENADAS
MUFLA
FUSIONES EN MUFLA
FIBRA CE3
FIBRA MUFLA CRA 18 CALLE 19
FIBRA MUFLA CRA 17 CALLE 20
FIBRA CE 4
P29-L2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4
15 16
1 2 3 4
17 18 19 20 21 22 23 24
17 18 19 20 21 22 23 24

ANEXO 2

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901289964	4	CONECTAR JDP S.A.S ZOMAC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONECTAR JDP SAS	CR 28 9 18	AGUAZUL-CASANARE	6384726	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1959283912	9495452715	E	2025/12/16	2025/11/27	BANCOLOMBIA	0	$1,088,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONECTAR JDP SAS (4 Afiliados)					$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$63,400		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)					$2,135,250	$341,700			$2,135,250	$85,500			$2,135,250	$85,500			$2,135,250	$11,300		$0	$0
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (2 Afiliados)					$2,135,250	$341,700			$2,135,250	$85,500			$2,135,250	$85,500			$2,135,250	$11,300		$0	$0
1	CC 1116550272	ESCOBAR JHORR	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
2	CC 1116553521	GAITAN DIEGO	230301	15	$711,750	$113,900	EPS005	15	$711,750	$28,500	CCF69	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$3,800	15	$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO SECUNDARIO (2 Afiliados)					$2,135,250	$341,700			$2,135,250	$85,500			$2,135,250	$85,500			$2,135,250	$52,100		$0	$0
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (2 Afiliados)					$2,135,250	$341,700			$2,135,250	$85,500			$2,135,250	$85,500			$2,135,250	$52,100		$0	$0
3	CC 1116550167	ALFONSO OSCAR	230301	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$28,500	CCF69	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$17,400	15	$0	$0
4	CC 1116796025	SANCHEZ VICTOR	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Total	**Afiliados(4)**				$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$63,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901289964	4	CONECTAR JDP S.A.S ZOMAC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONECTAR JDP SAS	CR 28 9 18	AGUAZUL-CASANARE	6384726	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1959283912	9495452715	E	2025/12/16	2025/11/27	BANCOLOMBIA	0	$1,088,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$683,400	$0	$0	$683,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$455,600	$0	$0	$455,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$63,400	$0	$0	$63,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$63,400	$0	$0	$63,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$171,000	$0	$0	$171,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	4	$171,000	$0	$0	$171,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$171,000	$0	$0	$171,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$142,500	$0	$0	$142,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$28,500	$0	$0	$28,500
TOTAL				4	$1,088,800	$0	$0	$1,088,800

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901289964	4	CONECTAR JDP S.A.S ZOMAC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONECTAR JDP SAS	CR 28 9 18	AGUAZUL-CASANARE	6384726	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1959283912	9495452715	E	2025/12/16	2025/11/27	BANCOLOMBIA	0	$1,088,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONECTAR JDP SAS (4 Afiliados)						$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$63,400		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)						$2,135,250	$341,700			$2,135,250	$85,500			$2,135,250	$85,500			$2,135,250	$11,300		$0	$0
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (2 Afiliados)						$2,135,250	$341,700			$2,135,250	$85,500			$2,135,250	$85,500			$2,135,250	$11,300		$0	$0
1	CC	1116550272	ESCOBAR JHORR	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
2	CC	1116553521	GAITAN DIEGO	230301	15	$711,750	$113,900	EPS005	15	$711,750	$28,500	CCF69	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$3,800	15	$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO SECUNDARIO (2 Afiliados)						$2,135,250	$341,700			$2,135,250	$85,500			$2,135,250	$85,500			$2,135,250	$52,100		$0	$0
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (2 Afiliados)						$2,135,250	$341,700			$2,135,250	$85,500			$2,135,250	$85,500			$2,135,250	$52,100		$0	$0
3	CC	1116550167	ALFONSO OSCAR	230301	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$28,500	CCF69	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$17,400	15	$0	$0
4	CC	1116796025	SANCHEZ VICTOR	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Total			**Afiliados(4)**			$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$63,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901289964	4	CONECTAR JDP S.A.S ZOMAC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONECTAR JDP SAS	CR 28 9 18	AGUAZUL-CASANARE	6384726	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1959283912	9495452715	E	2025/12/16	2025/11/27	BANCOLOMBIA	0	$1,088,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$683,400	$0	$0	$683,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$455,600	$0	$0	$455,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$63,400	$0	$0	$63,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$63,400	$0	$0	$63,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$171,000	$0	$0	$171,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	4	$171,000	$0	$0	$171,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$171,000	$0	$0	$171,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$142,500	$0	$0	$142,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$28,500	$0	$0	$28,500
TOTAL				4	$1,088,800	$0	$0	$1,088,800

JAIME ANDRES
PEREZ CHAPARRO

CONTADOR PUBLICO

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO INSCRITO ANTE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El suscrito en calidad de Contador Público **JAIME ANDRES PEREZ CHAPARRO** con Tarjeta Profesional N.º 271.819-T como aparece al pie de mi firma CERTIFICA que la empresa **CONECTAR JDP SAS ZOMAC** identificada con Nit: 901.289.964-4, domiciliada en la Cra 28 N 9-18 Barrio Villa del rio, de la ciudad de Aguazul, que, una vez revisado el estado de la organización, doy Fe que se encuentra a paz y salvo a la fecha de emisión de esta certificación por los siguientes conceptos:

- Aportes a la Caja de Compensación Familiar
- Aportes Fondo de Pensiones;
- Aportes aseguradora de riesgos profesionales
- Aportes empresas promotoras de salud
- Por salarios y prestaciones sociales

se expide en Aguazul Casanare a los Diecisiete (17) días del mes de Diciembre del año 2025.



JAIME ANDRES PEREZ
CONTADOR PÚBLICO
T.P 271.819-T

JAIME.CONTADOR7@GMAIL.COM 310-235-2175
CRA 24B No 12-62 Aquazul – Casanare

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F017 5FA0 6AE3 9C31

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
A QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAIME ANDRES PEREZ CHAPARRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1116549678 de AGUAZUL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 271819-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

ANEXO-CERTIFICACION MUNICIPIO AGUAZUL

ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

EMPRESA:	**CONECTAR JDP S.A.S ZOMAC**	NIT:	**901.289.964-4**
NOMBRE Y APELLIDOS:		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	
ENTIDAD Y/O BANCO:	**A QUIEN INTERESE**	FECHA:	**27 NOVIEMBRE 2025**

FIRMA _____





REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.116.549.678**
PEREZ CHAPARRO

APELLIDOS
JAIME ANDRES

NOMBRES

Jaime Perez

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **30-ABR-1994**
AGUAZUL
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | **B+** G.S. RH | **M** SEXO

21-JUN-2012 AGUAZUL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-4604000-00391498-M-1116549678-20120801 0030729255A 1 38613910

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141197557627

(415)7707212489984(8020) 000014119755762 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 8 9 9 6 4	4	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONECTAR JDP S.A.S ZOMAC

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Aguazul 0 1 0

41. Dirección principal
CR 28 9 18 BRR VILLA DEL RIO

42. Correo electrónico conectarjdp@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 4 7 2 4 0 0 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
6 1 2 0	2 0 1 9 0 5 2 9	4 7 4 1	2 0 2 2 0 1 0 3	4 6 5 2 6 1 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GAITAN AVELLA DIEGO FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141197557627

(415)7707212489984(8020) **000014119755762 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 8 9 9 6 4	4	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número	0 0 0	2
73. Fecha	2 0 1 9 0 5 2 7	2 0 2 1 1 0 0 8
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 5 2 9	2 0 2 1 1 0 1 5
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 4 2 1 7 8	1 4 2 1 7 8
78. Departamento	8 5	8 5
79. Ciudad/Municipio	0 1 0	5 0
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 9 0 5 2 9	2 0 1 9 0 5 2 9
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	9 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 9 0 1 0 1		-
2	4 9	2 0 1 9 0 5 2 9		-
3	9 1	2 0 2 1 1 0 1 5		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141197557627

(415)7707212489984(8020) **000014119755762 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 8 9 9 6 4	4	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 1 1 1 0		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 1 6 5 5 3 5 2 1		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GAITAN	AVELLA	DIEGO	FERNANDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 0 6 1 3		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 4 7 5 3 0 8 5		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CASTELLANOS	MORALES	RICARDO	ANDELFO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141197557627

(415)7707212489984(8020) **000014119755762 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 8 9 9 6 4	4	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 1 6 5 4 9 6 7 8	2	2 7 1 8 1 9

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
PEREZ	CHAPARRO	JAIME	ANDRES

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 4 3 0

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901289964	4	CONECTAR JDP S.A.S ZOMAC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONECTAR JDP SAS	CR 28 9 18	AGUAZUL-CASANARE	6384726	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1920409392	9493917956	E	2025/11/19	2025/11/11	BANCOLOMBIA	0	$725,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONECTAR JDP SAS (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$42,200		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	1116550272	ESCOBAR JHORR	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO SECUNDARIO (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$34,700		$0	$0
2	CC	1116796025	SANCHEZ VICTOR	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Total Afiliados(2)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$42,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901289964	4	CONECTAR JDP S.A.S ZOMAC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONECTAR JDP SAS	CR 28 9 18	AGUAZUL-CASANARE	6384726	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1920409392	9493917956	E	2025/11/19	2025/11/11	BANCOLOMBIA	0	$725,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$455,600	$0	$0	$455,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$42,200	$0	$0	$42,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$42,200	$0	$0	$42,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$0	$0	$114,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$114,000	$0	$0	$114,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$0	$0	$114,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$114,000	$0	$0	$114,000
TOTAL				**2**	**$725,800**	**$0**	**$0**	**$725,800**
