1. TIPO DE INFORME			
INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL	
Tipo de Contrato: OBRA	X	INTERVENTORÍA	
Informe Número: 02		Periodo comprendido entre el 1/09/2025 hasta el 31/10/2025.	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN			
Contrato o Aceptación de Oferta No. 4162.010.26.1.1984 de 2025			
Nombre Completo del Contratista: GRARCO SAS Representante legal: GUSTAVO EDUARDO AGUILAR DONNEYS			
Documento de identificación del contratista: 900.762.689-8			
Nombre (s) del Supervisor (es): EDGAR ALFREDO MARTINEZ BALANTA			
Organismo: SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL NIT. 890.399.011-3			
Obra Física Ejecutada del Periodo: 31.51%		Obra Física Ejecutada Acumulada: 57.56 %	
Objeto del contrato: “REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE JUEGO HÍBRIDO Y DE GRAMA NATURAL DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO BP-26005399”.			
3. INFORME JURÍDICO			
Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
11/JULIO/2025		31/DICIEMBRE/2025	
Modificación del contrato: Modificación Aclaratoria: Aclarar y corregir el nombre del R.L de GRARCO S.A.S, en el Contrato de Mantenimiento de Obra No 4162.010.26.1.1984-2025 el cual por error de digitación quedo como GUSTAVO ADOLFO AGUILAR DONNEYS y el nombre correcto corresponde al de GUSTAVO EDUARDO AGUILAR DONNEYS.			

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

Acta de recibo final de obra: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del Contrato: SETECIENTOS VEINTE Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL TRES CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/TE ($724.725.354)

Adición:N/A

Prórroga: N/A

Resumen Contable y Financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$724.725.354	$ 228.349.706	$ 188.790.006	$ 307.585.642

PERSONA JURÍDICA

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 14 NOVIEMBRE DE 2025
ANEXA CERTIFICACIÓN MES OCTUBRE DE 2025
ANEXA PLANILLAS DE PAGO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2025.
La certificación fue expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo a los requerimientos de Ley.

Observaciones al informe contable y financiero: N/A

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

5. INFORME TÉCNICO

Actividades realizadas en el periodo: Las actividades desarrolladas durante el contrato No. 4162.010.26.1.1984-2025 comprendidas entre el 1/09/2025 Hasta el 31/10/2025. El contratista realizó lo siguiente: LABORES GRAMA ESTADIO OLÍMPICO PASCUAL GUERRERO:

Es importante mencionar que se realizaron las labores según el Contrato No.4162.010.26.1.1984-2025 de la siguiente manera:

En la presente cuenta se pasan las Labores Contractuales:

1. **CORTE:** Se realizó el corte de manera permanente y ajustada para la conservación de la gramilla. Se realizó en sentido longitudinal y transversal utilizando una cortadora manual tipo casette G860 de 8 hojas; previa instalación de hilos para demarcaciones de las franjas.

2. **CEPILLADO:** Se realizó el cepillado, para la conservación de la gramilla. Se realizó en sentido longitudinal y transversal utilizando una cepilladora manual tipo casette G860 de escobillas.

3. **RIEGO:** Se realizó ajustándose a las condiciones hidroclimatologia de la zona: Radiación solar, evaporación, evapotranspiración, precipitaciones, etc.

4. **FERTILIZACIÓN:** Se realizó alternada entre forma líquida y sólida, aplicando elementos mayores: nitrógeno, fosforo y potasio y algunos elementos menores.

5. **ASPIRADO:** Se realizó el aspirado de manera permanente y después de cada corte. Se realizó en sentido longitudinal y transversal utilizando una máquina aspiradora manual PR 34.

6. **DESHIERBE Y CONTROL DE MALEZAS:** Se realizó de forma manual y permanente para evitar la presencia de malezas que fueran a contaminar el césped.

7. **CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES:** Se realizó aplicando insumos biológicos a toda la gramilla.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

8. **REPARACIÓN DE APIQUES O DIVOTS:** Se realizó después de cada partido, con herramienta especial para tapar divots y en algunos momentos arena media cernida.

9. **AIREACIÓN CON PINES SÓLIDOS:** Se realizó una (1) vez por semana, mejorando la oxigenación del suelo y ayudando a una mejor asimilación de los fertilizantes por parte de los sistemas radiculares de la grama hibrida.

10. **DEMARCACIÓN DEL CAMPO:** Se realizó previo a cada partido, regional, nacional o internacional. Se utilizó la maquinaria especializada tipo “LINE MARKER (WHEEL TO WHEEL) “para esta actividad es provista por la entidad.

11. **VERTICUT LEVE:** Se realizó a toda la gramilla, con el fin de remover el acolchonamiento. Se utilizó la maquinaria especializada tipo “BLADE CASETTE “para esta actividad, provista por la entidad.

12. **FONDO AGOTABLE PARA COMPRA DE REPUESTOS Y EQUIPOS DE MANTENIMIENTO:**
    Durante este periodo, el contratista presento un informe técnico respecto a la necesidad de cambia el temporizador, el sensor de humedad y la mano de obra de la instalación eléctrica, repuestos y actividades que fueron debidamente aprobadas para su ejecución por un monto de $3.800.000. Debido a que el contratista ya adquirió y está en proceso de instalación de los repuestos, se autoriza el pago de $2.204.000 en la presente acta.

13. **DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES:** Se realizó el aseo y limpieza permanente del área de trabajo y sus alrededores afectados.

14. **LIMPIEZA PERMANENTE PARA ZONAS EXPUESTAS POR CONTAMINACIÓN:** Se realizó el lavado de andenes peatonales, escaleras, muros y otras zonas duras del estadio Olímpico Pascual Guerrero.
    Se barrió, recolectó, acopio, se realizó la aplicación de agua y detergentes a alta presión, con máquinas hidrolavadoras.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

LABORES EN LA GRAMA NATURAL DEL ESTADIO INTERNACIONAL DE ATLETISMO PEDRO GRAJALES - CANCHA EN PISTA PRINCIPAL:

1. **CORTE:** Se realizó el corte de manera permanente y ajustada para la conservación de la gramilla. Se realizó en sentido longitudinal y transversal utilizando una cortadora manual tipo casette G860 de 8 hojas; previa instalación de hilos para demarcaciones de las franjas.

2. **RIEGO:** Se realizó ajustándose a las condiciones hidroclimatologia de la zona: Radiación solar, evaporación, evapotranspiración, precipitaciones, etc.

3. **FERTILIZACIÓN:** Se realizó alternada entre forma líquida y sólida, aplicando elementos mayores: nitrógeno, fosforo y potasio y algunos elementos menores.

4. **DESHIERBE Y CONTROL DE MALEZAS:** Se realizó de forma manual y permanente para evitar la presencia de malezas que fueran a contaminar el césped.

5. **CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES:** Se realizó aplicando insumos biológicos a toda la gramilla.

6. **AIREACIÓN CON PINES SÓLIDOS:** Se realizó la aireación para mejorar la circulación de aire y la penetración de agua y nutrientes en el suelo.

7. **REPARACIÓN DE APIQUES O DIVOTS:** Se arreglaron los baches generados después de partidos, se realizó utilizando la herramienta especial para esta labor y se realizó con la proporción 80% arena media y 20% tierra negra.

8. **MANTENIMIENTO DE FOSOS DE CAIDA Y OTRAS ÁREAS DE ARENA:** Se realizó mantenimiento a los fosos de caída y otras áreas de arena, aplicando material de relleno

9. **DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES:** Se realizó el aseo y limpieza permanente del área de trabajo y sus alrededores afectados.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

LABORES EN LA GRAMA NATURAL DEL ESTADIO INTERNACIONAL DE ATLETISMO PEDRO GRAJALES - CANCHA EN PISTA AUXILIAR.

1. **CORTE:** Se cortó la grama a la altura adecuada, para favorecer un crecimiento Saludable.

2. **RIEGO:** Se realizó ajustándose a las condiciones hidroclimatologia de la zona: Radiación solar, evaporación, evapotranspiración, precipitaciones, etc.

3. **FERTILIZACIÓN:** Se realizó alternada entre forma líquida y sólida, aplicando elementos mayores: nitrógeno, fosforo y potasio y algunos elementos menores.

4. **DESHIERBE Y CONTROL DE MALEZAS:** Se realizó de forma manual y permanente para evitar la presencia de malezas que fueran a contaminar el césped.

5. **CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES:** Se realizó aplicando insumos biológicos a toda la gramilla.

6. **AIREACIÓN CON PINES SÓLIDOS:** Se realizó la aireación para mejorar la circulación de aire y la penetración de agua y nutrientes en el suelo.

7. **REPARACIÓN DE APIQUES O DIVOTS:** Se arreglaron los baches generados después de partidos, se realizó utilizando la herramienta especial para esta labor y se realizó con la proporción 80% arena media y 20% tierra negra.

8. **TOP DRESSING:** Se llenaron los orificios realizados después de la aireación, en una proporción 80% arena de granulometría media lavada y pasada por zaranda y 20% de tierra negra.

9. **DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES:** Se realizó el aseo y limpieza permanente del área de trabajo y sus alrededores afectados.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

LABORES EN LA GRAMA NATURAL DEL DIAMANTE DE BEISBOL:

1. **CORTE:** Se cortó la grama a la altura adecuada, para favorecer un crecimiento saludable.

2. **RIEGO:** Se realizó ajustándose a las condiciones hidroclimatologia de la zona: Radiación solar, evaporación, evapotranspiración, precipitaciones, etc.

3. **FERTILIZACIÓN:** Se realizó alternada entre forma líquida y sólida, aplicando elementos mayores: nitrógeno, fosforo y potasio y algunos elementos menores.

4. **DESHIERBE Y CONTROL DE MALEZAS:** Se realizó de forma manual y permanente para evitar la presencia de malezas que fueran a contaminar el césped.

5. **CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES:** Se realizó aplicando insumos biológicos a toda la gramilla.

6. **REPARACIÓN DE APIQUES O DIVOTS:** Se arreglaron los baches generados después de partidos, se realizó utilizando la herramienta especial para esta labor y se realizó con la proporción 80% arena media y 20% tierra negra.

7. **MANTENIMIENTO DEL INFIELD - ÁREAS EN POLVO DE LADRILLO:** Se realizó el relleno con polvo de ladrillo. Incluyo los materiales minerales para el relleno; equipos y herramientas; y mano de obra para su correcta ejecución.

8. **AIREACIÓN CON PINES SÓLIDOS:** Se mejoró la circulación de aire y la penetración de agua y nutrientes en el suelo.

9. **DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES:** Se realizó el aseo y limpieza permanente del área de trabajo y sus alrededores afectados.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

LABORES EN LA GRAMA NATURAL DEL DIAMANTE DE SOFTBOL:

1. **CORTE:** Se cortó la grama a la altura adecuada, para favorecer un crecimiento saludable.

2. **RIEGO:** Se realizó ajustándose a las condiciones hidroclimatologia de la zona: Radiación solar, evaporación, evapotranspiración, precipitaciones, etc.

3. **FERTILIZACIÓN:** Se realizó alternada entre forma líquida y sólida, aplicando elementos mayores: nitrógeno, fosforo y potasio y algunos elementos menores.

4. **DESHIERBE Y CONTROL DE MALEZAS:** Se realizó de forma manual y permanente para evitar la presencia de malezas que fueran a contaminar el césped.

5. **CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES:** Se realizó aplicando insumos biológicos a toda la gramilla.

6. **AIREACIÓN CON PINES SÓLIDOS:** Se mejoró la circulación de aire y la penetración de agua y nutrientes en el suelo.

7. **TOP DRESSING:** Se llenaron los orificios realizados después de la aireación, en una proporción 80% arena de granulometría media lavada y pasada por zaranda y 20% de tierra negra.

8. **REPARACIÓN DE APIQUES O DIVOTS:** Se arreglaron los baches generados después de partidos, se realizó utilizando la herramienta especial para esta labor y se realizó con la proporción 80% arena media y 20% tierra negra.

9. **MANTENIMIENTO DEL INFIELD - ÁREAS EN POLVO DE LADRILLO:** Se realizó el relleno con polvo de ladrillo. Incluyo los materiales minerales para el relleno; equipos y herramientas; y mano de obra para su correcta ejecución.

10. **DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES:** Se realizó el aseo y limpieza permanente Del área de trabajo y sus alrededores afectados.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

LABORES EN EL ESCENARIO DE TIRO CON ARCO:

1. **CORTE:** Se realizó ajustado para la perfecta conservación de las gramillas. En sentido longitudinal y transversal utilizando una cortadora especializada tipo Greenera. Esto garantiza que el césped mantenga la altura óptima definida por la entidad. Se incluyó, toda la maquinaria necesaria, todos los materiales e insumos para su óptimo funcionamiento, operarios, herramienta menor y la recolección y disposición adecuada de los residuos.

2. **LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES:** Se debe realizar el aseo y limpieza permanente del área de trabajo y sus alrededores afectados; Se incluyó mano de obra, equipos y herramienta de cargue y descargue; maquinaria, equipo y herramienta para el transporte.

MANTENIMIENTO DE GRAMAS EXTERIORES:

1. **UNIDAD DEPORTIVA JAIME APARICIO:** Se realizó corte, acopio y recolección de residuos vegetales a 24.400 m2

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

REGISTRO FOTOGRÁFICO.
ITEM 1. ESTADIO OLIMPICO PASCUALGUERRERO.



Foto No. 1	Corte de grama hibrida sentido Sur – Norte.



Foto No. 2	Corte de grama hibrida sentido occidente – oriente.

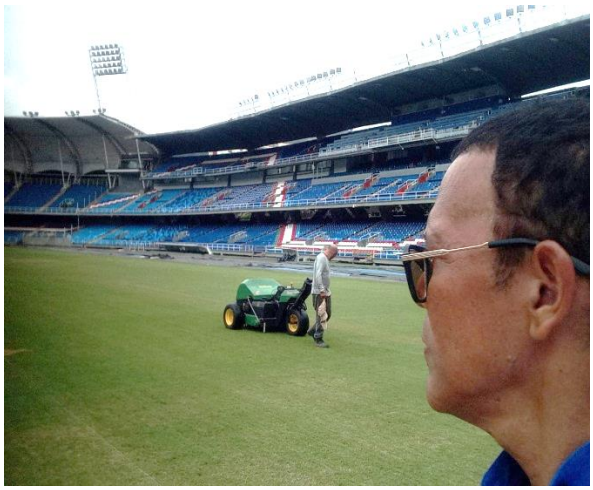


Foto No. 3	Aspirado



Foto No. 4	Aspirado

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

			
Foto No. 5	Supervisión en terreno de labores contractuales.	Foto No. 6	Aspirado de grama hibrida.
			
Foto No. 7	Aplicación de agua con sistema de riego con emisores Pop ups.	Foto No. 8	Aplicación de agua con sistema de riego con emisores Pop ups.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

			
Foto No. 9	Deshierbe y control de malezas.	Foto No. 10	Deshierbe y control de malezas.
			
Foto No. 11	Fertilización granular.	Foto No. 12	Fertilización líquida.

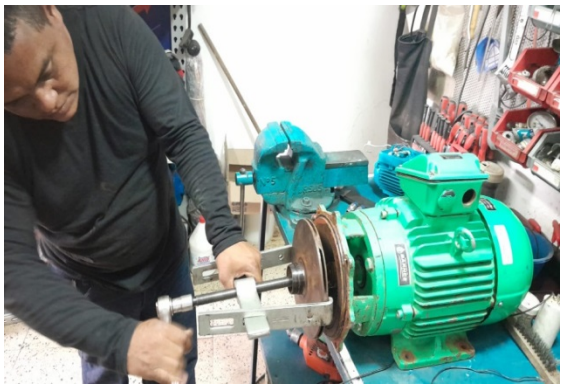
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

			
Foto No. 13	Control de plagas.	Foto No. 14	Control de plagas.
			
Foto No. 15	Aireación con pines sólidos.	Foto No. 16	Supervisión en terreno de labores contractuales.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

			
Foto No. 13	Aireación con pines sólidos.	Foto No. 14	Verticut Leve.
			
Foto No. 15	Reparación de Apiques o Divots.	Foto No. 16	Reparación de Apiques o Divots.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

			
Foto No. 13	Fondo Agotable.	Foto No. 14	Fondo Agotable.
			
Foto No. 15	Demarcación de campo.	Foto No. 16	Limpieza permanente y retiro de sobrantes.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

REGISTRO FOTOGRÁFICO.
MANTENIMIENTO DE GRAMAS EXTERIORES
UNIDAD DEPORTIVA SAN FERNANDO.



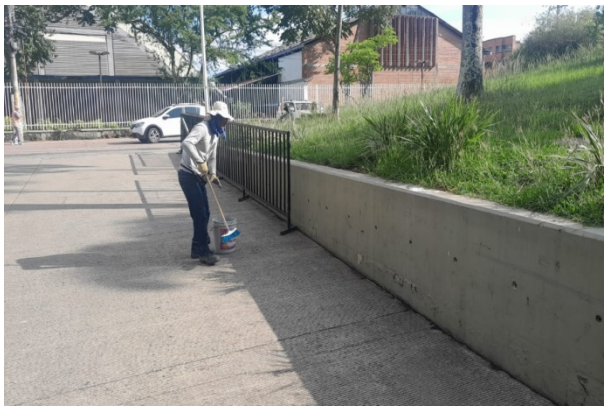


Foto No. 17	Limpieza permanente para zonas expuestas por contaminación.

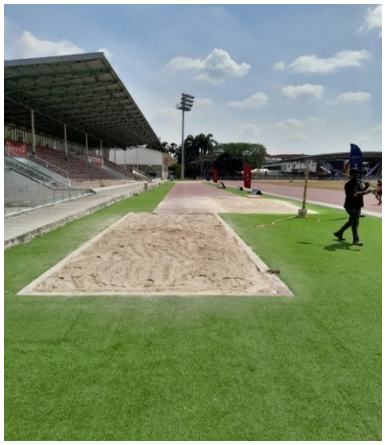
ITEM 2. MANTENIMIENTO GRAMA NATURAL DEL ESTADIO INTERNACIONAL DE ATLETISMO PEDRO GRAJALES - CANCHA EN PISTA PRINCIPAL.





Foto No. 1	Corte técnico con maquina Giro Cero	Foto No. 2	Aplicación de agua de riego con sistema de riesgo por aspersión.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

			
Foto No. 3	Aplicación de agua de riego con cañón.	Foto No. 4	Mantenimiento de fosos de caída y otras áreas en arena.
			
Foto No. 5	Mantenimiento de fosos de caída y otras áreas en arena.	Foto No. 6	Control de plagas y enfermedades.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

			
Foto No. 7	Aireación con Pines Sólidos.	Foto No. 8	Disposición final de sobrantes.

ITEM 3- MANTENIMIENTO GRAMA NATURAL DEL ESTADIO INTERNACIONAL DE ATLETISMO PEDRO GRAJALES - CANCHA EN PISTA DE CALENTAMIENTO.

			
Foto No. 1	Corte Técnico de la grama.	Foto No. 2	Riego de la grama.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

			
Foto No. 3	Riego del gramado, presión y caudal adecuados.	Foto No. 4	Fertilización granular.
			
Foto No. 5	Deshierbe y control de malezas.	Foto No. 6	Deshierbe y control de malezas.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

			
Foto No. 3	Fertilización granular.	Foto No. 4	Control de plagas y enfermedades.
			
Foto No. 5	Reparación de apiques o divots.	Foto No. 6	Reparación de apiques o divots.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

			
Foto No. 7	Top Dressing.	Foto No. 8	Top Dressing.
			
Foto No. 7	Disposición final de sobrantes.	Foto No. 8	Disposición final de sobrantes.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ITEM 4 - MANTENIMIENTO GRAMA NATURAL DEL DIAMANTE DE BÉISBOL.

			
Foto No. 1	Corte de la grama con máquina Giro cero.	Foto No. 2	Corte del gramado.
			
Foto No. 3	Aplicación de lámina de riego	Foto No. 4	Sistema de riego por aspersión.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

			
Foto No. 5	Deshierbe y control de malezas.	Foto No. 6	Arreglo de apiques ó divots.
			
Foto No. 7	Fertilización granulada.	Foto No. 8	Control de Plagas y enfermedades.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

			
Foto No. 9	Aireación con pines sólidos.	Foto No. 10	Aireación con pines sólidos.
			
Foto No. 11	Arreglo de apiques ó divots.	Foto No. 12	Arreglo de apiques ó divots.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

			
Foto No. 13	Mantenimiento del infield – áreas en polvo de ladrillo.	Foto No. 14	Mantenimiento del infield – áreas en polvo de ladrillo.
			
Foto No. 15	Disposición final de sobrantes.	Foto No. 16	Disposición final de sobrantes.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ITEM 5 - MANTENIMIENTO GRAMA NATURAL DEL DIAMANTE DE SOFTBOL.

			
Foto No. 1	Corte Técnico del gramado.	Foto No. 2	Corte Técnico del gramado.
			
Foto No. 3	Aplicación de agua de riego.	Foto No. 4	Aplicación de agua de riego.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

			
Foto No. 5	Deshierbe y control de malezas.	Foto No. 6	Deshierbe y control de malezas.
			
Foto No. 7	Fertilización granular.	Foto No. 8	Fertilización granular.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

			
Foto No. 9	Control de plagas y enfermedades.	Foto No. 10	Top Dressing.
			
Foto No. 11	Arreglo de apiques ó divots.	Foto No. 12	Arreglo de apiques ó divots.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

			
Foto No. 13	Arreglo de apiques ó divots.	Foto No. 14	Top Dressing.
			
Foto No. 15	Top Dressing.	Foto No. 16	Mantenimiento del infield – áreas en polvo de ladrillo.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

			
Foto No. 17	Disposición final de sobrantes.	Foto No. 18	Disposición final de sobrantes.

ITEM 6 - TIRO CON ARCO.

			
Foto No. 1	Corte de la grama con máquina Giro cero.	Foto No. 2	Corte de Zona Verde con guadaña.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

			
Foto No. 3	Limpieza y retiro de sobrantes.	Foto No. 4	Limpieza y retiro de sobrantes.

ITEM 7- MANTENIMIENTO DE GRAMAS EXTERIORES.
ITEM 7.01: UNIDAD DEPORTIVA JAIME APARICIO.

			
Foto No. 1	Mantenimiento de zonas verdes.	Foto No. 2	Recolección de residuos vegetales.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

RECIBO A SATISFACCIÓN: N/A

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: N/A

6.RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

NO SE REPORTAN RECOMENDACIONES EN ESTE PERIODO.


7.FIRMAS RESPONSABLES



EDGAR ALFREDO MARTÍNEZ BALANTA.
Nombre y firma del Supervisor



HECTOR MARIO ESCUDERO TRIVIÑO
Apoyo a la Supervisión



LUIS SEBASTIAN HERRERA CARDONA
Apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: DISTRITO SANTIAGO DE CALI, 23 NOVIEMBRE DE 2025

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
