ANEXO ACTA DE CONTRATO DE OBRA

ANEXO AL ACTA Nº 02 DEL CONTRATO SAMC-002-2025
(ACTA DE RECIBO PARCIAL __X__ ACTA DE RECIBO FINAL _____)

ALCALDÍA DE CONTRATACIÓN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO : SAMC-002-2025

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LAS VÍAS SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE CONTRATACION EN EL MARCO DEL CONVENIO N°CO1.PCCNTR.6937310 (IT-CD-24-14) CON EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

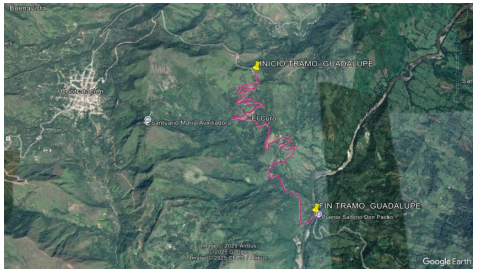
VALOR: $ 348,697,142.87 % EJECUCION **100.00%**

ITEM	NORMA ESPECIFICACION TECNICA	DESCRIPCION ITEM	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES EJECUTADAS (ACTA No.1)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACTA No.2)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)	
			UNID	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1		**MANTENIMIENTO VIAS CONTRATACIOJ**												
1.1		Desmonte y Limpieza en Zonas No Boscosas	Ha	3.00	$ 418,374.81	$ 1,255,124.44	0.00	$ -		$ -			0.00	$ -
1.2		Remoción Manual de Derrumbes Menores	M3	10.15	$ 40,660.00	$ 412,699.00	0.00	$ -		$ -			0.00	$ -
1.3		Limpieza a Mano de Cunetas, Zanjas y Descoles	ml	1,015.20	$ 10,103.70	$ 10,257,280.00	436.98	$ 4,415,116.44	210.00	$ 2,121,777.78	$ 226.98	$ 2,293,338.67	436.98	$ 4,415,116.44
1.4		Limpieza a Mano de Alcantarillas	und	30.00	$ 143,265.93	$ 4,297,977.78	5.00	$ 716,329.63	5.00	$ 716,329.63			5.00	$ 716,329.63
1.5		Transporte de material de afirmado y provenientes de la excavación de la explanación y deslizamientos, para distancias mayores de mil metros (1,000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	21,070.72	$ 1,845.19	$ 38,879,380.39	6,062.03	$ 11,185,567.95	4,679.61	$ 8,634,752.58	$ 1,382.42	$ 2,550,815.37	6,062.03	$ 11,185,567.95
1.6		Remoción de Derrumbes a Maquina	m3	51.00	$ 6,657.04	$ 339,508.89	50.00	$ 332,851.85	35.00	$ 232,996.30	$ 15.00	$ 99,855.56	50.00	$ 332,851.85
1.7		Poda de la parte aerea de árboles tipo IV	und	30.00	$ 60,940.74	$ 1,828,222.22		$ -		$ -			0.00	$ -
1.8		Conformacion y compactación de calzada existente (no incluye material)	m2	10,405.00	$ 1,716.30	$ 17,858,062.96	73,000.00	$ 125,289,629.63	38,000.00	$ 65,219,259.26	$ 35,000.00	$ 60,070,370.37	73,000.00	$ 125,289,629.63
1.9		Suministro, instalación y compatacion de afirmado (no incluye transporte)	m3	1,041.00	$ 75,480.00	$ 78,574,680.00	1,541.53	$ 116,354,684.40	1,190.00	$ 89,821,200.00	$ 351.53	$ 26,533,484.40	1,541.53	$ 116,354,684.40
													0.00	
		COSTO DIRECTO OBRA				**$ 153,702,935.68**		**$ 258,294,179.90**		**$ 166,746,315.54**		**$ 91,547,864.36**		**$ 258,294,179.90**
		ADMINISTRACIÓN			29%	$ 44,573,851.35		$ 74,905,312.17		$ 48,356,431.51		$ 26,548,880.66		$ 74,905,312.17
		IMPREVISTOS			1%	$ 1,537,029.36		$ 2,582,941.80		$ 1,667,463.16		$ 915,478.64		$ 2,582,941.80
		UTILIDAD			5%	$ 7,685,146.78		$ 12,914,709.00		$ 8,337,315.78		$ 4,577,393.22		$ 12,914,709.00
		COSTO INDIRECTO OBRA				**$ 53796027.490.00**		**$ 90,402,963**		**$ 225,107,525.99**		**$ 123,589,616.88**		**$ 348,697,142.87**
		COSTO TOTAL DE OBRA				**$ 207.498.963**		**$ 348.697.143**						
		PMT				**$ 9,444,130**								
		PMA				**$ 15,521,800**								
		VALOR TOTAL DEL PROYECTO				**$ 232,464,893.17**		**$ 348,697,142.87**		**$ 225,107,525.99**		**$ 123,589,616.88**		**$ 348,697,142.87**

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: **CIENTO VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS MCTA ($123.589.616,88)**

CARLOS CASTILLO RUEDA
REP. LEGAL COOPRESSTA NIT 804.013.342-7
CONTRATISTA

DIEGO FERNANDO MORENO CARREÑO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
MUNICIPIO DE CONTRATACION

MEMORIAS DE CONSTRUCCION											
PROYECTO	OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LAS VÍAS SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE CONTRATACION EN EL MARCO DEL CONVENIO N°CO1.PCCNTR.6937310 (IT-CD-24-14) CON EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER										
LOCALIZACION	VIA CONTRATATACION-GUADALUPE		**DESCRIPCIÓN:**		Limpieza a Mano de Cunetas, Zanjas y Descoles						
COORDENADAS MAGNA SIRGAS	INICIO					FINAL					
ITEM	1.3	**UNIDAD**	**ML**	**INICIO**				**FINAL**			
ESQUEMA					**Dimensiones**					**LONGITUD REALIZADA EN LIMPIEZA DE CUNETAS**	**Medida Total**
						Localización		**Longitud**	**Descripción**		
						Inicio	**Fin**	**KM**			**ML**
						TRAMO 1				**ML**	
						K0+000.00	K7+000.00	7.00	TRAMO CONTRATACION-GUADALUPE	226.98	226.98
					Subtotal						226.98
					TOTAL						**226.98**

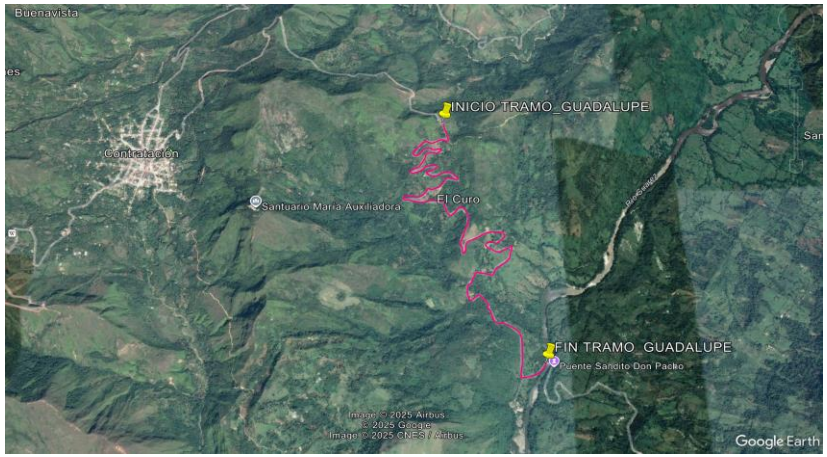
CARLOS CASTILLO RUEDA
REP. LEGAL COOPRESSTA NIT 804.013.342-7
CONTRATISTA

DIEGO FERNANDO MORENO CARREÑO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
MUNICIPIO DE CONTRATACION

MEMORIAS DE CONSTRUCCION

PROYECTO	OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LAS VÍAS SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE CONTRATACION EN EL MARCO DEL CONVENIO N°CO1.PCCNTR.6937310 (IT-CD-24-14) CON EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER				
LOCALIZACION	VIA CONTRATATACION-GUADALUPE	**DESCRIPCIÓN:**	Transporte de material de afirmado y provenientes de la excavación de la explanación y deslizamientos, para distancias mayores de mil metros (1,000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)		
COORDENADAS MAGNA SIRGAS	INICIO			FINAL	
ITEM	1.50 **UNIDAD**	**M3-KM**	**INICIO**	**FINAL**	

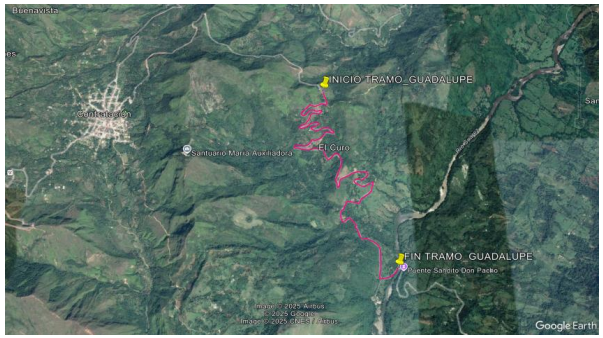
ESQUEMA



KM RECEBERA - RESTAURANTE BRISAS	Dimensiones: Localización Inicio	Localización Fin	Longitud KM	Descripción m	VIAJE #VIAJES	VIAJE M3	KMS TOTALES	TOTAL K
	TRAMO 1							**KM-M3**
	K0+000.00	K7+000.00	3.93	TRAMO CONTRATACION-GUACAMAYO	50	7	351.5411275	1382.42
				Subtotal				1382.42
				TOTAL				**1382.42**

CARLOS CASTILLO RUEDA
REP. LEGAL COOPRESSTA NIT 804.013.342
CONTRATISTA

DIEGO FERNANDO [illegible] CARREÑO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
MUNICIPIO DE CONTRATACION

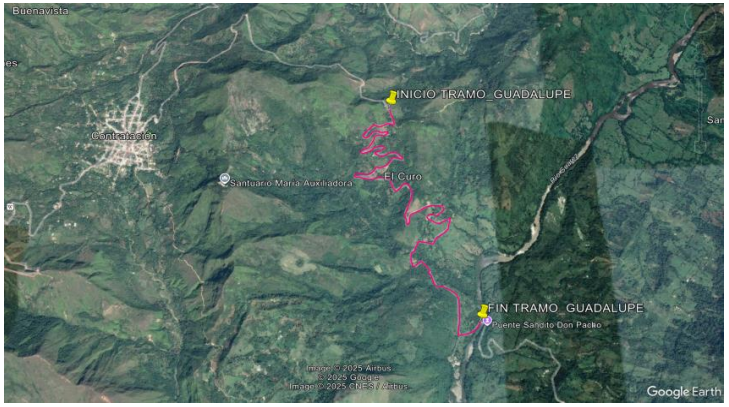
MEMORIAS DE CONSTRUCCION												
PROYECTO	OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LAS VÍAS SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE CONTRATACION EN EL MARCO DEL CONVENIO N°CO1.PCCNTR.6937310 (IT-CD-24-14) CON EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER											
LOCALIZACION	VIA CONTRATATACION-GUADALUPE		**DESCRIPCIÓN:**		Remoción de Derrumbes a Maquina							
COORDENADAS MAGNA SIRGAS	INICIO					FINAL						
ITEM	1.60	**UNIDAD**	**m3**	**INICIO**				**FINAL**				
ESQUEMA					**Dimensiones**					**VIAJE**		**Medida Total**
						Localización		**Longitud**	**Descripción**			
						Inicio	**Fin**	**KM**	**m**			**M3**
						TRAMO 1				**#VIAJES**	**M3**	
						K0+000.00	K7+000.00	7.00	TRAMO CONTRATACION-GUACAMAYO	2	7	15.00
									Subtotal			15.00
									TOTAL			**15.00**

CARLOS CASTILLO RUEDA
REP. LEGAL COOPRESSTA NIT 804.013.342·
CONTRATISTA

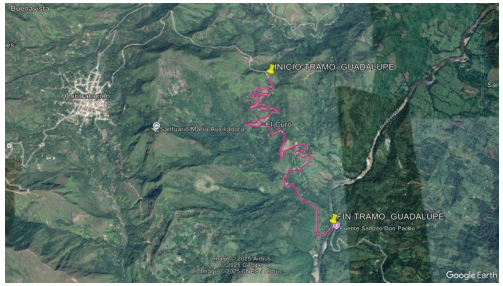
DIEGO FERNANDO MORENO CARREÑO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
MUNICIPIO DE CONTRATACION

MEMORIAS DE CONSTRUCCION

PROYECTO	OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LAS VÍAS SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE CONTRATACION EN EL MARCO DEL CONVENIO N°CO1.PCCNTR.6937310 (IT-CD-24-14) CON EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER								
LOCALIZACION	VIA CONTRATATACION-GUADALUPE		**DESCRIPCIÓN:**		Conformacion y compactación de calzada existente (no incluye material)				
COORDENADAS MAGNA SIRGAS	INICIO					FINAL			
ITEM	1.80	**UNIDAD**	**m2**	**INICIO**			**FINAL**		



ESQUEMA	Dimensiones					Medida Total
	Localización		Longitud	Descripción	ANCHO VIA	
	Inicio	Fin	KM	m		M2
	TRAMO 1					
	K0+000.00	K7+000.00	7.00	TRAMO CONTRATACION-GUACAMAYO	5	35000.00

MEMORIAS DE CONSTRUCCION												
PROYECTO	OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LAS VÍAS SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE CONTRATACION EN EL MARCO DEL CONVENIO N°CO1.PCCNTR.6937310 (IT-CD-24-14) CON EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER											
LOCALIZACION	VIA CONTRATATACION-GUADALUPE		**DESCRIPCIÓN:**		Suministro, instalación y compatacion de afirmado (no incluye transporte)							
COORDENADAS MAGNA SIRGAS	INICIO						FINAL					
ITEM	1.90	**UNIDAD**	**m3**	**INICIO**				**FINAL**				
ESQUEMA					**Dimensiones**					**VIAJE**		**Medida Total**
						Localización		**Longitud**	**Descripción**			
						Inicio	**Fin**	**KM**	**m**			**M3**
						TRAMO 1				**#VIAJES**	**M3**	
						K0+000.00	K7+000.00	7.00	TRAMO CONTRATACION-GUACAMAYO	50	7	351.53
									Subtotal			351.53
									TOTAL			**351.53**

CARLOS CASTILLO RUEDA
REP. LEGAL COOPRESSTA NIT 804.013.342·
CONTRATISTA

DIEGO FERNANDO MORENO CARREÑO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
MUNICIPIO DE CONTRATACION
