ITAF S.A.S
NIT 900.683.861-1

INFORME DE INTERVENTORIA AL CONTRATO DE LICITACIÓN OBRA PÚBLICA LP -SOC-2025-01

ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2025



ALCALDÍA MUNICIPAL SOCORRO-SANTANDER

CALLE 31 NO. 23-40 GIRON - SANTANDER
TELÉFONO: (7) 6812408 - 3153035155
Correo: itafsas@gmail.com

ITAF S.A.S
NIT 900.683.861-1

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE LICITACIÓN OBRA PÚBLICA LP -SOC-2025-01

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, INSTALACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER

TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE CONSULTORIA	
NÚMERO DE CONTRATO	CMA-SOC-2025-01	**FECHA:** 16/07/2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DEL SOCORRO	
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, INSTALACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER	
TERMINO DE DURACIÓN:	CINCO (5) MESES QUINCE (15) DIAS, contados a partir del acta de inicio, hasta el 30 de DICIEMBRE DE 2025	
VALOR:	CIENTO VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIMIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS ($ 127.920.918,00)	
CONTRATISTA:	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ITAF SAS	
SUPERVISOR:	CAMILO JOSE BLANCO RANGEL – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	
FECHA DE INICIO CONTRATO	18/07/2025	
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	30/12/2025	
PERIODO DEL PRESENTE INFORME:	18/10/2025	
	17/11/2025	

CALLE 31 NO. 23-40 GIRON - SANTANDER
TELÉFONO: (7) 6812408 - 3153035155
Correo: itafsas@gmail.com

Contenido

1. EQUIPOS DEL CONTRATISTA. 5
2. EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL CONCESIONARIO 6
3. CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ELEMENTOS PROPUESTOS 7
4. HERRAMIENTAS UTILIZADAS POR EL CONCESIONARIO: 20
5. PARÁMETROS TÉCNICOS TRABAJOS DE OYM, MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN: 21
6. PERSONAL IDÓNEO 21
7. INSPECCIONES SITIOS DE TRABAJO 22
8. ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION GEORREFERENCIADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO. 22
8.1. ADICION DE PUNTOS LUMINOSOS POR EXPANSIONES Literal A Punto 1 Articulo 4.6.2. RETILAP. 23
8.2. SUSTITUCION DE LUMINARIAS POR EFECTO DE LA MODERNIZACION O CAMBIO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA DE MERCURIO O SODIO A LED Literal B Punto 1 Articulo 4.6.2. RETILAP. 24
8.3. DISMINUCION O RETIRO DE LUMINARIAS POR INTERVENCIONES DEL ESPACIO PUBLICO Literal C Punto 1 Articulo 4.6.2. RETILAP. 26
8.4. SUSTITUCION DE MATERIALES Y/O EQUIPOS SIN AFECTAR LA CANTIDAD DE INFRAESTRUCTURA Literal D Punto 1 Articulo 4.6.2. RETILAP. 26
8.5. AUMENTO O DISMINUCION DE LA POTENCIA DE LOS PUNTOS LUMINOSOS Literal E Punto 1 Articulo 4.6.2. RETILAP. 27
9. CUMPLIMIENTO NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y PAGO AL PERSONAL. 27
10. INSTALACIONES Y EQUIPOS. 27
11. INFORMACIÓN REQUERIDA 29
12. PROBLEMAS, RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS PARA MEJORAR EL SERVICIO 29
13. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 30
14. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 30
15. EJECUCION CONTRACTUAL. 31
16. EJECUCION CONTRACTUAL DE LA INTERVENTORIA. 31

GENERALIDADES

Sujetos al compromiso contractual presentamos el Informe del 18 de octubre al 17 de noviembre de 2025, en el cual se muestra de forma resumida las actividades, gestiones, y trabajos adelantados por esta INTERVENTORIA con relación a la ejecución del contrato de CONTRATO DE LICITACIÓN OBRA PÚBLICA LP -SOC-2025-01 del Municipio de SOCORRO a cargo de la firma contratista EDIFICAR SAS.

El primer segmento del presente informe contiene un detalle de las acciones adelantadas con respecto a los Aspectos que hemos considerado de carácter general del mismo.

El Segundo segmento del presente informe contiene el informe con respecto a las acciones de interventoría adelantadas en el ÁREATÉCNICA con base en los resultados de las acciones adelantadas por el personal profesional y técnico de ingeniería eléctrica asignado por INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SAS para cubrir esta área.

El Tercer segmento del presente informe contiene el informe con respecto a las acciones de Interventoría adelantadas en el ÁREA ADMINISTRATIVA con base en los resultados del control ejercido por la gerencia de INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SAS.

El cuarto segmento del presente informe contiene el informe con respecto a las acciones de Interventoría adelantadas en el ÁREA FINANCIERA con base en los resultados de la auditoría adelantada por el personal profesional en el área contable asignados por INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SAS para cubrir este aspecto.

El quinto segmento del presente informe contiene el informe con respecto a las acciones de Interventoría adelantadas en la GESTIÓN AMBIENTAL.
interventoría y la administración municipal.

AREA TECNICA

1. EQUIPOS DEL CONTRATISTA.

En cumplimiento del Numeral 9 del Artículo 4.6.2 del RETILAP y con el objeto de comprobar, controlar y verificar que los equipos utilizados por el contratista sean los óptimos y adecuados para las respectivas tareas, se requirió de manera discriminada y detallada la relación de equipos que EDIFICAR S.A.S tiene puestos al servicio del contrato LP -SOC-2025-01, los cuales han sido verificados, calificados y requerido los cambios que hemos estimado. Los equipos son:

Registro completo de los vehículos del contratista de manera discriminada				
DETALLE	**MODELO**	**SERIE O PLACA**	**CAPACIDAD**	**SOAT TECNO VIGENTES**
DOBLE CABINA	2015	CWW286	**900**	**SI**
GRUA- CAMIÓN	2018	WDF-830	**3560**	**SI**






2. EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL CONCESIONARIO

Con el objeto de comprobar la cantidad de Empleados y Trabajadores que EDIFICAR SAS tiene para cumplir las labores encomendadas por el Municipio de SOCORRO-SANTANDER, Se requirió Lista de empleados y trabajadores y con base en la información suministrada, se verifico el cumplimiento de todos y cada uno de ellos en la labor encomendada, así como sus vinculaciones de ley, pago de parafiscales y demás obligaciones conforme se detalla más adelante.

PERSONAL OPERATIVO						
GABRIEL EMILIO MARTINEZ MARTINEZ	GERENCIA	SI	PENSIONADO	NUEVA EPS	CAJASAN	ARL SURA
BLANCO SOLANO NELSON EDO.	SUPERVISOR	SI	COLPENSIONES	SANITAS	CAJASAN	ARL SURA
ORLANDO MUÑOZ BAZ	OFICIAL ELECTRICISTA	SI	PORVENIR	NUEVA EPS	CAJASAN	ARL SURA
WILSON AMADO ACEVEDO	OFICIAL ELECTRICISTA	SI	PORVENIR	REGIMEN ESPECIAL FOSYGA	CAJASAN	ARL SURA
LUIS CARLOS POSADA ESPARRAGOZA	HSEQ	SI	PROTECCION	SURAMERICANA	NA	ARL SURA

3. CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ELEMENTOS PROPUESTOS

En cumplimiento del Numeral 9 del Artículo 4.6.2 del RETILAP y con el objeto de comprobar la calidad de los materiales y elementos instalados por el contratista en las labores de alumbrado público a él encomendadas por el Municipio de SOCORRO - SANTANDER, se solicitaron fichas técnicas, certificados Retilap con las cuales se pudieron verificar las características técnicas de los materiales por ellos instalados y verificado que los mismos cumplan con las especificaciones propuestas:

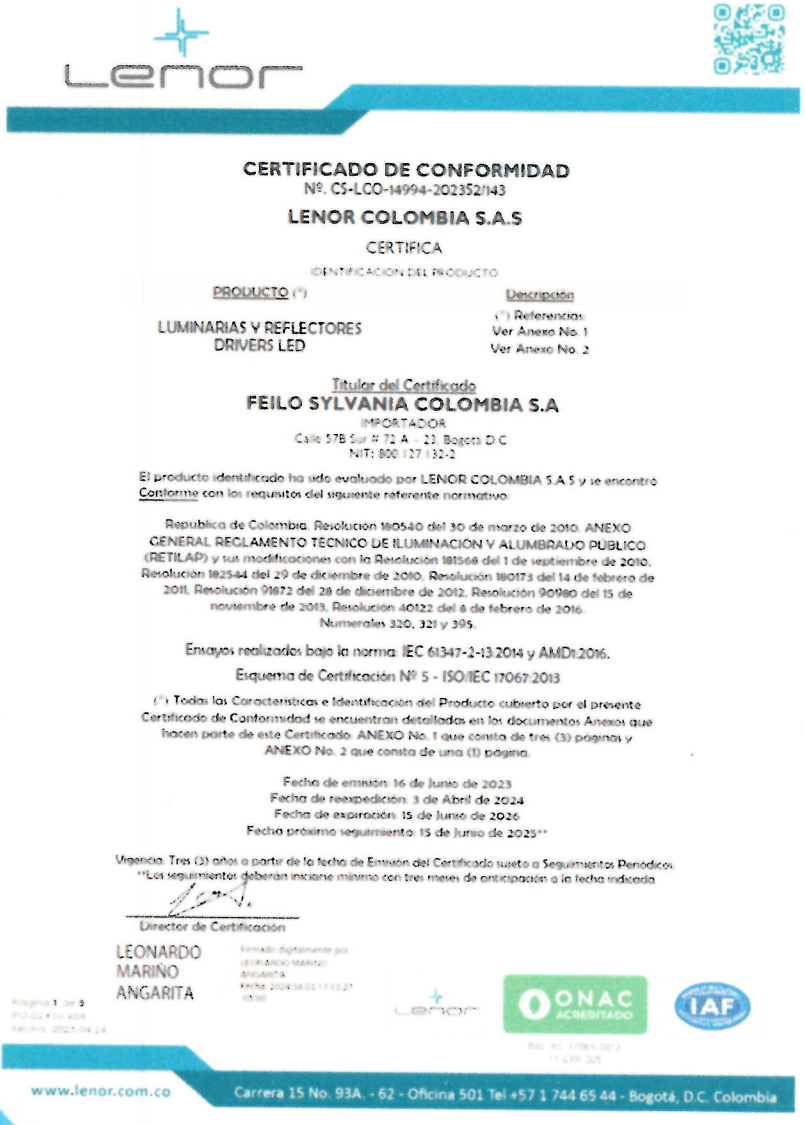

LENOR

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
Nº. CS-LCO-14994-202352/143

LENOR COLOMBIA S.A.S

CERTIFICA

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

PRODUCTO (*)	Descripción
LUMINARIAS Y REFLECTORES DRIVERS LED	(*) Referencias: Ver Anexo No. 1 Ver Anexo No. 2

Titular del Certificado
FEILO SYLVANIA COLOMBIA S.A
IMPORTADOR
Calle 57B Sur # 72 A - 23, Bogotá D.C
NIT: 800.127.132-2

El producto identificado ha sido evaluado por LENOR COLOMBIA S.A.S y se encontró Conforme con los requisitos del siguiente referente normativo:

República de Colombia. Resolución 180540 del 30 de marzo de 2010. ANEXO GENERAL REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO (RETILAP) y sus modificaciones con la Resolución 181568 del 1 de septiembre de 2010, Resolución 182544 del 29 de diciembre de 2010, Resolución 180173 del 14 de febrero de 2011, Resolución 91872 del 28 de diciembre de 2012, Resolución 90980 del 15 de noviembre de 2013, Resolución 40122 del 8 de febrero de 2016.
Numerales 320, 321 y 395.

Ensayos realizados bajo la norma: IEC 61347-2-13:2014 y AMD1:2016.

Esquema de Certificación Nº 5 - ISO/IEC 17067:2013

(*) Todas las Características e Identificación del Producto cubierto por el presente Certificado de Conformidad se encuentran detalladas en los documentos Anexos que hacen parte de este Certificado: ANEXO No. 1 que consta de tres (3) páginas y ANEXO No. 2 que consta de una (1) página.

Fecha de emisión: 16 de Junio de 2023
Fecha de reexpedición: 3 de Abril de 2024
Fecha de expiración: 15 de Junio de 2026
Fecha próximo seguimiento: 15 de Junio de 2025**

Vigencia: Tres (3) años a partir de la fecha de Emisión del Certificado sujeto a Seguimientos Periódicos.
**Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con tres meses de anticipación a la fecha indicada

Director de Certificación
LEONARDO MARIÑO ANGARITA

ONAC ACREDITADO IAF

www.lenor.com.co Carrera 15 No. 93A. - 62 - Oficina 501 Tel +57 1 744 65 44 - Bogotá, D.C. Colombia

Lenor

ANEXO No. 1 Certificado de Conformidad Nº. CS-LCO-14994-202352/143 LUMINARIAS Y REFLECTORES		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERISTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
1	LED HIGHBAY GC350 POTENCIAS 50W, 60W, 80W, 90W, 100W, 110W, 120W, 140W, 150W, 160W, 165W, 180W, 200W, 220W, 225W, 240W, 320W, 400W TENSIONES 85V-265V, 100V-240V, 100V-277V, 198V-242V, 200V-220V, 200V240V, 220V-277V, 208V-480V TEMPERATURA DE COLOR 2.700 - 3.000K(WW), 4.000-4.100K(NW), 5.000-5.700K(CW), 6.000- 6.500K(DL) IP65	GC350
2	LED HIGHBAY GC350-DIM POTENCIAS 50W, 60W, 80W, 90W, 100W, 110W, 120W, 140W, 150W, 160W, 165W, 180W, 200W, 220W, 225W, 240W, 320W, 400W TENSIONES 85V265V, 100V-240V, 100V-277V, 198V-242V, 200V-220V, 200V- 240V, 220V-277V, 208V-480V TEMPERATURA DE COLOR 2.700 -3.000K(WW), 4.000-4.100K(NW), 5.000-5.700K(CW), 6.000-6.500K(DL) IP65	GC350-DIM
3	LED HIGHBAY GC350-DIM-SENSOR POTENCIAS 50W, 60W, 80W, 90W, 100W, 110W, 120W, 140W, 150W, 160W, 165W, 180W, 200W, 220W, 225W, 240W, 320W, 400W TENSIONES 85V-265V, 100V-240V, 100V-277V, 198V-242V, 200V-220V, 200V-240V, 220V-277V, 208V-480V TEMPERATURA DE COLOR 2.700 -3.000K(WW), 4.000-4.100K(NW), 5.000- 5.700K(CW), 6.000-6.500K(DL) IP65	GC350-DIM-SENSOR
4	LED HIGHBAY GC015 POTENCIAS 50W, 60W, 80W, 90W, 100W, 110W, 120W, 140W, 150W, 160W, 165W, 180W, 200W, 220W, 225W, 240W TENSIONES 85V-265V, 100V-240V, 100V- 277V, 198V-242V, 200V-220V, 200V-240V, 220V-277V TEMPERATURA DE COLOR 2.700 -3.000K(WW), 4.000- 4.100K(NW), 5.000-5.700K(CW), 6.000-6.500K(DL) IP65	GC015
5	LED STREET LIGHT URBAN POTENCIAS 20W, 25W, 30W, 35W, 40W, 45W, 50W, 55W, 60W, 65W, 70W, 75W, 80W, 85W, 90W, 95W, 100W, 110W, 120W, 130W, 140W, 150W, 160W, 170W, 180W, 190W, 200W, 210W, 220W, 230W, 240W, 250W, 260W, 270W, 280W, 290W, 300W, 18W-35W, 30W-60W, 45W-90W, 60W-120W, 75W-150W, 100W-200W, 90W-180W, 110W-220W, 125W-250W, 140W-280W, 150W-300W TENSIONES 12V DC, 24V DC, 100V-240V, 100V- 277V, 198V- 242V, 200V-240V, 220V-240V TEMPERATURA DE COLOR 2.700 -3.000K(WW), 4.000-4.100K(NW), 5.000- 5.700K(CW), 6.000-6.500K(DL) IP66	LED STREET LIGHT URBAN

Lenor ONAC ACREDITADO IAF
ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

www.lenor.com.co
Carrera 15 No. 93A. - 62 - Oficina 501 Tel +57 1 744 65 44 - Bogotá, D.C. Colombia

CALLE 31 NO. 23-40 GIRON - SANTANDER
TELÉFONO: (7) 6812408 - 3153035155
Correo: itafsas@gmail.com

Lenor

ANEXO No. 1 Certificado de Conformidad Nº. CS-LCO-14994-2023S2/143 LUMINARIAS Y REFLECTORES		
ITEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERISTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
6	LED STREET LIGHT ZD216 POTENCIAS 20W, 25W, 30W, 35W, 40W, 45W, 50W, 55W, 60W, 65W, 66W, 70W, 75W, 80W, 85W, 90W, 95W, 100W, 110W, 120W, 130W, 135W, 140W, 150W, 160W, 165W, 170W, 180W, 190W, 200W, 210W, 220W, 240W, 30W-40W, 50W-60W, 50W-80W, 70W-100W, 110W-150W, 150W-200W TENSIONES 12V DC, 24V DC, 100V-240V, 100V-277V, 198V-242V, 200V-240V, 220V-240V TEMPERATURA DE COLOR 2.700 -3.000K(WW), 4.000-4.100K(NW), 5.000-5.700K(CW), 6.000-6.500K(DL) IP65 / IP66	ZD216
7	LED SVLFLOOD POTENCIAS 50W, 55W, 60W, 65W, 70W,75W, 80W, 85W, 90W, 95W, 100W, 105W, 110W, 115W, 120W,125W, 130W, 135W, 140W, 145W, 150W, 155W, 160W, 165W,170W, 175W, 180W, 185W, 190W, 195W, 200W, 210W, 215W,220W, 225W, 230W, 235W, 240W, 250W, 260W, 270W,280W, 300W, 350W, 400W, 450W, 500W, 550W, 600W,650W, 700W, 750W, 800W, 850W, 900W, 950W, 960W,1000W, 1200W, 1500W TENSIONES 12VDC, 24VDC, 120V,100V-240V, 100V-277V, 120V-277V, 85V-265V, 220V-240V, 277-480V TEMPERATURA DE COLOR RGB 2.700-3.000K(WW),4.000-4.100K(NW), 5.000-5.700K(CW), 6.000-6.500K(DL)IP66	LED SVLFLOOD
8	LED STREET LIGHT URBAN POTENCIAS 20W, 25W, 30W, 35W, 40W, 45W, 50W, 55W, 60W, 65W, 70W, 75W, 80W, 85W, 90W, 95W, 100W, 110W, 120W, 130W, 140W, 150W, 160W, 170W, 180W, 190W, 200W, 210W, 220W, 230W, 240W, 250W, 260W, 270W, 280W, 290W, 300W, 18W-35W, 30W-60W, 45W-90W, 60W-120W, 75W-150W, 100W-200W, 90W-180W, 110W-220W, 125W-250W, 140W-280W, 150W-300W TENSIONES 12V DC, 24V DC, 100V-240V, 100V-277V, 198V- 242V, 200V-240V, 220V-240V TEMPERATURA DE COLOR 2.700 -3.000K(WW), 4.000-4.100K(NW), 5.000-5.700K(CW), 6.000-6.500K(DL) IP66 CLASE II	LED STREET LIGHT URBAN CII
9	LED SVL-STREET POTENCIAS 20W, 25W, 30W, 35W, 40W, 45W, 50W, 55W, 60W, 65W, 70W, 75W, 80W, 85W, 90W, 95W, 100W, 110W, 120W, 130W, 140W, 150W, 160W, 170W, 180W, 190W, 200W, 18W-35W, 22W-35W, 30W-60W, 36W-60W, 40W-80W, 45W-90W, 60W-120W, 66W-100W, 75W150W, 94W-120W, 96W-150W, 100W-200W, 90W-180W, 110W-200W, 125W-200W, 136W-200W, 140W-200W, 150W-200W TENSIONES 12V DC, 24V DC, 100V-240V, 100V-277V, 198V- 242V, 200V-240V, 220V-240V, 277V-480V TEMPERATURA DE COLOR 2.700 -3.000K(WW),	LED SVL-STREET

Lenor ONAC ACREDITADO IAF
ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

www.lenor.com.co
Carrera 15 No. 93A. - 62 - Oficina 501 Tel +57 1 744 65 44 - Bogotá, D.C. Colombia

CALLE 31 NO. 23-40 GIRON - SANTANDER
TELÉFONO: (7) 6812408 - 3153035155
Correo: itafsas@gmail.com

ANEXO No. 1 Certificado de Conformidad Nº. CS-LCO-14994-2023S2/143 LUMINARIAS Y REFLECTORES		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERISTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
	4.000-4.100K(NW), 5.000-5.700K(CW), 6.000-6.500K(DL) IP66	
10	LED SVL-STREET POTENCIAS 20W, 25W, 30W, 35W, 40W, 45W, 50W, 55W, 60W, 65W, 70W, 75W, 80W, 85W, 90W, 95W, 100W, 110W, 120W, 130W, 140W, 150W, 160W, 170W, 180W, 190W, 200W, 18W-35W, 22W-35W, 30W-60W, 36W-60W, 40W-80W, 45W-90W, 60W-120W, 66W-100W, 75W-150W, 94W-120W, 96W-150W, 100W-200W, 90W-180W, 110W-200W, 125W-200W, 136W-200W, 140W-200W, 150W-200W TENSIONES 12V DC, 24V DC, 100V-240V, 100V-277V, 198V- 242V, 200V-240V, 220V-240V TEMPERATURA DE COLOR 2.700 -3.000K(WW), 4.000-4.100K(NW), 5.000-5.700K(CW), 6.000-6.500K(DL) IP66 CII	LED SVL-STREET CII

FIN DEL ANEXO No. 1

www.lenor.com.co
Carrera 15 No. 93A. - 62 - Oficina 501 Tel +57 1 744 65 44 - Bogotá, D.C. Colombia

CALLE 31 NO. 23-40 GIRON - SANTANDER
TELÉFONO: (7) 6812408 - 3153035155
Correo: itafsas@gmail.com

ANEXO No. 2 Certificado de Conformidad Nº. CS-LCO-14994-2023S2/143 DRIVERS LED		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERISTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
1	LED DRIVER DESDE 26W HASTA 150W TENSIONES SALIDA DC 20-34VDC, 24-36VDC, 30-42VDC, 36-48VDC, 42-54VDC, 48-59VDC, 48-60VDC, 60-84VDC CORRIENTES SALIDA 0.42-0.58A, 0.5-0.7A, 0.65-0.87A, 0.73-0.99A, 0.85-1.15A, 0.98-1.35A, 98-1.33A, 1.1-1.47A, 1.2-1.5A, 1.2-3A, 1.27-1.72A, 1.3-1.7A, 1.5A, 1.5-2.0A, 1.71A, 2.0A, 1.4-2A, 1.5-2.0A, 1.6-2.3A, 1.7-2.4A, 1.8-2.8A, 1.9-2.7A, 2-3.6A, 2.0-3.0A, 2.2-3.3A, 2.3-3.5A, 2.4A, 2.5-4.0A, 2.9-4.5A, 2.6-4.0A, 2.7-4.2A, 3.0-5.3A	LED DRIVER

FIN DEL ANEXO No. 2

www.lenor.com.co
Carrera 15 No. 93A. - 62 - Oficina 501 Tel +57 1 744 65 44 - Bogotá, D.C. Colombia

CALLE 31 NO. 23-40 GIRON - SANTANDER
TELÉFONO: (7) 6812408 - 3153035155
Correo: itafsas@gmail.com

ITAF S.A.S
NIT 900.683.861-1

LED Street ZD229

LED STREET ZD229 NW 3P

SYLVANIA

Ficha Tecnica - Rv 02



INFORMACION GENERAL

Luminaria LED para alumbrado público, iluminación vial y exterior, con diseño moderno y robusto, fabricada en un cuerpo de aluminio inyectado. Montaje en tubo de soporte para poste horizontal o en punta. Proyección uniforme de la luz, que reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

BENEFICIOS

Diseño moderno con fuente LED SMD y lentes en policarbonato.
Chasis robusto en aluminio inyectado y liviano, con vidrio de protección plano de alta transmitancia.
Base para fotocelda de 3 pines, opcional con base de 7 pines.
Driver atenuable 0-10 VDC y configurable con reóstato de ajuste. Soporte con ángulo ajustable para facil instalación y 10 años de garantía.

APLICACIONES

Código	Potencia de entrada (w)	Corriente de entrada (A) @220VAC	Flujo luminoso (lm)	Eficacia (lm/W)	Número de chip LED	Dimensiones (LxWxH) (mm)
P29450	25 - 35	0.11-0.15	4143 - 5800	155	80 pcs	515x190x98
P29451	30 - 50	0.13-0.22	4800 - 8000	160	100 pcs	515x190x98
P29452	40 - 60	0.18-0.27	6200 - 9300	155	120 pcs	515x190x98
P29453	55 - 80	0.25-0.36	9580 - 12640	158	160 pcs	575x242x109
P29454	45 - 100	0.20-0.45	6975 - 15500	155	200 pcs	575x242x109
P29455	60 - 120	0.27-0.54	9420 - 18840	157	240 pcs	615x262x110
P29456	70 - 150	0.31-0.68	10500 - 22500	150	288 pcs	615x262x110
P29458	80 - 200	0.36-0.90	12560 - 31400	157	360 pcs	685x287x110


DATOS OPTICOS

Temperatura de color	4000K
Tipo de distribucion	Tipo II S
Vida útil estimada L70	100000 h
Reproducción de color (IRC)	>70
Consistencia de color	SDCM ≤ 7
Tipo chip LED	SMD 3030
Tipo de Lente	PC
Transmitancia Lente	92%
Lentes con distribucion unica	SI
Difusor	Vidrio plano
Difusor	Alta transmitancia
Angulo de inclinacion	-15° a 15°
Flujo Hemisferico Superio FHS	0%


DATOS FISICOS

Acabado	Gris RAL7004
Grado IP conjunto óptico/electr	IP66
Grado IK conjunto óptico/electr	IK08

DIMENSIONES



DRIAGRAMA DE CONEXIÓN



By FEILO SYLVANIA

CALLE 31 NO. 23-40 GIRON - SANTANDER
TELÉFONO: (7) 6812408 - 3153035155
Correo: itafsas@gmail.com

ITAF S.A.S
NIT 900.683.861-1

LED Street ZD229

LED STREET ZD229 NW 3P


SYLVANIA

Ficha Tecnica - Rv-02

Material Chasis	Aluminio inyectado
Material optica	PC
Tipo de montaje	Brazo horizont/Vertic
Tipo de uso	Exterior
Tipo de producto	Alumbrado público
Diametro brazo(a)	50-60 mm
Peso 35/50/60W	2.5 Kg
Peso 80/100W	3.4 Kg
Peso 120/150W	4.0 Kg
Peso 200W	4.9 Kg
Temperatura de operación Ta	25°C ~ +45°C

DATOS ELECTRICOS	
Tensión de entrada (V)	100-277 VAC
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	0.9
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Corriente Constante
Atenuable	Señal 0-10V
Proteccion Corto Circuito/Temp	SI
Eficiencia driver	>80%
Clase aislamiento	Clase I
Protección integrada driver	10KV linea tierra
Protección Transitorios exter	DPS 10KV
Base fotocelda 35/50/60W	NEMA 3 pin
Base fotocelda 80/100/120W	NEMA 7 pin
Base fotocelda 150/200W	NEMA 7 pin
Fotocelda	No incluida
** No requiere accesorios	electricos adicionales para su normal funcionamiento**

ANGULOS DE INCLINACIÓN

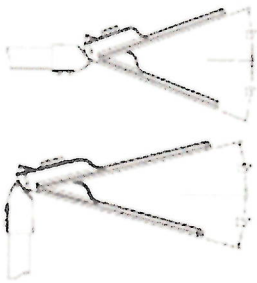

DIMENSIÓN DE BRAZO



*Ø de brazo 50 a 60 mm
**Tornillo M8X25
***Herramienta a utilizar llave Bristol (no incluida)


FOTOMETRIA 35W



FOTOMETRIA 50W

FOTOMETRIA 60W

FOTOMETRIA 80W

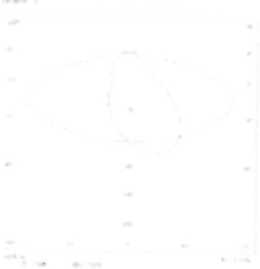

FOTOMETRIA 100W

FOTOMETRIA 120W

FEILO SYLVANIA

CALLE 31 NO. 23-40 GIRON - SANTANDER
TELÉFONO: (7) 6812408 - 3153035155
Correo: itafsas@gmail.com

ITAF S.A.S
NIT 900.683.861-1

LED Street ZD229

LED STREET ZD229 NW 3P

SYLVANIA

FOTOMETRIA 150W

FOTOMETRIA 200W

CORRIENTES DE OPERACIÓN

LED SYL-STREET ZD229 25W-35W

Corriente Módulo (mA)	Flujo Luminoso (lm)	Potencia (W)
300	5600	35
274	5303	32
240	4640	28
214	4143	25

LED SYL-STREET ZD229 30W-50W

Corriente Módulo (mA)	Flujo Luminoso (lm)	Potencia (W)
340	8000	50
299	7040	44
252	5929	37
204	4800	30

CORRIENTES DE OPERACIÓN

LED SYL-STREET ZD229 40-60W

Corriente Módulo (mA)	Flujo Luminoso (lm)	Potencia (W)
340	9300	60
300	8215	53
266	7285	47
227	6200	40

LED SYL-STREET ZD229 35-80W

Corriente Módulo (mA)	Flujo Luminoso (lm)	Potencia (W)
435	12640	80
353	10270	65
272	7900	50
190	5530	35

CORRIENTES DE OPERACIÓN

LED SYL-STREET ZD229 45-100W

Corriente Módulo (mA)	Flujo Luminoso (lm)	Potencia (W)
440	15500	100
361	12710	82
277	9765	63
198	6975	45

LED SYL-STREET ZD229 60-120W

Corriente Módulo (mA)	Flujo Luminoso (lm)	Potencia (W)
680	18640	120
567	15700	100
453	12560	80
340	9430	60

CORRIENTES DE OPERACIÓN

LED SYL-STREET ZD229 70-150W

Corriente Módulo (mA)	Flujo Luminoso (lm)	Potencia (W)
735	22500	150
603	18450	123
475	14550	97
343	10500	70

LED SYL-STREET ZD229 80-200W

Corriente Módulo (mA)	Flujo Luminoso (lm)	Potencia (W)
745	31400	200
596	25120	160
447	18840	120
298	12560	80

FEILO SYLVANIA

CALLE 31 NO. 23-40 GIRON - SANTANDER
TELÉFONO: (7) 6812408 - 3153035155
Correo: itafsas@gmail.com

ITAF S.A.S
NIT 900.683.861-1

LED SYLFLOOD

LED SYLFLOOD CW 15° 45° LW UNV

SYLVANIA



**Imagen de referencia

INFORMACION GENERAL

El nuevo LED Sylflood es una completa gama de proyectores de uso exterior para reemplazar los tradicionales reflectores de HID , diseño moderno y robusto con driver de alto desempeño. Incluye caja protectora para driver & DPS, además de DPS 10kV. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

BENEFICIOS

Diseño moderno y robusto, resistente a la humedad.
Chasis en aluminio extruido.
Lentes en material de alta transmitancia >90% en el espectro visible.
Driver dimerizable 0-10V.

APLICACIONES

Código	Potencia de entrada (W)	Angulo de apertura (°)	Flujo luminoso (lm)	Eficacia (lm/W)	Corriente de entrada (A) @220VAC	Dimensiones (mm) (LxWxH)
P27762	300	45	50100	167	1.30	545x163x137
P27763	400	45	71200	178	1.81	593x381x148
P27764	600	45	99000	165	2.72	593x381x148
P27765	800	15	116000	145	3.63	551x499x195
P29745	800	45	128000	160	3.63	551x499x195
P27766	960	15	142080	148	4.36	551x499x195
P29746	960	45	153600	160	4.36	551x499x195
P27767	1200	15	181200	151	5.45	607x551x195
P27768	1500	15	214500	143	6.81	837x551x195


DATOS OPTICOS

Temperatura de color	5000K
Tipo de distribución	Directa asimétrica
Reproducción de color (IRC)	>70
Vida útil L70	100000h *
Flujo Hemisférico superior (FHS)	0% (pendiente)

DATOS FISICOS

Acabado	Gris RAL7042
Grado de protección IK	IK08
Grado de protección IP	IP66
Peso 300W	6.3 Kg
Peso 400W-600W	11 Kg
Peso 800W-960W	20 Kg
Peso 1200W	26.6 Kg
Peso 1500W	30.7 Kg
Tipo de uso	Exterior
Tipo de montaje	Soporte orientable
Material del chasis	Aluminio extruido

DIMENSIONES



SISTEMA DE FIJACION 300 A 600W



FEILO SYLVANIA

CALLE 31 NO. 23-40 GIRON - SANTANDER
TELÉFONO: (7) 6812408 - 3153035155
Correo: itafsas@gmail.com

ITAF S.A.S
NIT 900.683.861-1

LED SYLFLOOD

LED SYLFLOOD CW 15° 45° LW UNV

SYLVANIA


Ficha Tecnica Rv 02

Material optica	Lente PMMA
Temperatura de operación Ta	25°C ~ +45°C
Dimensiones sistema de fijación	Ver diagrama
DATOS ELECTRICOS	
Tension de operación	120-277VAC~
Frecuencia	50/60Hz
Factor de potencia	0.9
Distorsión Armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Corriente constante
Atenuable	Si (0-10V)
Clase de aislamiento	Clase I
Protección integrada driver	3kV (L-L), 6kV (L-T)
** No requiere accesorios	electricos adicionales**

DIMENSIONES SOPORTE



DIAGRAMA CONEXIÓN




FOTOMETRIA 300W

FOTOMETRIA 400W


FOTOMETRIA 600W




FOTOMETRIA 800W



FOTOMETRIA 960W



FOTOMETRIA 1200W



FEILO SYLVANIA

CALLE 31 NO. 23-40 GIRON - SANTANDER
TELÉFONO: (7) 6812408 - 3153035155
Correo: itafsas@gmail.com

ITAF S.A.S
NIT 900.683.861-1

LED SYLFLOOD

LED SYLFLOOD CW 15° 45° LW UNV

SYLVANIA

Ficha Tecnica - Rev.02

FOTOMETRIA 1500W

FEILO SYLVANIA

CALLE 31 NO. 23-40 GIRON - SANTANDER
TELÉFONO: (7) 6812408 - 3153035155
Correo: itafsas@gmail.com

ITAF S.A.S
NIT 900.683.861-1



CALLE 31 NO. 23-40 GIRON - SANTANDER
TELÉFONO: (7) 6812408 - 3153035155
Correo: itafsas@gmail.com

ITAF S.A.S
NIT 900.683.861-1









CALLE 31 NO. 23-40 GIRON - SANTANDER
TELÉFONO: (7) 6812408 - 3153035155
Correo: itafsas@gmail.com

4. HERRAMIENTAS UTILIZADAS POR EL CONCESIONARIO:

Con el objeto de comprobar que las herramientas utilizadas por EDIFICAR SAS se encuentren en perfecto estado y sean las adecuadas para la actividad en las labores de alumbrado público a él encomendadas por el Municipio de SOCORRO - SANTANDER, se implementó un formato con el cual evidenciamos el detalle de herramientas utilizadas, la cantidad y el estado de las mismas y se verificó que las herramientas utilizadas por el concesionario son:

Velar que las herramientas de encuentran en perfecto estado y sean las adecuadas			
DETALLE	B	R	M
Equipo de taller			
Prensa	X		
Esmeril	X		
Medidor de Cable	X		
Equipos de oficina			
Computadores	X		
Impresoras	X		
Fotocopiadora	X		
Fax	X		
Conmutador telefónico	X		
Celulares	X		
Elemento menores de oficina			
Anilladoras	X		
Perforadoras	X		
Cosedoras	X		
Herramientas manuales cuadrillas			
Escalera extensible	X		
Equipo de puesta a tierra	X		
Cinturón de seguridad	X		
Juego de pretales	X		
Cortafrios	X		
Pinza de punta	X		
Alicates	X		
Pelacables	X		
Ponchadora pequeña y terminales	X		
Juego de llaves boca fija	X		
Llave expansiva	X		
Juego de destornilladores de pala	X		
Juego de destornilladores estrella	X		
Manila	X		
Linterna	X		
Zunchadora	X		
Barra	X		
Planillera	X		
Segueta	X		
Celulares	X		

Velar que las herramientas de encuentran en perfecto estado y sean las adecuadas			
DETALLE	B	R	M
Herramientas manuales - taller			
Pinza volta perimétrica	X		
Multimetro	X		
Banco de pruebas	X		
Taladro	X		
Juego de brocas	X		
Pistola de soldar	X		
Soldadura de estaño	X		
Pasta desoxidante	X		
Brocha	X		
Martillo	X		
Cizalla	X		
Barra	X		
Pértiga	X		
Probador de tensión para pértiga	X		
Hoyadora	X		
Banco de trabajo	X		
Muebles y enseres			
Archivadores	X		
Escritorios	X		
Mesas salón	X		
Tablero	X		
Sillas	X		
Ropa de labor y elementos de protección			
Overol	X		
Casco	X		
Par de botas dieléctricas	X		
Gafas con filtro solar	X		
Maletín para herramienta	X		
Par de guantes de carnaza	X		

5. PARÁMETROS TÉCNICOS TRABAJOS DE OYM, MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN:

En el periodo del **18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2025** en cumplimiento a su compromiso contractual, EDIFICAR SAS ha desarrollado las labores de Operación y Mantenimiento del sistema de alumbrado Público, al igual que se está cumpliendo con la programación de Modernización de alumbrado público del Municipio de SOCORRO - SANTANDER.

Se ha mantenido permanente contacto con el contratista con el objeto de verificar que los parámetros técnicos utilizados en la Operación y mantenimiento, modernización y expansión del sistema de alumbrado público del Municipio de SOCORRO - SANTANDER cumplan con la normatividad existente, implementando controles e informes que así lo permitan evidenciar.

El contratista ha cumplido con el cronograma de actividades y programa de trabajo adelantado para la ADMINISTRACION, OPERACIÓN y MANTENIMIENTO, EXPANSION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO del Municipio de SOCORRO - SANTANDER, haciendo presencia en todo el sector urbano y en los sectores rurales según programación.

6. PERSONAL IDÓNEO

Con el objeto de comprobar la idoneidad de los Empleados y Trabajadores que EDIFICAR SAS tiene para cumplir las labores encomendadas por el Municipio de SOCORRO se estudiaron las hojas de vida de todos y cada uno de ellos y se evalúo su desempeño en campo, detallando el resultado de esta actividad así:

5. PARÁMETROS TÉCNICOS TRABAJOS DE OYM, MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN:

En el periodo del **18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2025** en cumplimiento a su compromiso contractual, EDIFICAR SAS ha desarrollado las labores de Operación y Mantenimiento del sistema de alumbrado Público, al igual que se está cumpliendo con la programación de Modernización de alumbrado público del Municipio de SOCORRO - SANTANDER.

Se ha mantenido permanente contacto con el contratista con el objeto de verificar que los parámetros técnicos utilizados en la Operación y mantenimiento, modernización y expansión del sistema de alumbrado público del Municipio de SOCORRO - SANTANDER cumplan con la normatividad existente, implementando controles e informes que así lo permitan evidenciar.

El contratista ha cumplido con el cronograma de actividades y programa de trabajo adelantado para la ADMINISTRACION, OPERACIÓN y MANTENIMIENTO, EXPANSION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO del Municipio de SOCORRO - SANTANDER, haciendo presencia en todo el sector urbano y en los sectores rurales según programación.

6. PERSONAL IDÓNEO

Con el objeto de comprobar la idoneidad de los Empleados y Trabajadores que EDIFICAR SAS tiene para cumplir las labores encomendadas por el Municipio de SOCORRO se estudiaron las hojas de vida de todos y cada uno de ellos y se evalúo su desempeño en campo, detallando el resultado de esta actividad así:



7. INSPECCIONES SITIOS DE TRABAJO

La interventoría hizo presencia no programada a los sitios de trabajo en los que EDIFICAR SAS desarrolló labores de operación, mantenimiento, modernización de luminarias, con el objeto de evidenciar el cumplimiento del contrato.

8. ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION GEORREFERENCIADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO.

De conformidad con lo contenido en el numeral 1 de la sección 700.2 de la Resolución 40150 de 03 mayo 2024 "Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP), esta interventoría hizo presencia en las

instalaciones del Operador del Servicio de Alumbrado Público (EDIFICAR SAS) y con usuario y contraseña que posee del Sistema de Información de la Infraestructura de Alumbrado Público, descargó los registros de la Base de datos y los contrastó en terreno y se verificó la información de las modificaciones que se realizaron en la Infraestructura del SIAP durante el mes de **NOVIEMBRE DE 2025**, las cuales son las siguientes:

8.1. ADICION DE PUNTOS LUMINOSOS POR EXPANSIONES Literal A Punto 1 Articulo 4.6.2. RETILAP.

Durante el periodo del **18 DE OCUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2025** se evidencio la adición de **35** puntos luminosos por expansiones en el sistema de alumbrado público del municipio de Socorro.

Fecha solución	Tipo de Expansión	Descripción	Reporte Técnico	Código luminaria	Código de apoyo	Dirección luminaria	Barrio luminaria	Uso luminaria	Tipo de fuente	Potencia	Marca luminaria	Modelo luminaria	Tipo luminaria	Tipo de medid
2025-10-20	I	EXPANSION TIPO I	17	6106	SCP6106	CABLE 14 FRENTE BASÍLICA	CENTRO	URBANO	LED	50	SYLVANIA	ZD229	LED	AFORO
2025-10-20	I	EXPANSION TIPO I	17	6107	SCP6107	CABLE 14 FRENTE BASÍLICA.	CENTRO	URBANO	LED	50	SYLVANIA	ZD229	LED	AFORO
2025-10-23	III	EXPANSION	18	6109	SCP6109	ZONAS VERDES SANTA CLAR	SANTA CLARA	PARQUES	LED	50	SYLVANIA	ZD229	LED	AFORO
2025-10-23	III	EXPANSION	18	6113	SCP6113	ZONAS VERDES SANTA CLAR	SANTA CLARA	PARQUES	LED	50	SYLVANIA	ZD229	LED	AFORO
2025-10-23	I	EXPANSION TIPO I	19	6110	SCP6110	ZONAS VERDES SANTA CLAR	SANTA CLARA	PARQUES	LED	50	SYLVANIA	ZD229	LED	AFORO
2025-10-23	I	EXPANSION TIPO I	19	6111	SCP6111	ZONAS VERDES SANTA CLAR	SANTA CLARA	PARQUES	LED	80	SYLVANIA	ZD229	LED	AFORO
2025-10-23	I	EXPANSION TIPO I	19	6112	SCP6112	ZONAS VERDES SANTA CLAR	SANTA CLARA	PARQUES	LED	50	SYLVANIA	ZD229	LED	AFORO
2025-10-24	I	EXPANSION TIPO I	23	6122	SCP6122	CALLE 3A SUR CON 7	CAMINO CULEBRERO	URBANO	LED	50	SYLVANIA	ZD229	LED	AFORO
2025-10-24	I	EXPANSION TIPO I	20	6114	N V	CARRERA 6 ENTRE 10 Y 14	ALTOS DE LA FLORESTA	URBANO	LED	80	SYLVANIA	ZD229	HORIZONTAL CERRADA	AFORO
2025-10-24	I	EXPANSION TIPO I	20	6115	N V	CARRERA 6 ENTRE 10 Y 14	ALTOS DE LA FLORESTA	URBANO	LED	80	SYLVANIA	ZD229	HORIZONTAL CERRADA	AFORO
2025-10-24	I	EXPANSION TIPO I	20	6116	8852952	CARRERA 6 ENTRE 10 Y 14	ALTOS DE LA FLORESTA	URBANO	LED	80	SYLVANIA	ZD229	HORIZONTAL CERRADA	AFORO
2025-10-24	I	EXPANSION TIPO I	20	6117	8852952	CARRERA 6 ENTRE 10 Y 14	ALTOS DE LA FLORESTA	URBANO	LED	80	SYLVANIA	ZD229	HORIZONTAL CERRADA	AFORO
2025-10-24	I	EXPANSION TIPO I	20	6118	8852928	CARRERA 6 ENTRE 10 Y 14	ALTOS DE LA FLORESTA	URBANO	LED	80	SYLVANIA	ZD229	HORIZONTAL CERRADA	AFORO
2025-10-24	I	EXPANSION TIPO I	20	6119	8852910	CARRERA 6 ENTRE 10 Y 14	ALTOS DE LA FLORESTA	URBANO	LED	80	SYLVANIA	ZD229	HORIZONTAL CERRADA	AFORO
2025-10-24	I	EXPANSION TIPO I	20	6120	8852901	CARRERA 6 ENTRE 10 Y 14	ALTOS DE LA FLORESTA	URBANO	LED	80	SYLVANIA	ZD229	HORIZONTAL CERRADA	AFORO
2025-10-24	III	EXPANSION TIPO III	21	6121	SCP6121	CALLE 3A SUR CON 7.	CAMINO CULEBRERO	URBANO	LED	50	SYLVANIA	ZD229	LED	AFORO
2025-10-24	III	EXPANSION TIPO III	22	6123	SCP6123	ZONAS VERDES	VILLA MARIA	PARQUES	LED	80	SYLVANIA	ZD229	LED	AFORO
2025-10-27	I	EXPANSION TIPO I	25	6125	SCP6125	carrera 8 con calle 5.esquina	16 DE MARZO	URBANO	LED	50	SYLVANIA	ZD229	LED	AFORO
2025-10-27	II	EXPANSION TIPO II	24	6124	SCP6124	PARQUE INFANTIL SANTA CL	SANTA CLARA	PARQUES	LED	80	SYLVANIA	ZD229	LED	AFORO
2025-11-05	I	EXPANSION TIPO I	26	6126	SCP6126	carrera 9 con calle 16 esquin	SANTA BARBARA	URBANO	LED	50	SYLVANIA	ZD229	LED	AFORO
2025-11-07	I	EXPANSION TIPO I	28	6127	SCP6127	VEREDA SAN LORENZO.	VEREDA SAN LORENZO PART	RURAL	LED	50	SYLVANIA	ZD229	LED	AFORO
2025-11-07	III	EXPANSION TIPO III	27	6128	SCP6128	VEREDA SAN LORENZO	VEREDA SAN LORENZO PART	RURAL	LED	50	SYLVANIA	ZD229	LED	AFORO
2025-11-14	I	EXPANSION TIPO I	29	6129	SCP6129	CARRERA 8 #SUR 09	ORQUIDEA REAL	URBANO	LED	50	SYLVANIA	ZD229	LED	AFORO
2025-11-14	I	EXPANSION TIPO I	29	6130	SCP6130	CARRERA 8 #SUR 09	ORQUIDEA REAL	URBANO	LED	50	SYLVANIA	ZD229	LED	AFORO
2025-11-14	I	EXPANSION TIPO I	29	6131	SCP6131	ENTRADA SANTA ELENA	SANTA HELENA	URBANO	LED	50	SYLVANIA	ZD229	LED	AFORO
2025-11-14	III	EXPANSION TIPO III	30	6132	SCP6132	VÍA VILLA OLÍMPICA	VILLA OLIMPICA	AVENIDA	LED	50	SYLVANIA	ZD229	LED	AFORO
2025-11-14	III	EXPANSION TIPO III	30	6133	SCP6133	VÍA VILLA OLÍMPICA	VILLA OLIMPICA	AVENIDA	LED	50	SYLVANIA	ZD229	LED	AFORO
2025-11-14	III	EXPANSION TIPO III	30	6134	SCP6134	VÍA VILLA OLÍMPICA	VILLA OLIMPICA	AVENIDA	LED	50	SYLVANIA	ZD229	LED	AFORO
2025-11-14	III	EXPANSION TIPO III	30	6135	SCP6135	VÍA VILLA OLÍMPICA	VILLA OLIMPICA	AVENIDA	LED	50	SYLVANIA	ZD229	LED	AFORO
III	EXPANSION TIPO III	30	6136	SCP6136	VÍA VILLA OLÍMPICA	VILLA OLIMPICA	AVENIDA	LED	50	SYLVANIA	ZD229	LED	AFORO	
III	EXPANSION TIPO III	30	6137	SCP6137	VÍA VILLA OLÍMPICA	VILLA OLIMPICA	AVENIDA	LED	50	SYLVANIA	ZD229	LED	AFORO	
III	EXPANSION TIPO III	31	6138	SCP6138	PAQUEADERO VILLA OLÍMPI	VILLA OLIMPICA	ESCENARIOS	LED	50	SYLVANIA	ZD229	LED	AFORO	
III	EXPANSION TIPO III	31	6139	SCP6139	PARQUEADERO VILLA OLÍMP	VILLA OLIMPICA	ESCENARIOS	LED	50	SYLVANIA	ZD229	LED	AFORO	
III	EXPANSION TIPO III	31	6140	SCP6140	PARQUEADERO VILLA OLÍMP	VILLA OLIMPICA	ESCENARIOS	LED	50	SYLVANIA	ZD229	LED	AFORO	
III	EXPANSION TIPO III	31	6141	SCP6141	PARQUEADERO VILLA OLÍMP	VILLA OLIMPICA	ESCENARIOS	LED	50	SYLVANIA	ZD229	LED	AFORO	

ITAF S.A.S
NIT 900.683.861-1

8.2. SUSTITUCION DE LUMINARIAS POR EFECTO DE LA MODERNIZACION O CAMBIO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA DE MERCURIO O SODIO A LED Literal B Punto 1 Articulo 4.6.2. RETILAP.

Durante el periodo del **18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2025** se evidencio la Modernización de **122** luminarias, 73 luminarias LED de 50w, 29 luminarias LED 80w, 20 reflectores 200w y su actualización en el sistema de información georreferenciado de la infraestructura del servicio de alumbrado público e conformidad con el Literal B Punto 1 Articulo 4.6.2. RETILAP.

Fecha solución	Reporte	Código lu	Dirección luminaria	Barrio luminaria	Pot. (W) inicial	Tecnologia inicial	Pot. (W) fina	Tecnologia final	Tipo luminaria	Sector luminaria	Tipo de medid
2025-10-18	39	1012073	VIA SIMACOTA	VIA SIMACOTA	70	SODIO	50	LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-18	39	1012026	VIA SIMACOTA	VIA SIMACOTA	70	SODIO	50	LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-18	39	1012029	VIA SIMACOTA	VIA SIMACOTA	70	SODIO	50	LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-18	39	1012027	VIA SIMACOTA	VIA SIMACOTA	70	SODIO	50	LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-18	39	1012072	VIA SIMACOTA	VIA SIMACOTA	70	SODIO	50	LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-18	39	1012028	VIA SIMACOTA	VIA SIMACOTA	70	SODIO	50	LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-18	39	1012024	VIA SIMACOTA	VIA SIMACOTA	70	SODIO	50	LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-18	39	1012025	VIA SIMACOTA	VIA SIMACOTA	70	SODIO	50	LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-18	39	1012075	VIA SIMACOTA	VIA SIMACOTA	70	SODIO	50	LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-20	40	1010908	CARRERA 13 CON CALLE 13 E	CENTRO	70	SODIO	50	LED	LED	URBANO	AFORO
2025-10-20	40	1010886	CARRERA 13 No. 12 - 07	CENTRO	70	SODIO	50	LED	LED	URBANO	AFORO
2025-10-20	40	1010888	CARRERA 13 No. 12A - 19	CENTRO	70	SODIO	50	LED	LED	URBANO	AFORO
2025-10-20	40	1010887	CARRERA 13 #12 43	PUEBLITO VIEJO	70	SODIO	50	LED	LED	URBANO	AFORO
2025-10-20	40	1010903	CARRERA 13 CON CALLE 14 E	CENTRO	70	SODIO	50	LED	LED	URBANO	AFORO
2025-10-20	40	1010907	CARRERA 13 No. 13 - 27	CENTRO	70	SODIO	50	LED	LED	URBANO	AFORO
2025-10-20	40	1010870	CARRERA 13 CON CALLE 12 E	CENTRO	70	SODIO	50	LED	LED	URBANO	AFORO
2025-10-22	41	1011600	VIA ENTRADA COLISEO DE FI	ENTRADA VILLA DEL PRADO	70	SODIO	80	LED	LED	URBANO	AFORO
2025-10-22	41	6108	FRENTE COLISEO DEL CUS	NUEVAFERIA	70	SODIO	50	LED	LED	URBANO	AFORO
2025-10-22	41	1011601	VIA ENTRADA COLISEO DE FI	ENTRADA VILLA DEL PRADO	70	SODIO	80	LED	LED	URBANO	AFORO

CALLE 31 NO. 23-40 GIRON - SANTANDER
TELÉFONO: (7) 6812408 - 3153035155
Correo: itafsas@gmail.com



ITAF S.A.S
NIT 900.683.861-1

2025-10-22	41	1011598	VIA ENTRADA COLISEO DE FI	ENTRADA VILLA DEL PRADO	70 SODIO	50 LED	LED	URBANO	AFORO
2025-10-22	41	1011599	VIA ENTRADA COLISEO DE FI	ENTRADA VILLA DEL PRADO	70 SODIO	80 LED	LED	URBANO	AFORO
2025-10-22	41	1020210	FRENTE COLISEO CUS NUEVA	ENTRADA VILLA DEL PRADO	150 SODIO	80 LED	LED	URBANO	AFORO
2025-10-23	42	1011949	CARRERA 6 ENTRE CALLES 10	ALTOS DE LA FLORESTA	70 SODIO	80 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-23	42	1011947	CARRERA 7 CON CALLE 9	ALTOS DE LA FLORESTA	70 SODIO	80 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-23	42	1010498	CALLE 14 CON CARRERA 6	CONVENTO	70 SODIO	80 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-23	42	1011952	CARRERA 6 ENTRE CALLES 10	ALTOS DE LA FLORESTA	70 SODIO	80 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-23	42	1011959	CALLE 14 CON CARRERA 6	CONVENTO	70 SODIO	80 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-23	42	1011955	CALLE 13 ENTRE CARRERA 2,	CONVENTO	70 SODIO	80 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-23	42	1011946	CARRERA 7 CON CALLE 9	ALTOS DE LA FLORESTA	70 SODIO	80 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-23	42	1010499	CALLE 13 CON CARRERA 4	CONVENTO	70 SODIO	80 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-23	42	1010645	CALLE 12 CON CARRERA 8	CONVENTO	70 SODIO	80 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-23	42	1011950	CARRERA 6 ENTRE CALLES 10	ALTOS DE LA FLORESTA	70 SODIO	80 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-23	42	1011951	CARRERA 6 ENTRE CALLES 10	ALTOS DE LA FLORESTA	70 SODIO	80 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-23	42	1011953	CARRERA 6 ENTRE CALLES 10	ALTOS DE LA FLORESTA	70 SODIO	80 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-23	42	1011958	CALLE 13 ENTRE CARRERA 2,	CONVENTO	70 SODIO	80 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-23	42	1010495	CALLE 14 CON CARRERA 6	CONVENTO	70 SODIO	80 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-23	42	1011948	CARRERA 6 ENTRE CALLES 10	ALTOS DE LA FLORESTA	70 SODIO	80 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-23	42	1011954	CARRERA 6 ENTRE CALLES 10	ALTOS DE LA FLORESTA	70 SODIO	80 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-24	43	1010467	CALLE 13 No. 2 - 10 ESQUINA	ALTOS DE LA FLORESTA	70 SODIO	50 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-24	43	1011956	CALLE 13 # 4 - 30	CONVENTO	70 SODIO	80 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-24	43	1010468	CALLE 13 No. 2 - 10 ESQUINA	ALTOS DE LA FLORESTA	70 SODIO	50 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-24	43	1010470	CALLE 13 FRENTE COLEGIO SI	ALTOS DE LA FLORESTA	70 SODIO	50 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-24	43	1010471	CALLE 13 # 2 - 78	ALTOS DE LA FLORESTA	70 SODIO	80 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-24	43	1011957	CALLE 13 ENTRE CARRERA 2,	CONVENTO	70 SODIO	50 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-24	43	1010481	CALLE 13 # 2 - 84	CONVENTO	70 SODIO	80 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-24	43	1010497	CALLE 13 CON CARRERA 4	CONVENTO	70 SODIO	80 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-24	44	1011596	SALIDA SIMACOTA	SALIDA SIMACOTA	70 SODIO	80 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-24	43	1010469	CALLE 13 No. 2 - 46	ALTOS DE LA FLORESTA	70 SODIO	80 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-25	45	1010466	CALLE 14 No. 1 - 32	ALTOS DE LA FLORESTA	70 SODIO	80 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-25	46	1012065	PEATONAL 21A No. 6 - 50	PRIMERO DE MAYO	70 SODIO	50 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-25	46	1012066	SALIDA VIA VDA LIBANO	SALIDA VDA LIBANO	70 SODIO	50 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-25	45	1010464	CALLE 14 No. 1 - 94	ALTOS DE LA FLORESTA	70 SODIO	80 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-25	46	1012067	salida vereda libano	SALIDA VDA LIBANO	70 SODIO	50 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-25	46	1012070	SALIDA VIA VDA LIBANO	SALIDA VDA LIBANO	70 SODIO	50 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-25	46	1012069	SALIDA VIA VDA LIBANO	SALIDA VDA LIBANO	70 SODIO	50 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-25	45	1010465	CALLE 14 No. 1 - 64	ALTOS DE LA FLORESTA	70 SODIO	80 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-25	46	1012068	SALIDA VIA VDA LIBANO	SALIDA VDA LIBANO	70 SODIO	50 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-25	46	1012071	SALIDA VIA VDA LIBANO	SALIDA VDA LIBANO	70 SODIO	50 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-29	47	1040022	CANCHA MANUELA BELTRAN	MANUELA BELTRAN	400	200 LED	REFLECTOR	URBANO	MEDIDOR
2025-10-29	47	1040020	CANCHA MANUELA BELTRAN	MANUELA BELTRAN	400	200 LED	REFLECTOR	URBANO	MEDIDOR
2025-10-29	47	1040023	CANCHA MANUELA BELTRAN	MANUELA BELTRAN	400	200 LED	REFLECTOR	URBANO	MEDIDOR
2025-10-29	47	1040024	CANCHA MANUELA BELTRAN	MANUELA BELTRAN	400	200 LED	REFLECTOR	URBANO	AFORO
2025-10-29	47	1040019	CANCHA MANUELA BELTRAN	MANUELA BELTRAN	400	200 LED	REFLECTOR	URBANO	MEDIDOR
2025-10-29	47	1040021	CANCHA MANUELA BELTRAN	MANUELA BELTRAN	400	200 LED	REFLECTOR	URBANO	MEDIDOR
2025-10-30	48	1030041	POLIDEPORTIVO JUVENTUD	CONVENTO	250	200 LED	REFLECTOR	URBANO	MEDIDOR
2025-10-30	48	1040011	POLIDEPORTIVO JUVENTUD	CONVENTO	400	200 LED	REFLECTOR	URBANO	MEDIDOR
2025-10-30	49	1010899	CARRERA 13 No. 10 - 32	CENTRO	70 SODIO	50 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-30	49	1010898	CARRERA 13 No. 10 - 63	CENTRO	70 SODIO	50 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-30	48	1040012	POLIDEPORTIVO JUVENTUD	CONVENTO	400 LED	200 LED	REFLECTOR	URBANO	MEDIDOR
2025-10-30	49	1010900	CARRERA 13 CON CALLE 10 E	CENTRO	70 SODIO	50 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-30	49	1010859	CARRERA 13 No. 9 - 27	ACACIAS	70 SODIO	50 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-30	48	1040009	POLIDEPORTIVO JUVENTUD	CONVENTO	400	200 LED	REFLECTOR	URBANO	MEDIDOR
2025-10-30	48	1040010	POLIDEPORTIVO JUVENTUD	CONVENTO	400	200 LED	REFLECTOR	URBANO	MEDIDOR
2025-10-30	49	1010852	CARRERA 13 No. 8 - 15	ACACIAS	70 SODIO	50 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-30	49	1011082	CARRERA 13 CON CALLE 11 E	CHIQUINQUIRA	70 SODIO	50 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-30	49	1010896	CALLE 11 No. 13 - 08 ESQUIN	CENTRO	70 SODIO	50 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-30	49	1010858	CARRERA 13 No. 8 - 47	ACACIAS	70 SODIO	50 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-30	49	1010860	CARRERA 13 No. 9 - 49	ACACIAS	70 SODIO	50 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-30	49	1010851	CARRERA 13 No. 8 - 47	ACACIAS	70 SODIO	50 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-30	48	1030040	POLIDEPORTIVO JUVENTUD	CONVENTO	250	200 LED	REFLECTOR	URBANO	MEDIDOR
2025-10-31	50	1010894	CARRERA 13 No. 11 - 61	CENTRO	70 SODIO	50 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-31	50	1010890	CALLE 12A No. 13 - 34	CENTRO	70 SODIO	50 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-31	50	1010893	CARRERA 13 No. 11 - 86	CENTRO	70 SODIO	50 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-31	50	1010872	CALLE 12 No. 12 - 10	CENTRO	70 SODIO	50 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-31	50	1010871	CALLE 12 No. 12 - 32	CENTRO	70 SODIO	50 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-31	50	1010862	CALLE 10 No. 12 - 35	ACACIAS	70 SODIO	50 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-31	50	1010889	CALLE 12A No. 13 - 34	CENTRO	70 SODIO	50 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-31	50	1011399	CALLE 11 No. 15 - 35	CHIQUINQUIRA	70 SODIO	50 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-31	50	1010901	CARRERA 13 CON CALLE 10 E	CENTRO	70 SODIO	50 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-10-31	50	1010895	CARRERA 13 No. 11 - 41	CENTRO	70 SODIO	50 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-11-01	51	1011684	CARRERA 7 No. 2 SUR - 56	SAN RAFAEL	70 SODIO	50 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-11-01	51	1011642	CALLE 5 No. 6 - 133	EL BOSQUE	70 SODIO	50 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-11-01	51	1011647	CALLE 5 No. 6 - 65	EL BOSQUE	70 SODIO	50 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-11-01	51	1011664	CALLE 1A No. 6 - 07	SAN RAFAEL	70 SODIO	50 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-11-01	51	1011646	CALLE 5 No. 6 - 83	EL BOSQUE	70 SODIO	50 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-11-01	51	1011659	CALLE 1A No. 6 - 07	SAN RAFAEL	70 SODIO	50 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-11-01	51	1011682	CARRERA 7 No. 2 SUR - 38	SAN RAFAEL	70 SODIO	50 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-11-01	51	1011648	CALLE 5 No. 6 - 53	EL BOSQUE	70 SODIO	50 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-11-01	51	1011678	CARRERA 6 No. 3 - 18	SAN RAFAEL	70 SODIO	50 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-11-01	52	1030038	POLIDEPORTIVO JUVENTUD	CONVENTO	250	200 LED	REFLECTOR	URBANO	MEDIDOR
2025-11-01	52	1030039	POLIDEPORTIVO JUVENTUD	CONVENTO	250	200 LED	REFLECTOR	URBANO	MEDIDOR
2025-11-01	51	1011665	CALLE 1A No. 6 - 07	SAN RAFAEL	70 SODIO	50 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-11-01	51	1011679	CARRERA 7 No. 2 SUR - 38	SAN RAFAEL	70 SODIO	50 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-11-01	51	1011683	CARRERA 7 No. 2 SUR - 50	SAN RAFAEL	70 SODIO	50 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-11-01	51	1011645	CALLE 5 No. 6 - 101	EL BOSQUE	70 SODIO	50 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-11-01	51	1011660	CALLE 5 No. 6 - 29	SAN RAFAEL	70 SODIO	50 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO	AFORO
2025-11-02	53	1030046	POLIDEPORTIVO BICENTENA	BICENTENARIO V ETAPA	250 SODIO	200 LED	REFLECTOR	URBANO	AFORO
2025-11-02	53	1030044	POLIDEPORTIVO BICENTENA	BICENTENARIO V ETAPA	250 SODIO	200 LED	REFLECTOR	URBANO	AFORO
2025-11-02	53	1030045	POLIDEPORTIVO BICENTENA	BICENTENARIO V ETAPA	250 SODIO	200 LED	REFLECTOR	URBANO	AFORO

CALLE 31 NO. 23-40 GIRON - SANTANDER
TELÉFONO: (7) 6812408 - 3153035155
Correo: itafsas@gmail.com

2025-11-02	54	1030024	POLIDEPORTIVO DIAMANTE	DIAMANTE	250	200 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO AFORO
2025-11-02	54	1030025	POLIDEPORTIVO DIAMANTE	DIAMANTE	250	200 LED	HORIZONTAL CERRADA	URBANO AFORO
2025-11-02	53	1030047	POLIDEPORTIVO BICENTENA	BICENTENARIO V ETAPA	250 SODIO	200 LED	REFLECTOR	URBANO AFORO
2025-11-05	56	1010477	CALLE 14 No. 2 - 63	CONVENTO	70 SODIO	50 LED	LED	URBANO AFORO
2025-11-05	56	1010478	CALLE 14 No. 2 - 33	CONVENTO	70 SODIO	50 LED	LED	URBANO AFORO
2025-11-05	56	1010472	CALLE 14 No. 2 - 02	ALTOS DE LA FLORESTA	70 SODIO	50 LED	LED	URBANO AFORO
2025-11-05	56	1010492	CALLE 14 No. 4 - 09	CONVENTO	70 SODIO	50 LED	LED	URBANO AFORO
2025-11-05	56	1010475	CALLE 14 No. 3 - 59	CONVENTO	70 SODIO	50 LED	LED	URBANO AFORO
2025-11-05	56	1010473	CALLE 14 No. 4 - 03 ESQUINA	CONVENTO	70 SODIO	50 LED	LED	URBANO AFORO
2025-11-05	56	1010476	CALLE 14 No. 3 - 05	CONVENTO	70 SODIO	50 LED	LED	URBANO AFORO
2025-11-05	56	1010474	CALLE 14 No. 4 - 03 ESQUINA	CONVENTO	70 SODIO	50 LED	LED	URBANO AFORO
2025-11-05	55	1010531	CALLE 16 CON CARRERA 9A E	SANTA BARBARA	70 SODIO	50 LED	LED	URBANO AFORO
2025-11-14	57	1011375	CARRERA 7# 9E 6 INT. 6	SANTA HELENA	70 SODIO	50 LED	LED	URBANO AFORO

8.3. DISMINUCION O RETIRO DE LUMINARIAS POR INTERVENCIONES DEL ESPACIO PUBLICO Literal C Punto 1 Articulo 4.6.2. RETILAP.

Durante el periodo del **18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2025** se evidencio disminución o retiro de **02** luminarias por intervenciones del espacio público en el sistema de alumbrado público del municipio de Socorro y su actualización en el sistema de información georreferenciado de la infraestructura del servicio de alumbrado público de conformidad con el Literal C Punto 1 Articulo 4.6.2. RETILAP.

	Fecha Solución	Reporte	Código Luminaria	Dirección	Barrio	Uso	Sector	Tipo de Luminaria	Pot.(W)	Tecnología	Tipo Medida
1	20/10/2025	1	1012102	CARRERA 7 No. 24-50	PRIMERO DE MAYO	URBANO	URBANO	ZD229	50	LED	AFORO
2	31/10/2025	2	1070126	TERMINAL DE TRANSPORTES	VIA PRINCIPAL	URBANO	URBANO	ALURBAN	40	LED	AFORO

8.4. SUSTITUCION DE MATERIALES Y/O EQUIPOS SIN AFECTAR LA CANTIDAD DE INFRAESTRUCTURA Literal D Punto 1 Articulo 4.6.2. RETILAP.

Durante el periodo del **18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2025 NO** se evidencio sustitución de materiales y/o equipos sin afectar la cantidad de infraestructura en el sistema de alumbrado público del municipio de Socorro y su actualización en el sistema de información georreferenciado de la infraestructura del servicio de alumbrado público de conformidad con el Literal D Punto 1 Articulo 4.6.2. RETILAP.

8.5. AUMENTO O DISMINUCION DE LA POTENCIA DE LOS PUNTOS LUMINOSOS Literal E Punto 1 Articulo 4.6.2. RETILAP.

Durante el periodo del **18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2025 NO** se evidencio sustitución de materiales y/o equipos sin afectar la cantidad de infraestructura en el sistema de alumbrado público del municipio de Socorro y su actualización en el sistema de información georreferenciado de la infraestructura del servicio de alumbrado público de conformidad con el Literal E Punto 1 Articulo 4.6.2. RETILAP.

ÁREA ADMINISTRATIVA

9. CUMPLIMIENTO NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y PAGO AL PERSONAL.

Se recibió del contratista las afiliaciones y pagos de las planillas de seguridad social en las cuales consta el cumplimiento de sus obligaciones laborales y parafiscales en especial con respecto a los empleados y trabajadores que tiene asignados para el cumplimiento del contrato de LP-SOC-2025-01.

10. INSTALACIONES Y EQUIPOS.

Dentro de las visitas realizadas a la firma contratista se pudo evidenciar que la parte Técnica y operativa del contrato son desarrolladas en la Calle 5 No. 8-27 Piso 1 Barrio SANTA CLARA del Municipio Socorro-Santander, la atención de PQRS se realiza a través del teléfono y línea WhatsApp 318 340 9380.

ITAF S.A.S
NIT 900.683.861-1





CALLE 31 NO. 23-40 GIRON - SANTANDER
TELÉFONO: (7) 6812408 - 3153035155
Correo: itafsas@gmail.com



11. INFORMACIÓN REQUERIDA

Mediante interactuaciones personales, en forma escrita y a través del correo electrónico **edificarsas.2015@gmail.com** se ha mantenido permanente comunicación y exigencia de información requerida y en la medida de su recibo se está procesando y adelantando el proceso interventor en cada caso.

12. PROBLEMAS, RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS PARA MEJORAR EL SERVICIO

Hemos interactuado con el contratista y evidenciado que los problemas surgidos en el desarrollo del contrato y las recomendaciones dadas en nuestra calidad de interventores para mejorar el servicio han sido tenidos en cuenta, acatados y tomados los correctivos necesarios.

GESTIÓN AMBIENTAL

13. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Se ha recibido por parte del contratista el Plan de Manejo Ambiental y los documentos con los cuales en cumplimiento del Numeral 16 del artículo 4.2.6 del RETILAP son objeto de verificación por parte de esta interventoría.


14. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Esta interventoría ha hecho presencia en las Oficinas de EDIFICAR SAS, para en cumplimiento del Numeral 17 del artículo 4.6.2 del RETILAP verificar que las normas de implementación del SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO se cumplan:



ITAF S.A.S
NIT 900.683.861-1



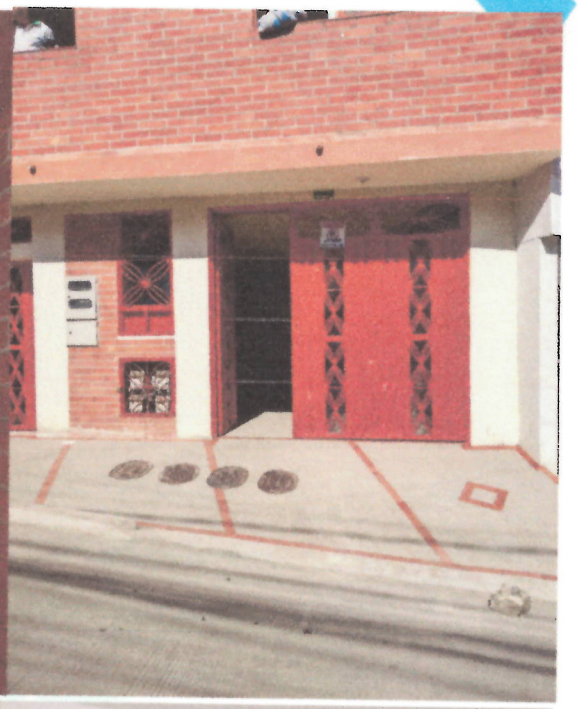





CALLE 31 NO. 23-40 GIRON - SANTANDER
TELÉFONO: (7) 6812408 - 3153035155
Correo: itafsas@gmail.com

AREA FINANCIERA
15. EJECUCION CONTRACTUAL.

Durante el periodo del **18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2025** la presente interventoría logro evidenciar el cumplimiento a satisfacción de las cantidades de obra ejecutadas conforme detalla en Anexo 1.

16. EJECUCION CONTRACTUAL DE LA INTERVENTORIA.

El periodo ejecutado del presente informe corresponde al cuarto mes de ejecución del contrato que va desde el 18 de octubre al 17 de noviembre de 2025.

ITEM	CONCEPTO Y/O CATEGORIA	CANT	DEDICACION (MES) %	VALOR MENSUAL	VALOR DEDICACION POR MES	DURACION (MES)	VALOR PARCIAL
1	**PERSONAL PROFESIONAL**						
1,1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	50%	$ 4.200.000	$ 2.100.000	1	$ 2.100.000
1,2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	100%	$ 2.700.000	$ 2.700.000	1	$ 2.700.000
1,3	PROFESIONAL DE ASPECTOS FINANCIEROS	1	100%	$ 1.500.000	$ 1.500.000	1	$ 1.500.000
1,4	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	35%	$ 1.423.500	$ 498.225	1	$ 498.225
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 6.798.225**
	FACTOR MULTIPLICADOR						**$ 2,20**
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 14.956.095**
ITEM	**CONCEPTO Y/O CATEGORIA**	**CANT**	**UNIDAD**	**VALOR MENSUAL**	**VALOR TOTAL MENSUAL**	**DURACION (MES)**	**VALOR PARCIAL**
2	**OTROS COSTOS DIRECTOS (GENERALIDADES)**						
2,1	COSTOS INFORMES + MEMORIAS FOTOGRAFICAS + PLANOS	1	$ 1.530.000	$ 1.530.000	$ 1.530.000	1	$ 1.530.000
2,2	COSTOS EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	1	$ 760.000	$ 760.000	$ 760.000	1	$ 760.000
2,3	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1	$ 320.000	$ 320.000	$ 320.000	1	$ 320.000
2,4	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 350.000	$ 350.000	$ 350.000	1	$ 350.000
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS						**$ 2.960.000**
	TOTAL COSTOS ACTIVIDADES POR AREAS Y OTROS COSTOS DIRECTOS						**$ 17.916.095**
	IVA (19%)						**$ 3.404.058**
	VALOR TOTAL COSTOS DE LA INTERVENTORIA						**$ 21.320.153**

A continuación, presentamos la discriminación del Factor Multiplicador así:

ITAF S.A.S
NIT 900.683.861-1

FACTOR MULTIPLICADOR CONTRATO CMA-SOC-2025-01
CONTRATISTA ITAF SAS

CALCULO FACTOR MULTIPLICADOR COSTOS DE PERSONAL				%	$
A.		VALOR BASE (Sueldos)		**100,000**	$ 6.798.225
B.		PRESTACIONES SOCIALES		**59,000**	$ **4.010.953**
	a.	Cesantías	(A/12)	8,330	$ 566.292
	b.	Intereses sobre Cesantías	(a*12%)	1,000	$ 67.982
	c.	Prima Anual	(A/12)	8,330	$ 566.292
	d.	Caja de Compensación	%A	4,000	$ 271.929
	e.	SENA	%A	2,000	$ 135.965
	f.	ICBF	%A	3,000	$ 203.947
	g.	Sistema de Seguridad Social: Salud	%A	8,380	$ 569.691
	h.	Sistema de Seguridad Social: Pensión	%A	12,000	$ 815.787
	i.	ARP personal	%A	6,960	$ 473.156
	j.	Vacaciones	(18/360*100)	5,000	$ 339.911
C.		SUMA (A+B)		**159,000**	$ **10.809.178**
D.		COSTOS INDIRECTOS		15,000	$ 1.019.734
		GASTOS DE ADMINISTRACION			$ -
	a.	ALQUILER DE OFICINA	%A	5,000	$ 339.911
	b.	GASTOS DE TRANSPORTE Y VEHICULOS	%A	2,000	$ 135.965
	c.	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO	%A	2,000	$ 135.965
	d.	PERSONAL TECNICO NO FACTURABLE Y ADMINISTRATIVO	%A	4,000	$ 271.929
	e.	SEGUROS Y ASESORIA LEGAL	%A	2,000	$ 135.965
E.		SUBTOTAL (C+D)		174,000	$ **11.828.912**
F.		HONORARIOS (26% Personal)	%A	26,000	$ 1.767.539
G.		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	%A	20,000	$ 1.359.645
H.		FACTOR MULTIPLICAADOR (E+F+H)		**220,000**	$ **14.956.095**

Atentamente,

BELCY YULIETH BONILLA DURAN
Representante Legal
ITAF SAS
Interventoría Alumbrado Público Socorro

CALLE 31 NO. 23-40 GIRON - SANTANDER
TELÉFONO: (7) 6812408 - 3153035155
Correo: itafsas@gmail.com

ITAF S.A.S
NIT 900.683.861-1

ANEXO 1
EJECUCION CONTRACTUAL OBRA

CALLE 31 NO. 23-40 GIRON - SANTANDER
TELÉFONO: (7) 6812408 - 3153035155
Correo: itafsas@gmail.com

MUNICIPIO DEL SOCORRO

"ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, INSTALACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

CUADRO GENERAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	COSTO UNITARIO PARCIAL	CANTIDADES INICIALES	VALOR INCIAL DEL CONTRATO	MAYORES CANTIDADES	MENORES CANTIDADES	CANTIDADES FINALES	VALOR FINAL DEL CONTRATO	AVANCE 1	VALOR AVANCE 1	AVANCE 2	VALOR AVANCE 2	AVANCE 3	VALOR AVANCE 3	AVANCE 4	VALOR AVANCE 4	PENDIENTE DE EJECUTAR	VALOR PENDIENTE DE EJECUTAR
1	MANTENIMIENTO (INCLUYE MODERNIZACION)																		
1,1	"ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, INSTALACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION CREG 101013 DE 2022	MES	35.532.400,00	6	213.194.400,00			6	213.194.400,00	1,00	35.532.400	1	35.532.400,00	1,00	35.532.400	1,00	35.532.400	2	71.064.800
1,2	SUMINISTRO E INSTALACION LICAP LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO LED 50W 130Lm	UND	1.037.416,00	366	379.694.256,00		65	301	312.262.216,00	7,00	7.261.912	73	75.731.368,00	42,00	43.571.472	88,00	91.292.608	91	94.404.856
1,3	SUMINISTRO E INSTALACION LICAP LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO LED 80W 130Lm	UND	1.162.996,00	100	116.296.600,00		20	80	93.037.280,00		-	8	9.303.728,00	22,00	25.585.252	39,00	45.355.674	11	12.792.626
1,4	SUMINISTRO E INSTALACION LICAP LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO LED 100W-120W 130Lm	UND	1.256.086,00	50	62.804.300,00	20		70	87.926.020,00		-	31	38.938.666,00	39,00	48.987.354		-	-	-
1,5	SUMINISTRO E INSTALACION LICAP LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO REFLECTOR LED 200W 130Lm	UND	1.767.986,50	120	214.558.380,00		22	98	175.222.677,00		-	4	7.151.946,00	9,00	16.091.879	20,00	35.759.730	65	116.219.123
1,6	SUMINISTRO E INSTALACION LICAP LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO REFLECTOR LED 400W 130Lm	UND	2.054.276,50	60	123.259.590,00		60	-	-		-		-		-		-	-	-
	SUBTOTAL MANTENMIENTO				1.109.804.526,00				881.642.593,00	8,00	42.794.912	117	160.658.108,00	113,00	169.768.357	148,00	207.940.412		294.491.405
2	EXPANSION																		
2,1	SUMINISTRO E INSTALACION LICAP LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO LED 50W 130Lm	UND	1.037.416,00	51	52.908.216,00			51	52.908.216,00		-		-	41,00	42.534.056	10,00	10.374.160	-	-
2,2	SUMINISTRO E INSTALACION LICAP LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO REFLECTOR LED 200W 130Lm	UND	1.787.986,50	16	28.607.784,00		12	4	7.151.946,00		-		-		-		-	4	7.151.946
2,3	SUMINISTRO E INSTALACION LICAP LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO REFLECTOR LED 400W 130Lm	UND	2.054.276,50	12	24.651.318,00		12	-	-		-		-		-		-	-	-
2,4	SUMINISTRO E INSTALACION LICAP REDES EXCLUSIVAS DE ALUMBRADO PUBLICO	ML	35.568,32	418	14.909.357,76		2	416	14.838.021,12		-		-	140,00	4.993.585		-	276	9.844.436
2,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE MET CONICO OCTOGONAL DE 8M	UND	2.098.890,33	20	41.977.806,60			20	41.977.806,60		-		-	4,00	8.395.561	16,00	33.582.245	-	-
2,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO PRFV DE 10MT	UND	2.243.690,33	12	26.924.283,96		12	-	-		-		-		-		-	-	-
2,7	SUMINISTRO E INSTALACION LICAP LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO ORNAMENTAL LED 60W 130Lm/IN (O SUPERIOR)	UND	1.675.358,00	10	16.753.560,00	7		17	28.481.052,00		-		-		-		-	17	28.481.052
2,8	SUMINISTRO E INSTALACION LICAP CONTROL PROGRAMABLE	UND	1.238.046,00	3	3.714.138,00		2	1	1.238.046,00		-		-		-		-	1	1.238.046
2,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE MET DE 5M	UND	1.385.502,00	10	13.855.020,00	7		17	23.570.534,00		-		-		-		-	17	23.570.534
2,10	ELABORACION DE DISEÑOS LUMINICOS VILLA OLIMPICA	GLO	9.900.000,00	1	9.900.000,00			1	9.900.000,00		-		-		-		-	1	9.900.000
2,11	CERTIFICACIONES RETILAP VILLA OLIMPICA	GLO	9.900.000,00	1	9.900.000,00			1	9.900.000,00		-		-		-		-	1	9.900.000
	SUBTOTAL EXPANSION				244.111.484,32				189.955.621,72	-	-	-	-	185,00	55.923.182	26,00	43.956.405		90.066.034
3	ITEMS NO PREVISTOS																		
3,1	DESMONTE DE REFLECTORES EXISTENTES	UND	91.695,00		-	36		36	3.299.976,00	36,00	3.299.976		-		-		-	-	-
3,2	MANTENIMIENTO DE POSTES Y CRUCETAS	UND	207.201,00		-	6		6	1.243.206,00	6,00	1.243.206		-		-		-	-	-
3,3	SUMINISTRO E INSTALACION UCAP LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO REFLECTOR LED SYLFLOOD 960W CW 45°	UND	4.610.555,00		-	32		32	147.537.760,00	32,00	147.537.760		-		-		-	-	-
3,4	SUMINISTRO E INSTALACION UCAP LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO REFLECTOR LED SYLFLOOD 300W	UND	2.148.518,67			30		30	64.455.560,00						-		-	30	64.455.560
3,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 14 MT	UND	5.640.665,83		-	6		6	33.843.995,00		-		-		-		-	6	33.843.995
3,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 8 MTS 510 KGF	UND	2.154.032,83		-	4		4	8.616.131,33		-		-		-		-	4	8.616.131
3,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES Y CANALIZACION REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL	GLO	11.627.950,45		-	1		1	11.627.950,45	1,00	11.627.950		-		-		-	-	-
3,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES EXPANSION VILLA OLIMPICA	GLO	6.650.994,00		-	1		1	6.650.994,00	-	-		-		-		-	1	6.650.994
3,9	DISEÑOS LUMINICOS ESTADIO JOSE A GALAN	GLO	5.000.000,00		-	1		1	5.000.000,00		-		-		-		-	1	5.000.000
	SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS				-				282.276.572,78		163.708.892		-		-		-		118.565.630
	VALOR COSTO DIRECTO				1.353.916.010,32				1.353.883.787,50		206.503.204		166.658.108,00		225.691.539		251.896.817		503.134.119
	ADMINISTRACION DE LA OBRA			29%	392.635.642,99			29%	392.626.298,38	29%	59.885.929	29%	48.330.851,32	29%	65.450.546	29%	73.050.077	29%	145.908.895
	IMPREVISTOS			1%	13.539.160,10			1%	13.538.837,88	1%	2.065.032	1%	1.666.581,08	1%	2.256.915	1%	2.518.968	1%	5.031.341
	UTILIDAD			5%	67.695.800,52			5%	67.694.189,38	5%	10.325.160	5%	8.332.905,40	5%	11.284.577	5%	12.594.841	5%	25.156.706
	TOTAL OBRA				1.827.786.613,93				1.827.743.113,13		278.779.326		224.988.445,80		304.683.577		340.060.703		679.231.061
	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO								43.500,81										43.501
	SUMAS IGUALES				1.827.786.613,93				1.827.786.613,93		278.779.326		224.988.445,80		304.683.577		340.060.703		679.274.562

ITAF S.A.S
NIT 900.683.861-1

FACTOR MULTIPLICADOR PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2025

ITEM	CONCEPTO Y/O CATEGORIA	CANT	DEDICACION (MES) %	VALOR MENSUAL	VALOR DEDICACION POR MES	DURACION (MES)	VALOR PARCIAL
1	**PERSONAL PROFESIONAL**						
1,1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	50%	$ 4.200.000	$ 2.100.000	1	$ 2.100.000
1,2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	100%	$ 2.700.000	$ 2.700.000	1	$ 2.700.000
1,3	PROFESIONAL DE ASPECTOS FINANCIEROS	1	100%	$ 1.500.000	$ 1.500.000	1	$ 1.500.000
1,4	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	35%	$ 1.423.500	$ 498.225	1	$ 498.225
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 6.798.225**
	FACTOR MULTIPLICADOR						**$ 2,20**
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 14.956.095**
ITEM	CONCEPTO Y/O CATEGORIA	CANT	UNIDAD	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL MENSUAL	DURACION (MES)	VALOR PARCIAL
2	**OTROS COSTOS DIRECTOS (GENERALIDADES)**						
2,1	COSTOS INFORMES + MEMORIAS FOTOGRAFICAS + PLANOS	1	$ 1.530.000	$ 1.530.000	$ 1.530.000	1	$ 1.530.000
2,2	COSTOS EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	1	$ 760.000	$ 760.000	$ 760.000	1	$ 760.000
2,3	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1	$ 320.000	$ 320.000	$ 320.000	1	$ 320.000
2,4	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 350.000	$ 350.000	$ 350.000	1	$ 350.000
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS						**$ 2.960.000**
	TOTAL COSTOS ACTIVIDADES POR AREAS Y OTROS COSTOS DIRECTOS						**$ 17.916.095**
	IVA (19%)						**$ 3.404.058**
	VALOR TOTAL COSTOS DE LA INTERVENTORIA						**$ 21.320.153**

CALLE 31 NO. 23-40 GIRON - SANTANDER
TELÉFONO: (7) 6812408 - 3153035155
Correo: itafsas@gmail.com

ITAF S.A.S
NIT 900.683.861-1

		CALCULO FACTOR MULTIPLICADOR COSTOS DE PERSONAL		%	$
A.		VALOR BASE (Sueldos)		100,000	$ 6.798.225
B.		PRESTACIONES SOCIALES		59,000	$ 4.010.953
	a.	Cesantías	(A/12)	8,330	$ 566.292
	b.	Intereses sobre Cesantías	(a*12%)	1,000	$ 67.982
	c.	Prima Anual	(A/12)	8,330	$ 566.292
	d.	Caja de Compensación	%A	4,000	$ 271.929
	e.	SENA	%A	2,000	$ 135.965
	f.	ICBF	%A	3,000	$ 203.947
	g.	Sistema de Seguridad Social: Salud	%A	8,380	$ 569.691
	h.	Sistema de Seguridad Social: Pensión	%A	12,000	$ 815.787
	i.	ARP personal	%A	6,960	$ 473.156
	j.	Vacaciones	(18/360*100)	5,000	$ 339.911
C.		SUMA (A+B)		159,000	$ 10.809.178
D.		COSTOS INDIRECTOS		15,000	$ 1.019.734
		GASTOS DE ADMINISTRACION			$ -
	a.	ALQUILER DE OFICINA	%A	5,000	$ 339.911
	b.	GASTOS DE TRANSPORTE Y VEHICULOS	%A	2,000	$ 135.965
	c.	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO	%A	2,000	$ 135.965
	d.	PERSONAL TECNICO NO FACTURABLE Y ADMINISTRATIVO	%A	4,000	$ 271.929
	e.	SEGUROS Y ASESORIA LEGAL	%A	2,000	$ 135.965
E.		SUBTOTAL (C+D)		174,000	$ 11.828.912
F.		HONORARIOS (26% Personal)	%A	26,000	$ 1.767.539
G.		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	%A	20,000	$ 1.359.645
H.		FACTOR MULTIPLICAADOR (E+F+H)		220,000	$ 14.956.095

CALLE 31 NO. 23-40 GIRON - SANTANDER
TELÉFONO: (7) 6812408 - 3153035155
Correo: itafsas@gmail.com

ITAF S.A.S
NIT 900.683.861-1

ITEM A Y B
PERSONAL DIRECTO
ITEM D. LITERAL d.
PERSONAL TECNICO NO FACTURABLE Y ADMINISTRATIVO

NOMINAS
PRESTACIONES SOCIALES
Y SEGURIDAD SOCIAL

CALLE 31 NO. 23-40 GIRON - SANTANDER
TELÉFONO: (7) 6812408 - 3153035155
Correo: itafsas@gmail.com

IITAF S.A.S
NIT. 900.683.861-1

NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

PERSONAL DIRECTO CONTRATO CMA-SOC-2025-01														
FUNCIONARIO	*CEDULA*	*DIAS*	SUELDO		BONIF	EXTRAS	AUXILIO	TOTAL	SALARIO	SALUD	PENSION	TOTAL	NETO A	*FIRMA*
		LAB.	BASICO	SUELDO	NO PREST	ADICIONAL	TRANPORTE	DEVENGADO	BASE DCTO			DESCUENTOS	PAGAR	*CONFORME*
DPTO ADMINISTRATIVO														
ALFREDO SERRANO	13.836.863	*30*	2.100.000	2.100.000	*0*	*0*	200.000	2.300.000	2.100.000	39.200	126.900	166.100	2.133.900	
NOLBER PEÑARANDA	1.096.950.107	*30*	2.700.000	2.700.000	*0*	*0*	200.000	2.900.000	2.700.000	50.400	126.900	177.300	2.722.700	
BELCY YULIETH BONILLA	1.092.343.954	*30*	1.500.000	1.500.000	*0*	*0*	200.000	1.700.000	1.500.000	28.000	28.000	56.000	1.644.000	
NYDIA MARIA VASQUEZ BAUTISTA	63.539.971	*30*	498.225	498.225	*0*	*0*	200.000	698.225	498.225	9.300	9.300	18.600	679.625	
TOTAL PERSONAL DIRECTO CONTRATO CMA-SOC-2025-01			6.798.225	6.798.225	0	0	800.000	7.598.225	6.798.225	126.900	291.100	418.000	7.180.225	

PRESTACIONES SOCIALES CAUSADAS PARA PAGO AL FINALIZAR EL CONTRATO

		Dias	*ASIGNACIONES*				*8,333*	*12%*	*8,333*	*4,177*	TOTAL
Funcionario	*CEDULA*	*Laborados*	*Sueldo Básico*	*Aux. Transporte*	*H. extras*	*Total Devengado*	*Cesantias*	*I.Cesantias*	*Prima*	*Vacaciones*	PROVISIONES
ALFREDO SERRANO	13836863	30	*2.100.000*	*200.000*		*2.300.000*	*191.659*	*22.999*	*191.659*	*87.717*	494.034
NOLBER PEÑARANDA	1096950107	30	*2.700.000*	*200.000*		*2.900.000*	*241.657*	*28.999*	*241.657*	*112.779*	625.092
BELCY YULIETH BONILLA	1092343954	30	*1.500.000*	*200.000*		*1.700.000*	*141.661*	*16.999*	*141.661*	*62.655*	362.976
NYDIA MARIA VASQUEZ BAUTISTA	63539971	30	*498.225*	*200.000*		*698.225*	*58.183*	*6.982*	*58.183*	*20.811*	144.159
			6.798.225	*800.000*	*0*	*7.598.225*	*633.160*	*75.979*	*633.160*	*283.962*	*1.626.261*

PERSONAL TECNICO NO FACTURABLE Y ADMINISTRATIVO														
FUNCIONARIO	*CEDULA*	*DIAS*	SUELDO		BONIF	EXTRAS	AUXILIO	TOTAL	SALARIO	SALUD	PENSION	TOTAL	NETO A	*FIRMA*
		LAB.	BASICO	SUELDO	NO PREST	ADICIONAL	TRANPORTE	DEVENGADO	BASE DCTO			DESCUENTOS	PAGAR	*CONFORME*
DPTO ADMINISTRATIVO														
EDILSE SERRANO CARREÑO	30.228.887	*30*	1.423.500	1.423.500	*0*	*0*	200.000	1.623.500	1.423.500	0	0	0	1.623.500	
TOTAL PERSONAL NO FACTURABLE Y ADMINISTRATIVO			1.423.500	1.423.500	0	0	200.000	1.623.500	1.423.500	0	0	0	1.623.500	

PRESTACIONES SOCIALES CAUSADAS PARA PAGO AL FINALIZAR EL CONTRATO

		Dias	*ASIGNACIONES*				*8,333*	*12%*	*8,333*	*4,177*	TOTAL
Funcionario	*CEDULA*	*Laborados*	*Sueldo Básico*	*Aux. Transporte*	*H. extras*	*Total Devengado*	*Cesantias*	*I.Cesantias*	*Prima*	*Vacaciones*	PROVISIONES
EDILSE SERRANO CARREÑO	30228887	30	*1.423.500*	*200.000*		*1.623.500*	*135.286*	*16.234*	*135.286*	*59.460*	346.266
TOTAL PERSONAL NO FACTURABLE Y ADMINISTRATIVO			*1.423.500*	*200.000*	*0*	*1.623.500*	*135.286*	*16.234*	*135.286*	*59.460*	*346.266*

IITAF S.A.S
NIT. 900.683.861-1

NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

PERSONAL DIRECTO CONTRATO CMA-SOC-2025-01														
FUNCIONARIO	*CEDULA*	*DIAS*	SUELDO		BONIF	EXTRAS	AUXILIO	TOTAL	SALARIO	SALUD	PENSION	TOTAL	NETO A	*FIRMA*
		LAB.	BASICO	SUELDO	NO PREST	ADICIONAL	TRANPORTE	DEVENGADO	BASE DCTO			DESCUENTOS	PAGAR	*CONFORME*
DPTO ADMINISTRATIVO														
ALFREDO SERRANO	13.836.863	*30*	2.100.000	2.100.000	*0*	*0*	200.000	2.300.000	2.100.000	39.200	126.900	166.100	2.133.900	
NOLBER PEÑARANDA	1.096.950.107	*30*	2.700.000	2.700.000	*0*	*0*	200.000	2.900.000	2.700.000	50.400	126.900	177.300	2.722.700	
BELCY YULIETH BONILLA	1.092.343.954	*30*	1.500.000	1.500.000	*0*	*0*	200.000	1.700.000	1.500.000	28.000	28.000	56.000	1.644.000	
NYDIA MARIA VASQUEZ BAUTISTA	63.539.971	*30*	498.225	498.225	*0*	*0*	200.000	698.225	498.225	9.300	9.300	18.600	679.625	
TOTAL PERSONAL DIRECTO CONTRATO CMA-SOC-2025-01			**6.798.225**	**6.798.225**	**0**	**0**	**800.000**	**7.598.225**	**6.798.225**	**126.900**	**291.100**	**418.000**	**7.180.225**	

PRESTACIONES SOCIALES CAUSADAS PARA PAGO AL FINALIZAR EL CONTRATO

		Dias	*ASIGNACIONES*				*8,333*	*12%*	*8,333*	*4,177*	TOTAL
Funcionario	*CEDULA*	*Laborados*	*Sueldo Básico*	*Aux. Transporte*	*H. extras*	*Total Devengado*	*Cesantias*	*I.Cesantias*	*Prima*	*Vacaciones*	PROVISIONES
ALFREDO SERRANO	13836863	30	*2.100.000*	*200.000*		*2.300.000*	*191.659*	*22.999*	*191.659*	*87.717*	494.034
NOLBER PEÑARANDA	1096950107	30	*2.700.000*	*200.000*		*2.900.000*	*241.657*	*28.999*	*241.657*	*112.779*	625.092
BELCY YULIETH BONILLA	1092343954	30	*1.500.000*	*200.000*		*1.700.000*	*141.661*	*16.999*	*141.661*	*62.655*	362.976
NYDIA MARIA VASQUEZ BAUTISTA	63539971	30	*498.225*	*200.000*		*698.225*	*58.183*	*6.982*	*58.183*	*20.811*	144.159
			6.798.225	***800.000***	***0***	***7.598.225***	***633.160***	***75.979***	***633.160***	***283.962***	***1.626.261***

PERSONAL TECNICO NO FACTURABLE Y ADMINISTRATIVO														
FUNCIONARIO	*CEDULA*	*DIAS*	SUELDO		BONIF	EXTRAS	AUXILIO	TOTAL	SALARIO	SALUD	PENSION	TOTAL	NETO A	*FIRMA*
		LAB.	BASICO	SUELDO	NO PREST	ADICIONAL	TRANPORTE	DEVENGADO	BASE DCTO			DESCUENTOS	PAGAR	*CONFORME*
DPTO ADMINISTRATIVO														
EDILSE SERRANO CARREÑO	30.228.887	*30*	1.423.500	1.423.500	*0*	*0*	200.000	1.623.500	1.423.500	0	0	0	1.623.500	
TOTAL PERSONAL NO FACTURABLE Y ADMINISTRATIVO			**1.423.500**	**1.423.500**	**0**	**0**	**200.000**	**1.623.500**	**1.423.500**	**0**	**0**	**0**	**1.623.500**	

PRESTACIONES SOCIALES CAUSADAS PARA PAGO AL FINALIZAR EL CONTRATO

		Dias	*ASIGNACIONES*				*8,333*	*12%*	*8,333*	*4,177*	TOTAL
Funcionario	*CEDULA*	*Laborados*	*Sueldo Básico*	*Aux. Transporte*	*H. extras*	*Total Devengado*	*Cesantias*	*I.Cesantias*	*Prima*	*Vacaciones*	PROVISIONES
EDILSE SERRANO CARREÑO	30228887	30	*1.423.500*	*200.000*		*1.623.500*	*135.286*	*16.234*	*135.286*	*59.460*	346.266
TOTAL PERSONAL NO FACTURABLE Y ADMINISTRATIVO			***1.423.500***	***200.000***	***0***	***1.623.500***	***135.286***	***16.234***	***135.286***	***59.460***	***346.266***

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACION:	900883661
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ITAF SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CLL 36 13 51 OF 404	TELÉFONO:	6912408
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7997554161	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1978352797

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	MORA	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 759.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 759.400	$ 0	$ 0	$ 759.400
230301	230301-PORVENIR	2	$ 2.106.100	$ 0	$ 0	$ 65.900	$ 65.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.237.900	$ 0	$ 0	$ 2.237.900
SUBTOTALES:											$ 2.997.300	$ 0	$ 0	$ 2.997.300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS046	EPS046-SALUD MIA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 132.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.900	$ 0	$ 0	$ 132.900
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 371.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 371.100	$ 0	$ 0	$ 371.100
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 296.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 296.500	$ 0	$ 0	$ 296.500
SUBTOTALES:													$ 800.500	$ 0	$ 0	$ 800.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.392.800	$ 1.392.800	$ 0	$ 0	$ 1.392.800
SUBTOTALES:									$ 1.392.800	$ 0	$ 0	$ 1.392.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	5	$ 800.500	$ 0	$ 800.500
SUBTOTALES:			$ 800.500	$ 0	$ 800.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1092343954	RONILA DURAN BELCY YULIETH	DEPENDIENTE		$ 3.322.000	FIJO		SI																	
2	CC 1098950107	PEÑARANDA HARDAS HOLGER LEBALLO	DEPENDIENTE		$ 7.411.690	FIJO		SI																	
3	CC 1098662407	MORALES TORRA LVIMER MAURICIO	DEPENDIENTE		$ 5.750.940	FIJO		SI																	
4	CC 13836863	SERRANO RUEDA ALFREDO	DEPENDIENTE	NO OBLIG COT PENSIONES	$ 2.100.000	FIJO		SI																	
5	CC 30206887	SERRANO CARRENO EDILSE	DEPENDIENTE		$ 1.423.500	FIJO		SI																	

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES: DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.322.000	$ 531.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 531.600	EPS046-SALUD MIA EPS	30	$ 3.322.000	$ 132.900	$ 0	$ 132.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.322.000	1	$ 231.300	30	$ 3.322.000	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 132.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	230301 PORVENIR	30	$ 7.411.690	$ 1.185.900	$ 37.100	$ 37.100	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.260.100	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 7.411.690	$ 296.500	$ 0	$ 296.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 7.411.690	1	$ 515.900	30	$ 7.411.690	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 296.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	230301-PORVENIR	30	$ 5.750.940	$ 920.200	$ 28.800	$ 28.800	$ 0	$ 0	Normal	$ 977.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 5.750.940	$ 230.100	$ 0	$ 230.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 5.750.940	1	$ 400.300	30	$ 5.750.940	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 230.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.100.000	$ 84.000	$ 0	$ 84.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.100.000	1	$ 146.200	30	$ 2.100.000	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	1	$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 5.991.100

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900683961
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ITAF SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CLL. 36 13 51 OF 404	TELÉFONO:	6812408
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	02 - SUCURSAL 2
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6000231533	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2025
DIAS DE MORA:			7				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/12/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2025301049

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 227.800	$ 1.100	$ 228.900
SUBTOTALES:										$ 227.800	$ 1.100	$ 228.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACION	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 57.000	$ 300	$ 0	$ 57.300
SUBTOTALES:													$ 57.000	$ 300	$ 0	$ 57.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 500	$ 0	$ 99.600
SUBTOTALES:									$ 99.100	$ 500	$ 0	$ 99.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	1	$ 57.000	$ 300	$ 57.300
SUBTOTALES:			$ 57.000	$ 300	$ 57.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RETORNA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 63539971	VARGUEZ BAUTISTA NYDIA MARIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																	

SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800

SEGURIDAD SOCIAL SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000

SEGURIDAD SOCIAL ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	1	$ 99.100

PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
$ 1.423.500	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 443.100

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900683861
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ITAF SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CLL 36 13 51 OF 404	TELEFONO:	6812408
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	SURCUSAL - SURCUSAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		79941410 36		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2025
DIAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/06		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1909220230	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 432.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 432.000	$ 0	$ 432.000
SUBTOTALES:										$ 432.000	$ 0	$ 432.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 84.000
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 108.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.000	$ 0	$ 0	$ 108.000
SUBTOTALES:													$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 192.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 334.200	$ 334.200	$ 0	$ 0	$ 334.200
SUBTOTALES:									$ 334.200	$ 0	$ 0	$ 334.200

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	2	$ 192.000	$ 0	$ 192.000
SUBTOTALES:			$ 192.000	$ 0	$ 192.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSION								SALUD						ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																											ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1006960107	HERNANDEZ VARGAS KOLBEN YSAACO	DEPEND		$ 2.700.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.700.000	$ 432.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 432.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.700.000	$ 108.000	$ 0	$ 108.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.700.000	1	$ 168.000	30	$ 2.700.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 108.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 13836853	SERRANO RUEDA ALFREDO	DEPEND	NO OBLIG COT PENSION	$ 2.100.000	FIJO			SI																			30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.100.000	$ 84.000	$ 0	$ 84.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.100.000	1	$ 146.200	30	$ 2.100.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.150.200

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900683861
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ITAF SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CLL 36 13 51 OF 404	TELÉFONO:	6812408
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	02 - SUCURSAL 2
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			5167697871	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/11/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			0752504696

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 759.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 759.400	$ 0	$ 759.400
230301	230301-PORVENIR	1	$ 889.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 889.500	$ 0	$ 889.500
SUBTOTALES:										$ 1.648.900	$ 0	$ 1.648.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 279.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 279.400	$ 0	$ 0	$ 279.400
EPS046	EPS046-SALUD MIA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 132.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.900	$ 0	$ 0	$ 132.900
SUBTOTALES:													$ 412.300	$ 0	$ 0	$ 412.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 717.400	$ 717.400	$ 0	$ 0	$ 717.400
SUBTOTALES:									$ 717.400	$ 0	$ 0	$ 717.400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40 COMFENALCO SANTANDER	3	$ 412.300	$ 0	$ 412.300
SUBTOTALES:			$ 412.300	$ 0	$ 412.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD						ARP								CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1092343954	BONILLA JURAN KELCY YULIETH	DEPEND		$ 3.322.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.322.000	$ 531.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 531.600	EPS046-SALUD MIA EPS	30	$ 3.322.000	$ 132.900	$ 0	$ 132.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.322.000	1	$ 231.300	30	$ 3.322.000	$CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 132.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1098662407	MORALES TORRA VILMER MAURICIO	DEPEND		$ 5.750.940	FIJO			SI	02																230301-PORVENIR	29	$ 5.559.242	$ 889.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 889.500	EPS005-SANITAS S.A.	29	$ 5.559.242	$ 222.400	$ 0	$ 222.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 5.559.242	1	$ 387.000	29	$ 5.559.242	$CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 222.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 30206887	SERRANO CARRENO ROSA ELISE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	1	$ 99.1000	30	$ 1.423.500	$CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 3.190.900

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900883861
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ITAF SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CL. 36 13 51 OF 404	TELÉFONO:	6812408
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	02 - SUCURSAL 2
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6000231355	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			34		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/12/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2025269286

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.900	$ 0	$ 227.800	$ 4.900	$ 232.700
SUBTOTALES:										$ 227.800	$ 4.900	$ 232.700

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 57.000	$ 1.300	$ 0	$ 58.300
SUBTOTALES:													$ 57.000	$ 1.300	$ 0	$ 58.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 2.200	$ 0	$ 101.300
SUBTOTALES:									$ 99.100	$ 2.200	$ 0	$ 101.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	1	$ 57.000	$ 1.300	$ 58.300
SUBTOTALES:			$ 57.000	$ 1.300	$ 58.300

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 63539971	VASQUEZ BAUTISTA NYDIA MARIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	1	$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 450.600

ITAF S.A.S
NIT 900.683.861-1

ITEM D. LITERAL a.
ALQUILER DE OFICINA

CALLE 31 NO. 23-40 GIRON - SANTANDER
TELÉFONO: (7) 6812408 - 3153035155
Correo: itafsas@gmail.com

CUENTA DE COBRO

FECHA DE ELABORACIÓN			NÚMERO
18	11	2025	016

CENTRO DE COSTO CONTRATO CMA-SOC-2025-01

INFORMACIÓN DEL VENDEDOR

RAZON SOCIAL	TIPO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DV
LUISA YOLANDA OSORIO CORZO	☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ OTRO	63313287	

DIRECCIÓN	CIUDAD	NÚMERO TELEFÓNICO	DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
CRA 23 30 28 APTO 201	GIRON		

INFORMACIÓN DEL COMPRADOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DV
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ITAF SAS	NIT	900.683.861	1

CORREO	CIUDAD	NÚMERO TELEFÓNICO
itafsas@gmail.com		

FECHA DD / MM / AAAA	CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR DE LA OPERACIÓN UNITARIO	VALOR DE LA OPERACIÓN TOTAL
18/11/2025	1	ARRIENDO OFICINA DEL 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBREDE 2025 LA TABLA DE RETENCIONES DE RENTAS LABORALES ARTICULO 383 DEL E.T.		$ 340.000

NOTAS

Fecha límite de pago:

TOTAL	$ 340.000
RTE FTE ___ %	
RTE ICA ___ X1000	
TOTAL A PAGAR	**$ 340.000**
RTE IVA REGIMEN SIMPLE	

ANEXOS (Marque con una "X")

☐ Aportes ARP ☐ Aportes AFC o pensiones voluntarias ☐ RUT

☐ Aportes salud ☐ Aportes pensiones

ESPACIO DE USO EXCLUSIVO DEL COMPRADOR

NÚMERO CONSECUTIVO

INFORMACIÓN DE DISMINUCIONES A LA BASE DE RETENCIÓN

Concepto	Entidad a la que se aporta	Base de aporte	Valor aportado	Fecha pago de aportes DD	Fecha pago de aportes MM
Aportes Obligatorios a Salud					
Aportes Obligatorios a Pensión					
Aportes Voluntarios a Pensión					
Aportes ARP					
Cuentas AFC					

FIRMA

ITAF S.A.S
NIT 900.683.861-1

ITEM 2.4
SERVICIO DE TRANSPORTE

E

ITEM D. LITERAL b.
GASTOS DE TRANSPORTE Y VEHICULOS

CALLE 31 NO. 23-40 GIRON - SANTANDER
TELÉFONO: (7) 6812408 - 3153035155
Correo: itafsas@gmail.com

CUENTA DE COBRO

FECHA DE ELABORACIÓN			NÚMERO	CENTRO DE COSTO CONTRATO CMA-SOC-2025-01
18	11	2025	017	

INFORMACIÓN DEL VENDEDOR

RAZON SOCIAL	TIPO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DV
YILMER HUMBERTO VARGAS AVILA	☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ OTRO	1097994217	

DIRECCIÓN	CIUDAD	NÚMERO TELEFÓNICO	DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
CRA 27B 22 25 BRR GALLINERAL	GIRON		

INFORMACIÓN DEL COMPRADOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DV
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ITAF SAS	NIT	900.683.861	1

CORREO	CIUDAD	NÚMERO TELEFÓNICO
itafsas@gmail.com		

FECHA DD / MM / AAAA	CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR DE LA OPERACIÓN UNITARIO	VALOR DE LA OPERACIÓN TOTAL
18/11/2025	1	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBREDE 2025 LA TABLA DE RETENCIONES DE RENTAS LABORALES ARTICULO 383 DEL E.T.		$ 486.000

NOTAS

Fecha límite de pago:

TOTAL	$ 486.000
RTE FTE ___ %	
RTE ICA ___ X1000	
TOTAL A PAGAR	**$ 486.000**
RTE IVA REGIMEN SIMPLE	

ANEXOS (Marque con una "X")

☐ Aportes ARP ☐ Aportes AFC o pensiones voluntarias ☐ RUT

☐ Aportes salud ☐ Aportes pensiones

ESPACIO DE USO EXCLUSIVO DEL COMPRADOR

NÚMERO CONSECUTIVO

INFORMACIÓN DE DISMINUCIONES A LA BASE DE RETENCIÓN

Concepto	Entidad a la que se aporta	Base de aporte	Valor aportado	Fecha pago de aportes DD	Fecha pago de aportes MM
Aportes Obligatorios a Salud					
Aportes Obligatorios a Pensión					
Aportes Voluntarios a Pensión					
Aportes ARP					
Cuentas AFC					

FIRMA



ITAF S.A.S
NIT 900.683.861-1

ITEM 2.2
EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

E

ITEM D. LITERAL c.
ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO

CALLE 31 NO. 23-40 GIRON - SANTANDER
TELÉFONO: (7) 6812408 - 3153035155
Correo: itafsas@gmail.com

CUENTA DE COBRO

FECHA DE ELABORACIÓN			NÚMERO
18	11	2025	018

CENTRO DE COSTO CONTRATO CMA-SOC-2025-01

INFORMACIÓN DEL VENDEDOR

RAZON SOCIAL	TIPO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DV
BRAYAN ANDRES AMAYA ROJAS	☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ OTRO	1095925676	

DIRECCIÓN	CIUDAD	NÚMERO TELEFÓNICO	DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
CLL 45 D 32-07 BRR BELLAVISTA GIRON	GIRON		

INFORMACIÓN DEL COMPRADOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DV
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ITAF SAS	NIT	900.683.861	1

CORREO	CIUDAD	NÚMERO TELEFÓNICO
itafsas@gmail.com		

FECHA DD / MM / AAAA	CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR DE LA OPERACIÓN UNITARIO	VALOR DE LA OPERACIÓN TOTAL
18/11/2025	1	ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA Y EQUIPOS DE COMPUTO DEL 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBREDE 2025 LA TABLA DE RETENCIONES DE RENTAS LABORALES ARTICULO 383 DEL E.T.		$ 896.000

NOTAS

Fecha límite de pago:

TOTAL	$ 896.000
RTE FTE ___ %	
RTE ICA ___ X1000	
TOTAL A PAGAR	**$ 896.000**
RTE IVA REGIMEN SIMPLE	

ANEXOS (Marque con una "X")

☐ Aportes ARP ☐ Aportes AFC o pensiones voluntarias ☐ RUT

☐ Aportes salud ☐ Aportes pensiones

ESPACIO DE USO EXCLUSIVO DEL COMPRADOR

NÚMERO CONSECUTIVO

INFORMACIÓN DE DISMINUCIONES A LA BASE DE RETENCIÓN

Concepto	Entidad a la que se aporta	Base de aporte	Valor aportado	Fecha pago de aportes DD	Fecha pago de aportes MM
Aportes Obligatorios a Salud					
Aportes Obligatorios a Pensión					
Aportes Voluntarios a Pensión					
Aportes ARP					
Cuentas AFC					

FIRMA

BRAYAN AMAYA

ITAF S.A.S
NIT 900.683.861-1

ITEM D. LITERAL e.
SEGUROS Y ASESORIA LEGAL

ITEM F.
HONORARIOS (26% Personal)

CALLE 31 NO. 23-40 GIRON - SANTANDER
TELÉFONO: (7) 6812408 - 3153035155
Correo: itafsas@gmail.com

seguros mundial®

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
NIT 860037013-6
Dirección CARRERA 43 B NO. 16 - 95 OFICINA 713, Medellin, Colombia

031F4086028

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre	Id	Teléfono	Contacto
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	900683861		INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y
Dirección	**Ciudad**		**Correo Electrónico**
CL 31 23 40 BRR CASCO ANTIGUO	Giron, Colombia		itafsas@gmail.com

DATOS DE LA FACTURA

Fecha Factura	Fecha Vencimiento	Fecha Validación DIAN	Forma De Pago	Medio De Pago
17.07.2025 09:46:37	16.08.2025	17.07.2025 09:46:46-05:00	Crédito	Transferencia Débito Interbancario

DETALLE DE LA FACTURA

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	UNITARIO	DESCUENTOS/CARGOS		IMPUESTO		TOTAL
						%	VALOR	%	VALOR	
1		POLIZA CUMPLIMIENTO 100064962 ANEXO 0, CERTIFICADO 22276439	1	94	258.914			IVA 19,00	49.194	258.914

Total Linea Detalles: 1

OBSERVACIONES DE LA FACTURA

Esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida a partir de su fecha de vencimiento, Art. 884 del Código de Comercio.

	PESOS
SUBTOTAL	258.914
IVA 19,00%	49.194
TOTAL OPERACIÓN COP	**308.108**
TOTAL A PAGAR CLIENTE	**308.108**

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No 18764090747550 con vigencia del 2025-03-19 al 2027-03-19 . Numeración habilitada del 031F4000001 al 031F5500000
ACTIVIDAD ECONÓMICA 6511.
RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 000200 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024
AGENTE RETENEDOR DE IVA SEGÚN ESTATUTO TRIBUTARIO ARTICULO 437-2 NUMERAL 2
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA BOGOTÁ SEGÚN RESOLUCIÓN No. DDI-010761 DEL 30 DE MARZO DE 2016.
A LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SE LES PRACTICA RETENCIÓN SEGÚN ART. 17 DECRETO 2509 DE 1985.
CUFE: d1a20fbe151c4153efc59aabd2d8c863ddf5186085470057a6209a238680d23ba49a82964d5cd4909755ca602bacccc1c3
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA DE COBRO

FECHA DE ELABORACIÓN			NÚMERO	CENTRO DE COSTO CONTRATO CMA-SOC-2025-01
18	11	2025	019	

INFORMACIÓN DEL VENDEDOR

RAZON SOCIAL	TIPO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DV
NATALIA MONSALVE	☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ OTRO	1098667083	

DIRECCIÓN	CIUDAD	NÚMERO TELEFÓNICO	DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
CONDOMINIO RUITOQUE GOLF	GIRON		

INFORMACIÓN DEL COMPRADOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DV
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ITAF SAS	NIT	900.683.861	1

CORREO	CIUDAD	NÚMERO TELEFÓNICO
itafsas@gmail.com		

FECHA DD / MM / AAAA	CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR DE LA OPERACIÓN UNITARIO	VALOR DE LA OPERACIÓN TOTAL
18/11/2025	1	HONORARIOS ASESORIA LEGAL DEL 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBREDE 2025 LA TABLA DE RETENCIONES DE RENTAS LABORALES ARTICULO 383 DEL E.T.		$ 1.860.000

NOTAS

Fecha límite de pago:

TOTAL	$ 1.860.000
RTE FTE ___ %	
RTE ICA ___ X1000	
TOTAL A PAGAR	**$ 1.860.000**
RTE IVA REGIMEN SIMPLE	

ANEXOS (Marque con una "X")

☐ Aportes ARP ☐ Aportes AFC o pensiones voluntarias ☐ RUT

☐ Aportes salud ☐ Aportes pensiones

ESPACIO DE USO EXCLUSIVO DEL COMPRADOR

NÚMERO CONSECUTIVO

INFORMACIÓN DE DISMINUCIONES A LA BASE DE RETENCIÓN

Concepto	Entidad a la que se aporta	Base de aporte	Valor aportado	Fecha pago de aportes DD	Fecha pago de aportes MM
Aportes Obligatorios a Salud					
Aportes Obligatorios a Pensión					
Aportes Voluntarios a Pensión					
Aportes ARP					
Cuentas AFC					

FIRMA

ITAF S.A.S
NIT 900.683.861-1

ITEM G.
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

CALLE 31 NO. 23-40 GIRON - SANTANDER
TELÉFONO: (7) 6812408 - 3153035155
Correo: itafsas@gmail.com

Banco de Occidente

SAS CORPORACION DE SANTANDER

PAG 2 | 18 DIC 2025 | PAG 2

RECIBIDO

SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890 201 235-6

Recibo de recaudo No: 2502500855125

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
No. Documento: 9006838611
Nombre
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SAS ITAF SAS

TRAMITE
CONTRATO DE INTERVENTORIA

VALOR BASE	17 916 095
VALOR TOTAL CONTRATO	127 920 918
VALOR ORDEN DE PAGO	21 320 153
FECHA CONTRATO	18/07/2025
NRO. CONTRATO	001
NUMERO ORDEN DE PAGO	ITAF309

ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO CONTRIBUCIÓN

PRO HOSPITAL	$358 300
PRO UIS	$358 300

Banco de Occidente

TOTAL	$716 600
Ordenanza 041 de 2005	$71 660
Total a Pagar	**$788.260**

Con destino a:
Alcaldia de Socorro

Fecha expedición: 2025/12/18
Fecha límite de pago: 2025/12/24

Puede ingresar a
https://estampillas.syc.com.co/
para validar y consultar el detalle del pago de la Estampilla Departamental.

RE-OF-07L

SOPORTE TRÁMITE

Hora Imp 2025/12/18 15:04:55

ITAF S.A.S
NIT 900.683.861-1

ITEM 2.1
COSTOS INFORMES + MEMORIAS FOTOGRAFICAS + PLANOS

E

ITEM 2.3. FOTOCOPIAS

CALLE 31 NO. 23-40 GIRON - SANTANDER
TELÉFONO: (7) 6812408 - 3153035155
Correo: itafsas@gmail.com

CUENTA DE COBRO

FECHA DE ELABORACIÓN			NÚMERO	CENTRO DE COSTO CONTRATO CMA-SOC-2025-01
18	11	2025	020	

INFORMACIÓN DEL VENDEDOR

RAZON SOCIAL	TIPO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DV
NELSY SIERRA ALMEIDA	☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ OTRO	1095927812	

DIRECCIÓN	CIUDAD	NÚMERO TELEFÓNICO	DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
CLL 45A 32D 07	GIRON	3164756702	nelsyalmeida01@gmail.com

INFORMACIÓN DEL COMPRADOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DV
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ITAF SAS	NIT	900.683.861	1

CORREO	CIUDAD	NÚMERO TELEFÓNICO
itafsas@gmail.com		

FECHA DD / MM / AAAA	CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR DE LA OPERACIÓN UNITARIO	VALOR DE LA OPERACIÓN TOTAL
18/11/2025	1	SERVICIOS DE ESTRUCTURA Y DIGITACION DE INFORMES, FOTOCOPIAS IMPRESIONES A COLOR, ADECUACIONES Y CORRECCIONES DEL 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBREDE 2025 LA TABLA DE RETENCIONES DE RENTAS LABORALES ARTICULO 383 DEL E.T.		$ 1.850.000

NOTAS

Fecha límite de pago:

TOTAL	$ 1.850.000
RTE FTE ___ %	
RTE ICA ___ X1000	
TOTAL A PAGAR	$ 1.850.000
RTE IVA REGIMEN SIMPLE	

ANEXOS (Marque con una "X")

☐ Aportes ARP ☐ Aportes AFC o pensiones voluntarias ☐ RUT

☐ Aportes salud ☐ Aportes pensiones

ESPACIO DE USO EXCLUSIVO DEL COMPRADOR

NÚMERO CONSECUTIVO

INFORMACIÓN DE DISMINUCIONES A LA BASE DE RETENCIÓN

Concepto	Entidad a la que se aporta	Base de aporte	Valor aportado	Fecha pago de aportes DD	Fecha pago de aportes MM
Aportes Obligatorios a Salud					
Aportes Obligatorios a Pensión					
Aportes Voluntarios a Pensión					
Aportes ARP					
Cuentas AFC					

FIRMA

NELSY SIERRA A.
