GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**INFORME DE ACCIÓN PARTICIPATIVA**	Código: FO-M4-P3-040 Versión: 1 Fecha de aprobación: 13/Marzo/2024

***Proceso*: Fortalecimiento Institucional y de la Participación Ciudadana**
***Procedimiento*: Promoción y Fortalecimiento de la Participación Ciudadana**

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ACCION A EJECUTAR	
NOMBRE DE LA ACCIÓN DESARROLLA REPORTADA	ASESORÍA
SUBREGIÓN/MUNICIPIO	NORTE – CAROLINA DEL PRINCIPE
FECHA (DÍA – MES) Y HORA:	25 DE NOVIEMBRE DE 2025
LUGAR CON SU RESPECTIVA DIRECCIÓN:	Secretaría de Agricultura, municipio de Carolina del Príncipe. Área Urbana y Veredas: La Vega, Clarita, La herradura, Tenche.
NOMBRE DEL ORGANIZADOR O DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	OSCAR JAVIER GIRALDO PLAZA
OBJETIVO DE LA ACCION	APOYO A LA SUPERVISION DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS
ORGANISMO RESPONSABLE	GERENCIA DE LA UNIDAD DE PROGRAMAS SOCIALES
DEPENDENCIA	Dirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
LÍNEA PLAN DE DESARROLLO	Cohesión desde lo social
COMPONENTE	
NOMBRE DEL PROGRAMA	Seguridad alimentaria, nutricional y alimentación escolar.
INDICADOR DE PRODUCTO AL QUE LE CONTRIBUYE	Unidades productivas para el autoconsumo instaladas: 3000
NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO O PROYECTO EN EL QUE SE REALIZA LA ACTIVIDAD REPORTADA	Articular acciones para la producción sostenible y sustentable de alimentos a través de la implementación de unidades productivas agrícolas generadoras de seguridad alimentaria en el municipio de Carolina del Príncipe.

REPORTE DETALLADO DE LA ACCIÓN PROGRAMADA			
LA ACTIVIDAD REPORTADA REQUIERE LISTADO DE ASISTENCIA	Si: X No: __ Explique: La actividad es en común acuerdo con personal técnico municipal y beneficiarios tanto escolares como familiares, los cuales reciben capacitación además del apoyo a la supervisión de las U.P.		
GRUPOS DE VALOR CONVOCADOS O ACTORES PRIORIZADOS	Población beneficiaria tanto escolar como familiar y personal técnico municipal, convenio interadministrativo N°4600017525.		
REPRESENTANTES DE ESPACIO O INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN QUE HACEN PARTE DE LA ACCIÓN REPORTADA	Definir los integrantes (beneficiarios, personal municipal, técnicos convenios) en la parte de abajo.	**SI** **X**	**NO**

	Consejos Municipales de Participación Ciudadana y Control Social		
	Consejos Municipales de Política Social (COMPOS)		
	Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR)		
	Consejos Territoriales de Planeación (CTP)		
	Consejo Municipal De Juventud		
	Plataforma de juventud		
	Consejos Comunitario de negritudes		
	Consejos municipales de cultura		
	Mesas de primera infancia, infancia y adolescencia y/o Familias		
	Comité Municipal de asignación de cupos y matriculas		
	Juntas Municipales de Educación		
	Comité Departamental de Educación		
	Comité municipal de convivencia escolar		
	Gobierno Escolar		
	Comités operativo de Educación		
	Otro	**X**	
	Cual: Beneficiarios U.P familiares y escolares: Personal municipal: (TECNICO DE CAMPO) SEBASTIAN PEÑA, (SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO) RAUL MAZO VELASQUEZ. Personal gobernación: (PROFESIONAL AGRO) OSCAR JAVIER GIRALDO PLAZA.		

INFORME DESCRIPTIVO DE LA ACCIÓN DESARROLLADA

1. AGENDA:

Con la descripción de la agenda de trabajo deberá dar cuenta de los siguientes ítems:

1.1. Modalidad de la acción:

- **Presencial**
- virtual
- mixta

1.2. Tipo de acción de participación

- **Municipal**
- Departamental

1.3. Fase del ciclo de la gestión a la cual contribuye la acción de participación desarrollada

- Diagnóstico
- Formulación,
- Ejecución
- **Seguimiento y evaluación.**

1.4. Nivel de incidencia de la participación

- Al ciudadano se le va a entregar información

***Proceso*: Fortalecimiento Institucional y de la Participación Ciudadana**
***Procedimiento*: Promoción y Fortalecimiento de la Participación Ciudadana**

- **Al ciudadano se le va a consultar**
- Al ciudadano se le va a permitir colaborar
- Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar
- Al ciudadano se le va a permitir formular y definir

2. DESARROLLO DE LA AGENDA

2.1. Mencionar las generalidades de la actividad realizada y la metodología:

De acuerdo a reuniones anteriores con la Supervisión y Coordinación de Producción Sostenible y Sustentable de Alimentos de los convenios intermunicipales, se decide realizar visitas de apoyo a la supervisión e implementación de Unidades Productivas tanto familiares como escolares. Se realizaron 08 visitas a U.P., dichas visitas fueron realizadas en el área urbana y rural en las Veredas: Claritas, La Vega, La granja, la María, Tenche, en el municipio de Carolina del Príncipe; en las cuales se encontró que en su gran mayoría están inactivas y algunas aun sin terminar.

2.2. Enumerar los principales resultados obtenidos en relación con el cumplimiento del objetivo de la acción de participación:

- VISITA N°1 Unidad productiva MARIA EUGENIA CALLE CER JOSE MARIA MENESES

  Ubicada en la vereda Tenche Miraflores, en la unidad se pudo apreciar las siguientes consideraciones:

- Estructural: La unidad se encuentra instalada, la soga pisadora no cumple los requerimientos técnicos puesto se encuentra en favor de la pendiente de la cubierta plástica en el centro lo que puede ocasionar daños en el plástico por el movimiento del viento y de igual forma no presta su función principal de soporte y tensado del plástico en los cuadrantes donde este no cuenta con soporte estructural de la guadua; la zona pecuaria se encuentra instalada.

- Sistema de riego: Se encuentra instalado efectivamente en las camas, y el tanque cuenta con el sistema de funcionamiento completo.

- Producción: Se logra evidenciar cultivos de Cilantro, zukini, coliflor, col china, col, ajo, tomate, arveja, espinaca, habichuela, remolacha, rábano, cebolla rama, cebolla huevo blanca y roja, brócoli, pimentón, albahaca, yerbabuena, menta, mora y uchuva; también se hace mención que no hay frutales aún suministrados.

  Registro Fotográfico:

***Proceso*:** Fortalecimiento Institucional y de la Participación Ciudadana
***Procedimiento*: Promoción y Fortalecimiento de la Participación Ciudadana**





- VISITA N°2 Unidad productiva LIZET CARDENAS PALACIO CER JOSE JOAQUIN VELEZ

  Ubicada en la vereda la herradura, en la unidad se pudo apreciar las siguientes consideraciones:

- Estructural: La unidad se encuentra instalada, la soga pisadora no cumple los requerimientos técnicos puesto se encuentra en favor de la pendiente de la cubierta plástica en el centro lo que puede ocasionar daños en el plástico por el movimiento del viento y de igual forma no presta su función principal de soporte y tensado del plástico en los cuadrantes donde este no cuenta con soporte estructural de la guadua; la zona pecuaria se encuentra instalada.

- Sistema de riego: Se encuentra instalado efectivamente en las camas, y el tanque cuenta con el sistema de funcionamiento completo.

- Producción: Se logra evidenciar cultivos de Cilantro, zukini, coliflor, col china, col, ajo, tomate, arveja, espinaca, habichuela, remolacha, rábano, cebolla rama, cebolla huevo blanca y roja, brócoli, pimentón, albahaca, yerbabuena, menta, mora y uchuva; también se hace mención que no hay frutales aún suministrados.

- Registro Fotográfico:



- VISITA N°3 Unidad productiva LUIS FERNANDO CADAVID


  Ubicada en la vereda La María, en la unidad se pudo apreciar las siguientes consideraciones:

- Estructural: la unidad se encuentra instalada, la soga pisadora no cumple los requerimientos técnicos puesto se encuentra en favor de la pendiente de la cubierta plástica en el centro lo que puede ocasionar daños en el plástico por el movimiento del viento y de igual forma no presta su función principal de soporte y tensado del plástico en los cuadrantes donde este no cuenta con soporte estructural de la guadua; la zona pecuaria se encuentra instalada.

- Sistema de riego: Se encuentra instalado efectivamente en algunas las camas, y el tanque cuenta con el sistema de funcionamiento completo.

- Producción: Las camas no se encuentran llenas y no se ha suministrado semillas y material vegetal.

  Registro Fotográfico:

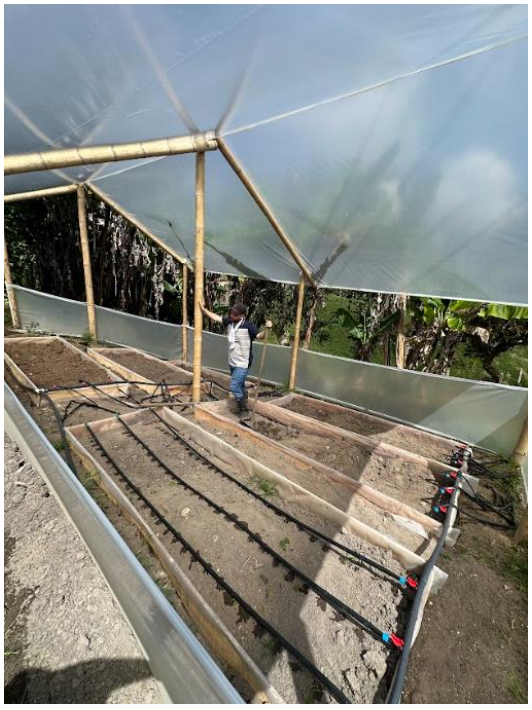



- VISITA N°4 Unidad productiva JUAN BERNARDO PASOS

  Ubicada en el sector urbana Barrio la Humareda, en la unidad se pudo apreciar las siguientes

consideraciones:

- Estructural: La unidad se encuentra instalada, la soga pisadora no cumple los requerimientos técnicos puesto se encuentra en favor de la pendiente de la cubierta plástica en el centro lo que puede ocasionar daños en el plástico por el movimiento del viento y de igual forma no presta su función principal de soporte y tensado del plástico en los cuadrantes donde este no cuenta con soporte estructural de la guadua; la zona pecuaria se encuentra instalada.

- Sistema de riego: Se encuentra instalado efectivamente en las camas, y el tanque cuenta con el sistema de funcionamiento completo.

- Producción: Se logra evidenciar cultivos de Cilantro, zukini, coliflor, col china, col, ajo, tomate, arveja, espinaca, habichuela, remolacha, rábano, cebolla rama, cebolla huevo blanca y roja, brócoli, pimentón, albahaca, yerbabuena, menta, mora y uchuva; también se hace mención que no hay frutales aún suministrados.

- Registro Fotográfico:



- VISITA N°5 Unidad productiva LUIS FERNANDO AGUDELO

  Ubicada en la vereda La Vega, en la unidad se pudo apreciar las siguientes consideraciones:

- Estructural: La unidad se encuentra instalada, la soga pisadora no cumple los requerimientos técnicos puesto se encuentra en favor de la pendiente de la cubierta plástica en el centro lo

que puede ocasionar daños en el plástico por el movimiento del viento y de igual forma no presta su función principal de soporte y tensado del plástico en los cuadrantes donde este no cuenta con soporte estructural de la guadua; la zona pecuaria se encuentra instalada.

- Sistema de riego: Se encuentra instalado efectivamente en las camas, y el tanque cuenta con el sistema de funcionamiento completo.

- Producción: Se logra evidenciar cultivos de Cilantro, zukini, coliflor, col china, col, ajo, tomate, arveja, espinaca, habichuela, remolacha, rábano, cebolla rama, cebolla huevo blanca y roja, brócoli, pimentón, albahaca, yerbabuena, menta, mora y uchuva; también se hace mención que no hay frutales aún suministrados.

Registro Fotográfico:





- VISITA N°6 Unidad productiva JESUS DARIO METAUTE

Ubicada en la vereda la Vega, en la unidad se pudo apreciar las siguientes consideraciones:

- Estructural: La unidad se encuentra instalada, la soga pisadora no cumple los requerimientos técnicos puesto se encuentra en favor de la pendiente de la cubierta plástica en el centro lo que puede ocasionar daños en el plástico por el movimiento del viento y de igual forma no presta su función principal de soporte y tensado del plástico en los cuadrantes donde este no cuenta con soporte estructural de la guadua; la zona pecuaria se encuentra instalada.

- Sistema de riego: Se encuentra instalado efectivamente en las camas, y el tanque cuenta con el sistema de funcionamiento completo.

- Producción: Se logra evidenciar cultivos de Cilantro, zukini, coliflor, col china, col, ajo, tomate, arveja, espinaca, habichuela, remolacha, rábano, cebolla rama, cebolla huevo blanca y roja, brócoli, pimentón, albahaca, yerbabuena, menta, mora y uchuva; también se hace mención que no hay frutales aún suministrados.

- Registro Fotográfico:



- VISITA N°7 Unidad productiva SILVIA MACIAS

  Ubicada en la vereda Claritas, en la unidad se pudo apreciar las siguientes consideraciones:

- Estructural: Se visualiza que la Unidad productiva, de igual forma que la visita realizada el mes de Agosto del presente año, cuenta con una estructura de invernadero en construcción pero con un poste de servicio de energía en el centro de la Unidad por lo que se debió realizar un hueco al techo y cubrir el poste con plástico para evitar que entre agua, este poste cuenta con cableados de energía libres y sueltos que significan un riesgo para la seguridad de las personas puesto la interacción de energía, plástico y agua bajo condiciones ambientales riesgosas puede generar un corto circuito y un incendio, así mismo el poste reduce y quita movilidad al interior de la unidad por encontrarse en la mitad de la unidad, la unidad cuenta

con cubierta de plástico sin tensores y con una dificultad en un costado del techo puesto se construyó el techo con medida reducida para que se instalara un sistema de conducción de agua para su posterior recolección y almacenamiento pero dicha modificación debió realizarse por fuera del punto de gotera y el cerramiento perimetral de la unidad, por lo que en este momento las guaduas que sirven de soporte al cortaviento del lado se encuentran expuestas a la intemperie y ya se logran visualizar daños por la alta humedad y pluviosidad de la zona puesto el exceso de agua en la parte superior, el agua que se recoge entre el plástico y la guadua y la humedad del suelo permanente están ocasionando una desintegración de la guadua por descomposición de la madera, la soga pisadora no cumple los requerimientos técnicos puesto se encuentra en favor de la pendiente de la cubierta plástica en el centro lo que puede ocasionar daños en el plástico por el movimiento del viento y de igual forma no presta su función principal de soporte y tensado del plástico en los cuadrantes donde este no cuenta con soporte estructural de la guadua.

- Sistema de riego: Se encuentra instalado efectivamente en las camas junto al tanque y el sistema de conducción.

- Producción: Las camas se encuentran llenas, pero no se ha suministrado semillas y material vegetal.

Registro Fotográfico:







- VISITA N°8 Unidad productiva YULIANA GALEANO

  Ubicada en la vereda Claritas, en la unidad se pudo apreciar las siguientes consideraciones:

- Estructural: La unidad se encuentra instalada, la soga pisadora no cumple los requerimientos técnicos puesto se encuentra en favor de la pendiente de la cubierta plástica en el centro lo que puede ocasionar daños en el plástico por el movimiento del viento y de igual forma no presta su función principal de soporte y tensado del plástico en los cuadrantes donde este no cuenta con soporte estructural de la guadua; la zona pecuaria se encuentra instalada.

- Sistema de riego: Se encuentra instalado efectivamente en algunas las camas, y el tanque cuenta con el sistema de funcionamiento completo.

- Producción: Las camas se encuentran llenas, pero no se ha suministrado semillas y material vegetal.

  Registro Fotográfico:







3. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

El proyecto de implementación de Unidades Productivas (U.P.) es una alternativa sólida, funcional y económica para fortalecer la seguridad alimentaria de las familias antioqueñas, razón por la cual es de vital importancia darle celeridad a este proyecto para completar su ejecución contractual puesto que se tienen las siguientes consideraciones:

Cabe resaltar que el informe presentado en el mes de octubre se hicieron las siguientes

apreciaciones:

"…El presente CONVENIO N°4600017525 con fecha de inicio del 23 de octubre de 2024 y con un plazo inicial de 10 meses, que fue prorrogado por 98 días bajo la modificación N°1 del 19 de mayo de 2025 para un plazo total de trece (13) meses y ocho (08) días, dando como fecha final el 30 de noviembre de 2025 para la implementación de 23 Unidades Productivas en el Municipio de Carolina del Príncipe.

Así como el cumplimiento de los siguientes compromisos técnicos: *"El técnico de campo realizará mínimo cuatro (4) visitas de asistencia técnica integral –ATI a cada uno de los hogares que implementa las Unidades Productivas. En la visita deberá diligenciar como fuente de verificación los formatos de visita de asistencia técnica integral – ATI y el formato de Seguimiento a la producción y sostenibilidad de la huerta, ambos se encuentran en el Aplicativo Survey. Para un total de 92 visitas a las VEINTITRES (23) Unidades productivas del proyecto."*

Es pertinente señalar que las Unidades Productivas Escolares presentan una particularidad asociada al calendario académico establecido por la Gobernación de Antioquia, el cual fija como fecha de culminación de las semanas lectivas y de los periodos académicos el 30 de noviembre. En este sentido, si para dicha fecha las actividades de siembra y desarrollo productivo no se encuentran finalizadas, se genera un desfase en la programación técnica y en la ejecución de las visitas de asistencia previstas. Adicionalmente, la salida a vacaciones de los docentes y estudiantes implica la ausencia de personal responsable del mantenimiento y seguimiento de los cultivos, lo que reduce significativamente la sostenibilidad de las unidades productivas y representa un riesgo para la continuidad y el uso adecuado de la inversión del proyecto.

A la fecha del 22 de octubre de 2025 de la visita se puede evidenciar un retraso considerable en la implementación y puesta en marcha de las Unidades Productivas conveniadas entre las partes.

Finalmente es importante que el conveniante tenga presente los anexos técnicos, el presupuesto aprobado y los lineamientos bajo los cuales se realizó el convenio con la Gobernación de Antioquia para que, de efectivo cumplimiento en tiempo y calidad a las obligaciones, evitando comprometer la vida útil y el manejo eficiente de los recursos públicos…"

Es vital tener en cuenta los aspectos técnicos, jurídicos y financieros de ejecución de los contratos públicos como en este caso, se logra evidenciar un retraso considerable en la implementación de las unidades, así como en reiteradas ocasiones se han hecho recomendaciones técnicas y se han omitido puesto no se han realizado las acciones de mejora.

Recomendaciones
Beneficiarios de U.P. Familiares y U.P. Escolares

- Se recomienda que la implementación de las unidades productivas se haga bajo los parámetros técnicos, la totalidad de materiales y su calidad contratados buscando el uso eficiente de recursos, esto conlleva al éxito a mediano y largo plazo del proyecto, así como su sostenibilidad.
- Se recomienda que las unidades cuenten efectivamente con una puerta para el control de acceso a animales que puedan ocasionar daños.
- Se recomienda realizar un acompañamiento permanente para iniciar con prontitud la terminación de la instalación de unidades, el llenado de las camas para iniciar los procesos de siembra, y el Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades.

***Proceso*: Fortalecimiento Institucional y de la Participación Ciudadana**

***Procedimiento*: Promoción y Fortalecimiento de la Participación Ciudadana**

4. COMPROMISOS			
COMPROMISOS	**FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO**	**RESPONSABLE**	**EVIDENCIA DE CUMPLIMENTO DEL COMPROMISO- ANEXA A ESTA ACCIÓN***

NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA QUE REPORTA LA ACCION	**CARGO**	**FIRMA**
OSCAR JAVIER GIRALDO PLAZA	**PROFESIONAL AGRO**	
