ACTA PARCIAL

PERIODO / FECHA: Del 20 de diciembre al 29 de diciembre de 2025.

AREA O DEPENDENCIA: Oficina de Planeación e Infraestructura Municipal

RESPONSABLE: Héctor Horacio Gaitán Guerrero

OBJETIVO DEL INFORME:

REALIZAR EL INFORME PARA EL PAGO DEL ACTA PARCIAL No. 1, DEL CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CENTRO RECREACIONAL NUEVA ESPERANZA Y DE LA VEREDA PEÑA NEGRA, EN EL MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO "UNIDOS SÍ PODEMOS 2024–2027", SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PITAL- HUILA Y CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2025

CONTENIDO DEL INFORME:

INFORME DE SUPERVISIÓN PARCIAL No. 1

CONTRATO	OBRA	**No.:**	252	**AÑO:**	2025
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PITAL- CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2025					

CONTRATISTA:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:**	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2025		
	NIT O CC:	902.016.855-2		
	R.L.:	LEIDY LORENA RAMÍREZ LOSADA		
	CC:	1.081.394.218 de La Plata Huila		
	DIRECCIÓN:	CALLE 10 N° 7-52 OFICINA 208	TEL:	3125445187
	CIUDAD:	Neiva – Huila		
OBJETO:	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CENTRO RECREACIONAL NUEVA ESPERANZA Y DE LA VEREDA PEÑA NEGRA, EN EL MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO "UNIDOS SÍ PODEMOS 2024–2027".			
	En cifras: $136.737.907,03 M/CTE.			

VALOR TOTAL DE CONTRATO:	**En Letras:** CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS CON TRES CENTAVOS M/CTE.		
PLAZO INICIAL:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE UN (01) MES Y/O TERMINACIÓN DE LA OBRA, EL PLAZO BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRÁ EXCEDER DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025; DE TAL FORMA QUE, SI LLEGADO ESE DÍA EL CONTRATO NO SE HUBIERE EJECUTADO EN SU TOTALIDAD, TANTO EL CONTRATISTA COMO EL CONTRATANTE, ACEPTAN LIQUIDAR EL CONTRATO LIBERANDO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE EL PITAL – HUILA LA SUMA NO EJECUTADA. ESTA OBLIGACIÓN DEBE QUEDAR CONSIGNADA EN EL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA.		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)		
FECHA DE INICIO:	VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)		
FECHA TERMINACION:	**No. 1**	**TERMINACION INICIAL**	30/12/2025
PRESENTES HOY:	NOMBRE:		**HÉCTOR HORACIO GAITÁN GUERRERO**
	EN CALIDAD DE:		Supervisor
	NOMBRE:		**KAREN TATIANA GUTIÉRREZ VILLAQUIRA**
	EN CALIDAD DE:		Apoyo técnico Supervisión

1. CONTRATO OBRA

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR
Acta parcial No. 1	29-12-2025	**$ 68.583.818,06**
Acta parcial No. 2	-	$ 0,00
Acta parcial No. 3	-	$ 0,00
Acta Final	-	$ 0,00
TOTAL		**$ 68.583.818,06**

1.1 BALANCE ECONÓMICO

DESCRIPCIÒN	VALOR	SALDO
1. Valor del contrato		$ 136.737.907,03
2. Valor acta parcial No. 1	$ 68.583.818,06	$ 0,00
3. Saldo por ejecutar	$ 68.154.088,97	$ 0,00
TOTAL	**$ 136.737.907,03**	**$ 136.737.907,03**

1.1 BALANCE ANTICIPO

ANTICIPO (0%)		$ 00,00
VALOR A AMORTIZAR ACTA No 1	$ 00,00	$ 00,00
VALOR AMORTIZADO ACTA No 2	$ 00,00	$ 00,00
VALOR AMORTIZADO ACTA FINAL	$ 00,00	$ 00,00
SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR	$ 00,00	$ 00,00
TOTAL	**$ 00,00**	**$ 00,00**

1.2 CONTROL DE GARANTÍAS

1.2.1 CUMPLIMIENTO

PÓLIZA No. **61-44-101062842**

COBERTURAS	**ANEXO 0** **FECHA DE EXPEDICIÓN:** 17 de Diciembre de 2025	
	Valor Asegurado	**VIGENCIA**
Cumplimiento del contrato	$ 27.347.581,40	16/12/2025 al 14/07/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 13.673.790,70	16/12/2025 al 30/12/2028
Estabilidad y calidad de la obra	$ 41.021.372,10	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS

1.2.2 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

PÓLIZA No. **61-40-101022799**

COBERTURAS	**ANEXO 0** **FECHA DE EXPEDICIÓN:** 17 de Diciembre de 2025	
	Valor Asegurado	**VIGENCIA**
Predios labores y operaciones	$284.700.000,00	16/12/2025 al 30/12/2025
Contratistas y subcontratistas	$284.700.000,00	16/12/2025 al 30/12/2025
Vínculos propios u no propios	$284.700.000,00	16/12/2025 al 30/12/2025

1.2.3 CUMPLIMIENTO

PÓLIZA No. **61-44-101062842**

COBERTURAS	**ANEXO 1** **FECHA DE EXPEDICIÓN:** 24 de Diciembre de 2025	
	Valor Asegurado	**VIGENCIA**
Cumplimiento del contrato	$ 27.347.581,40	20/12/2025 al 18/07/2026

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 13.673.790,70	20/12/2025 al 03/01/2029
Estabilidad y calidad de la obra	$ 41.021.372,10	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS

1.2.4 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
PÓLIZA No. **61-40-101022799**

COBERTURAS	**ANEXO 1** **FECHA DE EXPEDICIÓN:** 24 de Diciembre de 2025	
	Valor Asegurado	**VIGENCIA**
Predios labores y operaciones	$284.700.000,00	20/12/2025 al 03/01/2026
Contratistas y subcontratistas	$284.700.000,00	20/12/2025 al 03/01/2026
Vínculos propios u no propios	$284.700.000,00	20/12/2025 al 03/01/2026

1.2.5 CUMPLIMIENTO
PÓLIZA No. **61-44-101062842**

COBERTURAS	**ANEXO 2** **FECHA DE EXPEDICIÓN:** 24 de Diciembre de 2025	
	Valor Asegurado	**VIGENCIA**
Cumplimiento del contrato	$ 27.347.581,40	Cumplimiento del contrato
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 13.673.790,70	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales
Estabilidad y calidad de la obra	$ 41.021.372,10	Estabilidad y calidad de la obra

1.2.6 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
PÓLIZA No. **61-40-101022799**

COBERTURAS	**ANEXO 2** **FECHA DE EXPEDICIÓN:** 24 de Diciembre de 2025	
	Valor Asegurado	**VIGENCIA**
Predios labores y operaciones	$284.700.000,00	Predios labores y operaciones
Contratistas y subcontratistas	$284.700.000,00	Contratistas y subcontratistas
Vínculos propios u no propios	$284.700.000,00	Vínculos propios u no propios

De acuerdo al Informe Parcial No. 1 presentado por el Contratista de CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2025, mediante oficio, radicado en la Secretaria de Planeacion e Infraestructura de fecha veintinueve (20) de diciembre del dos mil veinticinco (2025), el cual fue verificado por la supervisión, se certifica que

el contratista viene cumpliendo a entera satisfacción con el Contrato de Obra No. 252 de 2025, el cual tiene por objeto "CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CENTRO RECREACIONAL NUEVA ESPERANZA Y DE LA VEREDA PEÑA NEGRA, EN EL MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO "UNIDOS SÍ PODEMOS 2024–2027".

Es viable recibir a satisfacción las actividades ejecutadas en el marco del CONTRATO DE OBRA No. 252 DE 2025 DERIVADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 008 DE 2023, el cual tiene por objeto ""CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CENTRO RECREACIONAL NUEVA ESPERANZA Y DE LA VEREDA PEÑA NEGRA, EN EL MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO "UNIDOS SÍ PODEMOS 2024–2027", dado que el Contratista viene cumpliendo a entera satisfacción el contrato.

Durante la ejecución del Contrato se resaltan los siguientes aspectos:

1. El día dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinticinco (2025), el Contratista suscribió contrato de Obra No. 252 de 2025.

2. El día veinte (20) de diciembre de dos mil veinticinco (2025), el Contratista suscribió acta de inicio.

3. El día veintinueve (29) de diciembre del dos mil veinticinco (2025), se suscribe el Acta Parcial No. 1.

4. El Informe del contratista de obra, establece que el porcentaje ejecutado conforme al Acta Parcial No. 1 es del 50,16 %, que corresponde a $ 68.583.818,06 del total del valor del contrato de obra.

5. Que según Informe y Acta Parcial No. 1, el contratista ejecutó las siguientes actividades:

ALCALDÍA EL PITAL HUILA / SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	OBJETO: CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CENTRO RECREACIONAL NUEVA ESPERANZA Y DE LA VEREDA PEÑA NEGRA, EN EL MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO "UNIDOS SÍ PODEMOS 2024–2027"				CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2025	
					ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1	
DEPARTAMENTO DEL HUILA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2025	FECHA CONTRATO DE OBRA:	16 Diciembre de 2025	Parcial	X
	R.L.	LEIDY LORENA RAMÍREZ LOSADA	FECHA INICIO	20 de diciembre de 2025	Modifica	
MUNICIPIO DE EL PITAL	SUPERVISOR	ING. HÉCTOR HORACIO GAITAN GUERRERO	PLAZO DE EJECUCIÓN:	Un (01) mes y/o terminación de la obra, el plazo bajo ninguna circunstancia podrá exceder del 30 de diciembre de 2025	Final	
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VALOR INICIAL:	$ 136.737.907,03	VALOR ACTA PARCIAL No. 1	$ 68.583.818,06	FECHA DE LA PRESENTE ACTA 29 de diciembre de 2025	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				OBRA EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
A	**ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL PARQUE RECREACIONAL NUEVA ESPERANZA - ZANA URBANA**				**$ 475.456,76**		**$ 475.456,76**		**$ 475.456,76**
A1	**PRELIMINARES**				**$ 4.576.926,23**		**$ 4.576.926,23**		**$ 4.576.926,23**
A1,1	Localización y replanteo.	M2	158,38	$ 3.002,00	$ 475.456,76	158,38	$ 475.456,76	158,38	$ 475.456,76
A2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**				**$ 27.061.122,96**		**$ 9.508.271,48**		**$ 9.508.271,48**
A2,1	Excavación manual. Incluye retiro del material.	M3	50,71	$ 42.929,00	$ 2.176.929,59	50,71	$ 2.176.929,59	50,71	$ 2.176.929,59
A2,2	Relleno en recebo compactado mecánicamente.	M3	14,59	$ 164.496,00	$ 2.399.996,64	14,59	$ 2.399.996,64	14,59	$ 2.399.996,64
A3	**CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA**								
A3,1	Suministro e instalación de tapa goteras.	M2	1868	$ 2.497,00	$ 4.664.396,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A3,2	Suministro e instalación de Teja Termoacústica Ecoroof UPVC 2.mm Blanco. Incluyendo el desmonte y retiro del material existente.	M2	14	$ 73.456,00	$ 1.028.384,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A3,3	Suministro e instalación de correas metálicas perfil 2C 160*60*20 2,0 mm, Incluye pintura y desmonte de la existente.	ML	40	$ 78.564,00	$ 3.142.560,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A3,4	Desmonte de canal metálico existente.	ML	40	$ 19.769,00	$ 790.760,00	40,00	$ 790.760,00	40,00	$ 790.760,00
A3,5	Suministro e Instalación de Canal metálico cal 20 ds = 1.00 mts Incluye refuerzos en Angulo 1" x 1/8"+ pintura.	ML	80	$ 124.603,00	$ 9.968.240,00	40,00	$ 4.984.120,00	40,00	$ 4.984.120,00
A3,6	Suministro e instalación de Bajante ALL PVC 4". Incluye accesorios.	ML	143,78	$ 51.932,00	$ 7.466.782,96	71,89	$ 3.733.391,48	71,89	$ 3.733.391,48

A4	**PINTURA GENERAL Y ACABADOS**				**$ 26.121.033,16**		**$ 7.658.372,96**		**$ 7.658.372,96**
A4,1	Suministro y aplicación de anticorrosivo sobre cercha estructura metálica tubular y correas metálicas perfil 2C 160*60* 20 2,0 mm existentes.	M2	1868,00	$ 8.307,00	$ 15.517.476,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A4,2	Suministro y Aplicación de pintura vinilo tipo coraza (fachada), incluye resane de muros.	M2	138,95	$ 21.196,00	$ 2.945.184,20	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A4,3	Suministro y Aplicación de Esmalte sobre lámina llena.	M2	17,16	$ 20.688,00	$ 355.006,08	17,16	$ 355.006,08	17,16	$ 355.006,08
A4,4	Suministro y Aplicación de Esmalte para marcos de puertas.	UND	7	$ 39.701,00	$ 277.907,00	7,00	$ 277.907,00	7,00	$ 277.907,00
A4,5	Suministro y Aplicación de pintura vinilo tipo 1- III manos, incluye resane de muros pañete impermeabilizado, estuco y demolición de pañete existente h :1 mt.	M2	315,66	$ 22.156,00	$ 6.993.762,96	315,66	$ 6.993.762,96	315,66	$ 6.993.762,96
A4,6	Suministro y Aplicación de Esmalte para rejas.	M2	1,62	$ 19.566,00	$ 31.696,92	1,62	$ 31.696,92	1,62	$ 31.696,92
A5	**ESTRUCTURA**				**$ 30.687.855,02**		**$ 24.508.966,91**		**$ 24.508.966,91**
A5,1	suministro e instalación de rejilla para desagüe.	ML	32,6	$ 221.471,00	$ 7.219.954,60	32,60	$ 7.219.954,60	32,60	$ 7.219.954,60
A5,2	Cuneta A.LL. en concreto de 3.000 PSI Tipo U.	ML	32,6	$ 146.242,00	$ 4.767.489,20	32,60	$ 4.767.489,20	32,60	$ 4.767.489,20
A5,3	Anden en concreto 3000 PSI e=0,10 m. incluye malla electrosoldada.	M2	87	$ 96.625,00	$ 8.406.375,00	87,00	$ 8.406.375,00	87,00	$ 8.406.375,00
A5,4	Suministro e instalación de tubería ALL PVC 6" desagüe. Incluye accesorios.	ML	126,86	$ 64.877,00	$ 8.230.296,22	63,43	$ 4.115.148,11	63,43	$ 4.115.148,11
A5,5	Reparación y mantenimiento de correas metálicas perfil 2C 160*60* 20 2,0 mm existentes.	ML	10	$ 206.374,00	$ 2.063.740,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
B	**ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA VEREDA PEÑA NEGRA**								
B1	**CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA**				**$ 13.539.399,28**		**$ 6.028.788,78**		**$ 6.028.788,78**
B1,1	Suministro e instalación de Teja Termoacústica Ecoroof UPVC 2.mm Blanco. Incluyendo el desmonte y retiro del material existente.	M2	48	$ 76.028,00	$ 3.649.344,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
B1,2	Desmonte de canal metálico existente.	ML	64,2	$ 19.565,00	$ 1.256.073,00	32,10	$ 628.036,50	32,10	$ 628.036,50
B1,3	Suministro e Instalación de Canal metálico cal 20 ds = 1.00 mts Incluye refuerzos en Angulo 1" x 1/8"+ pintura.	ML	64,6	$ 99.484,00	$ 6.426.666,40	32,10	$ 3.193.436,40	32,10	$ 3.193.436,40
B1,4	Suministro e instalación de Bajante ALL PVC 4". Incluye accesorios.	ML	41,91	$ 52.668,00	$ 2.207.315,88	41,91	$ 2.207.315,88	41,91	$ 2.207.315,88
B2	**EXTERIORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**				**$ 2.721.212,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
B2,1	Suministro e instalación de tubería ALL PVC 6" desagüe. Incluye accesorios.	ML	34	$ 71.779,00	$ 2.440.486,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
B2,2	Suministro y aplicación de pintura esmalte para pórticos (Incluye pintura de tableros)	UND	2	$ 140.363,00	$ 280.726,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
		VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS			**$ 105.183.005,41**		**$ 52.756.783,12**		**$ 52.756.783,12**
		ADMINISTRACION		23,00%	$ 24.192.091,24		$ 12.134.060,12		$ 12.134.060,12
		IMPREVISTOS		2,00%	$ 2.103.660,11		$ 1.055.135,66		$ 1.055.135,66
		UTILIDAD		5,00%	$ 5.259.150,27		$ 2.637.839,16		$ 2.637.839,16
		VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS			**$ 31.554.901,62**		**$ 15.827.034,94**		**$ 15.827.034,94**
		VALOR TOTAL DE OBRA			**$ 136.737.907,03**		**$ 68.583.818,06**		**$ 68.583.818,06**

SON: **SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CON SEIS CENTAVOS**

6. El contratista en su informe relaciona el cuadro de personal, el cual corresponde así:

RELACIÓN PERSONAL PROFESIONAL:

NOMBE	CARGO	C.C.
JULIO CESAR ROJAS CERQUERA	DIRECTOR DE OBRA	No. 7.723.538 de Neiva - Huila
DENNY PATRICIA ROMAN ARBOLEDA	RESIDENTE DE OBRA	No. 31.323.401 de Cali
DANIEL VARGAS PAREDES	MAESTRO DE OBRA	No. 1.026.558.697 de Bogotá D.C.
ANYI LORENA LOSADA GUTIERREZ	OFICIAL	No. 1.075.681.712 Zipaquirá
CIPRIANO ADOLFO COMBITA SALAZAR	AYUDANTE	74.363.331 de Sutatenza
JHON FREDY CUELLAR POLANIA	AYUDANTE	No. 83.225.405 de Teruel

1. El día veintinueve (29) de diciembre del dos mil veinticinco (2025), el Contratista radica cuenta de cobro e informe parcial de obra con los soportes requeridos por la entidad contratante, entre los cuales se encuentra: (Oficio OFI-001-2025, Radicado en la Secreatria de Planeacion e Infraestructura, cámara de comercio, RUT, paz y salvo de tesorería, certificado de disponibilidad presupuestal (CDP), Contrato, registro presupuestal (RP), PAGO ESTAMPILLAS (Legalización del contrato), póliza con su aprobación anexo 0,1 y 2, acta de inicio, seguridad social -pago y detallado, Factura electrónica CI-1, Acta de recibo parcial de obra No. 1 , Informe de obra No. 1, Certificado de la supervisión, Certificado de la cuenta bancaria y Autorización para consignar.

Por lo anteriormente expuesto, la supervisión considera viable proceder a recibir y cancelar parcialmente las actividades ejecutadas.

Para constancia, se firma en el municipio de El Pital - Huila, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025), por quienes intervinieron.

HÉCTOR HORACIO GAITÁN GUERRERO
SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA
ALCALDÍA DE EL PITAL– HUILA


Karen Tatiana Gutierrez V


KAREN TATIANA GUTIÉRREZ V.
APOYO A LA SUPERVISIÓN
ALCALDÍA DE EL PITAL – HUILA


Anexo: 15 Registro Fotográfico


ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CENTRO RECREACIONAL NUEVA ESPERANZA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA VEREDA PEÑA NEGRA.




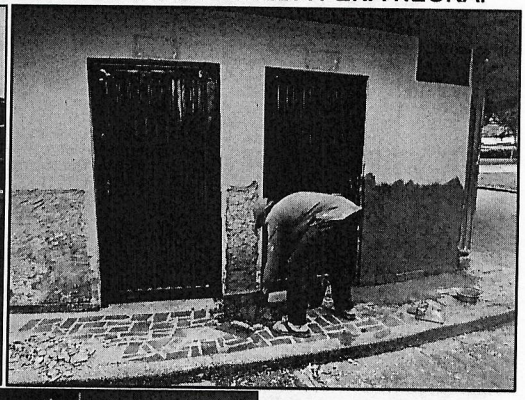


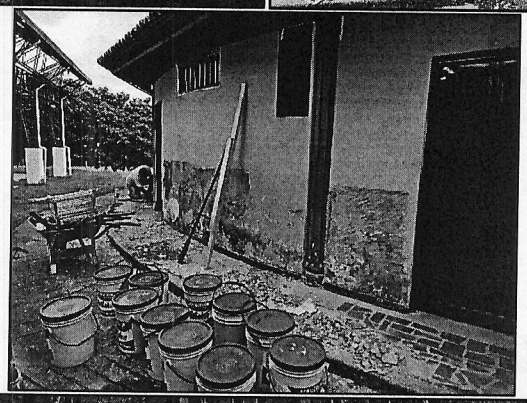

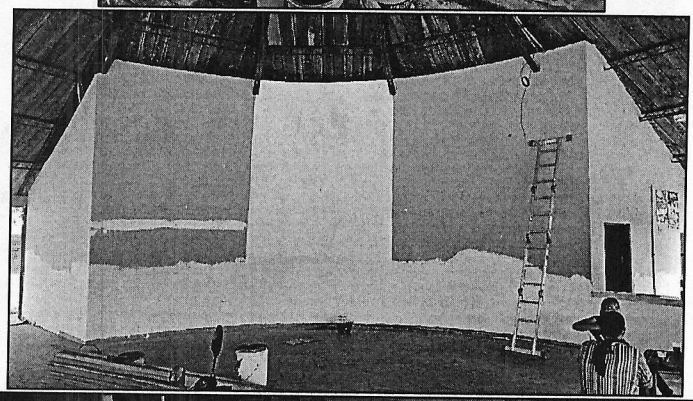

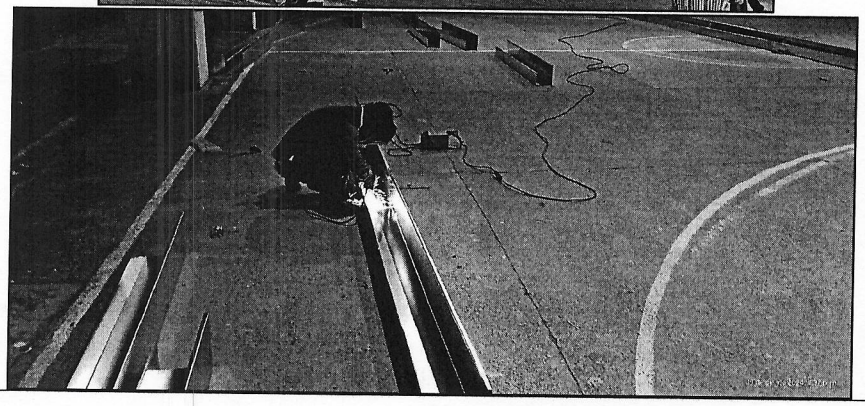

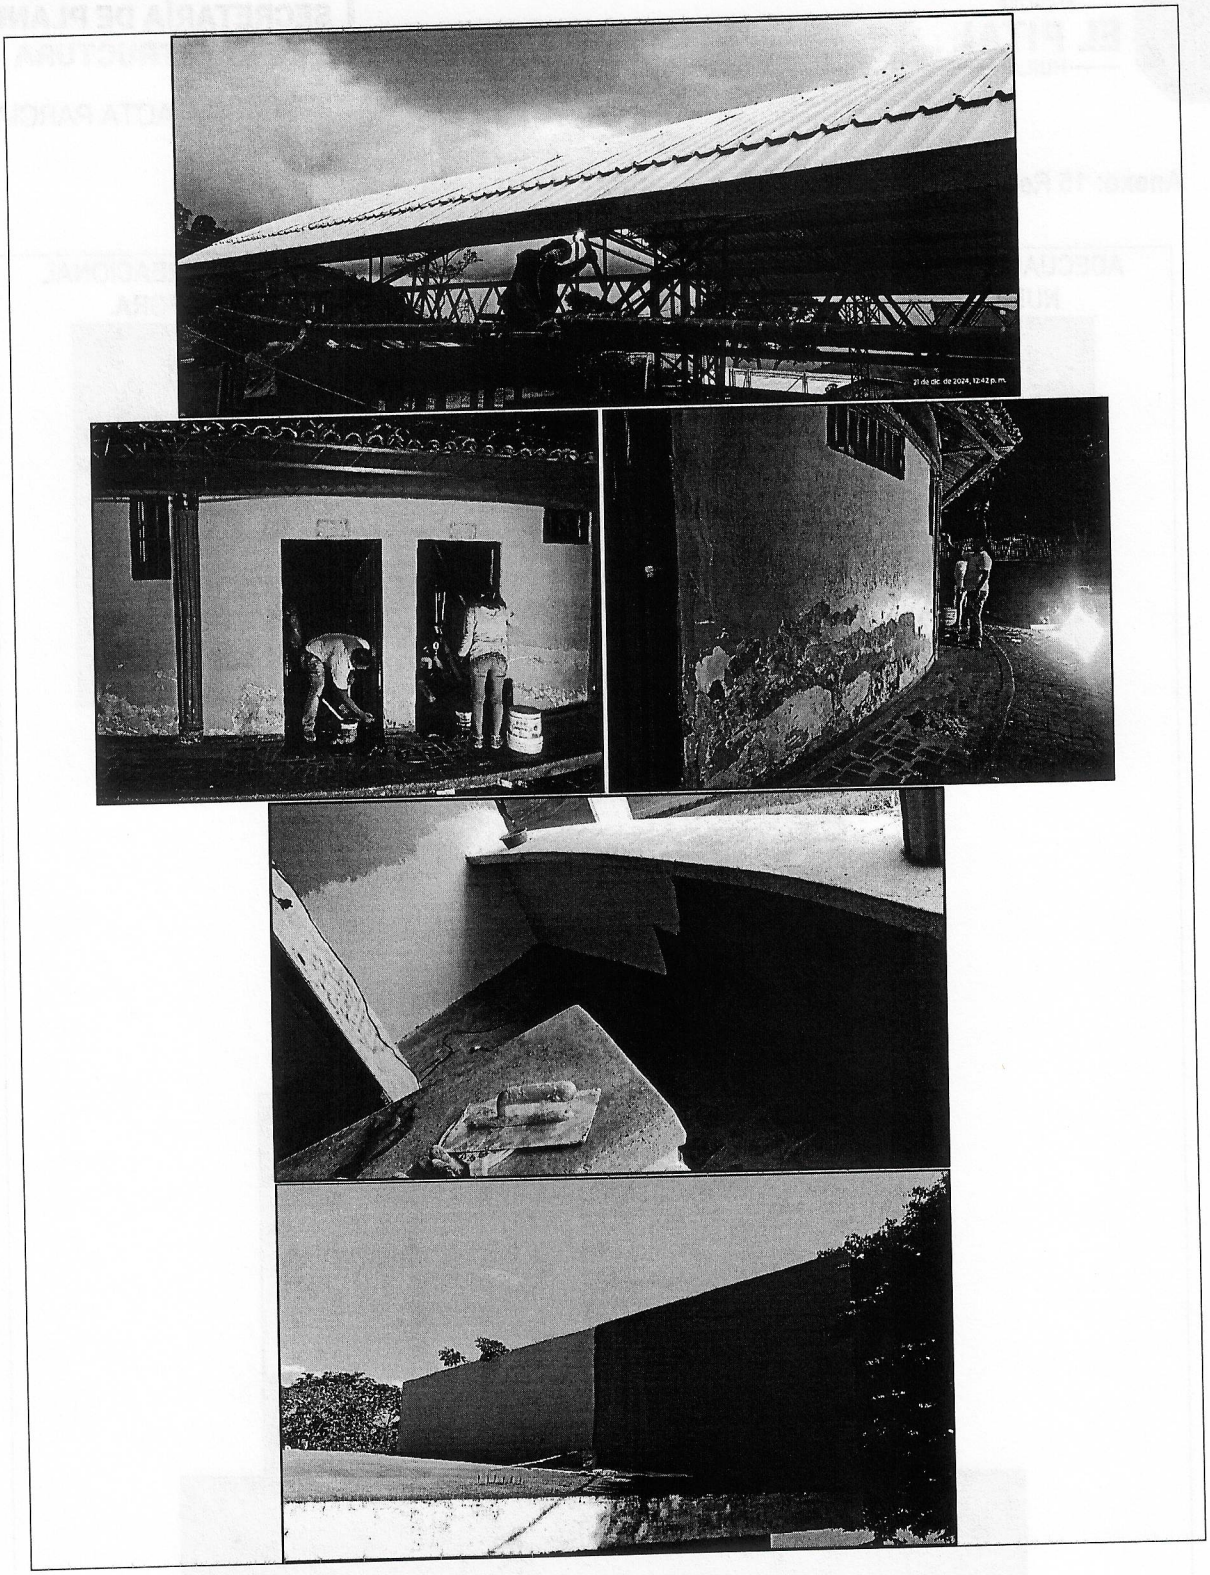
21 de dic de 2024, 12:42 p. m.

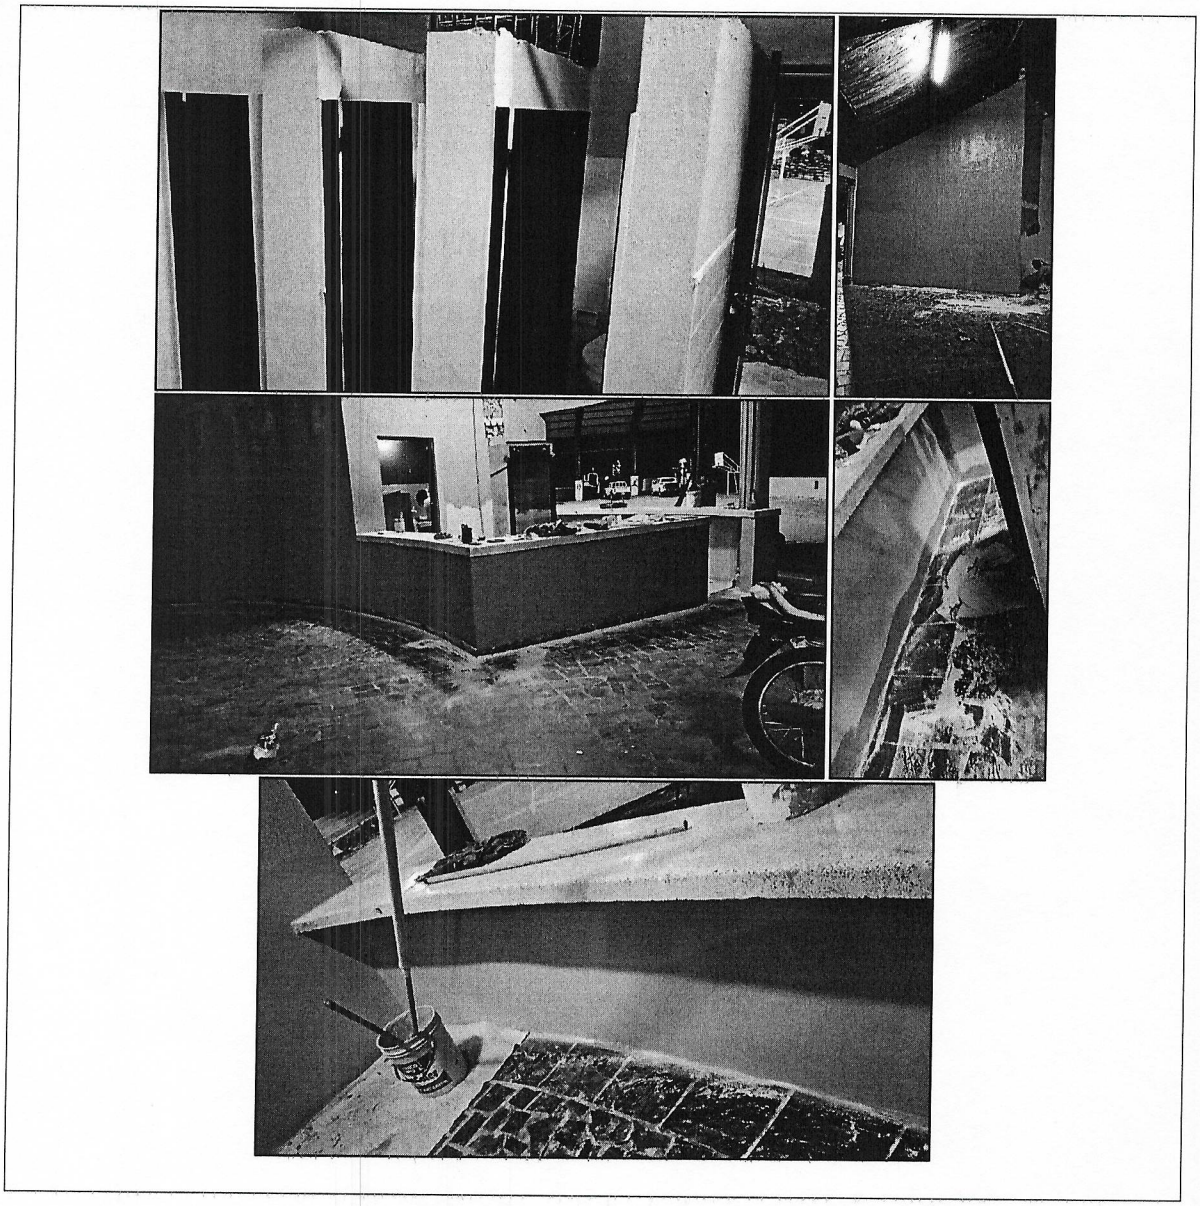

Karen Tatiana Gutierrez V.

PROYECTÓ: KAREN TATIANA GUTIÉRREZ VILLAQUIRA
INGENIERA CIVIL DE APOYO A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

BORIS FERNANDO ALVARADO P.

REVISÓ: BORIS FERNANDO ALVARADO PERDOMO
ASESOR JURÍDICO DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

