REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA


ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO I	RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA	**ITEM**	1.1.1	**LOCALIZACION Y REPLANTEO**				**UNIDAD**	**M2**
				SECCION	**DIMENSIONES**			**N° DE ELEMENTOS**	**MEDIDA TOTAL**
					LARGO (m)	**ANCHO(m)**	**ALTO(m)**	**AREA (m^2)**		
				AREA A CONSTRUIR						
				AREA RESTAURANTE	8,40	6,20			1	52,08
								TOTAL A EJECUTAR		52,08

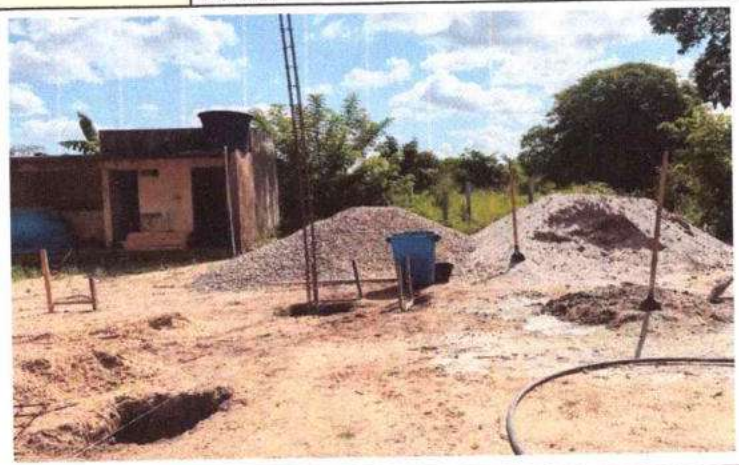

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO I	RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA	ITEM 1.1.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD	UNIDAD	M2



SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
ZAPATAS						
Ejes 1,2,3,4 Entre ejes A-B-C	0,60	0,60	0,90	0,324	8	2,59
VIGAS CIMENTACION						
Eje 1, entre ejes A-C	2,40	0,40	0,25	0,24	2	0,48
Eje 2, entre ejes A-C	5,40	0,40	0,25	0,54	1	0,54
Eje 4, entre ejes A-C	2,40	0,40	0,25	0,24	2	0,48
Eje A,entre ejes 1-4	3,50	0,40	0,25	0,35	2,00	0,70
Eje C,entre ejes 1-4	3,50	0,40	0,25	0,35	2,00	0,70
TUBERIA SANITARIA						
Tuberia Sanitaria 4"	25,00	0,20	0,30	1,50	1,00	1,50
			TOTAL A EJECUTAR			6,99

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA OPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

989

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO I	RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA	**ITEM**	**1.1.3**	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR T. SALTARIN	**UNIDAD**	**M3**



SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
ZAPATAS						
Ejes 1,2,3,4 Entre ejes A-B-C	0,60	0,60	0,25		8	0,72
RELLENOS PARA PLACA						
Restaurante	9,00	6,00	0,45	24,30	1	24,30
				TOTAL A EJECUTAR		25,02

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L ISR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

990

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO I	RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA	**ITEM**	**1.2.1**	



CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO E = 0,05 M					UNIDAD	M2
SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
ZAPATAS						
Ejes 1,2,3,4 Entre ejes A-B-	0,60	0,60			8	2,88
VIGAS CIMENTACION						
Eje 1, entre ejes A-C	2,80	0,20			2	1,12
Eje 2, entre ejes A-C	5,80	0,20			1	1,16
Eje 4, entre ejes A-C	2,80	0,20			2,00	1,12
Eje A,entre ejes 1-4	3,90	0,20			2,00	1,56
Eje C,entre ejes 1-4	3,90	0,20			2,00	1,56
			TOTAL A EJECUTAR			9,40

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/ LNSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA OPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO I	RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA	**ITEM**	**1.2.2**	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS DE 0.60 x 0.60 x 0.30 m	**UNIDAD**	**M3**



SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
ZAPATAS						
Ejes 1,2,3,4 Entre ejes A-B-C	0,60	0,60	0,30		8,00	0,86
				TOTAL A EJECUTAR		**0,86**

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO I	**RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA**	**ITEM**	**1.2.3**



PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30 x 0.30 m — **UNIDAD**: ML

SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
PEDESTAL						
En eje A entre ejes 1 y 4	0,35				3,00	1,05
En eje B entre ejes 1 y 4	0,35				2,00	0,70
En eje C entre ejes 1 y 4	0,35				3,00	1,05
				TOTAL A EJECUTAR		2,80

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO I	RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA	**ITEM**	1.2.4	**UNIDAD**	**ML**



VIGA DE CIMENTACION 0.20 x 0.25 m EN CONCRETO DE 3000 PSI

SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
VIGAS CIMENTACION						
Eje 1, entre ejes A-C	2,80				2	5,60
Eje 2, entre ejes A-C	5,80				1	5,80
Eje 4, entre ejes A-C	2,80				2,00	5,60
Eje A,entre ejes 1-4	3,90				2,00	7,80
Eje C,entre ejes 1-4	3,90				2,00	7,80
				TOTAL A EJECUTAR		**32,60**

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO I	RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA	**ITEM**	**1.2.5**



COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI 0.20 x 0.20 m.					UNIDAD	ML
SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
COLUMNAS						
Columnas Eje A	3,70				3,00	11,10
Columnas Eje B	4,10				2,00	8,20
Columnas Eje C	3,70				3,00	11,10

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA


ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO I	RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA	ITEM	1.2.6

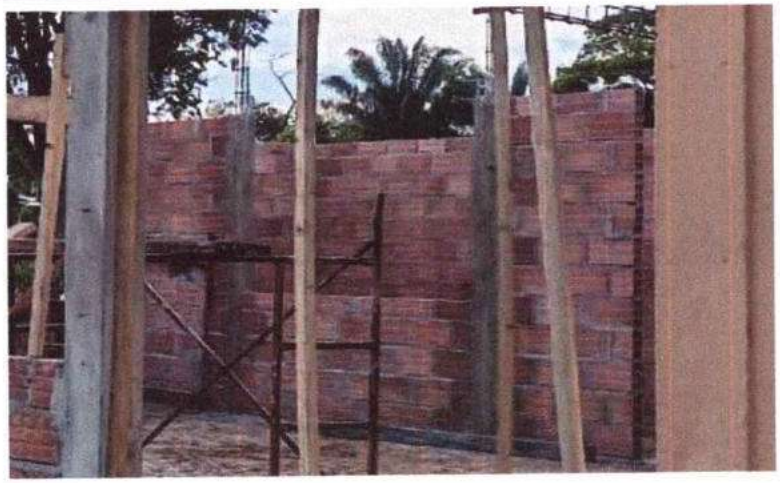

COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI 0.13 X 0.20 m — UNIDAD: ML

SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
COLUMNETA						
Eje A	3,70				1,00	3,70
Eje A'	3,82				1,00	3,82
Eje B'	4,16				1,00	4,16
Eje C	3,70				1,00	3,70
				TOTAL A EJECUTAR		15,38

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

996

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO I	RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA	**ITEM**	1.2.7	**UNIDAD**	M2



MESON EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI INCLUYE ENCHAPE

SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
MESON EN CONCRETO						
Barra	2,00	0,30			1,00	0,60
				TOTAL A EJECUTAR		0,60

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO I	RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA	**ITEM**	1.2.8



VIGA AEREA 0.20 x 0.25 m CONCRETO DE 3000 PSI					UNIDAD	ML
SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
VIGAS AEREAS						
Eje 1, entre ejes A-C	8,40				1,00	8,40
Eje 2, entre ejes A-C	8,40				1,00	8,40
Eje 3, entre ejes A-C	2,20				1,00	2,20
Eje 4, entre ejes A-C	8,40				1,00	8,40
Eje A, entre ejes 1-4	7,80				1,00	7,80
Eje C, entre ejes 1-4	7,80				1,00	7,80
		TOTAL A EJECUTAR				43,00

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO I	RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA	**ITEM**	**UNIDAD**	**ML**
		1.2.9		



VIGA CINTA 0.13x0.20 EN CONCRETO DE 3000 PSI

SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
VIGAS CINTA						
Eje 1, entre ejes A-C	6,20				1,00	6,20
Eje 2, entre ejes A-C	6,20				1,00	6,20
Eje 4, entre ejes A-C	6,20				1,00	6,20
Eje A, entre ejes 1-4	8,40				1,00	8,40
Eje C, entre ejes 1-4	8,40				1,00	8,40
				TOTAL A EJECUTAR		35,40

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO I: RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA

ITEM: 1.2.10



ACERO DE REFUERZO Fy : 60000 PSI

UNIDAD: KG

SECCION	DIMENSIONES					N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	CANTIDAD	LARGO (m)	Diametro	PESO Kg/m	PESO (Kg)		
ACEROS ZAPATAS							
Bastones sentido X	6	0,70	1/2	1,00	4,20	10,00	42,00
Bastones sentido Y	6	0,70	1/2	1,00	4,20	10,00	42,00
ACEROS VIGA							
VC- Eje 1 entre ejes A-C							
Baston 1	3	7,00	1/2	1,00	21,00	1,00	21,00
Baston 2	3	7,00	1/2	1,00	21,00	1,00	21,00
Flejes	48	0,82	3/8	0,56	22,04	1,00	22,04
VC- Eje 2 entre ejes A-C							
Baston 1	3	7,00	1/2	1,00	21,00	1,00	21,00
Baston 2	3	7,00	1/2	1,00	21,00	1,00	21,00
Flejes	48	0,82	3/8	0,56	22,04	1,00	22,04
VC- Eje 4 entre ejes A-C							
Baston 1	3	7,00	1/2	1,00	21,00	1,00	21,00
Baston 2	3	7,00	1/2	1,00	21,00	1,00	21,00
Flejes	48	0,82	3/8	0,56	22,04	1,00	22,04
VC- Eje A entre ejes 1-4							
Baston 1	3	9,00	1/2	1,00	27,00	1,00	27,00
Baston 2	3	5,20	1/2	1,00	15,60	1,00	15,60
Baston 3	3	4,00	1/2	1,00	12,00	1,00	12,00
Flejes	78	0,82	3/8	0,56	35,82	1,00	35,82
VC- Eje C entre ejes 1-4							
Baston 1	3	9,00	1/2	1,00	27,00	1,00	27,00
Baston 2	3	5,20	1/2	1,00	15,60	1,00	15,60
Baston 3	3	4,00	1/2	1,00	12,00	1,00	12,00
Flejes	78	0,82	3/8	0,56	35,82	1,00	35,82
ACEROS COLUMNAS							
Eje A entre ejes 1-4							
Bastones	8	4,50	1/2	1,00	36,00	3,00	108,00
Flejes	61	0,66	3/8	0,56	22,55	3,00	67,64
Eje B entre ejes 1-4							
Bastones	8	4,50	1/2	1,00	36,00	2,00	72,00
Flejes	61	0,66	3/8	0,56	22,55	2,00	45,09
Eje C entre ejes 1-4							
Bastones	8	4,50	1/2	1,00	36,00	3,00	108,00
Flejes	61	0,66	3/8	0,56	22,55	3,00	67,64
ACEROS COLUMNETAS							
Eje A entre ejes 2							

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO I	RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA	ITEM	1.2.10



ACERO DE REFUERZO Fy : 60000 PSI						UNIDAD	KG
Bastones	4	4,00	1/2	1,00	16,00	1,00	16,00
Flejes	54	0,52	3/8	0,56	15,72	1,00	15,72
Eje A' entre ejes 2							
Bastones	4	4,20	1/2	1,00	16,80	1,00	16,80
Flejes	59	0,52	3/8	0,56	17,18	1,00	17,18
Eje B' entre ejes 2							
Bastones	4	4,30	1/2	1,00	17,20	1,00	17,20
Flejes	51	0,52	3/8	0,56	14,85	1,00	14,85
Eje D' entre ejes 2							
Bastones	4	4,00	1/2	1,00	16,00	1,00	16,00
Flejes	54	0,52	3/8	0,56	15,72	1,00	15,72
ACEROS VIGA AEREA							
VA- Eje 1 entre ejes A-C							
Baston 1	3	9,00	1/2	1,00	27,00	1,00	27,00
Baston 2	3	4,20	1/2	1,00	12,60	1,00	12,60
Baston 3	3	4,60	1/2	1,00	13,80	1,00	13,80
Flejes	118	0,82	3/8	0,56	54,19	1,00	54,19
VA- Eje 2 entre ejes A-C							
Baston 1	3	9,00	1/2	1,00	27,00	1,00	27,00
Baston 2	3	9,00	1/2	1,00	27,00	1,00	27,00
Flejes	42	0,82	3/8	0,56	19,29	1,00	19,29
VA- Eje 4 entre ejes A-C							
Baston 1	3	9,00	1/2	1,00	27,00	1,00	27,00
Baston 2	3	4,20	1/2	1,00	12,60	1,00	12,60
Baston 3	3	4,60	1/2	1,00	13,80	1,00	13,80
Flejes	118	0,82	3/8	0,56	54,19	1,00	54,19
VA- Eje A entre ejes 1-4							
Baston 1	3	9,00	1/2	1,00	27,00	1,00	27,00
Baston 2	3	4,30	1/2	1,00	12,90	1,00	12,90
Baston 3	3	4,70	1/2	1,00	14,10	1,00	14,10
Flejes	118	0,82	3/8	0,56	54,19	1,00	54,19
VA- Eje C entre ejes 1-4							
Baston 1	3	9,00	1/2	1,00	27,00	1,00	27,00
Baston 2	3	4,30	1/2	1,00	12,90	1,00	12,90
Baston 3	3	4,70	1/2	1,00	14,10	1,00	14,10
Flejes	118	0,82	3/8	0,56	54,19	1,00	54,19
ACEROS VIGA CINTA							
VA- Eje 1 entre ejes A-C							
Baston 1	2	6,80	3/8	0,56	7,62	1,00	7,62
Baston 2	2	3,20	3/8	0,56	3,58	1,00	3,58
Baston 3	2	3,60	3/8	0,56	4,03	1,00	4,03
Flejes	100	0,52	3/8	0,56	29,12	1,00	29,12

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO I: RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA

ITEM: 1.2.10



ACERO DE REFUERZO Fy : 60000 PSI						UNIDAD	KG
VA- Eje 2 entre ejes A-C							
Baston 1	2	7,00	3/8	0,56	7,84	1,00	7,84
Baston 2	2	6,80	3/8	0,56	7,62	1,00	7,62
Flejes	100	0,52	3/8	0,56	29,12	1,00	29,12
VA- Eje 4 entre ejes A-C							
Baston 1	2	7,00	3/8	0,56	7,84	1,00	7,84
Baston 2	2	3,50	3/8	0,56	3,92	1,00	3,92
Baston 3	2	3,60	3/8	0,56	4,03	1,00	4,03
Flejes	100	0,52	3/8	0,56	29,12	1,00	29,12
VA- Eje A entre ejes 1-4							
Baston 1	2	9,00	3/8	0,56	10,08	1,00	10,08
Baston 2	2	5,00	3/8	0,56	5,60	1,00	5,60
Baston 3	2	4,70	3/8	0,56	5,26	1,00	5,26
Flejes	100	0,82	3/8	0,56	45,92	1,00	45,92
VA- Eje C entre ejes 1-4							
Baston 1	2	9,00	3/8	0,56	10,08	1,00	10,08
Baston 2	2	5,00	3/8	0,56	5,60	1,00	5,60
Baston 3	2	4,70	3/8	0,56	5,26	1,00	5,26
Flejes	100	0,82	3/8	0,56	45,92	1,00	45,92
		TOTAL A EJECUTAR					1827,21

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO I	RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA	**ITEM** 1.3.1	LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.07 M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA				**UNIDAD**	**M2**
			SECCION	**DIMENSIONES**			**N° DE ELEMENTOS**	**MEDIDA TOTAL**
				LARGO (m)	**ANCHO(m)**	**ALTO(m)**	**AREA (m^2)**		
			PLACA DE PISO						
			Piso Salon				48,25	1,00	48,25
			Piso Pasillo	8,55	2,00			1,00	17,10
						TOTAL A EJECUTAR			65,35



OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

(83)

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO I	RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA	**ITEM**	**1.3.2**	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA Nº5



UNIDAD	**M2**

SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
MAMPOSTERIA						
Eje A entre eje 1-2	2,97		2,32		1,00	6,89
Descuentos A entre eje 1-2	1,70		0,60		-1,00	-1,02
Descuentos A entre eje 1-2	0,20		3,17		-1,00	-0,63
Cuchilla Eje A entre eje 1-2	2,97		0,56		1,00	1,66
Eje A entre eje 2-4	5,03		0,80		1,00	4,02
Descuento Eje A entre eje 2-4	0,20		0,80		-1,00	-0,16
Cuchilla Eje A entre eje 2-4	4,83		0,40		1,00	1,93
Eje C entre eje 1-2	2,54		3,13		1,00	7,95
Descuento Eje C entre eje 1-2	2,54		0,20		-1,00	-0,51
Eje C entre eje 2-4	5,07		0,40		1,00	2,03
Eje 1 entre eje A-C	5,60		2,62		1,00	14,67
Cuchilla Eje 1 entre eje A-C	5,60		0,90		2,00	10,08
Eje 2 entre A-C	5,94		2,62		1,00	15,56
Cuchilla Eje 2 entre A-C	5,94		0,90		1,00	5,35
Descuento Eje 2 entre A-C	2,00		1,72		1,00	3,44
Descuento Eje 2 entre A-C	1,20		2,32		1,00	2,78
Eje 4 entre A-C	5,60		0,80		1,00	4,48
Cuchilla Eje 4 entre A-C	2,80		0,90		2,00	5,04
Cuchillas volados	1,20		0,43		3,00	1,55
Cuchillas volados	0,60		0,50		3,00	0,90
				TOTAL A EJECUTAR		**86,01**

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO I	RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA	**ITEM**	1.3.3



PAÑETE EN MORTERO 1:4 SOBRE MURO					**UNIDAD**	**M2**
SECCION	**DIMENSIONES**				**N° DE ELEMENTOS**	**MEDIDA TOTAL**
	LARGO (m)	**ANCHO(m)**	**ALTO(m)**	**CARAS**		
MURO						
Eje A entre eje 1-2	2,97		2,32	2,00	1,00	13,78
Descuentos A entre eje 1-2	1,70		0,60	1,00	-1,00	-1,02
Cuchilla Eje A entre eje 1-2	2,97		0,56	2,00	1,00	3,32
Eje A entre eje 2-4	5,03		0,80	2,00	1,00	8,04
Cuchilla Eje A entre eje 2-4	4,83		0,40	2,00	1,00	3,86
Eje A'	0,60		3,82	2,00	1,00	4,58
Eje C entre eje 1-2	2,54		3,13	2,00	1,00	15,90
Eje C entre eje 2-4	5,07		0,40	2,00	1,00	4,06
Eje 1 entre eje A-C	5,60		2,62	2,00	1,00	29,34
Cuchilla Eje 1 entre eje A-C	5,60		0,90	2,00	1,00	10,08
Eje 2 entre A-C	5,60		2,62	2,00	1,00	29,34
Cuchilla Eje 2 entre A'-C	4,00		0,90	2,00	1,00	7,20
Descuento Eje 2 entre A'-C	2,00		1,72	1,00	-1,00	-3,44
Descuento Eje 2 entre A'-C	1,20		2,32	1,00	-1,00	-2,78
Eje 4 entre A-C	5,60		0,80	2,00	1,00	8,96
Cuchilla Eje 4 entre A-C	2,80		0,90	2,00	1,00	5,04
Cuchillas volados	1,20		0,43	2,00	3,00	3,10
Cuchillas volados	0,60		0,50	2,00	3,00	1,80
			TOTAL A EJECUTAR			**141,16**

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO I	RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA	ITEM	1.3.4



PINTURA VINILO TIPO 1 A TRES MANOS INTERIORES — UNIDAD: M2

SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	CARAS		
MURO A LA VISTA						
Eje A entre eje 1-2	2,97		2,32	2,00	1,00	13,78
Descuentos A entre eje 1-2	1,70		0,60	1,00	-1,00	-1,02
Cuchilla Eje A entre eje 1-2	2,97		0,56	2,00	1,00	3,32
Eje A entre eje 2-4	5,03		0,80	2,00	1,00	8,04
Cuchilla Eje A entre eje 2-4	4,83		0,40	2,00	1,00	3,86
Eje A'	0,60		3,82	2,00	1,00	4,58
Eje C entre eje 1-2	2,54		3,13	2,00	1,00	15,90
Eje C entre eje 2-4	5,07		0,40	2,00	1,00	4,06
Eje 1 entre eje A-C	5,60		2,62	2,00	1,00	29,34
Cuchilla Eje 1 entre eje A-C	5,60		0,90	2,00	1,00	10,08
Eje 2 entre A-C	5,60		2,62	2,00	1,00	29,34
Cuchilla Eje 2 entre A-A'	5,60		0,90	2,00	1,00	10,08
Descuento Eje 2 entre A'-C	2,00		1,72	1,00	-1,00	-3,44
Descuento Eje 2 entre A'-C	1,20		2,32	1,00	-1,00	-2,78
Eje 4 entre A-C	5,60		0,80	2,00	1,00	8,96
Cuchilla Eje 4 entre A-C	2,80		0,90	2,00	1,00	5,04
Cuchillas volados	1,20		0,43	2,00	3,00	3,10
Cuchillas volados	0,60		0,50	2,00	3,00	1,80
Columnas	0,20		3,13	4	2,00	5,00
		TOTAL A EJECUTAR				149,04

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L ISR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO I	RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA	**ITEM**	1.3.5	**UNIDAD**	M2



PISO CERÁMICA 60*60 CM O SIMILAR						
SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
RESTAURANTE						
Piso restaurante				48,26	1,00	48,26

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	**"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**

CAPITULO I	**RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA**	**ITEM**	**1.3.6**



GUARDA ESCOBA EN CERAMICA — **UNIDAD**: **ML**

SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
RESTAURANTE						
Eje 1 entre ejes A-C	6,22				1,00	6,22
Eje 2 entre ejes A-C	5,67				2,00	11,34
Eje 4 entre ejes A-C	6,22				1,00	6,22
Eje A entre ejes 1-4	8,15				1,00	8,15
Eje C entre ejes 1-2	2,75				2,00	5,50
		TOTAL A EJECUTAR				**37,43**

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO I	RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA	**ITEM** 1.4.1	CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA GALVANIZADA	**UNIDAD**	M2



SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
AREA CUBIERTA						
Cubierta	10,00	8,40			1,00	84,00
				TOTAL A EJECUTAR		84,00

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1009

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO I	**RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA**	**ITEM**	**1.4.2**	**CABALLETE EN LAMINA GALVANIZADA**				**UNIDAD**	**ML**
				SECCION	**DIMENSIONES**			**N° DE ELEMENTOS**	**MEDIDA TOTAL**
					LARGO (m)	**ANCHO(m)**	**ALTO(m)**	**AREA (m^2)**		
				AREA CUBIERTA						
				Caballete	10,00				1,00	10,00
								TOTAL A EJECUTAR		10,00



OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO I	**RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA**	**ITEM**	**1.4.3**	**CORREA EN TUBO RECTANGULAR DE 3 x 1 1/2 CAL 18 INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA**				**UNIDAD**	**ML**



SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
CORREAS METALICAS						
Correas	10,00				10,00	100,00
Cercha Principal	8,50				2,00	17,00
				TOTAL A EJECUTAR		**117,00**

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO I	RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA	**ITEM**	1.4.4	



VENTANA METALICA DE CORREDERA INCLUYE REJA					UNIDAD	M2
SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
VENTANAS						
En eje A entre ejes 1 y 2		1,70	0,70		1,00	1,19
		TOTAL A EJECUTAR				1,19

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSB BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO I	RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA	**ITEM**	1.4.5	**UNIDAD**	M2



PUERTA METÁLICA INCLUYE CHAPA

SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
PUERTA						
PUERTA RESTAURANTE	1,20		2,32		1,00	2,78
				TOTAL A EJECUTAR		2,78

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L ISR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	**"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**

CAPITULO I	**RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA**	**ITEM**	**1.4.6**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO 4 mm**				**UNIDAD**	**M2**
				SECCION	**DIMENSIONES**			**N° DE ELEMENTOS**	**MEDIDA TOTAL**
					LARGO (m)	**ANCHO(m)**	**ALTO(m)**	**AREA (m^2)**		
				VIDRIOS						
				VENTANAS						
				En eje A entre ejes 1 y 2		1,70	0,50		1,00	0,85
								TOTAL A EJECUTAR		0,85



OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1614

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO I	RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA	ITEM	1.4.7



VENTANA METÁLICA TIPO REJA					UNIDAD	M2
SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
PERSIANA HORIZONTAL						
SOBRE VENTANAS						
En eje 2		2,00	1,42		1,00	2,84
		TOTAL A EJECUTAR				2,84

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO I	**RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA**	**ITEM**	**1.4.8**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA**				**UNIDAD**	**ML**
				SECCION	**DIMENSIONES**			**N° DE ELEMENTOS**	**MEDIDA TOTAL**
					LARGO (m)	**ANCHO(m)**	**ALTO(m)**	**AREA (m^2)**		
				CANAL EN LAMINA						
				En eje C	10,00				1,00	10,00
								TOTAL A EJECUTAR		**10,00**



OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

106

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO I	RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA	**ITEM**	1.5.1



ACOMETIDA ELECTRICA MONOFASICA					UNIDAD	UND
SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
ACOMETIDA ELECTRICA						
ACOMETIDA ELECTRICA					1,00	1,00
TOTAL A EJECUTAR						1,00

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO I	RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA	**ITEM**	**1.5.2**



TABLERO DE 12 CIRCUITOS					UNIDAD	UND
SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
TABLERO						
TABLERO 12 CIRCUITOS					1,00	1,00
				TOTAL A EJECUTAR		1,00

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO I	RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA	**ITEM** 1.5.3	ACOMETIDA 2#8+1#10T THHN 600V				**UNIDAD** ML
			SECCION	**DIMENSIONES**			**N° DE ELEMENTO**	**MEDIDA TOTAL**
				LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
			ACOMETIDA 2#8+1#10T						
			CABLE ENTRADA	30,00				1,00	30,00

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO I	**RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA**	**ITEM**	**1.5.4**	



ACOMETIDA 2#12+1#12T THHN 600V					**UNIDAD**	**ML**
SECCION	**DIMENSIONES**				**N° DE ELEMENTOS**	**MEDIDA TOTAL**
	LARGO (m)	**ANCHO(m)**	**ALTO(m)**	**AREA (m^2)**		
ACOMETIDA 2#12+1#12T						
CABLE ENTRADA	30,00				1,00	30,00
				TOTAL A EJECUTAR		30,00

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1020

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO I	**RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA**	**ITEM**	**PUESTA A TIERRA GENERAL DE TABLERO**	**UNIDAD** / **UND**
		1.5.5		



SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
PUESTA A TIERRA DE						
PUESTA A TIERRA					1,00	1,00
				TOTAL A EJECUTAR		**1,00**

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1027

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	**"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**

CAPITULO I	**RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA**	**ITEM**	**1.5.6**	**LAMPARA LED 36 W DE SOBREPONER**				**UNIDAD**	**UND**
				SECCION	**DIMENSIONES**			**N° DE ELEMENTOS**	**MEDIDA TOTAL**
					LARGO (m)	**ANCHO(m)**	**ALTO(m)**	**AREA (m^2)**		
				LAMPARAS					
									4,00	4,00

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO I	**RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA**	**ITEM**	**1.5.7**	**PUNTO ELECTRICO (TOMACORRIENTE 110 V)**				**UNIDAD**	**UND**
				SECCION	**DIMENSIONES**			**N° DE ELEMENTOS**	**MEDIDA TOTAL**
					LARGO (m)	**ANCHO(m)**	**ALTO(m)**	**AREA (m^2)**		
				TOMACORRIENTES					
				TOMAS				8,00	8,00

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA


ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO I	RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA	**ITEM** 1.5.8	**PUNTO ELECTRICO INTERRUPTOR**				**UNIDAD**	**UND**
			SECCION	**DIMENSIONES**			**N° DE ELEMENTOS**	**MEDIDA TOTAL**
				LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)	
			INTERRUPTORES					
			INTERRUPTOR				3,00	3,00
						TOTAL A EJECUTAR		3,00

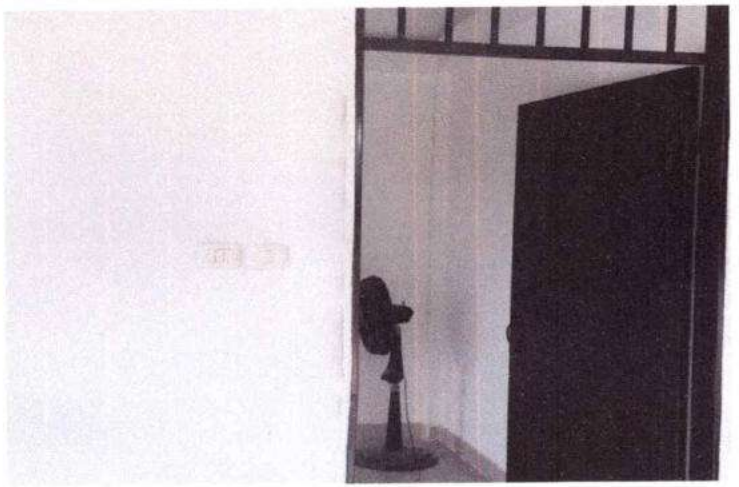

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

624

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO I	**RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA**	**ITEM**	**1.6.1**	**PUNTO HIDRAULICO PVC-P 1/2"**				**UNIDAD**	**UND**
				SECCION	**DIMENSIONES**			**N° DE ELEMENTOS**	**MEDIDA TOTAL**
					LARGO (m)	**ANCHO(m)**	**ALTO(m)**	**AREA (m^2)**		
				RESTAURANTE					
				Punto Hidraulico					1,00	1,00
								TOTAL A EJECUTAR		**1,00**



OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L ISR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1025

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO I	RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA	**ITEM**	**1.6.2**	PUNTO SANITARIO PVC 2"	**UNIDAD**	**UND**



SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
RESTAURANTE						
Punto Sanitario lavaplatos					1,00	1,00
				TOTAL A EJECUTAR		**1,00**

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

026

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA


ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO I	RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA	ITEM	1.6.3

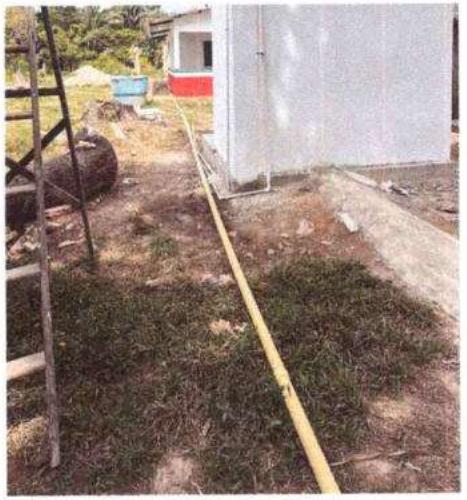

PUNTO SANITARIO PVC 3"					UNIDAD	UND
SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
RESTAURANTE						
Sifon rejilla					1,00	1,00
				TOTAL A EJECUTAR		1,00

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO I	RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA	ITEM	1.6.4



SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA 3"					UNIDAD	UND
SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
RESTAURANTE						
Rejilla en piso					1,00	1,00
TOTAL A EJECUTAR						1,00

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1028

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO I	**RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA**	**ITEM**	**1.6.5**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 4" PVC-S**		**UNIDAD**	**ML**



SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
RESTAURANTE						
Tuberia caja a disposicion final	6,00				4,00	24,00
				TOTAL A EJECUTAR		**24,00**

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1029

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO I	RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA	**ITEM**	1.6.6	



SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 3" PVC-S					UNIDAD	ML
SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
RESTAURANTE						
Sifon a caja de inspeccion	4,00				1,00	4,00
				TOTAL A EJECUTAR		4,00

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1030

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO I	RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA	ITEM	1.6.7



SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 2" PVC-S					UNIDAD	ML
SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
RESTAURANTE						
Lavaplatos	3,00				1,00	3,00
				TOTAL A EJECUTAR		3,00

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO I	RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA	ITEM	1.6.8



RED DE DISTRIBUCION PVC-P 1/2"					UNIDAD	ML
SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
RESTAURANTE						
Red Hidraulica	8,00				1,00	8,00
				TOTAL A EJECUTAR		8,00

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1032

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO I	RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA	ITEM	1.6.9



BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 4"					UNIDAD	ML
SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
RESTAURANTE						
Bajante	5,40				1,00	5,40
				TOTAL A EJECUTAR		5,40

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1033

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA


ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO II	BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA	ITEM	2.1.1

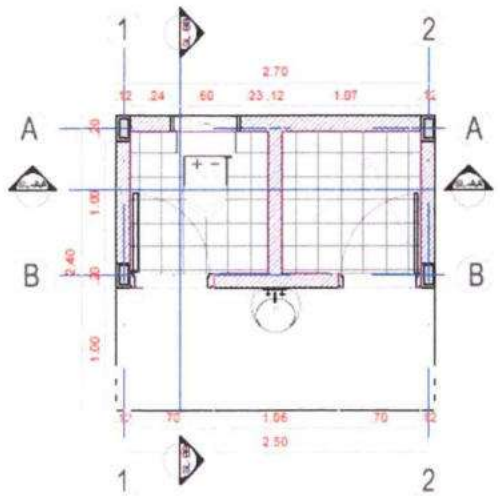

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL EDIFICACIONES					UNIDAD	M2
SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
Area de construcción	2,70	2,40		6,48	1,00	6,48

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO II	BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA	ITEM 2.2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD	UNIDAD	M3



SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
VIGA 0.20 X 0.20						
Eje 1 entre ejes A-B	1,40	0,20	0,20	0,06	1,00	0,06
Eje 2 entre ejes A-B	1,40	0,20	0,20	0,06	1,00	0,06
Eje A entre ejes 1-2	2,30	0,20	0,20	0,09	1,00	0,09
Eje B entre ejes 1-2	2,30	0,20	0,20	0,09	1,00	0,09
	1,40	0,20	0,20	0,06	1,00	0,06
Viga perimetral	4,46	0,12	0,15	0,08	1,00	0,08
		TOTAL A EJECUTAR				0,43

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1035

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO II	BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA	**ITEM**	**2.2.2**	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR T. SALTARIN	**UNIDAD**	**M3**



SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
AREA DE CONSTRUCCION	2,40	2,70	0,50	3,24	1,00	3,24
	2,40	1,50	0,50	1,8	1,00	1,80
				TOTAL A EJECUTAR		5,04

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1036

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO II	BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA	**ITEM**	**2.3.1**	COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI 0.12 X 0.20 m	**UNIDAD** / **ML**



SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
Eje A entre ejes 1-2	2,80				2,00	5,60
Eje B entre ejes 1-2	2,50				2,00	5,00
				TOTAL A EJECUTAR		10,60

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1037

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO II	BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA	**ITEM**	**2.3.2**	CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO E = 0,05 M	**UNIDAD**	**M2**



SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
Eje 1 entre ejes A-B	1,40	0,20			1,00	0,28
Eje 2 entre ejes A-B	1,40	0,20			1,00	0,28
Eje A entre ejes 1-2	2,30	0,20			1,00	0,46
Eje B entre ejes 1-2	2,30	0,20			1,00	0,46
	1,40	0,20			1,00	0,28
Viga perimetral	4,46	0,12			1,00	0,54
		TOTAL A EJECUTAR				2,30

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO II	BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA	**ITEM**	**2.3.3**	VIGA DE CIMENTACION 0.20 x 0.20 m EN CONCRETO DE 3000 PSI	**UNIDAD**	**ML**



SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
Eje 1 entre ejes A-B	1,40				1,00	1,40
Eje 2 entre ejes A-B	1,40				1,00	1,40
Eje A entre ejes 1-2	2,30				1,00	2,30
Eje B entre ejes 1-2	2,30				1,00	2,30
			TOTAL A EJECUTAR			7,40

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1039

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO II	BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA	ITEM	2.3.4



VIGA DE CONFINAMIENTO 0.12 x 0.15 m EN CONCRETO 3000 PSI — UNIDAD: ML

SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
Viga perimetral	4,46				1,00	4,46
				TOTAL A EJECUTAR		4,46

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO II	BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA	**ITEM** 2.3.5	VIGA AEREA 0.12 x 0.20 m CONCRETO DE 3000 PSI	**UNIDAD**	**ML**



SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
EJE 1	2,40				1,00	2,40
EJE 2	2,40				1,00	2,40
EJE A	2,70				1,00	2,70
EJE B	2,70				1,00	2,70
			TOTAL A EJECUTAR			10,20

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L ISR BUILDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES


OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"


CAPITULO I: BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA — **ITEM**: 2.3.6









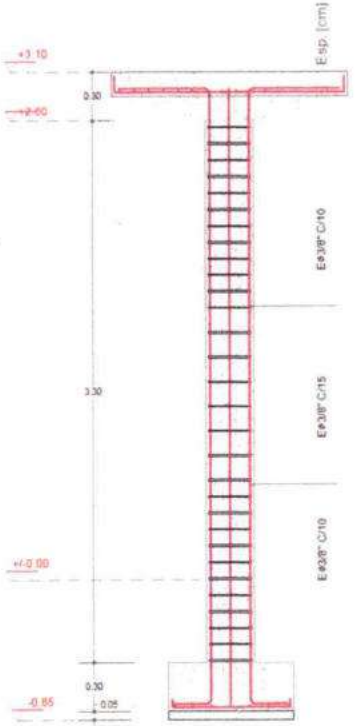

SECCION	ACERO DE REFUERZO Fy : 60000 PSI					UNIDAD	KG
	DIMENSIONES					N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	CANTIDAD	LARGO (m)	Diametro	PESO Kg/m	PESO (Kg)		
ACEROS VIGA							
VC- Eje 1 entre ejes A-B							
Baston 1	2	1,60	1/2	1,00	3,20	1,00	3,20
Baston 2	2	1,60	1/2	1,00	3,20	1,00	3,20
Flejes	20	0,7	3/8	0,56	7,84	1,00	7,84
VC- Intermedia							
Baston 1	2	1,60	1/2	1,00	3,20	1,00	3,20
Baston 2	2	1,60	1/2	1,00	3,20	1,00	3,20
Flejes	20	0,7	3/8	0,56	7,84	1,00	7,84
VC- Eje 2 entre ejes A-B							
Baston 1	2	1,60	1/2	1,00	3,20	1,00	3,20
Baston 2	2	1,60	1/2	1,00	3,20	1,00	3,20
Flejes	20	0,7	3/8	0,56	7,84	1,00	7,84
VC- Eje A entre ejes 1-2							
Baston 1	2	2,90	1/2	1,00	5,80	1,00	5,80
Baston 2	2	2,90	1/2	1,00	5,80	1,00	5,80
Flejes	35	0,7	3/8	0,56	13,72	1,00	13,72
VC- Eje B entre ejes 1-2							
Baston 1	2	2,90	1/2	1,00	5,80	1,00	5,80
Baston 2	2	2,90	1/2	1,00	5,80	1,00	5,80
Flejes	35	0,7	3/8	0,56	13,72	1,00	13,72
ACEROS VIGA CONFIN							
Baston 1	2	4,90	1/2	1,00	9,80	1,00	9,80
Baston 2	2	4,90	1/2	1,00	9,80	1,00	9,80
Flejes	60	1,16	3/8	0,56	38,98	1,00	38,98
	6	0,60	1/2	1,00	3,60	4,00	14,40
	6	0,60	1/2	1,00	3,60	4,00	14,40
ACEROS COLUMNETAS							
Eje A entre ejes 1-2							
Bastones	4	3,27	1/2	1,00	13,08	2,00	26,16
Flejes	35	0,54	3/8	0,56	10,58	2,00	21,17
Eje B entre ejes 1-2							
Bastones	4	2,52	1/2	1,00	10,08	2,00	20,16
Flejes	35	0,54	3/8	0,56	10,58	2,00	21,17
Bastones	6	4,60	1/2	1,00	27,60	2,00	55,20

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME


SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO I: BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA — **ITEM**: 2.3.6





ACERO DE REFUERZO Fy : 60000 PSI						UNIDAD	KG
Flejes	35	0,54	3/8	0,56	10,58	2,00	21,17
ACEROS VIGA AEREA							
VA- Eje 1 entre ejes A-B							
Baston 1	2	3,00	1/2	1,00	6,00	1,00	6,00
Baston 2	2	3,00	1/2	1,00	6,00	1,00	6,00
Flejes	35	0,54	3/8	0,56	10,58	1,00	10,58
VA- Eje 2 entre ejes A-B							
Baston 1	2	3,00	1/2	1,00	6,00	1,00	6,00
Baston 2	2	3,00	1/2	1,00	6,00	1,00	6,00
Flejes	35	0,54	3/8	0,56	10,58	1,00	10,58
VA- Eje A entre ejes 1-2							
Baston 1	2	3,00	1/2	1,00	6,00	1,00	6,00
Baston 2	2	3,00	1/2	1,00	6,00	1,00	6,00
Flejes	35	0,54	3/8	0,56	10,58	1,00	10,58
VA- Eje B entre ejes 1-2							
Baston 1	2	3,00	1/2	1,00	6,00	1,00	6,00
Baston 2	2	3,00	1/2	1,00	6,00	1,00	6,00
Flejes	35	0,54	3/8	0,56	10,58	1,00	10,58
		TOTAL A EJECUTAR					436,09

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO II	BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA	ITEM	2.3.7	LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.07 M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	UNIDAD	M2



SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
PISO EXTERIOR	1,00	2,40			1,00	2,40
PLACA DE PISO	2,70	1,40			1,00	3,78
				TOTAL A EJECUTAR		6,18

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1644

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO II	BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA	**ITEM**	2.4.1



MURO EN BLOQUE DE ARCILLA Nº5					UNIDAD	M2
SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
Eje 1 entre Ejes A-B	1,00		2,00	2	1,00	2,00
Cuchilla Eje 1 entre Ejes A-B	2,00		0,35	0,7	1,00	0,70
	1,00		2,00	2	1,00	2,00
	1,00		0,35	0,35	1,00	0,35
Eje 2 entre Ejes A-B	1,00		2,00	2	1,00	2,00
Cuchilla Eje 2 entre Ejes A-B	2,00		0,35	0,7	1,00	0,70
Eje A entre Ejes 1-2	2,46		2,00	4,92	1,00	4,92
descuento Eje A entre Ejes 1-2	0,60		0,30	0,18	-1,00	-0,18
Cuchilla Eje A entre Ejes 1-2	2,46		0,60	1,48	1,00	1,48
Eje B entre Ejes 1-2	2,46		2,00	4,92	1,00	4,92
Descuentos Eje B entre Ejes 1-2	0,70		2,00	1,40	-2,00	-2,80
Cuchilla Eje B entre Ejes 1-2	2,46		0,30	0,74	1,00	0,74
		TOTAL A EJECUTAR				16,82

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO II	BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA	**ITEM**	2.4.2



PAÑETE EN MORTERO 1:4 SOBRE MURO — **UNIDAD**: M2

SECCION	DIMENSIONES				N° DE CARAS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
Eje 1 entre Ejes A-B	1,40		2,20	3,08	2,00	6,16
Cuchilla Eje 1 entre Ejes A-B	2,00		0,35	0,7	2,00	1,40
	1,00		2,20	2,2	2,00	4,40
	1,00		0,35	0,35	2,00	0,70
Eje 2 entre Ejes A-B	1,40		2,20	3,08	2,00	6,16
Cuchilla Eje 2 entre Ejes A-B	2,00		0,35	0,7	2,00	1,40
Eje A entre Ejes 1-2	2,70		2,20	5,94	2,00	11,88
descuento Eje A entre Ejes 1-2	0,60		0,30	0,18	-1,00	-0,18
Cuchilla Eje A entre Ejes 1-2	2,70		0,60	1,62	2,00	3,24
Eje B entre Ejes 1-2	2,70		2,20	5,94	2,00	11,88
Descuentos Eje B entre Ejes 1-2	0,70		2,00	1,40	-2,00	-2,80
Cuchilla Eje B entre Ejes 1-2	2,70		0,30	0,81	2,00	1,62
			TOTAL A EJECUTAR			45,86

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO BANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1946

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO II	BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA	**ITEM** 2.4.3	PISO CERÁMICA 60*60 CM O SIMILAR				**UNIDAD**	**M2**
			SECCION	**DIMENSIONES**			**N° DE ELEMENTO**	**MEDIDA TOTAL**
				LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
			En placa de piso interna	1,17	1,17		1,37	2,00	2,74
						TOTAL A EJECUTAR			**2,74**



OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1643

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO II	**BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA**	**ITEM**	**2.4.4**



ENCHAPE MUROS					**UNIDAD**	**M2**
SECCION	**DIMENSIONES**				**N° DE ELEMENTOS**	**MEDIDA TOTAL**
	LARGO (m)	**ANCHO(m)**	**ALTO(m)**	**AREA (m^2)**		
Eje 1 entre ejes A-B	1,30		1,80	2,34	1,00	2,34
Muro Divisorio	1,16		1,80	2,09	1,00	2,09
Eje 2 entre ejes A-B	1,30		1,80	2,34	1,00	2,34
Eje A entre ejes 1-2	1,17		1,80	2,11	2,00	4,21
Eje B entre ejes 1-2	0,47		1,80	0,85	2,00	1,69
				TOTAL A EJECUTAR		**12,67**

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JER BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO II	BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA	**ITEM**	2.4.5	PINTURA VINILO TIPO 1 A TRES MANOS INTERIORES



UNIDAD	**M2**

SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
Eje 1 entre ejes A-B Externo	1,30		2,64	3,43	1,00	3,43
Eje 1 entre ejes A-B Interno	1,30		0,73	0,95	1,00	0,95
Muro Divisorio	1,16		0,85	0,99	3,00	2,96
Eje 2 entre ejes A-B Externo	1,30		2,64	3,43	1,00	3,43
Eje 2 entre ejes A-B Interno	1,30		0,73	0,95	1,00	
Eje A entre ejes 1-2 Interno	1,17		2,80	3,28	2,00	6,55
Eje A entre ejes 1-2 Externo	1,17		0,73	0,85	2,00	1,71
Eje B entre ejes 1-2 interno	0,47		0,73	0,34	2,00	0,69
Eje B entre ejes 1-2Externo	2,70		2,50	6,75	2,00	13,50
descuentos	0,70		2,00	1,40	-2,00	-2,80
		TOTAL A EJECUTAR				30,42

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L J&R BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO II	**BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA**	**ITEM**	**2.5.1**	**CORREA EN TUBO RECTANGULAR DE 3 x 1 1/2 CAL 18 INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA**	**UNIDAD** / **ML**



SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
Estructura de cubierta	2,70				3,00	8,10
				TOTAL A EJECUTAR		8,10

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

106

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO II	BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA	**ITEM**	2.5.2	CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA GALVANIZADA	**UNIDAD** M2



SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
Cubierta	2,70	2,40		6,48	1,00	6,48
				TOTAL A EJECUTAR		6,48

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO II	**BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA**	**ITEM**	**2.5.3**



PUERTA METÁLICA INCLUYE CHAPA — **UNIDAD**: M2

SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
Puerta	0,70	2,00		1,40	2,00	2,80
				TOTAL A EJECUTAR		2,80

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO II	BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA	**ITEM**	2.5.4	VENTANA METÁLICA TIPO REJA	**UNIDAD** M2



SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
Ventana	0,60		0,30	0,18	1,00	0,18
				TOTAL A EJECUTAR		0,18

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO II	BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA	**ITEM** 2.6.1	PUNTO HIDRAULICO PVC-P 1/2"	**UNIDAD** UND



SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
Punto Hidraulico					3,00	3,00
				TOTAL A EJECUTAR		3,00

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L ISR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO II	BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA	**ITEM**	**2.6.2**	PUNTO SANITARIO PVC 2"



SECCION	DIMENSIONES				UNIDAD	UND
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
Punto Sanitario					2,00	2,00
				TOTAL A EJECUTAR		2,00

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSB BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO II	BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA	**ITEM**	**2.6.3**



PUNTO SANITARIO PVC 4"					UNIDAD	UND
SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
Sanitario					1,00	1,00
		TOTAL A EJECUTAR				1,00

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO II	BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA	**ITEM** 2.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO PARA BATERÍA SANITARIA. INCLUYE ACCESORIOS	**UNIDAD**	**UND**



SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
Combo Sanitario					2,00	2,00
				TOTAL A EJECUTAR		2,00

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

105

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO II	BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA	**ITEM** 2.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE AÉREO DE 1000 L. INCLUYE ZAPATA, PEDESTAL, COLUMNA, PLACA AEREA EN CONCRETO DE 3000 PSI Y	**UNIDAD**	**UND**



SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
Tanque Aereo					1,00	1,00
				TOTAL A EJECUTAR		1,00

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO II	BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA	**ITEM** 2.6.6	CONSTRUCCIÓN DE POZO SÉPTICO EN LADRILLO TOLETE. DIMENSIONES 1,50X1,50X2,00 M.	**UNIDAD** UND



SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
Pozo Séptico					1,00	1,00
				TOTAL A EJECUTAR		1,00

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO II	BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA	ITEM 2.6.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 4" PVC-S	UNIDAD	ML



SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
Tuberia 4"	2,00				1,00	2,00
				TOTAL A EJECUTAR		2,00

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO II	BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA	**ITEM** 2.6.8	TUBERIA PVC-SANITARIA 2"				**UNIDAD**	**ML**
			SECCION	**DIMENSIONES**			**N° DE ELEMENTOS**	**MEDIDA TOTAL**
				LARGO (m)	**ANCHO(m)**	**ALTO(m)**	**AREA (m^2)**	
			Tuberia 2"	2,30			1,00	2,30
						TOTAL A EJECUTAR		**2,30**



OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO II	BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA	**ITEM** 2.6.9	RED DE DISTRIBUCION PVC-P 1/2"				**UNIDAD**	**ML**
			SECCION	**DIMENSIONES**			**N° DE ELEMENTOS**	**MEDIDA TOTAL**
				LARGO (m)	**ANCHO(m)**	**ALTO(m)**	**AREA (m^2)**	
			Tuberia 1/2"	5,71			1,00	5,71
						TOTAL A EJECUTAR		**5,71**



OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1062

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO II	BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA	ITEM	2.7.1	SUMINISTRO E INTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO SOLAR AUTOMATIZADO	UNIDAD	UND



SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
SISTEMA DE BOMBEO SOLAR AUTOMATIZADO					1,00	1,00
				TOTAL A EJECUTAR		1,00

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO II	BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA	**ITEM**	**2.8.1**	LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.07 M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	**UNIDAD** M2



SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
Losa de piso	6,00	12,00		72,00	1,00	72,00
				TOTAL A EJECUTAR		72,00

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO II	BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA	**ITEM**	2.8.3	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR T. SALTARIN	**UNIDAD** M3



SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
Costados construccion antigua	12,00	6,00	0,40	28,80	1,00	28,80
				TOTAL A EJECUTAR		28,80

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R.L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO I	BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA	ITEM 2.8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA	UNIDAD	ML



SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
CANAL EN LAMINA						
FACHADA FRONTAL	10,00				1,00	10,00
FACHADA TRASERA	10,00				1,00	10,00
		TOTAL A EJECUTAR				20,00

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO 2	BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA	**ITEM**	**2.8.4**



BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 4" — **UNIDAD**: ML

SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
RESTAURANTE						
Bajante	5,40				2,00	10,80
				TOTAL A EJECUTAR		**10,80**

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO II	AULAS ANTIGUAS - IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA	**ITEM**	**1.1.1**	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR T. SALTARIN	**UNIDAD**	**M3**



SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
AREA DE CONSTRUCCION	20,00	1,00	0,50	10	1,00	10,00
				TOTAL A EJECUTAR		10,00

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1068

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO I	AULAS ANTIGUAS - IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA	ITEM 1.2.1	LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.07 M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	UNIDAD	M2



SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
PLACA DE PISO						
Piso Externo	20,00	1,00			1,00	20,00
				TOTAL A EJECUTAR		20,00

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1069

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO I	**AULAS ANTIGUAS - IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA**	**ITEM** 1.2.2	**PINTURA VINILO TIPO 1 A TRES MANOS INTERIORES**	**UNIDAD**	**M2**



SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	CARAS		
MURO A LA VISTA						
Aula 1						
Muros Frontales	8,00		4,00	2,00	1,00	64,00
Muros Posterior	8,00		4,00	2,00	1,00	64,00
Muros Laterales	9,00		2,90	4,00	1,00	104,40
Cuchilla Eje Central	8,00		1,50	2,00	1,00	24,00
Aula 2						
Muros Frontales	8,00		4,00	2,00	1,00	64,00
Muros Posterior	8,00		4,00	2,00	1,00	64,00
Muros Laterales	9,00		2,90	4,00	1,00	104,40
Muros Antiguos	7,50		3,03	2,00	1,00	45,40
		TOTAL A EJECUTAR				534,20

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSRBUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA


ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	**"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**

CAPITULO II	**BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA**	**ITEM**	**2.1.1**

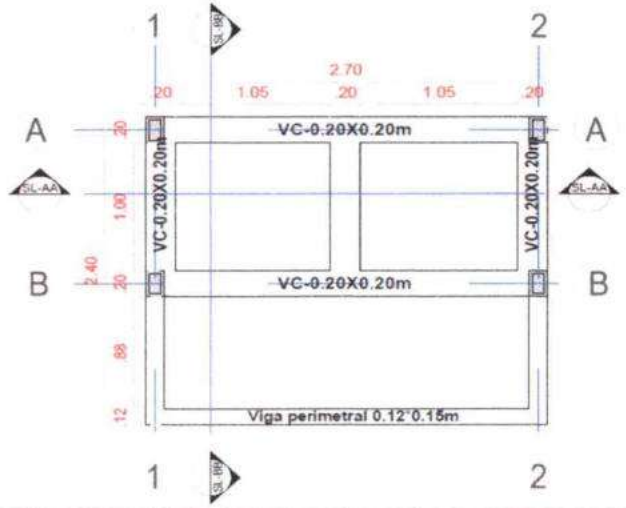

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL EDIFICACIONES					**UNIDAD**	**M2**
SECCION	**DIMENSIONES**				**N° DE ELEMENTO**	**MEDIDA TOTAL**
	LARGO (m)	**ANCHO(m)**	**ALTO(m)**	**AREA (m^2)**		
Area de construcción	2,70	2,40		6,48	1,00	6,48
			TOTAL A EJECUTAR			**6,48**

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

197

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO II	**BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA**	**ITEM**	**2.2.1**	**EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD**	**UNIDAD**	**M3**



SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
VIGA 0.20 X 0.20						
Eje 1 entre ejes A-B	1,40	0,20	0,20	0,06	1,00	0,06
Eje 2 entre ejes A-B	1,40	0,20	0,20	0,06	1,00	0,06
Eje A entre ejes 1-2	2,30	0,20	0,20	0,09	1,00	0,09
Eje B entre ejes 1-2	2,30	0,20	0,20	0,09	1,00	0,09
	1,40	0,20	0,20	0,06	1,00	0,06
Viga perimetral	4,46	0,12	0,15	0,08	1,00	0,08
			TOTAL A EJECUTAR			0,43

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO II	BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA	**ITEM**	**2.2.2**	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR T. SALTARIN	**UNIDAD**	**M3**



SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
AREA DE CONSTRUCCION	2,40	2,70	0,50	3,24	1,00	3,24
	2,40	1,50	0,50	1,8	1,00	1,80
				TOTAL A EJECUTAR		5,04

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L ISR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

7073

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ACALDIA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	**"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**

CAPITULO II	**BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA**	**ITEM**	**COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI 0.12 X 0.20 m**	**UNIDAD** / **ML**
		2.3.1		



SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
Eje A entre ejes 1-2	2,80				2,00	5,60
Eje B entre ejes 1-2	2,50				2,00	5,00
				TOTAL A EJECUTAR		10,60

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSB BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1024

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ACALDIA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	**"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**

CAPITULO II	**BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA**	**ITEM**	**CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO E = 0,05 M**	**UNIDAD** / **M2**



SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
Eje 1 entre ejes A-B	1,40	0,20			1,00	0,28
Eje 2 entre ejes A-B	1,40	0,20			1,00	0,28
Eje A entre ejes 1-2	2,30	0,20			1,00	0,46
Eje B entre ejes 1-2	2,30	0,20			1,00	0,46
	1,40	0,20			1,00	0,28
Viga perimetral	4,46	0,12			1,00	0,54
				TOTAL A EJECUTAR		2,30

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

16-25

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	**"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**

CAPITULO II	BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA	ITEM 2.3.3



VIGA DE CIMENTACION 0.20 x 0.20 m EN CONCRETO DE 3000 PSI — UNIDAD: ML

SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
Eje 1 entre ejes A-B	1,40				1,00	1,40
Eje 2 entre ejes A-B	1,40				1,00	1,40
Eje A entre ejes 1-2	2,30				1,00	2,30
Eje B entre ejes 1-2	2,30				1,00	2,30
				TOTAL A EJECUTAR		7,40

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1076

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ACALDIA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	**"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**

CAPITULO II	**BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA**	**ITEM**	**2.3.4**	**VIGA DE CONFINAMIENTO 0.12 x 0.15 m EN CONCRETO 3000 PSI**				**UNIDAD**	**ML**
				SECCION	**DIMENSIONES**			**N° DE ELEMENTO**	**MEDIDA TOTAL**
					LARGO (m)	**ANCHO(m)**	**ALTO(m)**	**AREA (m^2)**	
				Viga perimetral	4,46			1,00	4,46
							TOTAL A EJECUTAR		**4,46**



OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

10-37

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	**"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**

CAPITULO II	**BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA**	**ITEM**	**2.3.5**	**VIGA AEREA 0.12 x 0.20 m CONCRETO DE 3000 PSI**	**UNIDAD**	**ML**



SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
EJE 1	2,40				1,00	2,40
EJE 2	2,40				1,00	2,40
EJE A	2,70				1,00	2,70
EJE B	2,70				1,00	2,70
				TOTAL A EJECUTAR		10,20

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSB BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1076

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME


SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO


MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"


CAPITULO I	BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA	ITEM 2.3.6









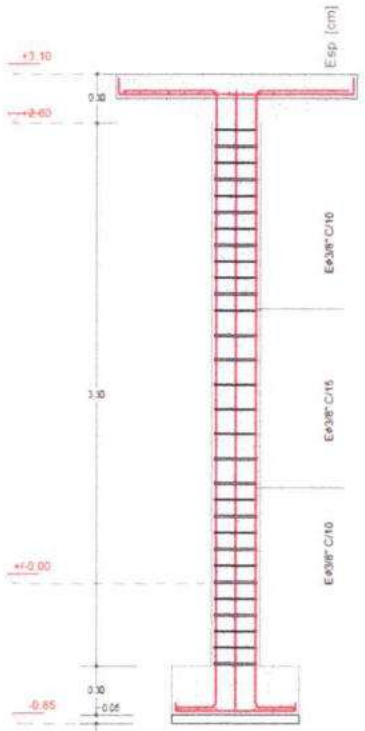

ACERO DE REFUERZO Fy : 60000 PSI						UNIDAD	KG
SECCION	DIMENSIONES					N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	CANTIDAD	LARGO (m)	Diametro	PESO Kg/m	PESO (Kg)		
ACEROS VIGA							
VC- Eje 1 entre ejes A-B							
Baston 1	2	1,60	1/2	1,00	3,20	1,00	3,20
Baston 2	2	1,60	1/2	1,00	3,20	1,00	3,20
Flejes	20	0,7	3/8	0,56	7,84	1,00	7,84
VC- Intermedia							
Baston 1	2	1,60	1/2	1,00	3,20	1,00	3,20
Baston 2	2	1,60	1/2	1,00	3,20	1,00	3,20
Flejes	20	0,7	3/8	0,56	7,84	1,00	7,84
VC- Eje 2 entre ejes A-B							
Baston 1	2	1,60	1/2	1,00	3,20	1,00	3,20
Baston 2	2	1,60	1/2	1,00	3,20	1,00	3,20
Flejes	20	0,7	3/8	0,56	7,84	1,00	7,84
VC- Eje A entre ejes 1-2							
Baston 1	2	2,90	1/2	1,00	5,80	1,00	5,80
Baston 2	2	2,90	1/2	1,00	5,80	1,00	5,80
Flejes	35	0,7	3/8	0,56	13,72	1,00	13,72
VC- Eje B entre ejes 1-2							
Baston 1	2	2,90	1/2	1,00	5,80	1,00	5,80
Baston 2	2	2,90	1/2	1,00	5,80	1,00	5,80
Flejes	35	0,7	3/8	0,56	13,72	1,00	13,72
ACEROS VIGA CONFIN							
Baston 1	2	4,90	1/2	1,00	9,80	1,00	9,80
Baston 2	2	4,90	1/2	1,00	9,80	1,00	9,80
Flejes	60	1,16	3/8	0,56	38,98	1,00	38,98
	6	0,60	1/2	1,00	3,60	4,00	14,40
	6	0,60	1/2	1,00	3,60	4,00	14,40
ACEROS COLUMNETAS							
Eje A entre ejes 1-2							
Bastones	4	3,27	1/2	1,00	13,08	2,00	26,16
Flejes	35	0,54	3/8	0,56	10,58	2,00	21,17
Eje B entre ejes 1-2							
Bastones	4	2,52	1/2	1,00	10,08	2,00	20,16
Flejes	35	0,54	3/8	0,56	10,58	2,00	21,17
Bastones	6	4,60	1/2	1,00	27,60	2,00	55,20
Flejes	35	0,54	3/8	0,56	10,58	2,00	21,17
ACEROS VIGA AEREA							
VA- Eje 1 entre ejes A-B							

7679

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA


ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO I: BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA — **ITEM**: 2.3.6

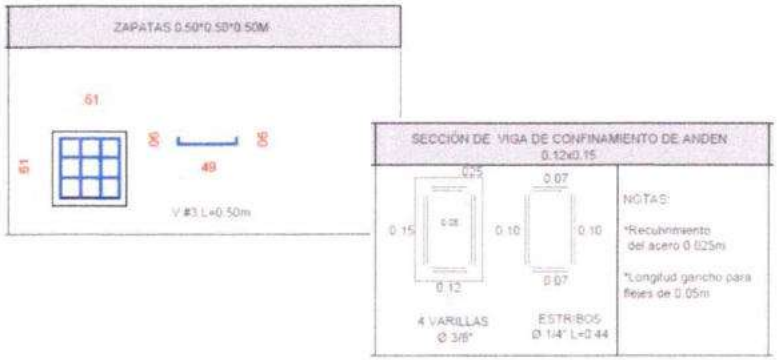

ACERO DE REFUERZO Fy : 60000 PSI						UNIDAD	KG
Baston 1	2	3,00	1/2	1,00	6,00	1,00	6,00
Baston 2	2	3,00	1/2	1,00	6,00	1,00	6,00
Flejes	35	0,54	3/8	0,56	10,58	1,00	10,58
VA- Eje 2 entre ejes A-B							
Baston 1	2	3,00	1/2	1,00	6,00	1,00	6,00
Baston 2	2	3,00	1/2	1,00	6,00	1,00	6,00
Flejes	35	0,54	3/8	0,56	10,58	1,00	10,58
VA- Eje A entre ejes 1-2							
Baston 1	2	3,00	1/2	1,00	6,00	1,00	6,00
Baston 2	2	3,00	1/2	1,00	6,00	1,00	6,00
Flejes	35	0,54	3/8	0,56	10,58	1,00	10,58
VA- Eje B entre ejes 1-2							
Baston 1	2	3,00	1/2	1,00	6,00	1,00	6,00
Baston 2	2	3,00	1/2	1,00	6,00	1,00	6,00
Flejes	35	0,54	3/8	0,56	10,58	1,00	10,58
		TOTAL A EJECUTAR					436,09

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO II	BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA	ITEM 2.3.7	LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.07 M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	UNIDAD	M2



SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
PISO EXTERIOR	1,00	2,40			1,00	2,40
PLACA DE PISO	2,70	1,40			1,00	3,78
			TOTAL A EJECUTAR			6,18

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO II	BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA	**ITEM**	**2.4.1**	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA Nº5	**UNIDAD**	**M2**



SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
Eje 1 entre Ejes A-B	1,00		2,00	2	1,00	2,00
Cuchilla Eje 1 entre Ejes A-B	2,00		0,35	0,7	1,00	0,70
	1,00		2,00	2	1,00	2,00
	1,00		0,35	0,35	1,00	0,35
Eje 2 entre Ejes A-B	1,00		2,00	2	1,00	2,00
Cuchilla Eje 2 entre Ejes A-B	2,00		0,35	0,7	1,00	0,70
Eje A entre Ejes 1-2	2,46		2,00	4,92	1,00	4,92
descuento Eje A entre Ejes 1-2	0,60		0,30	0,18	-1,00	-0,18
Cuchilla Eje A entre Ejes 1-2	2,46		0,60	1,48	1,00	1,48
Eje B entre Ejes 1-2	2,46		2,00	4,92	1,00	4,92
Descuentos Eje B entre Ejes 1-	0,70		2,00	1,40	-2,00	-2,80
Cuchilla Eje B entre Ejes 1-2	2,46		0,30	0,74	1,00	0,74
			TOTAL A EJECUTAR			16,82

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1082

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO II	BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA	ITEM 2.4.2



PAÑETE EN MORTERO 1:4 SOBRE MURO					UNIDAD	M2
SECCION	DIMENSIONES				N° DE CARAS	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
Eje 1 entre Ejes A-B	1,40		2,20	3,08	2,00	6,16
Cuchilla Eje 1 entre Ejes A-B	2,00		0,35	0,7	2,00	1,40
	1,00		2,20	2,2	2,00	4,40
	1,00		0,35	0,35	2,00	0,70
Eje 2 entre Ejes A-B	1,40		2,20	3,08	2,00	6,16
Cuchilla Eje 2 entre Ejes A-B	2,00		0,35	0,7	2,00	1,40
Eje A entre Ejes 1-2	2,70		2,20	5,94	2,00	11,88
descuento Eje A entre Ejes 1-2	0,60		0,30	0,18	-1,00	-0,18
Cuchilla Eje A entre Ejes 1-2	2,70		0,60	1,62	2,00	3,24
Eje B entre Ejes 1-2	2,70		2,20	5,94	2,00	11,88
Descuentos Eje B entre Ejes 1-	0,70		2,00	1,40	-2,00	-2,80
Cuchilla Eje B entre Ejes 1-2	2,70		0,30	0,81	2,00	1,62
		TOTAL A EJECUTAR				45,86

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO II	**BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA**	**ITEM**	**2.4.3**



PISO CERÁMICA 60*60 CM O SIMILAR					**UNIDAD**	**M2**
SECCION	**DIMENSIONES**				**N° DE ELEMENTO**	**MEDIDA TOTAL**
	LARGO (m)	**ANCHO(m)**	**ALTO(m)**	**AREA (m^2)**		
En placa de piso interna	1,17	1,17		1,37	2,00	2,74
				TOTAL A EJECUTAR		**2,74**

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	**"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**

CAPITULO II	**BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA**	**ITEM**	**2.4.4**	**ENCHAPE MUROS**	**UNIDAD**	**M2**



SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
Eje 1 entre ejes A-B	1,30		1,80	2,34	1,00	2,34
Muro Divisorio	1,16		1,80	2,09	1,00	2,09
Eje 2 entre ejes A-B	1,30		1,80	2,34	1,00	2,34
Eje A entre ejes 1-2	1,17		1,80	2,11	2,00	4,21
Eje B entre ejes 1-2	0,47		1,80	0,85	2,00	1,69
				TOTAL A EJECUTAR		12,67

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO II	BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA	ITEM 2.4.5



PINTURA VINILO TIPO 1 A TRES MANOS INTERIORES					UNIDAD	M2
SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
Eje 1 entre ejes A-B Externo	1,30		2,64	3,43	1,00	3,43
Eje 1 entre ejes A-B Interno	1,30		0,73	0,95	1,00	0,95
Muro Divisorio	1,16		0,85	0,99	3,00	2,96
Eje 2 entre ejes A-B Externo	1,30		2,64	3,43	1,00	3,43
Eje 2 entre ejes A-B Interno	1,30		0,73	0,95	1,00	
Eje A entre ejes 1-2 Interno	1,17		2,80	3,28	2,00	6,55
Eje A entre ejes 1-2 Externo	1,17		0,73	0,85	2,00	1,71
Eje B entre ejes 1-2 interno	0,47		0,73	0,34	2,00	0,69
Eje B entre ejes 1-2Externo	2,70		2,50	6,75	2,00	13,50
descuentos	0,70		2,00	1,40	-2,00	-2,80
				TOTAL A EJECUTAR		30,42

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	**"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**

CAPITULO II	**BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA**	**ITEM**	**2.5.1**	**CORREA EN TUBO RECTANGULAR DE 3 x 1 1/2 CAL 18 INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA**	**UNIDAD**	**ML**



SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
Estructura de cubierta	2,70				3,00	8,10
				TOTAL A EJECUTAR		8,10

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L ISR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1087

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	**"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**

CAPITULO II	**BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA**	**ITEM**	**2.5.2**	**CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA GALVANIZADA**	**UNIDAD**	**M2**



SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
Cubierta	2,70	2,40		6,48	1,00	6,48

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ACALDIA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO II	BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA	ITEM	2.5.3



PUERTA METÁLICA INCLUYE CHAPA					UNIDAD	M2
SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
Puerta	0,70	2,00		1,40	2,00	2,80
			TOTAL A EJECUTAR			2,80

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L ISR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

188

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ACALDIA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	**"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**

CAPITULO II	BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA	ITEM 2.5.4



VENTANA METÁLICA TIPO REJA — UNIDAD: M2

SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
Ventana	0,60		0,30	0,18	1,00	0,18
				TOTAL A EJECUTAR		0,18

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1090

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO II	BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA	ITEM	2.6.1



PUNTO HIDRAULICO PVC-P 1/2"					UNIDAD	UND
SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
Punto Hidraulico					3,00	3,00
				TOTAL A EJECUTAR		3,00

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1097

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO II	BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA	ITEM	2.6.2



PUNTO SANITARIO PVC 2"					UNIDAD	UND
SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
Punto Sanitario					2,00	2,00

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO II	BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA	ITEM	2.6.3



PUNTO SANITARIO PVC 4"					UNIDAD	UND
SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
Sanitario					1,00	1,00
				TOTAL A EJECUTAR		1,00

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1093

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO II	BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA	ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO PARA BATERÍA SANITARIA. INCLUYE ACCESORIOS	UNIDAD	UND
		2.6.4			



SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
Combo Sanitario					2,00	2,00

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO II	BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA	ITEM	2.6.5



CONSTRUCCIÓN DE POZO SÉPTICO EN LADRILLO TOLETE. DIMENSIONES 1,50X1,50X2,00 M.					UNIDAD	UND
SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
Pozo Séptico					1,00	1,00
				TOTAL A EJECUTAR		1,00

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025


ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ACALDIA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO II	BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA	ITEM	2.6.6

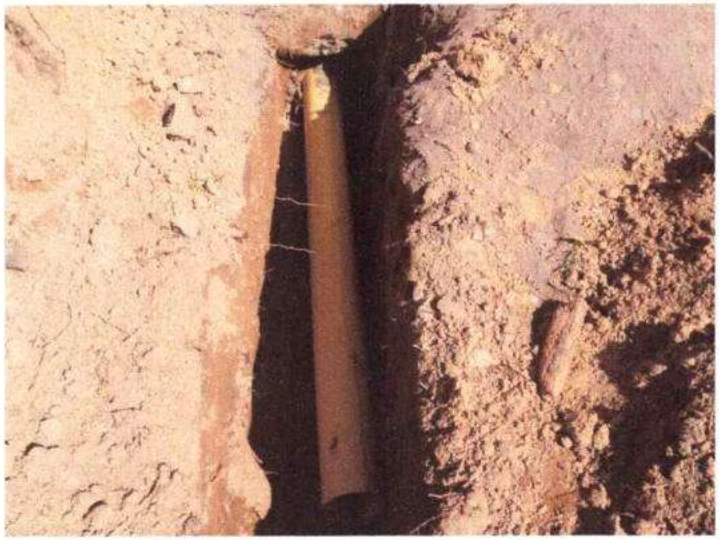

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 4" PVC-S					UNIDAD	ML
SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
Tuberia 4"	2,00				1,00	2,00
			TOTAL A EJECUTAR			2,00

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ACALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO II	BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA	ITEM	2.6.7



TUBERIA PVC-SANITARIA 2" — UNIDAD: ML

SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
Tuberia 4"	2,30				1,00	2,30
				TOTAL A EJECUTAR		2,30

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1097

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ACALDIA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CAPITULO II	BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA	ITEM	2.6.8



RED DE DISTRIBUCION PVC-P 1/2"					UNIDAD	ML
SECCION	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTO	MEDIDA TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO(m)	ALTO(m)	AREA (m^2)		
Tuberia 1/2"	5,66				1,00	5,66
				TOTAL A EJECUTAR		5,66

OBSERVACIONES:

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1068

1099

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	22 de agosto de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 1

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÒN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÌA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÀN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME -	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÒS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÙN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÒS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÙN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	
Inspector de obra		Ayudante	
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado		
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. ALISTAMIENTO DE MATERIALES

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1160

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	23 de agosto de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 2

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÀN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÒS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÒS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	
Inspector de obra		Ayudante	
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. ALISTAMIENTO DE MATERIALES

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	24 de agosto de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 3

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra		Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	
Inspector de obra		Ayudante	
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. DÍA DOMINICAL NO LABORABLE

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción
		DIA NO LABORABLE

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	25 de agosto de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 4

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	
Inspector de obra		Ayudante	
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. ALISTAMIENTO DE MATERIALES

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	26 de agosto de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 5

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÒN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÙN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÙN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	
Inspector de obra		Ayudante	
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. ALISTAMIENTO DE MATERIALES

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1104

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	27 de agosto de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 6

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	
Inspector de obra		Ayudante	
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. ALISTAMIENTO DE MATERIALES

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO... 2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	28 de agosto de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 7

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	
Inspector de obra		Ayudante	
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. ALISTAMIENTO DE MATERIALES

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 395 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	29 de agosto de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 8

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	
Inspector de obra		Ayudante	
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. ALISTAMIENTO DE MATERIALES

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1167

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	30 de agosto de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 9

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	
Inspector de obra		Ayudante	
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. ALISTAMIENTO DE MATERIALES

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	31 de agosto de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 10

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra		Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	
Inspector de obra		Ayudante	
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

DÍA DOMINICAL

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción
		NO LABORABLE

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 395 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1109

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	1 de septiembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 11

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÀN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra		Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	
Inspector de obra		Ayudante	
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado		
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. ALISTAMIENTO DE MATERIALES

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	2 de septiembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 12

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÀN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	
Inspector de obra		Ayudante	
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. ALISTAMIENTO DE MATERIALES

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO... 2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

7777

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	3 de septiembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 13

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	
Inspector de obra		Ayudante	
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. ALISTAMIENTO DE MATERIALES

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO... 2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

7772

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	4 de septiembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 14

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	
Inspector de obra		Ayudante	
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. ALISTAMIENTO DE MATERIALES

FIN

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO... 2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	5 de septiembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 15

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	
Inspector de obra		Ayudante	
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	X
Gafas	X
Guantes	X
Uniforme	X
Botas	X

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado		X
Seco		
Nublado	X	
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. ALISTAMIENTO DE MATERIALES

FIN

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1774

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	6 de septiembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 16

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	
Inspector de obra		Ayudante	
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. ALISTAMIENTO DE MATERIALES

FIN

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	7 de septiembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 17

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra		Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	
Inspector de obra		Ayudante	
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. DÍA DOMINICAL

FIN

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción
		NO LABORABLE

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1776

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME.

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	8 de septiembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 18

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	2
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	X
Gafas	X
Guantes	X
Uniforme	X
Botas	X

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

SE DA INICIO A LAS ACTIVIDADES EN EL FRENTE DE TRABAJO DEL RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA

1. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

FIN

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción
1.1 PRELIMINARES	1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	1
	-	-
	-	-
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1777

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	9 de septiembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 19

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	2
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	X
Gafas	X
Guantes	X
Uniforme	X
Botas	X

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA MEDIANTE LA LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

FIN

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción
1.1 PRELIMINARES	1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
1.1 -PRELIMINARES	1.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	1
	-	-
	-	-
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	10 de septiembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 20

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	2
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	X
Gafas	X
Guantes	X
Uniforme	X
Botas	X

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE TRABAJO DEL RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA

1. EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN
2. ACERO DE REFUERZO Fy:60000PSI

FIN

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción
1.1 PRELIMINARES	1.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL
1,2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS	1.2.10	ACERO DE REFUERZO Fy : 60000 PSI

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
PULIDORA INDUSTRIAL	1	1
HERRAMIENTA MENOR	-	1
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

7779

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	11 de septiembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 21

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	2
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	X
Gafas	X
Guantes	X
Uniforme	X
Botas	X

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	
Seco		
Nublado		X
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE TRABAJO DEL RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA

1. CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO E = 0,05 M

2. ACERO DE REFUERZO Fy:60000PSI

FIN

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción
1,2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS	1.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL
	1.2.10	ACERO DE REFUERZO Fy : 60000 PSI

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
PULIDORA INDUSTRIAL	1	1
HERRAMIENTA MENOR	1	1
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1120

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	12 de septiembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 22

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	2
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	X
Gafas	X
Guantes	X
Uniforme	X
Botas	X

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	
Seco		
Nublado		X
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE TRABAJO DEL RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA

1. CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO E = 0,05 M
2. ACERO DE REFUERZO Fy:60000PSI

FIN

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción
1,2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS	1,2,1	CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO E = 0,05 M
	1.2.10	ACERO DE REFUERZO Fy : 60000 PSI

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	1
MEZCLADORA	1	1
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	13 de septiembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 23

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	2
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	X
Gafas	X
Guantes	X
Uniforme	X
Botas	X

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	
Seco		
Nublado		X
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE TRABAJO DEL RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA

1. CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO E = 0,05 M

3. CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS DE 0.60 x 0.60 x 0.30 m

2. ACERO DE REFUERZO Fy:60000PSI

FIN

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción
1,2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS	1,2,1	CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO E = 0,05 M
	1,2,2	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS DE 0.60 x 0.60 x 0.30 m
	1.2.10	ACERO DE REFUERZO Fy : 60000 PSI

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	1
MEZCLADORA	1	1
EXCELENTE....1	BUENO...2	DEFICIENTE...3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1127

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	14 de septiembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 24

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra		Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	
Inspector de obra		Ayudante	
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado		X
Seco		
Nublado	X	
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. DÍA DOMINICAL NO LABORABLE

FIN

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción
		NO LABORABLE

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	15 de septiembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 25

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	2
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado		
Seco		
Nublado		X
Lluvia Pasajera	X	
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE TRABAJO DEL RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA

1. MURO EN BLOQUE DE ARCILLA Nº5

FIN

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción
1.3 MAMPOSTERÍA Y ACABADOS	1.3.2	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA Nº5

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	1
MEZCLADORA	1	1
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	16 de septiembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 26

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	2
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado		X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera	X	
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE TRABAJO DEL RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA

1. MURO EN BLOQUE DE ARCILLA Nº5

FIN

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción
1,3 MAMPOSTERÍA Y ACABADOS	1.3.2	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA Nº5

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	1
MEZCLADORA	1	1
EXCELENTE....1	BUENO... 2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L. JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	17 de septiembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 27

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÀN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	2
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE TRABAJO DEL RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA

1. MURO EN BLOQUE DE ARCILLA Nº5

FIN

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción
1,3 MAMPOSTERÍA Y ACABADOS	1.3.2	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA Nº5

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	1
MEZCLADORA	1	1
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	18 de septiembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 28

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	2
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE TRABAJO DEL RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA

1. MURO EN BLOQUE DE ARCILLA Nº5
2. PUNTO ELÉCTRICO (TOMACORRIENTE 110 V)
3. PUNTO ELÉCTRICO INTERRUPTOR
4. PUNTO HIDRÁULICO PVC-P 1/2"
5. PUNTO SANITARIO PVC 2"
6. PUNTO SANITARIO PVC 3"

FIN

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción
1,3 MAMPOSTERÍA Y ACABADOS	1.3.2	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA Nº5
1,5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1,5,7	PUNTO ELÉCTRICO (TOMACORRIENTE 110 V)
	1,5,8	PUNTO ELÉCTRICO INTERRUPTOR
1.6 INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS	1,6,1	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P 1/2"
	1,6,2	PUNTO SANITARIO PVC 2"
	1,6,3	PUNTO SANITARIO PVC 3"
	1,6,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 4" PVC-S
	1,6,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 3" PVC-S
	1,6,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2" PVC-S
	1,6,8	RED DE DISTRIBUCIÓN PVC-P 1/2"

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	1
MEZCLADORA	1	1
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	19 de septiembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 29

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÀN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	2
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE TRABAJO DEL RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA

1. MURO EN BLOQUE DE ARCILLA Nº5

2. VIGA AÉREA 0.20 x 0.25 m CONCRETO DE 3000 PSI

FIN

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción
1,3 MAMPOSTERÍA Y ACABADOS	1.3.2	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA Nº5
1,2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS	1.2.8	VIGA AÉREA 0.20 x 0.25 m CONCRETO DE 3000 PSI
	1.2.10	ACERO DE REFUERZO Fy : 60000 PSI

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	1
MEZCLADORA	1	1
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	20 de septiembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 30

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	2
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE TRABAJO DEL RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA

1. PAÑETE EN MORTERO 1:4 SOBRE MURO
2. CORREA EN TUBO RECTANGULAR DE 3 x 1 1/2 CAL 18 INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA

FIN

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción
1.3 MAMPOSTERÍA Y ACABADOS	1.3.3	PAÑETE EN MORTERO 1:4 SOBRE MURO
1.4 ESTRUCTURA METÁLICA Y PUERTA	1.4.3	CORREA EN TUBO RECTANGULAR DE 3 x 1 1/2 CAL 18 INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA
1.5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.5.1	ACOMETIDA ELÉCTRICA MONOFÁSICA
	1.5.2	TABLERO DE 12 CIRCUITOS
	1.5.3	ACOMETIDA 2#8+1#10T THHN 600V
	1.5.4	ACOMETIDA 2#12+1#12T THHN 600V
	1.5.5	PUESTA A TIERRA GENERAL DE TABLERO

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	1
MEZCLADORA	1	1
PULIDORA INDUSTRIAL	1	1
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	21 de septiembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 31

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra		Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	
Inspector de obra		Ayudante	
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado		
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. DÍA DOMINICAL

FIN

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción
		NO LABORABLE

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
EXCELENTE....1	BUENO...2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	22 de septiembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 32

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	2
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE TRABAJO DEL RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA

1. PAÑETE EN MORTERO 1:4 SOBRE MURO
2. CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTÓNICA GALVANIZADA
3. MESÓN EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI INCLUYE ENCHAPE

FIN

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción
1.2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS	1.2.7	MESÓN EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI INCLUYE ENCHAPE
1.3 CARPINTERÍA Y ACABADOS	1.3.3	PAÑETE EN MORTERO 1:4 SOBRE MURO
1.4 ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA	1.4.1	CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTÓNICA GALVANIZADA

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	1
MEZCLADORA	1	1
PULIDORA INDUSTRIAL	1	1
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1137

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	23 de septiembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 33

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	2
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE TRABAJO DEL RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA

1. PAÑETE EN MORTERO 1:4 SOBRE MURO
2. CABALLETE EN LAMINA GALVANIZADA

FIN

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción
1,3 MAMPOSTERÍA Y ACABADOS	1.3.3	PAÑETE EN MORTERO 1:4 SOBRE MURO
	1.4.2	CABALLETE EN LAMINA GALVANIZADA
ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA	1.4.4	VENTANA METÁLICA DE CORREDERA INCLUYE REJA
	1.4.5	PUERTA METÁLICA INCLUYE CHAPA
	1.4.7	VENTANA METÁLICA TIPO REJA

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	1
MEZCLADORA	1	1
PULIDORA INDUSTRIAL	1	1
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1132

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	24 de septiembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 34

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÈ ANTONIO GALÀN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	2
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE TRABAJO DEL RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA

1. LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.08 M

FIN

Resumen de las Actividades

Capitulo	Item	Descripción
1,3 MAMPOSTERÍA Y ACABADOS	1.3.1	LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.08 M

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	1
MEZCLADORA	1	1
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	25 de septiembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 35

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÀN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	2
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE TRABAJO DEL RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA

1. LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.08 M

FIN

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción
1,3 MAMPOSTERÍA Y ACABADOS	1.3.1	LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.08 M

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	1
MEZCLADORA	1	1
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	26 de septiembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 36

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	2
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE TRABAJO DEL RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA

1. PISO CERÁMICA 50*50 CM O SIMILAR TRAFICO 5

FIN

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción
1,3 MAMPOSTERÍA Y ACABADOS	1.3.5	PISO CERÁMICA 50*50 CM O SIMILAR TRAFICO 5

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	1
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	27 de septiembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 37

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	2
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE TRABAJO DEL RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA

1. PISO CERÁMICA 50*50 CM O SIMILAR TRAFICO 5
2. GUARDA ESCOBA EN CERÁMICA
3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA

FIN

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción
1,3 MAMPOSTERÍA Y ACABADOS	1.3.5	PISO CERÁMICA 50*50 CM O SIMILAR TRAFICO 5
	1.3.6	GUARDA ESCOBA EN CERÁMICA
1.4 ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA	1.4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	1
EXCELENTE....1	BUENO...2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	28 de septiembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 38

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÈ ANTONIO GALÀN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	2
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. DÍA DOMINICAL

FIN

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción
		NO LABORABLE

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
PULIDORA INDUSTRIAL	-	-
EQUIPO DE SOLDADURA	-	-
EQUIPO DE SEGURIDAD EN ALTURAS	-	-
EQUIPO OXICORTE	-	-
EXCELENTE....1	BUENO... 2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	29 de septiembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 39

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	2
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE TRABAJO DEL RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA

1. PINTURA VINILO TIPO 1 A DOS MANOS INTERIORES
2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA 3"

FIN

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción
1.3 MAMPOSTERÍA Y ACABADOS	1.3.4	PINTURA VINILO TIPO 1 A DOS MANOS INTERIORES
1.6 INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS	1.4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA 3"

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	1
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	30 de septiembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 40

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	2
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE TRABAJO DEL RESTAURANTE ESCOLAR - IE AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA

1. PINTURA VINILO TIPO 1 A DOS MANOS INTERIORES
2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4 mm

FIN

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción
1,3 MAMPOSTERÍA Y ACABADOS	1.3.4	PINTURA VINILO TIPO 1 A DOS MANOS INTERIORES
1.5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.5.6	LAMPARA LED 36 W DE SOBREPONER
[illegible]TRUCTURA METÁLICA Y [illegible]ERTA	1.4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4 mm

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	1
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1139

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	1 de octubre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 41

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	
Inspector de obra		Ayudante	
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	x	x
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. ALISTAMIENTO DE MATERIALES

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1140

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	2 de octubre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 42

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	
Inspector de obra		Ayudante	
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	x	x
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. ALISTAMIENTO DE MATERIALES

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	3 de octubre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 43

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	
Inspector de obra		Ayudante	
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	x	x
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. ALISTAMIENTO DE MATERIALES

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	4 de octubre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 44

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	
Inspector de obra		Ayudante	
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	x	x
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. ALISTAMIENTO DE MATERIALES

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO...2	DEFICIENTE...3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	5 de octubre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 45

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	
Inspector de obra		Ayudante	
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	x	x
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. DÍA DOMINICAL

FIN

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción
		NO LABORABLE

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO... 2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1144

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	6 de octubre de 2025	Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca	Hoja No. 46

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	
Inspector de obra		Ayudante	
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	x	x
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. ALISTAMIENTO DE MATERIALES

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	7 de octubre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 47

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	2
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

1. ALISTAMIENTO DE MATERIALES

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1146

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	8 de octubre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 48

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	
Inspector de obra		Ayudante	
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	x	x
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. ALISTAMIENTO DE MATERIALES

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1147

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	9 de octubre de 2025	Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca	Hoja No. 49

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	
Inspector de obra		Ayudante	
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	x	x
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. ALISTAMIENTO DE MATERIALES

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	10 de octubre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 50

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	
Inspector de obra		Ayudante	
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	x	x
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. ALISTAMIENTO DE MATERIALES

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1149

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	11 de octubre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 51

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	
Inspector de obra		Ayudante	
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	x	x
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. ALISTAMIENTO DE MATERIALES

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1150

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	12 de octubre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 52

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	
Inspector de obra		Ayudante	
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	x	x
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. DÍA DOMINICAL

FIN

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción
		NO LABORABLE

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1157

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	13 de octubre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 53

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	
Inspector de obra		Ayudante	
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	x	x
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. DÍA FESTIVO

FIN

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción
		NO LABORABLE

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1152

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	14 de octubre de 2025	Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca	Hoja No.	54

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	
Inspector de obra		Ayudante	
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	x	x
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. ALISTAMIENTO DE MATERIALES

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	15 de octubre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 55

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**

CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	
Inspector de obra		Ayudante	
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	x	x
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. ALISTAMIENTO DE MATERIALES

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1154

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	16 de octubre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 56

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	
Inspector de obra		Ayudante	
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	x	x
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. ALISTAMIENTO DE MATERIALES

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1155

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	17 de octubre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 57

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

SE DA INICIO A LAS ACTIVIDADES EN EL FRENTE DE TRABAJO DE LA BATERÍA SANITARIA - IE JOSÉ ANTONIO GALÁN VEREDA BAJA FLORIDA

1. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

FIN

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción
2.1 PRELIMINARES	2.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	1
	-	-
	-	-
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1156

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	18 de octubre de 2025	Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca	Hoja No.	58

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE TRABAJO DE LA BATERÍA SANITARIA - IE JOSÉ ANTONIO GALÁN VEREDA BAJA FLORIDA

1. EXCAVACIÓN MANUAL

FIN

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción
2.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA	2.2.1	EXCAVACIÓN MANUAL

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	1
	-	-
	-	-
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	19 de octubre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 59

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. DÍA DOMINICAL

FIN

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción
		NO LABORABLE

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1150

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	20 de octubre de 2025	Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca	Hoja No. 60

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE TRABAJO DE LA BATERÍA SANITARIA - IE JOSÉ ANTONIO GALÁN VEREDA BAJA FLORIDA

1. CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO E = 0,05 M
2. VIGA DE CIMENTACIÓN 0.20 x 0.20 m EN CONCRETO DE 3000 PSI
3. VIGA DE CONFINAMIENTO 0.12 x 0.15 m EN CONCRETO 3000 PSI
4. CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS DE 0.60 x 0.60 x 0.30 m PARA TANQUE AÉREO
5. ACERO DE REFUERZO Fy : 60000 PSI

FIN

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción
2.3 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO	2.3.2	CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO E = 0,05 M
	2.3.3	VIGA DE CIMENTACIÓN 0.20 x 0.20 m EN CONCRETO DE 3000 PSI
	2.3.4	VIGA DE CONFINAMIENTO 0.12 x 0.15 m EN CONCRETO 3000 PSI
	2.3.6	ACERO DE REFUERZO Fy : 60000 PSI
2.6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	2.6.5	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS DE 0.60 x 0.60 x 0.30 m PARA TANQUE AÉREO

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	1
	-	-
	-	-
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

11 59

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	21 de octubre de 2025	Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca	Hoja No.	61

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE TRABAJO DE LA BATERÍA SANITARIA - IE JOSÉ ANTONIO GALÁN VEREDA BAJA FLORIDA

1. COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI 0.12 X 0.20 m
2. PUNTO HIDRÁULICO PVC-P 1/2"
3. PUNTO SANITARIO PVC 2"
4. PUNTO SANITARIO PVC 4"
5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 4" PVC-S
6. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2" PVC-S
7. RED DE DISTRIBUCIÓN PVC-P 1/2"
8. COLUMNA EN CONCRETO 3000 PARA TANQUE AÉREO

FIN

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción
2.3 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO	2.3.3	COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI 0.12 X 0.20 m
2.6 INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS	2.6.1	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P 1/2"
	2.6.2	PUNTO SANITARIO PVC 2"
	2.6.3	PUNTO SANITARIO PVC 4"
	2.6.5	COLUMNA EN CONCRETO 3000 PARA TANQUE AÉREO
	2.6.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 4" PVC-S
	2.6.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2" PVC-S
	2.6.9	RED DE DISTRIBUCIÓN PVC-P 1/2"

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	1
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	22 de octubre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 62

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE TRABAJO DE LA BATERÍA SANITARIA - IE JOSÉ ANTONIO GALÁN VEREDA BAJA FLORIDA

1. MURO EN BLOQUE DE ARCILLA N°5
2. VIGA AÉREA 0.12 x 0.20 m CONCRETO DE 3000 PSI
3. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR T. SALTARÍN
4. LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.07 M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA
5. ACERO DE REFUERZO Fy : 60000 PSI
6. PLACA EN CONCRETO 3000 PARA TANQUE AÉREO

FIN

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción
2.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA	2.2.2	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR T. SALTARÍN
2.3 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO	2.3.5	VIGA AÉREA 0.12 x 0.20 m CONCRETO DE 3000 PSI
	2.3.7	LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.07 M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA
	2.3.6	ACERO DE REFUERZO Fy : 60000 PSI
2.4 MAMPOSTERÍA Y ACABADOS	2.4.1	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA N°5
2.6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	2.6.5	PLACA EN CONCRETO 3000 PARA TANQUE AÉREO

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
	-	-
HERRAMIENTA MENOR	-	1
	-	-
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	23 de octubre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 63

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE TRABAJO DE LA BATERÍA SANITARIA - IE JOSÉ ANTONIO GALÁN VEREDA BAJA FLORIDA

1. MURO EN BLOQUE DE ARCILLA Nº5
2. CORREA EN TUBO RECTANGULAR DE 3 x 1 1/2 CAL 18 INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA
3. PUERTA METÁLICA INCLUYE CHAPA
4. VENTANA METÁLICA TIPO REJA

FIN

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción
2.4 MAMPOSTERÍA Y ACABADOS	2.4.1	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA Nº5
ESTRUCTURA METÁLICA NAMENTACIÓN	2.5.1	CORREA EN TUBO RECTANGULAR DE 3 x 1 1/2 CAL 18 INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA
	2.5.3	PUERTA METÁLICA INCLUYE CHAPA
	2.5.4	VENTANA METÁLICA TIPO REJA

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	-
	-	1
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	24 de octubre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 64

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE TRABAJO DE LA BATERÍA SANITARIA - IE JOSÉ ANTONIO GALÁN VEREDA BAJA FLORIDA

1. CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTÓNICA GALVANIZADA
2. PAÑETE EN MORTERO 1:4 SOBRE MURO
3. INSTALACIÓN DE TANQUE AÉREO DE 1000 L

FIN

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción
2.4 MAMPOSTERÍA Y ACABADOS	2.4.2	PAÑETE EN MORTERO 1:4 SOBRE MURO
2.5 ESTRUCTURA METÁLICA ORNAMENTACIÓN	2.5.2	CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTÓNICA GALVANIZADA
2.6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	2.6.5	INSTALACIÓN DE TANQUE AÉREO DE 1000 L

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	-
	-	1
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	25 de octubre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 65

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE TRABAJO DE LA BATERÍA SANITARIA - IE JOSÉ ANTONIO GALÁN VEREDA BAJA FLORIDA

1. PISO CERÁMICA 60*60 CM O SIMILAR
2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO SOLAR AUTOMATIZADO

FIN

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción
2.4 MAMPOSTERÍA Y ACABADOS	2.4.3	PISO CERÁMICA 60*60 CM O SIMILAR
2.7 INSTALACIONES ELÉCTRICAS	2.7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO SOLAR AUTOMATIZADO

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	-
	-	1
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	26 de octubre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 66

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. DÍA DOMINICAL

FIN

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción
		NO LABORABLE

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
PULIDORA INDUSTRIAL	-	-
EQUIPO DE SOLDADURA	-	-
EQUIPO DE SEGURIDAD EN ALTURAS	-	-
EQUIPO OXICORTE	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	27 de octubre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 67

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE TRABAJO DE LA BATERÍA SANITARIA - IE JOSÉ ANTONIO GALÁN VEREDA BAJA FLORIDA

1. ENCHAPE MUROS
2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO PARA BATERÍA SANITARIA. INCLUYE ACCESORIOS
3. CONSTRUCCIÓN DE POZO SÉPTICO EN LADRILLO TOLETE. DIMENSIONES 1,50X1,50X2,00 M.

FIN

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción
2.4 MAMPOSTERÍA Y ACABADOS	2.4.4	ENCHAPE MUROS
2.6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	2.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO PARA BATERÍA SANITARIA. INCLUYE ACCESORIOS
	2.6.6	CONSTRUCCIÓN DE POZO SÉPTICO EN LADRILLO TOLETE. DIMENSIONES 1,50X1,50X2,00 M.

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	-
	-	1
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO... 2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	28 de octubre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 68

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE TRABAJO DE LA BATERÍA SANITARIA - IE JOSÉ ANTONIO GALÁN VEREDA BAJA FLORIDA

1. PINTURA VINILO TIPO 1 A TRES MANOS INTERIORES
2. CONSTRUCCIÓN DE POZO SÉPTICO EN LADRILLO TOLETE. DIMENSIONES 1,50X1,50X2,00 M.

FIN

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción
2.4 MAMPOSTERÍA Y ACABADOS	2.4.4	PINTURA VINILO TIPO 1 A TRES MANOS INTERIORES
2.6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	2.6.6	CONSTRUCCIÓN DE POZO SÉPTICO EN LADRILLO TOLETE. DIMENSIONES 1,50X1,50X2,00 M.

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	-
	-	1
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	29 de octubre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 69

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE TRABAJO DE LA BATERÍA SANITARIA - IE JOSÉ ANTONIO GALÁN VEREDA BAJA FLORIDA

1. PINTURA VINILO TIPO 1 A TRES MANOS INTERIORES
2. CONSTRUCCIÓN DE POZO SÉPTICO EN LADRILLO TOLETE. DIMENSIONES 1,50X1,50X2,00 M.

FIN

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción
2.4 MAMPOSTERÍA Y ACABADOS	2.4.4	PINTURA VINILO TIPO 1 A TRES MANOS INTERIORES
2.6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	2.6.6	CONSTRUCCIÓN DE POZO SÉPTICO EN LADRILLO TOLETE. DIMENSIONES 1,50X1,50X2,00 M.

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	-
	-	1
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	30 de octubre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 70

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE TRABAJO DE LA BATERÍA SANITARIA - IE JOSÉ ANTONIO GALÁN VEREDA BAJA FLORIDA

1. CONSTRUCCIÓN DE POZO SÉPTICO EN LADRILLO TOLETE. DIMENSIONES 1,50X1,50X2,00 M.

FIN

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción
2.6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	2.6.6	CONSTRUCCIÓN DE POZO SÉPTICO EN LADRILLO TOLETE. DIMENSIONES 1,50X1,50X2,00 M.

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	-
	-	1
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE...3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1169

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	31 de octubre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 71

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE TRABAJO DE LA BATERÍA SANITARIA - IE JOSÉ ANTONIO GALÁN VEREDA BAJA FLORIDA

1. CONSTRUCCIÓN DE POZO SÉPTICO EN LADRILLO TOLETE. DIMENSIONES 1,50X1,50X2,00 M.

FIN

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción
2.6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	2.6.6	CONSTRUCCIÓN DE POZO SÉPTICO EN LADRILLO TOLETE. DIMENSIONES 1,50X1,50X2,00 M.

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	-
	-	1
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1170

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	1 de noviembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 72

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE TRABAJO DE LA BATERÍA SANITARIA - IE JOSÉ ANTONIO GALÁN VEREDA BAJA FLORIDA

1. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR T. SALTARÍN

FIN

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción
2.8 OBRA ANTIGUA - AULA	2.8.2	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR T. SALTARÍN

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	-
	-	1
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	2 de noviembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 73

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. DÍA DOMINICAL

FIN

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción
		NO LABORABLE

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
PULIDORA INDUSTRIAL	-	-
EQUIPO DE SOLDADURA	-	-
EQUIPO DE SEGURIDAD EN ALTURAS	-	-
EQUIPO OXICORTE	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1172

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	3 de noviembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 74

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. DÍA FESTIVO

FIN

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción
		NO LABORABLE

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
PULIDORA INDUSTRIAL	-	-
EQUIPO DE SOLDADURA	-	-
EQUIPO DE SEGURIDAD EN ALTURAS	-	-
EQUIPO OXICORTE	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	4 de noviembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 75

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÀN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÙN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÙN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE TRABAJO DE LA BATERÍA SANITARIA - IE JOSÉ ANTONIO GALÁN VEREDA BAJA FLORIDA

1. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR T. SALTARÍN

FIN

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción
2.8 OBRA ANTIGUA - AULA	2.8.2	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR T. SALTARÍN

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	-
	-	1
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	5 de noviembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 76

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÀN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE TRABAJO DE LA BATERÍA SANITARIA - IE JOSÉ ANTONIO GALÁN VEREDA BAJA FLORIDA

1. LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.07 M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA

2. SE REALIZA COMITÉ No. 01 DONDE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EXPONE PRESUPUESTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS AULAS ANTIGUAS DE LA IE AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y LA CONSTRUCCIÓN BATERÍA SANITARIA - IE JOSÉ ANTONIO GALÁN VEREDA BAJA FLORIDA POR UN VALOR DE $40.988.140,42, DONDE EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN EXPONE QUE CUENTA CON LOS RECURSOS Y SE COMPROMETE A GESTIONAR EL RESPECTIVO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, EL ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL R/L DE JSR BUILDING ACEPTA LA ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 320 DE 2025 Y SOLICITA 1 MES DE ADICIÓN PARA REALIZAR LA OBRA Y SE FIRMA EL ACTA DE ADICIÓN AL CONTRATO PRINCIPAL

FIN

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción
2.8 OBRA ANTIGUA - AULA	2.8.2	LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.07 M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	-
	-	1
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	6 de noviembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 77

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE TRABAJO DE LA BATERÍA SANITARIA - IE JOSÉ ANTONIO GALÁN VEREDA BAJA FLORIDA

1. LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.07 M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA

FIN

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción
2.8 OBRA ANTIGUA - AULA	2.8.2	LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.07 M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	-
	-	1
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO... 2	DEFICIENTE... 3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	7 de noviembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 78

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE TRABAJO DE LA BATERÍA SANITARIA - IE JOSÉ ANTONIO GALÁN VEREDA BAJA FLORIDA

1. LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.07 M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA

FIN

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción
2.8 OBRA ANTIGUA - AULA	2.8.2	LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.07 M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	-
	-	1
	-	-
EXCELENTE...1	BUENO...2	DEFICIENTE...3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1177

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	8 de noviembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 79

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE TRABAJO DE LA BATERÍA SANITARIA - IE JOSÉ ANTONIO GALÁN VEREDA BAJA FLORIDA

1. LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.07 M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA

FIN

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción
2.8 OBRA ANTIGUA - AULA	2.8.2	LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.07 M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	-
	-	1
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE...3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1178

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	9 de noviembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 80

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. DÍA DOMINICAL

FIN

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción
		NO LABORABLE

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
PULIDORA INDUSTRIAL	-	-
EQUIPO DE SOLDADURA	-	-
EQUIPO DE SEGURIDAD EN ALTURAS	-	-
EQUIPO OXICORTE	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	10 de noviembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 81

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE TRABAJO DE LA BATERÍA SANITARIA - IE JOSÉ ANTONIO GALÁN VEREDA BAJA FLORIDA

1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA

FIN

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción
2.8 OBRA ANTIGUA - AULA	2.8.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	-
	-	1
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO...2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	11 de noviembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 82

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE TRABAJO DE LA BATERÍA SANITARIA - IE JOSÉ ANTONIO GALÁN VEREDA BAJA FLORIDA

1. BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 4"

FIN

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción
2.8 OBRA ANTIGUA - AULA	2.8.4	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 4"

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	-
	-	1
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	12 de noviembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 83

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. SE DA INICIO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

FRENTE DE TRABAJO DE LAS AULAS ANTIGUAS - IE AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA

2. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR T. SALTARÍN

FIN

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción
3 MITIGACIÓN AMBIENTAL	3.1.1	MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
1.1 PRELIMINARES	1.1.1	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR T. SALTARÍN

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	-
	-	1
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1162

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	13 de noviembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 84

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

FRENTE DE TRABAJO DE LAS AULAS ANTIGUAS - IE AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA

2. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR T. SALTARÍN

FIN

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción
3 MITIGACIÓN AMBIENTAL	3.1.1	MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
1.1 PRELIMINARES	1.1.1	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR T. SALTARÍN

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	-
	-	1
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1183

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	14 de noviembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 85

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

FRENTE DE TRABAJO DE LAS AULAS ANTIGUAS - IE AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA

2. LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.07 M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA

FIN

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción
3 MITIGACIÓN AMBIENTAL	3.1.1	MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
1.2 MAMPOSTERÍA Y ACABADOS	1.2.1	LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.07 M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	-
	-	1
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	15 de noviembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 86

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

FRENTE DE TRABAJO DE LAS AULAS ANTIGUAS - IE AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA

2, LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.07 M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA

FIN

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción
3 MITIGACIÓN AMBIENTAL	3.1.1	MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
1.2 MAMPOSTERÍA Y ACABADOS	1.2.1	LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.07 M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	-
	-	1
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1185

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	16 de noviembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 87

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias intensas		

Actividades Desarrolladas

1. DÍA DOMINICAL

FIN

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción
		NO LABORABLE

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
PULIDORA INDUSTRIAL	-	-
EQUIPO DE SOLDADURA	-	-
EQUIPO DE SEGURIDAD EN ALTURAS	-	-
EQUIPO OXICORTE	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1186

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	17 de noviembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 88

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÈ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. DÍA FESTIVO

FIN

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción
		NO LABORABLE

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
PULIDORA INDUSTRIAL	-	-
EQUIPO DE SOLDADURA	-	-
EQUIPO DE SEGURIDAD EN ALTURAS	-	-
EQUIPO OXICORTE	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	18 de noviembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 89

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

FRENTE DE TRABAJO DE LAS AULAS ANTIGUAS - IE AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA

2. PINTURA VINILO TIPO 1 A DOS MANOS INTERIORES

FIN

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción
3 MITIGACIÓN AMBIENTAL	3.1.1	MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
1.2 MAMPOSTERÍA Y ACABADOS	1.2.2	PINTURA VINILO TIPO 1 A DOS MANOS INTERIORES

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	-
	-	1
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1188

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	19 de noviembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 90

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

FRENTE DE TRABAJO DE LAS AULAS ANTIGUAS - IE AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA

2. PINTURA VINILO TIPO 1 A DOS MANOS INTERIORES

FIN

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción
3 MITIGACIÓN AMBIENTAL	3.1.1	MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
1.2 MAMPOSTERÍA Y ACABADOS	1.2.2	PINTURA VINILO TIPO 1 A DOS MANOS INTERIORES

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	-
	-	1
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

7139

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	20 de noviembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 91

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

FRENTE DE TRABAJO DE LAS AULAS ANTIGUAS - IE AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA

2. PINTURA VINILO TIPO 1 A DOS MANOS INTERIORES

FIN

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción
3 MITIGACIÓN AMBIENTAL	3.1.1	MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
1.2 MAMPOSTERÍA Y ACABADOS	1.2.2	PINTURA VINILO TIPO 1 A DOS MANOS INTERIORES

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	-
	-	1
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1190

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	21 de noviembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 92

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

2. SE FIRMA EL OTRO SI No. 001 ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 320 DE 2025

FRENTE DE TRABAJO DE LAS AULAS ANTIGUAS - IE AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA

2. PINTURA VINILO TIPO 1 A DOS MANOS INTERIORES

FIN

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción
1.2 MAMPOSTERÍA Y ACABADOS	1.2.2	PINTURA VINILO TIPO 1 A DOS MANOS INTERIORES

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	-
	-	1
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1192

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	22 de noviembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 93

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÀN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE TRABAJO DE LAS AULAS ANTIGUAS - IE AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA

1. PINTURA VINILO TIPO 1 A DOS MANOS INTERIORES

FIN

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción
1.2 MAMPOSTERÍA Y ACABADOS	1.2.2	PINTURA VINILO TIPO 1 A DOS MANOS INTERIORES

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	-
	-	1
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1163

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	23 de noviembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 94

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. DÍA DOMINICAL

FIN

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción
		NO LABORABLE

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1164

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	24 de noviembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 95

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÈ ANTONIO GALÀN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE OBRA BATERÍA SANITARIA - IE JOSÉ ANTONIO GALÁN VEREDA BAJA FLORIDA

1. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL EDIFICACIONES

FIN

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción
2.1 PRELIMINARES	2.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL EDIFICACIONES

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	-
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1195

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	25 de noviembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 96

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE OBRA BATERÍA SANITARIA - IE JOSÉ ANTONIO GALÁN VEREDA BAJA FLORIDA

1. EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD
2. CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO E = 0,05 M

FIN

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción
2.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA	2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD
2.3 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO	2.3.2	CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO E = 0,05 M

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	-
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	26 de noviembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 97

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE OBRA BATERÍA SANITARIA - IE JOSÉ ANTONIO GALÁN VEREDA BAJA FLORIDA

1. VIGA DE CIMENTACIÓN 0.20 x 0.20 m EN CONCRETO DE 3000 PSI
2. VIGA DE CONFINAMIENTO 0.12 x 0.15 m EN CONCRETO 3000 PSI
3,ACERO DE REFUERZO Fy : 60000 PSI

FIN

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción
2.3 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO	2.3.3	VIGA DE CIMENTACIÓN 0.20 x 0.20 m EN CONCRETO DE 3000 PSI
	2.3.4	VIGA DE CONFINAMIENTO 0.12 x 0.15 m EN CONCRETO 3000 PSI
	2.3.6	ACERO DE REFUERZO Fy : 60000 PSI

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	-
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	27 de noviembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 98

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE OBRA BATERÍA SANITARIA - IE JOSÉ ANTONIO GALÁN VEREDA BAJA FLORIDA

1. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR T. SALTARÍN
2. COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI 0.12 X 0.20 m
3. ACERO DE REFUERZO Fy : 60000 PSI

FIN

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción
2.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA	2.2.2	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR T. SALTARÍN
2.3 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO	2.3.1	COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI 0.12 X 0.20 m
	2.3.6	ACERO DE REFUERZO Fy : 60000 PSI

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	-
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1198

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	28 de noviembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 99

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE OBRA BATERÍA SANITARIA - IE JOSÉ ANTONIO GALÁN VEREDA BAJA FLORIDA

1. MURO EN BLOQUE DE ARCILLA Nº5

FIN

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción
2.4 MAMPOSTERÍA Y ACABADOS	2.4.1	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA Nº5

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	-
	-	
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	29 de noviembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 100

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE OBRA BATERÍA SANITARIA - IE JOSÉ ANTONIO GALÁN VEREDA BAJA FLORIDA

1. MURO EN BLOQUE DE ARCILLA Nº5
2. VIGA AÉREA 0.12 x 0.20 m CONCRETO DE 3000 PSI
3. ACERO DE REFUERZO Fy : 60000 PSI
4. PUNTO HIDRÁULICO PVC-P 1/2"
5. PUNTO SANITARIO PVC 2"
6. PUNTO SANITARIO PVC 4"
7. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 4" PVC-S
8. TUBERÍA PVC-SANITARIA 2"
9. RED DE DISTRIBUCIÓN PVC-P 1/2"

FIN

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción
[illegible]AMPOSTERÍA Y [illegible]ADOS	2.4.1	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA Nº5
2.3 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO	2.3.5	VIGA AÉREA 0.12 x 0.20 m CONCRETO DE 3000 PSI
	2.3.6	ACERO DE REFUERZO Fy : 60000 PSI
2.6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	2.6.1	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P 1/2"
	2.6.2	PUNTO SANITARIO PVC 2"
	2.6.3	PUNTO SANITARIO PVC 4"
	2.6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 4" PVC-S
	2.6.7	TUBERÍA PVC-SANITARIA 2"
	2.6.8	RED DE DISTRIBUCIÓN PVC-P 1/2"

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	-
	-	
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	30 de noviembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 101

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	2
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. DÍA DOMINICAL

FIN

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción
		NO LABORABLE

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
PULIDORA INDUSTRIAL	-	-
EQUIPO DE SOLDADURA	-	-
EQUIPO DE SEGURIDAD EN ALTURAS	-	-
EQUIPO OXICORTE	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	1 de diciembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 102

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE OBRA BATERÍA SANITARIA - IE JOSÉ ANTONIO GALÁN VEREDA BAJA FLORIDA

1. LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.07 M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA
2. PAÑETE EN MORTERO 1:4 SOBRE MURO
3. PUERTA METÁLICA INCLUYE CHAPA
4. VENTANA METÁLICA TIPO REJA

FIN

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción
2.3 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO	2.3.7	LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.07 M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA
2.4 MAMPOSTERÍA Y ACABADOS	2.4.2	PAÑETE EN MORTERO 1:4 SOBRE MURO
2.5 ESTRUCTURA METÁLICA ORNAMENTACIÓN	2.5.3	PUERTA METÁLICA INCLUYE CHAPA
	2.5.4	VENTANA METÁLICA TIPO REJA

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	-
EXCELENTE....1	BUENO... 2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1202

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	2 de diciembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 103

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE OBRA BATERÍA SANITARIA - IE JOSÉ ANTONIO GALÁN VEREDA BAJA FLORIDA

1. PAÑETE EN MORTERO 1:4 SOBRE MURO
2. PISO CERÁMICA 60*60 CM O SIMILAR
3. CORREA EN TUBO RECTANGULAR DE 3 x 1 1/2 CAL 18 INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA
4. CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTÓNICA GALVANIZADA

FIN

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción
2.4 MAMPOSTERÍA Y ACABADOS	2.4.2	PAÑETE EN MORTERO 1:4 SOBRE MURO
	2.4.3	PISO CERÁMICA 60*60 CM O SIMILAR
2.5 ESTRUCTURA METÁLICA Y ORNAMENTACIÓN	2.5.1	CORREA EN TUBO RECTANGULAR DE 3 x 1 1/2 CAL 18 INCLUYE ANTICORROS
	2.5.2	CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTÓNICA GALVANIZADA

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	3 de diciembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 104

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE OBRA BATERÍA SANITARIA - IE JOSÉ ANTONIO GALÁN VEREDA BAJA FLORIDA

1. PAÑETE EN MORTERO 1:4 SOBRE MURO
2. PISO CERÁMICA 60*60 CM O SIMILAR

FIN

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción
2.4 MAMPOSTERÍA Y ACABADOS	2.4.2	ENCHAPE MUROS
	2.4.3	PISO CERÁMICA 60*60 CM O SIMILAR

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	4 de diciembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 105

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE OBRA BATERÍA SANITARIA - IE JOSÉ ANTONIO GALÁN VEREDA BAJA FLORIDA

1. PINTURA VINILO TIPO 1 A TRES MANOS INTERIORES

FIN

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción
2.4 MAMPOSTERÍA Y ACABADOS	2.4.5	PINTURA VINILO TIPO 1 A TRES MANOS INTERIORES

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	5 de diciembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 106

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE OBRA BATERÍA SANITARIA - IE JOSÉ ANTONIO GALÁN VEREDA BAJA FLORIDA

1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO PARA BATERÍA SANITARIA. INCLUYE ACCESORIOS

FIN

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción
2.6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	2.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO PARA BATERÍA SANITARIA. INCLUYE ACCESORIOS

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1266

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	6 de diciembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 107

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÀN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE OBRA BATERÍA SANITARIA - IE JOSÉ ANTONIO GALÁN VEREDA BAJA FLORIDA

1. CONSTRUCCIÓN DE POZO SÉPTICO EN LADRILLO TOLETE. DIMENSIONES 1,50X1,50X2,00 M.

FIN

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción
2.6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	2.6.5	CONSTRUCCIÓN DE POZO SÉPTICO EN LADRILLO TOLETE. DIMENSIONES 1,50X1,50X2,00 M.

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1207

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	7 de diciembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 108

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	2
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. DÍA DOMINICAL

FIN

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción
		NO LABORABLE

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
PULIDORA INDUSTRIAL	-	-
EQUIPO DE SOLDADURA	-	-
EQUIPO DE SEGURIDAD EN ALTURAS	-	-
EQUIPO OXICORTE	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	8 de diciembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 109

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	2
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

1. DÍA FESTIVO

FIN

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción
		NO LABORABLE

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
PULIDORA INDUSTRIAL	-	-
EQUIPO DE SOLDADURA	-	-
EQUIPO DE SEGURIDAD EN ALTURAS	-	-
EQUIPO OXICORTE	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1209

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	9 de diciembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 110

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE OBRA BATERÍA SANITARIA - IE JOSÉ ANTONIO GALÁN VEREDA BAJA FLORIDA

1. CONSTRUCCIÓN DE POZO SÉPTICO EN LADRILLO TOLETE. DIMENSIONES 1,50X1,50X2,00 M.

FIN

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción
2.6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	2.6.5	CONSTRUCCIÓN DE POZO SÉPTICO EN LADRILLO TOLETE. DIMENSIONES 1,50X1,50X2,00 M.

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	10 de diciembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 111

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE OBRA BATERÍA SANITARIA - IE JOSÉ ANTONIO GALÁN VEREDA BAJA FLORIDA

1. CONSTRUCCIÓN DE POZO SÉPTICO EN LADRILLO TOLETE. DIMENSIONES 1,50X1,50X2,00 M.

FIN

Resumen de las Actividades

Capítulo	Ítem	Descripción
2.6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	2.6.5	CONSTRUCCIÓN DE POZO SÉPTICO EN LADRILLO TOLETE. DIMENSIONES 1,50X1,50X2,00 M.

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	11 de diciembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 112

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

FRENTE DE OBRA BATERÍA SANITARIA - IE JOSÉ ANTONIO GALÁN VEREDA BAJA FLORIDA

1. CONSTRUCCIÓN DE POZO SÉPTICO EN LADRILLO TOLETE. DIMENSIONES 1,50X1,50X2,00 M.

FIN

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción
2.6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	2.6.5	CONSTRUCCIÓN DE POZO SÉPTICO EN LADRILLO TOLETE. DIMENSIONES 1,50X1,50X2,00 M.

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
HERRAMIENTA MENOR	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	12 de diciembre de 2025	**Localización: Zona Rural del Municipio de Tame - Arauca**	**Hoja No.** 113

OBJETO DE CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**		
CONTRATO DE OBRA No.	320 DE 2025	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:**	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($ 174.983.737,63)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	**VALOR DE ADICIONAL:**	CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($40,988,140.42)
NIT:	800.102.801-3	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	TRES (03) MESES
CONTRATISTA:	JSR BUILLDING S.A.S., R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	**FECHA ACTA DE INICIO:**	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIÚN (21) DE NOVIEMBRE DE 2025
NIT:	901.582.823-1	**PRORROGA:**	UN (01) MES
SUPERVISORA:	Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	**INICIO DE PRORROGA:**	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA:	VEINTIÚN (21) DE DICIEMBRE DE 2025
		FIN DE PRORROGA ANTICIPADA	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Director de Obra		Ayu. Soldador	
Residente de Obra	1	Maestro	
Residente Ambiental - HSEQ		Oficial	1
Inspector de obra		Ayudante	3
Soldador		Visitante	

EPPs

Descripción	Uso
Casco	
Gafas	
Guantes	
Uniforme	
Botas	

Estado del Clima

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvias Intensas		

Actividades Desarrolladas

SE DA POR TERMINADAS LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 320 DE 2025

SE FIRMA ACTA DE RECIBO FINAL

FIN

Resumen de las Actividades

Capitulo	Ítem	Descripción

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
	-	-
EXCELENTE....1	BUENO....2	DEFICIENTE....3

ING. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
R/L JSR BUILLDING S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 320 DE 2025

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

1213

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

PERIODO: DEL 22 DE AGOSTO AL 12 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATO DE OBRA No 320 DE 2025

CONTRATISTA: JSR BUILLDING S.A.S. NIT. 901.582.823-1 R/L JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.018.423.557 EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C.


OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE LA GALAXIA Y UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO GALÁN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

SUPERVISORA: JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TAME – ARAUCA

JRS BUILDING SAS
NIT 901 582 823 - 1
318 814 3112
Carrera 23 No. 15-23
Barrio el Cielo, Tame

1214

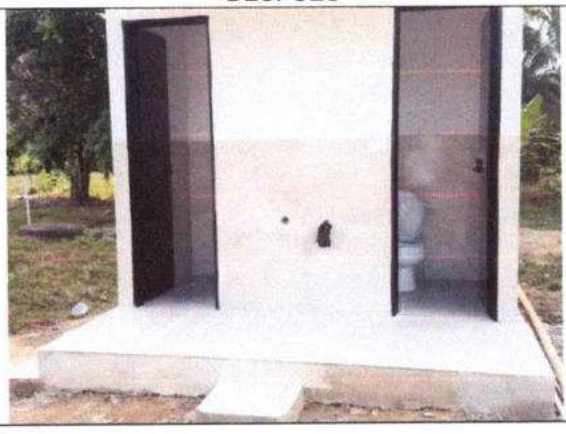ANTES	DESPUÉS
	
ANTES	**DESPUÉS**
	
ANTES	**DESPUÉS**
	

318 814 3112
Carrera 23 No. 15-23
Barrio el Cielo, Tame

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

1. REALIZAR PRELIMINARES

1.1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO



1.1.2 EXCAVACIÓN MANUAL



318 814 3112
Carrera 23 No. 15-23
Barrio el Cielo, Tame

1216

1.1.3 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL COMÚN



1.2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS

1.2.1 CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO E = 0,05 M



318 814 3112
Carrera 23 No. 15-23
Barrio el Cielo, Tame

1.2.2 CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS DE 60*60*30 CM



1.2.3 PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 30*30 CM




12 18


1.2.4 VIGA DE CIMENTACIÓN 20*25 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI



1.2.5 COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI 0.20 x 0.20 m.

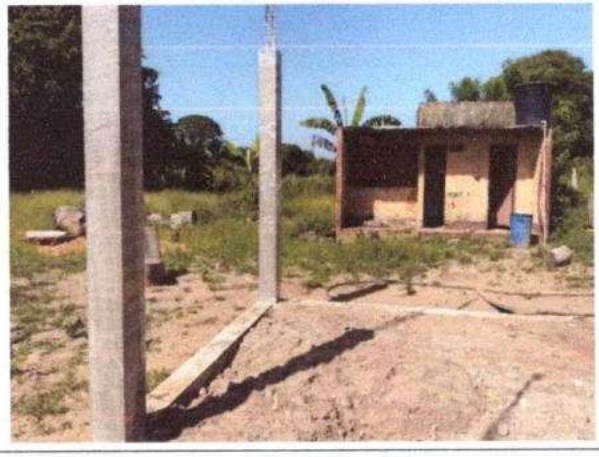

1.2.6 COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI 0.13 X 0.20 m

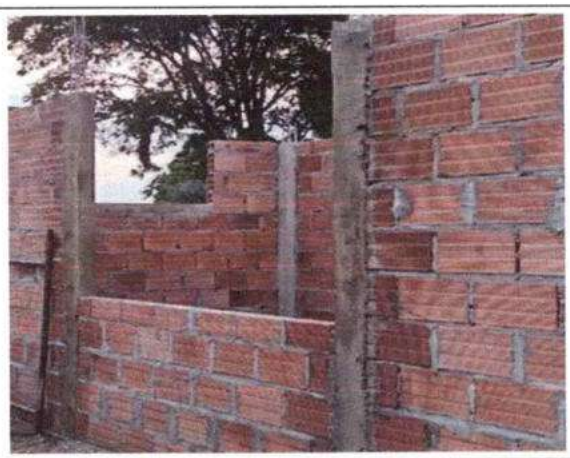

1219

1.2.7 MESÓN EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI INCLUYE ENCHAPE



1.2.8 VIGA AÉREA 0.20 m x 0.25 m CONCRETO DE 3000 PSI



1.2.9 VIGA CINTA 0.13x0.20 EN CONCRETO DE 3000 PSI



1.2.10 ACERO DE REFUERZO Fy: 60000 PSI

318 814 3112
Carrera 23 No. 15-23
Barrio el Cielo, Tame

1220



1.3 MAMPOSTERÍA Y ACABADOS

1.3.1 LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.07 M



1.3.2 MURO EN BLOQUE DE ARCILLA Nº5



1.3.3 PAÑETE EN MORTERO 1:4 SOBRE MURO

1227



1.3.4 PINTURA VINILO TIPO 1 A DOS MANOS INTERIORES



1.3.5 PISO CERÁMICA 50*50 CM O SIMILAR



1.3.6 GUARDA ESCOBA EN CERÁMICA

1222



1.4 ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA

1.4.1 CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTÓNICA GALVANIZADA



1.4.2 CABALLETE EN LAMINA GALVANIZADA



1.4.3 CORREA EN TUBO RECTANGULAR DE 3x1 1/2 MM CAL 18 INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA

1223



1.4.4 VENTANA METÁLICA DE CORREDERA INCLUYE REJA



1.4.5 PUERTA METÁLICA INCLUYE CHAPA




1.4.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4 mm

1224



1.4.7 VENTANA METÁLICA TIPO REJA

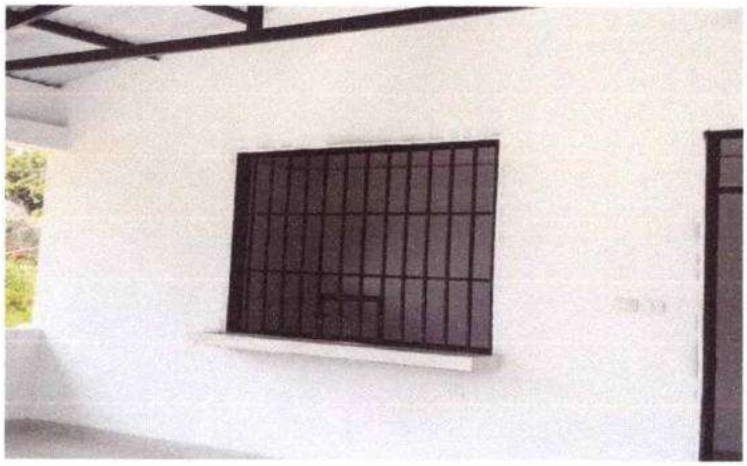

1.4.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA



1.5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

1225

1.5.1 ACOMETIDA ELÉCTRICA MONOFÁSICA



1.5.2 TABLERO DE 12 CIRCUITOS



1.5.3 ACOMETIDA 2#8+1#10T THHN 600V



1.5.4 ACOMETIDA 2#12+1#12T THHN 600V

1226



1.5.5 PUESTA A TIERRA GENERAL DE TABLERO




1.5.6 LAMPARA LED 36 W DE SOBREPONER




1.5.7 PUNTO ELÉCTRICO (TOMACORRIENTE 110 V)

1227

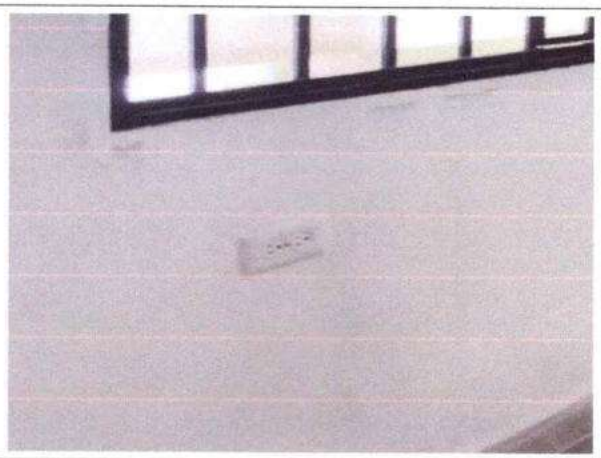

1.5.8 PUNTO ELÉCTRICO INTERRUPTOR

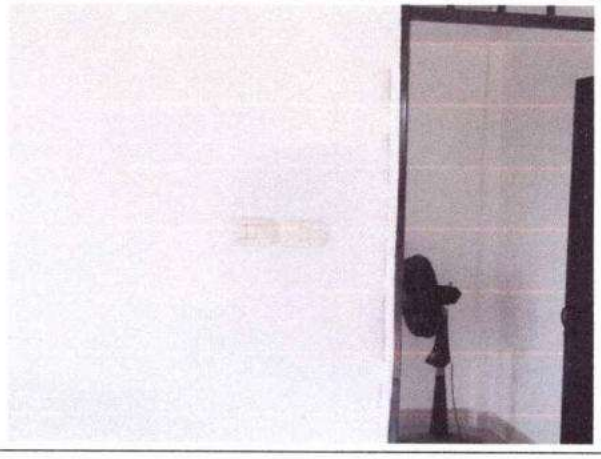

1.6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

1.6.1 PUNTO HIDRÁULICO PVC-P 1/2"



1.6.2 PUNTO SANITARIO PVC 2"


1228



1.6.3 PUNTO SANITARIO PVC 3"



1.6.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE 3"

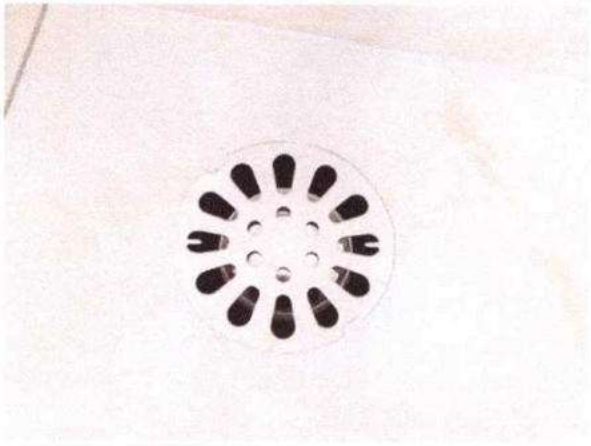

1.6.5 SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 4" PVC-S

1229



1.6.6 SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 3" PVC-S



1.6.7 SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2" PVC-S



1.6.8 RED DE DISTRIBUCIÓN PVC-P 1/2"

318 814 3112
Carrera 23 No. 15-23
Barrio el Cielo, Tame

7230



1.6.9 BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 4"



318 814 3112
Carrera 23 No. 15-23
Barrio el Cielo, Tame

1237

2. BATERÍA SANITARIA – IE JOSÉ ANTONIO GALÁN VEREDA BAJA FLORIDA

2.1. PRELIMINARES

2.1.1. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO



2.2. MOVIMIENTOS DE TIERRA

2.2.1. EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN



1232

2.2.2. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL COMÚN



2.3. CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO

2.3.1. COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI 0.12 X 0.20 m



2.3.2. SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI E= 0.05 M



2.3.3. VIGA DE CIMENTACIÓN 0.20 x 0.20 m EN CONCRETO DE 3000 PSI

1233



2.3.4. VIGA DE CONFINAMIENTO 0.12 x 0.15 m EN CONCRETO 3000 PSI



2.3.5. VIGA AÉREA 0.12 x 0.20 m CONCRETO DE 3000 PSI



2.3.6. ACERO DE REFUERZO Fy: 60000 PSI

1234




2.3.7. LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.07 M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA



2.4. MAMPOSTERÍA Y ACABADOS

2.4.1. MURO EN BLOQUE DE ARCILLA Nº5

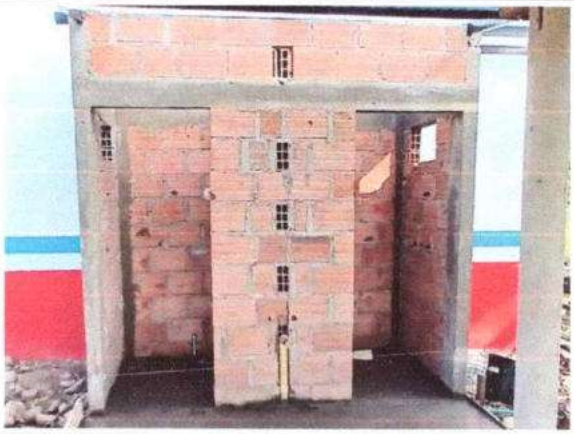

2.4.2. PAÑETE EN MORTERO 1:4 SOBRE MURO

1235



2.4.3. PISO CERÁMICA 50*50 CM O SIMILAR




2.4.4. ENCHAPE MUROS



2.4.5. PINTURA VINILO TIPO 1 A TRES MANOS INTERIORES

123C

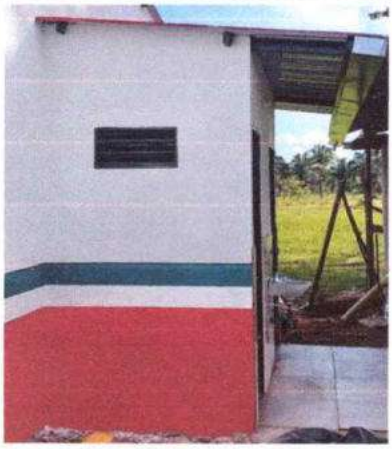

2.5. ESTRUCTURA METÁLICA Y ORNAMENTACIÓN

2.5.1. CORREA EN TUBO RECTANGULAR DE 3 x 1 1/2 CAL 18 INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA



2.5.2. CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTÓNICA GALVANIZADA



2.5.3. PUERTA METÁLICA INCLUYE CHAPA



2.5.4. VENTANA METÁLICA TIPO REJA



2.6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

2.6.1. PUNTO HIDRÁULICO PVC-P 1/2"





2.6.2. PUNTO SANITARIO PVC 2"

1238



2.6.3. SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 4" PVC-S



2.6.4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO PARA BATERÍA SANITARIA. INCLUYE ACCESORIOS



2.6.5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE AÉREO DE 1000 L. INCLUYE ZAPATA, PEDESTAL, COLUMNA, PLACA AÉREA EN CONCRETO DE 3000 PSI Y TANQUE DE 1000 L CON ACCESORIOS DE CONEXIÓN
