PREACTA DE RECIBO DE OBRA N° 01 Y FINAL

REPOSICIÓN DEL TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 4 ENTRE VÍA PANAMERICANA Y CARRERA 8 DEL BARRIO LIMONAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PATÍA DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Empatia ESP ¡LA Empresa de Todos!

EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL EL BORDO PATIA, EMPATIA E.S.P
NIT.: 800.219.279-1

CONTRATANTE:	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL EL BORDO PATIA, EMPATIA E.S.P
CONTRATO:	012 2025
CONTRATISTA:	CONSTRUCK SAS

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	9	5	2025

ITEM:	DESCRIPCION	DIMENSIONES Cantidad	long t	Ancho	Altura	Subtotal
1	**PRELIMINARES**					
1,1	**LOCALIZACION-REPLANTEO ALCANTARILLADO**					
TRAMOS			90,00			90,00
						-
					Cantidad [ML]:	**90,00**
1,2	**SEÑALIZACIÓN CON CINTA BOMBONES Y MALETA**					
SEÑALIZACION		1				1,00
						-
					Cantidad [GBL]:	**1,00**
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**					
2,1	**CORTADORA DE PAVIMENTO A 10CM DISCO 10"**					
CORTE DE PAV-DOMICILIARIAS Y COLECTOR			178,00	-	-	178,00
			-	-	-	-
						-
					Cantidad [ML] :	**178,00**
2,2	**DEMOLICION PAVIMENTO CONCRETO E=20CM**					
COLECTOR			62,00	0,70		43,69
DOMICILIARIAS			89,00	0,39		34,71
					Cantidad [M3] :	**78,40**
2,3	**EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN EN SECO**					
Tramo Central			62,00	0,70	1,25	54,45
						-
					Cantidad [M3] :	**54,45**
2,4	**EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN EN SECO**					
Domiciliaria			89,00	0,39	1,25	43,26
aras de inspeccion			1,70	1,70	2,00	11,56
eccioon para domiciliarias			1,00	1,00	1,10	8,80
on excavacion mecanica			62,00	0,70	0,22	9,39
					Cantidad [M3] :	**73,00**
2,5	**COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARREO**					
Tramo Central			62,00	0,70	0,10	4,23
Domiciliaria			89,00	0,39	0,10	3,34
					Cantidad [M3] :	**7,57**
2,6	**RELLENO IMPORTADO MATERIAL COMUN INCLUYE ACARREO Y COMPACTACIÓN**					
Tramo Central		73,00				95,57
						-
Domiciliaria		54,45			-	71,29
el coeficiente de expansion						
					Cantidad [M3] :	**166,86**
2,7	**RETIRO MAT. SOBRANTE MANUAL-VOLQUETA <=10KM.**					
material excavado		166,86				166,86
emolido sobrante de obra		39,99				39,99
					Cantidad [M3] :	**206,85**
3	**TUBERIAS Y ACCESORIOS**					
3,1	**E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ESTRUCTURAL PARA ALCANTARILLADO UNION MECANICA DE DOBLE PARED E**					
Tramo Centro			62,00			62,00
						-
					Cantidad [ML] :	**62,00**
3,2	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ESTRUCTURAL PARA ALCANTARILLADO UNION MECANICA DE DOBLE PARED EN PVC Ø=6".**					

FOTOS










PREACTA DE RECIBO DE OBRA N° 01 Y FINAL

REPOSICIÓN DEL TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 4 ENTRE VÍA PANAMERICANA Y CARRERA 8 DEL BARRIO LIMONAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PATÍA DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Empatia ESP ¡LA Empresa de Todos!

EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL EL BORDO PATIA, EMPATIA E.S.P
NIT.: 800.219.279-1

CONTRATANTE:	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL EL BORDO PATIA, EMPATIA E.S.P
CONTRATO:	012 2025
CONTRATISTA:	CONSTRUCK SAS

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	9	**5**	**2025**

Tramo Centro		89,00			89,00
					-
				Cantidad [ML] :	**89,00**
3,2	**SUMINISTRO E INSTALACION KIT SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 10"**				
Tramo Centro		7,00			7,00
					-
				Cantidad [und] :	**7,00**
3,3	**REPARACIONES VARIAS (REDES TUBERÍA HIDROSANITARIA Y/O ACCESORIOS)**				
Conexión de domiciliarias		4,00			4,00
					-
				Cantidad [UND] :	**4,00**
4	**CONCRETOS**				
4,1	**CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS (INCLUYE TAPA Y CAÑUELA)**				
global	2				2,00
					-
				Cantidad [und]:	**2,00**
4,2	**CAJAS DE INSPECCION EN CONCRETO 0.80m X 0.80m X 1,0m INTERNOS (Incluye refuerzo en parrilla 3/8" @20cm)**				
cajas domiciliarias	7				8,00
					-
				Cantidad [und] :	**8,00**
4,3	**LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO 21MPA E= 0.20 M PARA RESANE DE VÍA**				
reparacion pavimento		62,00	0,71		43,79
		89,00	0,39		34,71
				Cantidad [M2] :	**78,50**











OBSERVACIONES:

Anderson Ledesma.

RL ANDERSON FABIAN LEDESMA
CONSTRUCK SAS
CONTRATISTA

INFORME FINAL DE OBRA DE ALCANTARILLADO EN EL BORDO CAUCA

CONTRATO DE OBRA CTO 012 2025

REPOSICIÓN DEL TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 4 ENTRE VÍA PANAMERICANA Y CARRERA 8 DEL BARRIO LIMONAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PATÍA DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE PATIA (EL BORDO) CAUCA
MAYO 09 DE 2025

Praderas de la Hacienda Mzna 10 Casa 113
El Bordo (Patía) Cauca
construck.sasing@gmail.com

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO 2
INTRODUCCIÓN 3
1.1. Localización 3
2. DATOS GENERALES 4
3. DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE OBRA 4
4. ACTIVIDADES DE OBRA 5
4.1. AVANCE DE OBRA 5
4.2. seguimiento al avance financiero 6
5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO 7
5.1. Equipo implementado en el desarrollo del presente contrato 7
5.2. Plan de seguridad y salud en el trabajo: 7
6. PROPUESTA ECONÓMICA 7
7. RESPONSABLES EN OBRA 9
8. VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 9
9. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO 9
10. REGISTRO FOTOGRÁFICO 9
OBRA DE ALCANTARILLADO LIMONAR 9
11. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 16

INTRODUCCIÓN

En este informa se presenta el inicio, desarrollo y culminación del proyecto de alcantarillado en el municipio del bordo cauca teniendo en cuenta los aspectos técnicos y constructivos que el contrato requiere, de igual forma se presenta de forma ilustrativa y descriptiva todas las labores que se desarrollaron para cumplir cabalmente con lo requerido en el mismo,

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1. Localización

El proyecto se encuentra ubicado en el Municipio de Patía (El bordo), en el sur del departamento del Cauca, tal como se observa en la siguiente ilustración:

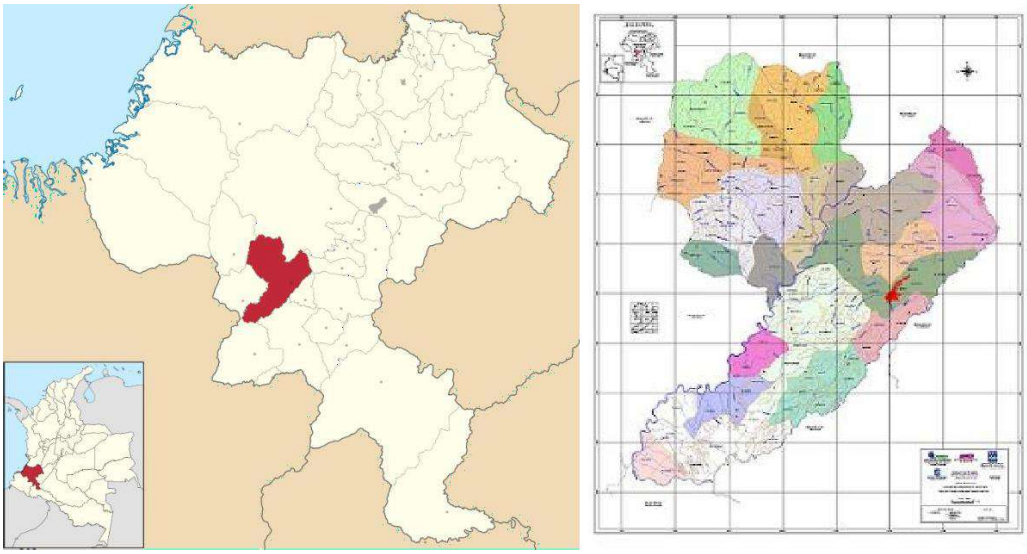


Ilustración 1 Ubicación geográfica del municipio.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%ADa

Las siguientes son algunas características relevantes del municipio:

Límites del municipio:

Norte con el Tambo
Nororiente con la Sierra
Occidente con Argelia y Balboa
Oriente con Sucre
Sur Mercaderes y Bolívar
Extensión total: 641.009 km2.
Altitud 1167 metros sobre el nivel del mar.
Una población de 36205 habitantes, 13.444 en zona urbana y 22.761 en la zona rural.
Distancia de referencia: 82 km a Popayán, capital del Departamento del Cauca.

2. DATOS GENERALES

FECHA DE ENTREGA:	MAYO 13 DEL 2025	**INFORME No.**	**1 Y FINAL**

PERIODO No.	1	**DEL**:	**26/04/2025**	**AL**:	**11/05/2025**

OBJETO DEL CONTRATO:	REPOSICIÓN DEL TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 4 ENTRE VÍA PANAMERICANA Y CARRERA 8 DEL BARRIO LIMONAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PATÍA DEPARTAMENTO DEL CAUCA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE PATIA

3. DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE OBRA

CONTRATO DE:	OBRA
CONTRATO No.:	CTO 012 2025
CONTRATISTA:	CONSTRUCK S.A.S (NIT 901.838.789-8)
R.L. CONTRATISTA DE OBRA:	ANDERSON FABIAN LEDESMA RENGIFO (CC 1002840708)
INTERVENTORIA:	EMPATIA SAS
R.L. INTERVENTORIA:	EMPATIA SAS
PLAZO INICIAL:	QUINCE DIAS (15)
FECHA DE INICIO:	26/04/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	MAYO 11 DEL 2025
PLAZO TRANSCURRIDO:	Quince (15) Días
FECHA DE SUSPENSION	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACION	MAYO 11 DEL 2025
VALOR INICIAL:	$ 85’248.507
VALOR FINAL	$ 85’248.507

4. ACTIVIDADES DE OBRA

Durante el periodo en el cual se enmarca el presente informe, se da a conocer las actividades ejecutadas por pare del contratista, para el contrato CTO 012 2025 "REPOSICIÓN DEL TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 4 ENTRE VÍA PANAMERICANA Y CARRERA 8 DEL BARRIO LIMONAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PATÍA DEPARTAMENTO DEL CAUCA." de la siguiente manera: se realiza la intervención en el frente de trabajo el cual se desarrolla en el barrio limonar. Inicialmente se desarrolló procesos de localización y replanteo para la identificación de reposición y/o de instalación de tubería para alcantarillado según sea el caso posteriormente y dependiendo del tránsito peatonal o del flujo vehicular se procede a realizar demarcaciones o señales de peligro utilizando implementos tales como bombones, maleta y cinta de esta forma se evita accidentes con personal ajeno a las labores civiles desarrolladas en el presente contrato, seguido se procede a realizar las demoliciones y/o excavaciones pertinentes para reposición de tubería, instalación de tubería nueva, mejoramiento de terreno o alistamiento del mismo, teniendo en cuenta esto se evalúa la calidad del material extraído, para este caso se importa material seco para efectos de relleno, para la instalación de tubería se implementa un solado o colchón de arena para la protección de la misma, una vez instalada se procede a empalmar con cajas o cámaras de inspección según sea el caso, se rellenar y compacta con saltarín hasta llegar al nivel del terreno inicial, de ese modo se realiza el debido Re parcheo o resane en vía de esa forma se garantiza que la red de alcantarillado queda funcionando de una forma adecuada y eficiente asegurando que en el entorno donde se ejecutó la labor civil no presente alteraciones físicas o visuales que perjudiquen el estilo de vida de los pobladores de la zona

CONCRETOS


Para el desarrollo de esta obra se elaboró una mezcla de concreto de 21 Mpa (resane de vía, cámaras de inspección y cajas de inspección) con el objeto de garantizar la resistencia del mismo, frente a las cargas que ejercen los vehículos que transitan en la zona

DIMENSIONES DE TUBERÍA

Para el correcto desempeño del sistema se empleó tubería en pvc estructural para alcantarillado unión mecánica de doble pared de 10 pulgadas para el colector principal y de 6 pulgadas para la red domiciliaria con una unión de silla yee (10" a 6") conservando una pendiente del 5% para garantizar el flujo constante de material solido en el sistema.

4.1. AVANCE DE OBRA

A continuación, se presenta un gráfico de obra teniendo en cuenta la proyección estimada y el tiempo de ejecución real en el cual se evidencia que el cronograma se cumple a cabalidad logrando un porcentaje del 100%, con esto se asume el compromiso del contratista y el deseo de mejorar la calidad de vida en el menor tiempo posible para los pobladores de las zonas.

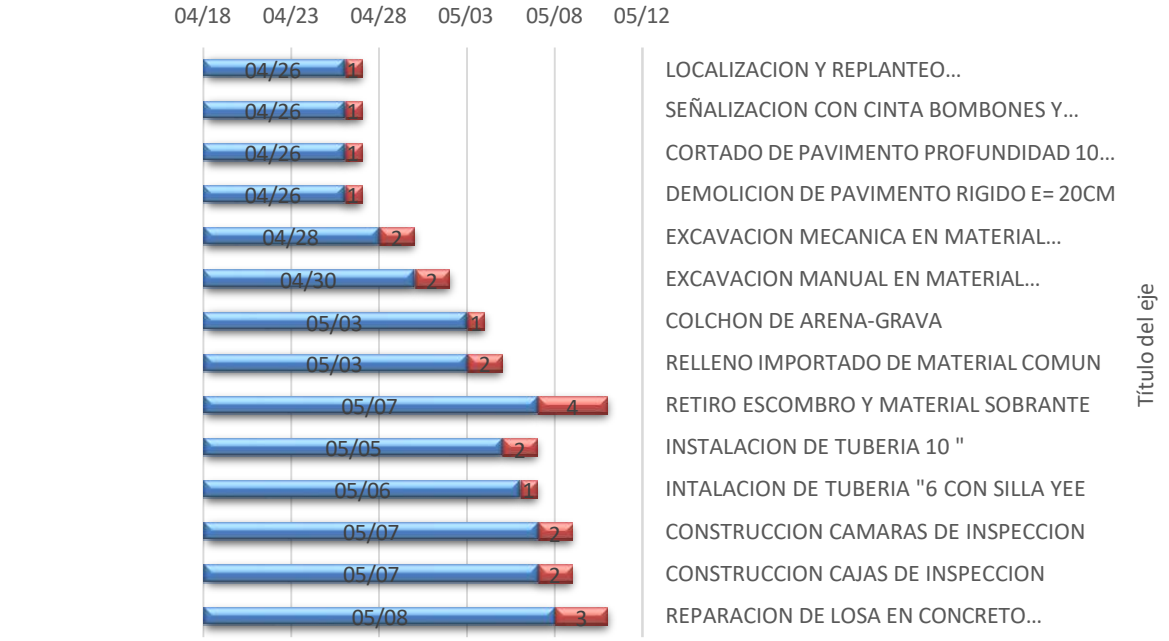

	REPARACION DE LOSA EN CONCRETO REFORSADO	CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION	CONSTRUCCION CAMARAS DE INSPECCION	INTALACION DE TUBERIA "6 CON SILLA YEE	INSTALACION DE TUBERIA 10 "	RETIRO ESCOMBRO Y MATERIAL SOBRANTE	RELLENO IMPORTADO DE MATERIAL COMUN	COLCHON DE ARENA-GRAVA	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN EN SECO	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN EN SECO	DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO E= 20CM	CORTADO DE PAVIMENTO PROFUNDIDAD 10 CM	SEÑALIZACION CON CINTA BOMBONES Y MALETA	LOCALIZACION Y REPLANTEO ALCANTARILLADO
FECHA DE INICIO	05/08	05/07	05/07	05/06	05/05	05/07	05/03	05/03	04/30	04/28	04/26	04/26	04/26	04/26
DURACIÓN (días)	3	2	2	1	2	4	2	1	2	2	1	1	1	1

Figura 1. Avance al cumplimiento del cronograma.

4.2. seguimiento al avance financiero

Hasta la fecha del presente informe se presenta ante EMPATIA SAS el acta final de obra N° 1, como se muestra en la siguiente tabla.

ACTA FINAL N°	VALOR CONTRACTUAL TOTAL	EJECUTADO PRESENTE ACTA	SALDO POR EJECUTAR
1	**$85.248.507**	**$85.248.507**	**$85.248.507**

5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO

5.1. Equipo implementado en el desarrollo del presente contrato

Para el desarrollo de este contrato se implementan equipos y herramientas como se muestra en la siguiente tabla, las cuales fueron destinadas para la realización de las diferentes actividades programadas y cumplir en precisión, acabados, resultado final y claramente con el cronograma de actividades y avance general de obra

Descripción de maquinaria y equipos	Disposición en obra
Cortadora de concreto	1
Cortadora caladora madera	1
Mezcladora de concreto	1
Pulidora Dewallt 11000 Rpm	1
Taladro Dewallt	1
Compactador (saltarin)	2
Volqueta de 7 M3	1
Pajarita retrocargador	1
Vibrador de concreto	1
Compactador (Rana)	1

5.2. Plan de seguridad y salud en el trabajo:

Para el plan de seguridad y salud en el trabajo se implementan medidas de prevención y de cuidado al momento de ejecutar las labores civiles tales como charlas y capacitaciones esto con el fin de evitar posibles riesgos y/o peligro para el personal en la zona de intervención. De igual forma se utilizan los elementos de protección personal tales como guantes, botas, lentes y tapabocas minimizando la accidentalidad en el desarrollo del contrato.

6. PROPUESTA ECONÓMICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1,1	LOCALIZACIÓN-REPLANTEO ALCANTARILLADO	ML	90,00	$2.589	$233.010
1,2	SEÑALIZACIÓN CON CINTA BOMBONES Y MALETA	GLB	1,00	$309.817	$309.817

2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				
2,1	CORTADORA DE PAVIMENTO A 10CM DISCO 10"	ML	178	$11.495	$2.046.110
2,2	DEMOLICION PAVIMENTO CONCRETO E=20CM	M2	78,4	$13.159	$1.031.665
2,3	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	54,45	$7368	$401.187
2,4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	73	$23.588	$1.721.924
2,5	COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARREO	M3	7,57	$122.074	$924.100
2,6	RELLENO IMPORTADO MATERIAL COMUN INCLUYE ACARREO Y COMPACTACIÓN	M3	166,86	$119.746	$19.980.817
2,7	RETIRO MAT. SOBRANTE MANUAL-VOLQUETA <=10KM.	M3	206,85	$33.218	$6.871.143
3	**TUBERÍAS Y ACCESORIOS**				
3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ESTRUCTURAL PARA ALCANTARILLADO UNION MECANICA DE DOBLE PARED EN PVC Ø=10".	ML	62,00	$89.200	$5.530.400
3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC ESTRUCTURAL PARA ALCANTARILLADO UNION MECANICA DE DOBLE PARED EN PVC Ø=6".	ML	89,00	$61813	$5.501.357
3,2	SUMINISTRO E INSTALACION KIT SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 10"	UND	7,00	$230.233,8	$1.611.636
3,3	REPARACIONES VARIAS (REDES TUBERÍA HIDROSANITARIA Y/O ACCESORIOS)	GLB	4,00	$15.701	$62.804
4	**CONCRETOS**				
4,1	CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS (INCLUYE TAPA Y CAÑUELA)	UND	2,00	$2.025.876	$4.051.752
4,2	CAJAS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO 0.80m X 0.80m X 1,0m INTERNOS (Incluye refuerzo en parrilla 3/8" @20cm)	UND	8,00	$573.816	$4.590.528
4,3	LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO 21MPA E= 0.20 M PARA RESANE DE VÍA	M2	78,50	$169.816	$13.330.556
				SUBTOTAL	$68.198.806
				Administración 17%	$11.593.797
				Imprevistos 3%	$2.045.964

Utilidad	5%	$3.409.940
	TOTAL	**$85.248.507**

7. RESPONSABLES EN OBRA

A continuación, se presenta las personas responsables para que el contrato se desarrolle en base a las especificaciones técnicas y constructivas requeridas por parte del contratante

No.	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	SALUD	PENSIÓN	ARL
1	ANDERSON FABIAN LEDESMA RENGIFO	1.002.840.708	RESINDENTE DE OBRA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA
2	PEDRO HERIBERTO CAICEDO MARTINEZ	10.692.681	MAESTRO D OBRA	ASMED SALUD	PORVENIR	POSITIVA

8. VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Para verificación de pago de seguridad social y aportes legales ver ANEXO. “PLANILLAS”.

9. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO.

A continuación, se presentan las garantías del contrato con su respectivo número de póliza, nombre de aseguradora y verificación de las vigencias actualizadas hasta la fecha del presente informe. ver ANEXOS “PÓLIZAS”.

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Durante el periodo del presente informe se realizaron distintas actividades en conjunto con la supervisión de dirección de obra y Empatía SAS, siguiendo el correcto proceso constructivo en cada uno de los frentes, además del positivo avance en las actividades programadas.

OBRA DE ALCANTARILLADO LIMONAR



Fotografía 1 Localización Y Replanteo De Alcantarillado



Fotografía 2 Corte de concreto profundidad 10 cm



Fotografía 3 Demolición de concreto espesor 20 cm



Fotografía 4 Excavación mecánica con retrocargador



Fotografía 5 corrección de excavación mecánica con excavación manual



Fotografía 6 instalación de tubería y colchón de arena



Fotografía 7relleno material importado



Fotografía 8 fundición de cámaras de inspección



Fotografía 9 instalación de silla yee para red domiciliaria



Fotografía 10 preparación para fundición de cajas de inspección red domiciliaria



Fotografía 11inicio resane de vía

11. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- En la zona intervenida y con avance del 100% se deja operativa la reposición del tramo de alcantarillado sanitario en la calle 4 entre vía panamericana y carrera 8 del barrio Limonar en la cabecera municipal de Patía departamento del Cauca
- Teniendo en cuenta el cronograma de actividades, no se presentaron atrasos en las labores civiles, esto gracias al potencial de la mano de obra y organización para la ejecución de las actividades sin desmeritar el capital financiero del contratista.
- Se encontró una tubería de 18 pulgadas de concreto, obsoleta e inoperativa la cual podría generar afectaciones en la calzada (hundimiento o fractura) debido al tránsito vehicular de la zona, vale la pena aclarar que en la zona de intervención se retiró, relleno y compacto para evitar alteraciones en el funcionamiento del nuevo sistema de alcantarillado.
- El acompañamiento por parte de Empatía SAS es de gran valor ya que se articulan esfuerzos y gestión para que este proyecto culmine, cumpliendo los estándares de calidad en procesos constructivos y beneficiando a los usuarios presentes en la zona de trabajo. Esto es muestra del compromiso que se adquirió con la comunidad.

proyectó:

ING. Anderson Fabian Ledesma Rengifo
Residente de Obra

CONSTRUCK SAS

NIT: 901838789-8
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
cl 1 # 20-20 piedra sentada, Pat??a, Cauca, Colombia
Tel.

Autorización facturación electrónica No. 18764093391321 válida desde 2025-05-21 hasta 2027-05-21 rango desde FVC1 hasta FVC300

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	800219279
Razón Social:	EMPATÍA ESP
Dirección:	Carrera 1 No 9-12 Via Panamericana B/Jardin, Pat??a, Cauca, Colombia
Teléfono:	3235448504
Email:	juridicaempatiaesp@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	FVC1
Fecha Emisión	29/05/2025 09:20:07
Fecha Vencimiento	
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Tarjeta Débito
Total de Lineas:	1

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1010	SERVICIO MANO DE OBRA REPOSICIÓN DEL TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LACALLE 4 ENTRE VÍA PANAMERICANA Y CARRERA 8 DEL BARRIOLIMONAR ENLA CABECERA MUNICIPAL DE PATÍADEPARTAMENTO DEL CAUCA	WSD	1,00	$85.248.507,00				0,00	$85.248.507,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe

Subtotal:	$85.248.507,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$85.248.507,00

Notas:	LA ENTIDAD ES RESPONSABLE DE LAS RETENCIONES Y DESCUENTOS, POR SER UNA ENTIDAD PÚBLICA
CUFE:	0084711b02e272f587ebdd0214769b36075076b7cc0fe1bc0d614b1db761a866762c499b08d86e9f519d8a7e48b8cfbd
Total con letra:	(ochenta y cinco millones doscientos cuarenta y ocho mil quinientos siete pesos)

Firma Digital: j+TY872l44yTkCR7tJSKtW13QkopbsCHa5xfbAKptjBPN1Y8POuaeI2N2ZCe3jgq kZS/tET7h+ii3JGZ+/XLfaW8jaTl6dc0SLWHYk1nyjlqVM/6tO GgR6B0Fp3bF6vz KB1MzCOvkxvovQLythVhpm8gHHKAQkN0seYa336vY1LrZYj+qqyujfJBjDHtKcV4 wVochX+bG3ItldFVILqYemSKVyNc1tsT/xc zgGss971JGVGm32sB/4MwMa2rODIO 1sKo0bnculFKdaViUqMe1GXwdWOstWPGu2K5azMIWYk5cIdvXun9gQ0eKS4Qf+Qt /Eve91Cf17HSDTN4RpaD jQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901838789	8	CONSTRUCK SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSTRUCK SEDE PRINCIPAL	CORREGIMIENTO PIEDRA SENTADA	PATIA-CAUCA	3116023296	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1428681407	9484464783	E	2025/04/23	2025/04/23	NEQUI	0	$376,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																												
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	1002840708	LEDESMA RENGIFO ANDERSON FABIAN	Dependiente	0	No	No																												

Total Afiliados(1)

							SALARIO			PENSION													SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.423.500	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	16%	SIN RIESGO	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800		NUEVA E.P.S.	30	$ 1.423.500	4%	$ 57.000	$
																					$ 227.800						$ 57.000	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 57.000		COMFACAUCA	30	$ 1.423.500	4%	$ 57.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.423.500	2,436%	3	$ 34.700	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$ 57.000						$ 57.000						$ 34.700				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901838789	8	CONSTRUCK SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSTRUCK SEDE PRINCIPAL	CORREGIMIENTO PIEDRA SENTADA	PATIA-CAUCA	3116023296	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1428681407	9484464783	E	2025/04/23	2025/04/23	NEQUI	0	$376,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$0	$0	$34,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$34,700	$0	$0	$34,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				**1**	**$376,500**	**$0**	**$0**	**$376,500**

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901838789	8	CONSTRUCK SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSTRUCK SEDE PRINCIPAL	CORREGIMIENTO PIEDRA SENTADA	PATIA-CAUCA	3116023296	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1477721493	9485553103	E	2025/05/22	2025/05/13	NEQUI	0	$376,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																												
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	1002840708	LEDESMA RENGIFO ANDERSON FABIAN	Dependiente	0	No	No																												

Total Afiliados(1)

							SALARIO			PENSION														SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.423.500	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	16%	SIN RIESGO	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800		NUEVA E.P.S.	30	$ 1.423.500	4%	$ 57.000	$
																					$ 227.800						$ 57.000	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 57.000		COMFACAUCA	30	$ 1.423.500	4%	$ 57.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.423.500	2,436%	3	$ 34.700	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$ 57.000						$ 57.000						$ 34.700				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901838789	8	CONSTRUCK SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSTRUCK SEDE PRINCIPAL	CORREGIMIENTO PIEDRA SENTADA	PATIA-CAUCA	3116023296	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1477721493	9485553103	E	2025/05/22	2025/05/13	NEQUI	0	$376,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$0	$0	$34,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$34,700	$0	$0	$34,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				**1**	**$376,500**	**$0**	**$0**	**$376,500**

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901838789	8	CONSTRUCK SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSTRUCK SEDE PRINCIPAL	CORREGIMIENTO PIEDRA SENTADA	PATIA-CAUCA	3116023296	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1497401870	9486339790	E	2025/06/24	2025/05/21	NEQUI	0	$514,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																												
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	10692681	CAICEDO MARTINEZ PEDRO HERIBERTO	Dependiente	0	No	No				X	2025/05/11																							
2	CC	1002840708	LEDESMA RENGIFO ANDERSON FABIAN	Dependiente	0	No	No																												

Total **Afiliados(2)**

							SALARIO			PENSION														SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.423.500	No	Fijo	PORVENIR	11	$ 521.950	16%	SIN RIESGO	$ 83.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.600		ASMET SALUD EPS SAS	11	$ 521.950	4%	$ 20.900	$
							$ 1.423.500	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	16%	SIN RIESGO	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800		NUEVA E.P.S.	30	$ 1.423.500	4%	$ 57.000	$
																					$ 311.400						$ 77.900	

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 20.900		COMFACAUCA	11	$ 521.950	4%	$ 20.900	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	11	$ 521.950	2,436%	3	$ 12.800	11	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 57.000		COMFACAUCA	30	$ 1.423.500	4%	$ 57.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.423.500	2,436%	3	$ 34.700	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$ 77.900						$ 77.900						$ 47.500				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901838789	8	CONSTRUCK SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSTRUCK SEDE PRINCIPAL	CORREGIMIENTO PIEDRA SENTADA	PATIA-CAUCA	3116023296	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1497401870	9486339790	E	2025/06/24	2025/05/21	NEQUI	0	$514,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$311,400	$0	$0	$311,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$83,600	$0	$0	$83,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$47,500	$0	$0	$47,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$47,500	$0	$0	$47,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$77,900	$0	$0	$77,900
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	$77,900	$0	$0	$77,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$77,900	$0	$0	$77,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$20,900	$0	$0	$20,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				**2**	**$514,700**	**$0**	**$0**	**$514,700**

J&C ASERPATÍA SERVICIOS PROFESIONALES

"Te brindamos asesorías especializadas, para que tus asuntos personales y empresariales lleguen al éxito"

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA JURIDICA

Yo, **JOSE FERNANDO CASTILLO RUANO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.059.908.610 de Patía (El Bordo Cauca) y con Tarjeta Profesional No. **321924 -T** inscrita en la Junta Central de Contadores, luego de examinar los estados financieros de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos 6 meses calendario legalmente exigibles, **ANDERSON FABIAN LEDESMA RENGIFO** identificado con NIT **901838789** ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra paz y salvo por todo concepto.

Teniendo en cuenta y de acuerdo a la ley 1943 -2019 según el inciso primero del artículo 114-1 del estatuto tributario, por ser persona jurídica y no tener más de 10 empleados que superen los 10 SMLV son exonerados del pago a parafiscales SENA Y ICBF, es por ello que solo se realiza el aporte correspondiente a Caja de compensación.

Dada en la Ciudad de El Bordo Cauca, a los 12 días de junio de 2025

JOSE FERNANDO CASTILLO RUANO
C.C. 1.059.908.610 de Patía
TP. 321924 – T

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CAUCA

comfacauca

al servicio del trabajador y su familia

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES

EL JEFE DE PROMOCION Y CONTROL DE APORTES DE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA

"COMFACAUCA"

HACE CONSTAR:

Que la empresa **CONSTRUCK SAS** Identificada con Nit: **901838789**, ha cancelado aportes parafiscales del 4%, con destino al régimen de Subsidio Familiar, por el periodo comprendido de Enero 2025 a Mayo 2025 según relación adjunta:

Periodo	Recibo No	Valor Nomina	Valor Caja	Fecha Pago
202501	9480268934	1.425.000	57.000	01-14-2025
202502	9482812347	1.425.000	57.000	03-07-2025
202503	9484464783	1.425.000	57.000	04-23-2025
202504	9485553103	1.425.000	57.000	05-13-2025
202505	9486339790	1.947.500	77.900	05-21-2025
202504	9486331413	237.500	9.500	05-21-2025
TOTAL		7.885.000	315.400	

EL DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA EFECTOS FISCALES, NI LIQUIDACION DE CONTRATOS DE OBRA.

"LA EXPEDICION DE ESTA CERTIFICACION NO IMPIDE QUE COMFACAUCA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACION DE APORTES Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO POR VIGENCIAS O PERIODOS ANTERIORES".

Se expide en Popayán, a los 10 días del mes de Junio de 2025.

JEFE DE PROMOCION Y CONTROL

VIGILADO SuperSubsidio

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS - LEY 142 DE 1994 - PATRICLSUSP03V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4352169918

PÓLIZA No: 435-47-994000059814 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: POPAYAN DELEGADA COD. AGENCIA: 435 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
19	05	2025	19	05	2025

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: CONSTRUCK S.A.S. IDENTIFICACIÓN: NIT 901.838.789-8

DIRECCIÓN: CL 1 20 20 CRR PIEDRA SENTADA CIUDAD: PATÍA- EL BORDO, CAUCA TELÉFONO: 3116023296

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE PATIA IDENTIFICACIÓN: NIT 800.219.279-1

BENEFICIARIO: EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE PATIA IDENTIFICACIÓN: NIT 800.219.279-1

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	24/04/2025	11/09/2025	8,524,850.70
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	24/04/2025	11/11/2025	25,574,552.10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	24/04/2025	11/05/2028	4,262,425.35
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	17,049,701.40

BENEFICIARIOS
NIT 800219279 - EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE PATIA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA No. 012 DE 2025, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON: REPOSICIÓN DEL TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 4 ENTRE VÍA PANAMERICANA Y CARRERA 8 DEL BARRIO LIMONAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PATÍA DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

*** NOTA ACLARATORIA ***

SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO DE LA POLIZA ARRIBA CITADA PARA ACLARAR LAS VIGENCIAS SEGUN ACTA DE RECIBO DE OBRA 01 Y FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 012 DE 2025.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL 13/05/2025 HASTA 13/05/2030

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ****55,411,529.55	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
EDWIN ARMANDO DIAZ MAYORGA	4076	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/ws_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2018 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS"

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000435216991

Anderson Ledesma.
FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CADB257A0E08F57F5F

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * Celular: 310 223 4304 * Correo electrónico: martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 791 91 80 * Fax: (601) 791 91 80 * Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93. - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Scanned with CamScanner

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE EMPRESAS DE SERVICIOS

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: POPAYAN DELEGADA COD. AGENCIA: 435 RAMO: 47 No PÓLIZA: 994000059814 ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSTRUCK S.A.S. IDENTIFICACIÓN: NIT 901.838.789-8

ASEGURADO: EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE PATIA IDENTIFICACIÓN: NIT 800.219.279-1

BENEFICIARIO: EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE PATIA IDENTIFICACIÓN: NIT 800.219.279-1

TEXTO ITEM 1

LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

CLIENTE

Scanned with CamScanner
