MEMORIAS DE CANTIDADES

SUTATAUSA, CUNDINAMARCA

PRESUPUESTO SUTATAUSA						
OBJETO: ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS						
ÍTEM	ÍTEM ICCU	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (AxB)
1.	**ADECUACION AULAS AMBIENTALES**					
1.1	1,42	Replanteo manual de cimientos	M2	20,24	$ 1.243,00	$ 25.158,00
1.2	1,31	Descapote manual y retiro e= 0.20 m apile a 15 m	M2	20,24	$ 8.402,00	$ 170.056,00
1.3	2,4	Instalación de Relleno tipo gravilla"	M3	1,11	$ 12.393,00	$ 13.732,00
1.4	5,1	Instalación Ladrillo Común Recocido 20x10x6cms	ML	17,72	$ 7.770,00	$ 137.684,00
	ADECUACION AULAS AMBIENTALES					**$ 346.630,00**
6	**INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES**					
6,1	1,32	Desmonte Aparatos Sanitarios	UN	48,00	$ 24.787,00	$ 1.189.776,00
6,2	11,9	Instalación aparato Sanitario	UN	19,00	$ 68.373,00	$ 1.299.087,00
6,3	17,6	Instalacion griferias	UN	29,00	$ 68.373,00	$ 1.982.817,00
	INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES					**$ 4.471.680,00**
	NO PREVISTOS					**$ -**
17	**HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR, ASEO TRANSPORTE Y RESTIRO DE ESCROMBROS**					
17,1	6,6	Herramienta menor y equipos, aseo, limpieza, retiro de escombros y transporte.	GL		$ 0,10	$ 481.831,00
	TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 5.300.141,00**
					ADMINISTRACION 19%	$ 1.007.027,00
					IMPREVISTO 1%	$ 53.001,00
					UTILIDAD 5%	$ 254.407,00
					IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%	$ 48.337,00
	VALOR OFERTA ECONOMICA					**$ 6.662.913,00**

NOTA 1: Cada uno de los items deberá cumplir con el detalle y especificaciones incluidos en el anexo denominado ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS.

NOTA 2: En ningún caso el Porcentaje % del AIU podrá ser superior al 25%.

NOTA 3: La propuesta económica deberá presentarse en formato PDF debidamente suscrita por el representante Legal del Proponente, así mismo, en Formato Excel con

Nombre del Proponente CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025.
Nombre del representante legal YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA
C. C. 1.024.532.372 de BOGOTA

ÍTEM 1- ADECUACIÓN AULAS AMBIENTALES

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO	**1,00**	**ADECUACION AULAS AMBIENTALES**					
ITEM	1,1	**Replanteo manual de cimientos**					
UNIDAD	M2						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
SUTATAUSA	IED SUTATAUSA	5,06	4,00		1,00	20,24	
					SUB-TOTAL	**20,24**	
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**20,24**	

FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE OBRA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO	**1,00**	**ADECUACION AULAS AMBIENTALES**
ITEM	1,1	**Replanteo manual de cimientos**
UNIDAD	M2	





FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE OBRA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO	**1,00**	**ADECUACION AULAS AMBIENTALES**					
ITEM	1,2	**Descapote manual y retiro e= 0,20 m apile a 15 m**					
UNIDAD	M2						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
SUTATAUSA	IED SUTATAUSA	5,06	4,00		1,00	20,24	
					SUB-TOTAL	**20,24**	
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**20,24**	

FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE OBRA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO	**1,00**	**ADECUACION AULAS AMBIENTALES**
ITEM	1,2	**Descapote manual y retiro e= 0,20 m apile a 15 m**
UNIDAD	M2	





FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE OBRA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO	**1,00**	**ADECUACION AULAS AMBIENTALES**					
ITEM	1,3	Instalación de Relleno tipo gravilla"					
UNIDAD	M3						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
SUTATAUSA	IED SUTATAUSA	4,86	3,80	0,06	1,00	1,11	
					SUB-TOTAL	**1,11**	
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**1,11**	

FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE OBRA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO	**1,00**	**ADECUACION AULAS AMBIENTALES**
ITEM	1,3	Instalación de Relleno tipo gravilla"
UNIDAD	M3	





FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE OBRA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 2


CAPITULO	**1,00**	**ADECUACION AULAS AMBIENTALES**					
ITEM	1,4	Instalación Ladrillo Común Recocido 20x10x6cms					
UNIDAD	ML						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
SUTATAUSA	IED SUTATAUSA	5,06			2,00	10,12	
			3,80		2,00	7,60	
					SUB-TOTAL	**17,72**	
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**17,72**	

FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE OBRA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO	**1,00**	**ADECUACION AULAS AMBIENTALES**
ITEM	1,4	Instalación Ladrillo Común Recocido 20x10x6cms
UNIDAD	ML	



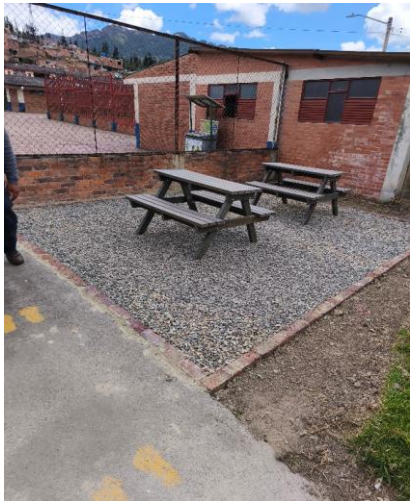

FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE OBRA TECHNE S.A.S

ÍTEM 6 -INSTALACIONES HIDROSANITARIAS: GRIFERÍAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO	**6,00**	**INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES**					
ITEM	6,1	**Desmonte Aparatos Sanitarios**					
UNIDAD	UN						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LUGAR	**ANCHO**	**ALTO**			
	DESMONTE SANITARIOS						
SUTATAUSA	ALCALDIA	BAÑO TALLER			1,00	1,00	
	CONCHA CUSTICA	BAÑOS MIXTOS			5,00	5,00	
	BIBLIOTECA	BAÑO MUJERES			1,00	1,00	
	IED SUTATAUSA	BAÑO H. CANCHA			2,00	2,00	
		BAÑO NIÑOS			2,00	2,00	
		BAÑO NIÑAS			1,00	1,00	
		BAÑO PROFESORES			1,00	1,00	
		BAÑO NIÑAS			6,00	6,00	
					SUB-TOTAL	**19,00**	
	DESMONTE GRIFERIA LAVAMANOS						
	CENTRO DE SALUD	BAÑO HOMBRES			1,00	1,00	
		BAÑO MUJERES			1,00	1,00	
	ALCALDIA	BAÑO TALLER			1,00	1,00	
		BAÑO ARCHIVO H.			1,00	1,00	
		BAÑO ARCHIVO M.			1,00	1,00	
	CONCHA CUSTICA	BAÑOS MIXTOS			6,00	6,00	
	BIBLIOTECA	BAÑO MUJERES			1,00	1,00	
	IED SUTATAUSA	BAÑO NIÑOS			3,00	3,00	
		BAÑO NIÑAS			3,00	3,00	
		BAÑO PROFESORES			1,00	1,00	
		BAÑO NIÑAS			6,00	6,00	
		BAÑO NIÑOS			4,00	4,00	
					SUB-TOTAL	**29,00**	
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**48,00**	


FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE OBRA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO	**6,00**	**INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES**
ITEM	6,1	**Desmonte Aparatos Sanitarios**
UNIDAD	UN	









FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE OBRA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO	**6,00**	**INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES**					
ITEM	6,2	**Instalación aparato Sanitario**					
UNIDAD	UN						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
	INSTALACION SANITARIOS						
SUTATAUSA	ALCALDIA	BAÑO TALLER			1,00	1,00	
	CONCHA CUSTICA	BAÑOS MIXTOS			5,00	5,00	
	BIBLIOTECA	BAÑO MUJERES			1,00	1,00	
	IED SUTATAUSA	BAÑO H. CANCHA			2,00	2,00	
		BAÑO NIÑOS			2,00	2,00	
		BAÑO NIÑAS			1,00	1,00	
		BAÑO PROFESORES			1,00	1,00	
		BAÑO NIÑAS			6,00	6,00	
					SUB-TOTAL	**19,00**	
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**19,00**	

FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE OBRA TECHNE S.A.S


REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO	**6,00**	**INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES**
ITEM	6,2	**Instalación aparato Sanitario**
UNIDAD	UN	







FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE OBRA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO	**6,00**	**INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES**					
ITEM	6,3	**Instalcion de griferia**					
UNIDAD	UN						
MUNICIPIO DE EJECUCION	**UBICACIÓN DE INTERVENCION**	**DIMENSIONES**			**UNIDAD**	**TOTAL**	ESQUEMA
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**			
SUTATAUSA	**GRIFERIA LAVAMANOS**						
	CENTRO DE SALUD	BAÑO HOMBRES			1,00	1,00	
		BAÑO MUJERES			1,00	1,00	
	ALCALDIA	BAÑO TALLER			1,00	1,00	
		BAÑO ARCHIVO H.			1,00	1,00	
		BAÑO ARCHIVO M.			1,00	1,00	
	CONCHA CUSTICA	BAÑOS MIXTOS			6,00	6,00	
	BIBLIOTECA	BAÑO MUJERES			1,00	1,00	
	IED SUTATAUSA	BAÑO NIÑOS			3,00	3,00	
		BAÑO NIÑAS			3,00	3,00	
		BAÑO PROFESORES			1,00	1,00	
		BAÑO NIÑAS			6,00	6,00	
		BAÑO NIÑOS			4,00	4,00	
					SUB-TOTAL	**29,00**	
OBSERVACIONES:							
					TOTAL	**29,00**	

FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE OBRA TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No. 2

CAPITULO	**6,00**	**INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES**
ITEM	6,3	**Instalcion de griferia**
UNIDAD	UN	



FIRMA: JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA: FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE OBRA TECHNE S.A.S
