eLATIN	**ACTA DE AFECTACIÓN DE BOLSA CONTRATO No. 3984-2025**	Sistema de Gestión de Calidad	
		FORMATO N°:	FT-MET-001
		Fecha:	Febrero 01/2020
		Versión:	3

ACTA N°	**AB 007**	**EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:**	**PUNTO DE CÁMARA P06 CONDINA A P04 EXPOFUTURO - FIBRA ÓPTICA**

FECHA DE INICIO **12 / 08 / 25**

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Durante la inspección realizada al enlace de fibra óptica entre los puntos de cámara P06 Condina y P04 Expofuturo, se evidenció la presencia de un corte en el tendido de fibra, lo cual interrumpe la transmisión de datos a través del medio.

Debido a que la fibra óptica es el medio de transporte principal para la red de videovigilancia y garantiza la transmisión de datos en alta velocidad y sin pérdidas significativas, asegurando continuidad en la operación de los sistemas de cámaras IP, la confiabilidad y baja latencia, necesarias para la visualización en tiempo real en el centro de monitoreo y la interconexión de nodos críticos de la red de seguridad, permitiendo la integración de diferentes puntos de cámara.

El corte detectado en la fibra óptica ocasiona la inoperatividad total de los puntos y dispositivos dependientes de este tramo, afectando la transmisión de video de los siguientes equipos:

- Punto de cámara LPR Mercasa
- Punto de cámara CAI 29 Entrada Belmont
- Punto de cámara CAI 26 San José de las Villas
- Punto de cámara CAI 13 Setra
- Punto de cámara P06 Condina
- Punto de cámara P01 Mercasa
- Cámaras de reconocimiento Mercasa

Esto implica la pérdida de cobertura de videovigilancia en un sector estratégico, comprometiendo la capacidad de supervisión, disuasión y registro de eventos de seguridad en el área.

GEOLOCALIZACIÓN:	**latitud:** 4.8037299 - **longitud:** -75.759148 - **altitud:** 1269 **m**

REGISTRO FOTOGRÁFICO













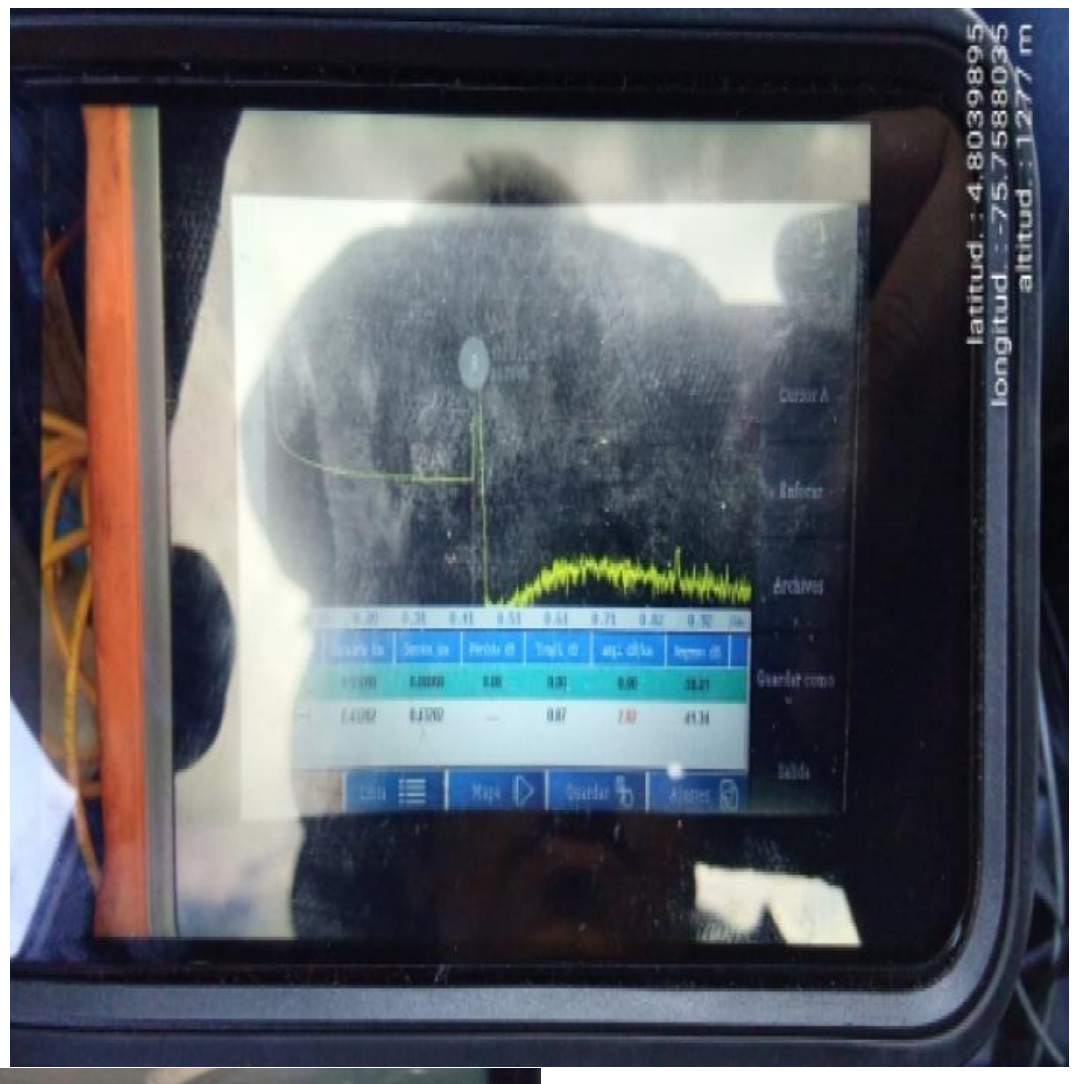



REPUESTO SOLICITADO		
Se solicita a la supervisión autorizar la afectación de bolsa de repuestos de los siguientes elementos: **1-** Sección SISTEMA DE TRANSMISIÓN **- Ítem:** Fibra Óptica por metro 24 hilos, ADSS Spam 200. Incluye Empalmes. Monomodo**,** Cantidad: doscientos cincuenta (250) metros. Costo metro $ 50.000, Valor total $ 12.500.000 **2-** Sección SISTEMA DE TRANSMISIÓN **- Ítem:** Caja de Empalme (exteriores) - Mufla. 24 hilos. 8 derivaciones, Cantidad: una (1) unidad. Costo unitario $ 851.000 **3-** Sección SISTEMA DE TRANSMISIÓN **- Ítem:** Retención para tendido Fibra Óptica, Cantidad: una (1) unidad. Costo unitario $ 440.000 **4-** Sección SISTEMA DE TRANSMISIÓN **- Ítem:** Suspensión para tendido Fibra Óptica, Cantidad: una (1) unidad. Costo unitario $411.000		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre	José Sebastián Mayoral	
C.C	1.120.217.147	
Cargo	Ingeniero de Soporte	
Teléfono	3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre	Sebastián Madrid	
C.C	9.861.041	
Cargo	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Teléfono	3117076440	
