eLATIN	**ACTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO** **CONTRATO No. 3984-2025**	Sistema de Gestión de Calidad	
		FORMATO N°:	FT-MET-001
		Fecha:	Febrero 01/2020
		Versión:	3

ACTA N°	**MC 040**	**EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:**	**PUNTO DE CÁMARA CAI 21 FERROCARRIL CALLE 10 - FUENTE DE PODER 12V 1,5A CÁMARA FIJA IP TIPO BALA**

FECHA DE INICIO **17 / 09 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

En el acta de afectación de bolsa N° AB 062, se le informó a la supervisión sobre la falla en la cámara fija ip tipo bala que está asociada a la fuente de alimentación, lo que impide garantizar la confiabilidad, seguridad eléctrica y operativa del sistema de videovigilancia. Después de la aprobación por parte del supervisor del contrato, se procedió a realizar la instalación de los elementos requeridos.


ACTIVIDAD REALIZADA

A solicitud de la supervisión, se realiza la instalación de una (1) fuente de poder 12v 1,5A de acuerdo al acta de afectación de bolsa AB 062, con esta intervención se permite restablecer el suministro energético al equipo asociado, recuperando la transmisión de señal de video hacia el sistema central de monitoreo. Con ello se garantiza la estabilidad operativa, la seguridad eléctrica y la confiabilidad funcional del sistema de videovigilancia, asegurando la continuidad del servicio

GEOLOCALIZACIÓN:	**latitud:** 4.8111089737729 - **longitud:** -75.688405688377 - **altitud:** 1414 **m**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



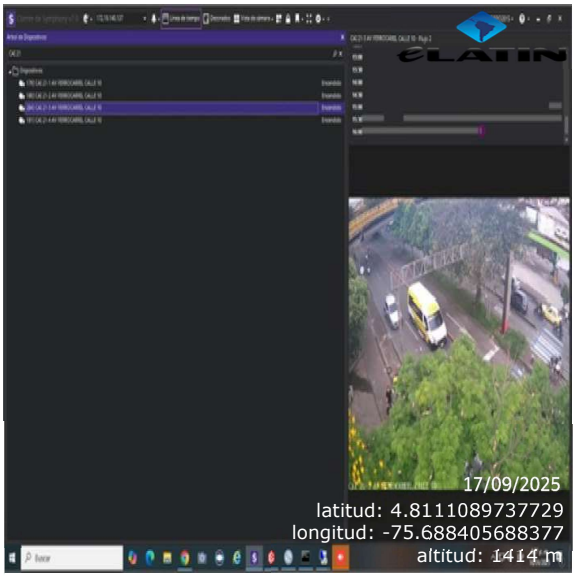

OBSERVACIONES

Finalizada la intervención, la cámara queda con enlace de red restablecido (link activo) y transmisión de video en visualización normal hacia el sistema de monitoreo.

FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre	José Sebastián Mayoral	Sebastián Mayoral
C.C	1.120.217.147	
Cargo	Ingeniero de Soporte	
Teléfono	3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre	Sebastián Madrid	
C.C	9.861.041	
Cargo	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Teléfono	3117076440	
