INFORME MENSUAL DE OBRA N°8

ENTIDAD: CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG".

OBJETO: "INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES."



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-006-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO ICASM2023

VIGENCIA: 2025

PERIODO: 1 OCTUBRE DE 2025 HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 4
2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 5
2.1 DESCRIPCION GENERAL 5
2.2 LOCALIZACIÓN 6
2.2.1 Localización Especifica del Proyecto 7
2.2.2 Inventario y estado inicial del sitio donde se ejecutarán las obras 8
2.3 ALCANCE Y CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO 11
3 ESTADO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS 18
3.1 CONTRATO DE OBRA 18
3.1.1 INFORMACION BÁSICA CONTRATO DE OBRA Nº LP-006-2023 .. 18
4 ACTIVIDADES DE OBRA 18
4.1 ACTIVIDADES DE ORDEN TECNICO 18
4.1.1 INFORME DE REFERENCIAS TOPOGRAFICAS VERIFICADAS DENTRO DEL PERIODO 23
4.1.2 INFORMES TÉCNICOS DESARROLLADOS Y/O APROBADOS EN EL PERIODO 24
4.1.3 PERSONAL DE OBRA 24
4.1.4 EQUIPO DE OBRA 24
4.1.5 ACTIVIDADES REALIZADAS 25
4.1.6 SEGUIMIENTO AL AVANCE DE OBRA Y LA PROGRAMACION 26
4.1.7 BITÁCORA DE OBRA. 27
4.1.8 CONTROL DEL ESTADO DEL TIEMPO 27
4.1.9 CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA 28
4.1.10 CONTROL DE PERSONAL 28
4.2 ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO 28
4.2.1 CONTROL DE PÓLIZAS 28
4.2.2 CONTROL DE DISPOSICIONES LABORALES 29
4.2.3 CORRESPONDENCIA 29
4.2.4 ESTADO DEL TRÁMITE DE LOS PERMISOS 30
4.2.5 REUNIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 30
4.3 informe ejecutivo especialista hidraulico. 31
4.4 ACTIVIDADES DE COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO 31
4.5 ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO 33
4.5.1 ACTAS PARCIALES DE COBRO 33
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 34

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Datos generales de contrato de Obra Pública No. LP 006 2023, Periodo 2025. 18
Tabla 2. Informes Semanales. 24
Tabla 3. Personal de mínimo Obra. 24
Tabla 4. Relación Maquinara de Obra. 24
Tabla 5. Relación de Equipos de Topografía. 25
Tabla 6. Resumen del cumplimiento a la programación durante el periodo. 26
Tabla 7. Póliza del Contrato no. LP 006 DE 2023. 29
Tabla 8. Relación de correspondencia durante el periodo. 30
Tabla 9. Descripción de pagos o cobros realizados por el contratista de obra. 33

LISTA DE FIGURAS

Ilustración 1. Localización general del proyecto, Distrito de Santa Marta. Fuente: Propia. 6
Ilustración 2. Ubicación de los cuerpos de agua que se tiene proyectado su intervención. Fuente: Propia. 7
Ilustración 3. Recorrido de campo en Quebrada Bureche. Fuente: Propia. 8
Ilustración 4. Estado de Box en Quebrada Bureche. Fuente Propia. 9
Ilustración 5 Evento climático a inicios de año 2025. Fuente: Derecho de petición radicado a la corporación por la Junta de acción comunal de la Vereda Los Naranjos. 10
Ilustración 6 Toma aérea con dron del punto crítico. Fuente: Propia. 10
Ilustración 7 Registro fotográfico de visita de personal de obra al Rio piedras. Fuente Propia. 11
Ilustración 8. Localización de la Cuenca del Río Piedras. Fuente: Propia 14
Ilustración 9. Figura representativa de muro en Geocontenedor. Fuente: Propia. 15
Ilustración 10 Presupuesto de obra correspondiente al periodo 2025. 17
Ilustración 11. Socialización del proyecto de Rio Piedras en la Vereda de Los Naranjos. Fuente: Propia. 22
Ilustración 12. Recorrido de personal de obra con dueños de los predios en la margen derecha del rio. Fuente: Propia. 22
Ilustración 13. Jornadas de sensibilización a las comunidades del Distrito. Fuente: Propia. 22
Ilustración 14. Actividades de topografía y toma de niveles en Rio Piedras. Fuente: Propia. 23

LISTA DE GRÁFICO

Gráfico 1. Porcentaje Programado vs Ejecutado en las semanas del mes. Fuente: Propia. 26
Gráfico 2. Porcentaje Acumulado de vs Programado vs Ejecutado. Fuente: Propia. 26
Gráfico 3. Porcentaje de Adelanto o Atraso de la Programación del proyecto. Fuente: Propia. 27
Gráfico 4. Estado del Tiempo en el Mes. Fuente: Propia. 27
Gráfico 5.Avance Financiero de Ejecutado Vs Pagado Mensual. Fuente: Propia. 33

1 INTRODUCCIÓN

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG) dentro de sus funciones propone y articula las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y procedimientos de tipo ambiental, por lo anterior le adjudicó el contrato de obra al CONSORCIO ICASM2023, cuyo objeto es "**INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES**".

El presente documento corresponde al informe mensual de obra N°8, este contiene las actividades desarrolladas en la ejecución de los trabajos relacionados con el contrato de obra en el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de octubre de 2025 y 31 de octubre de 2025 de la vigencia 2025, en cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Dentro de las funciones de obra se tienen en cuenta la ejecución de las actividades del contrato, con el fin de dar el cumplimiento eficaz de las mismas, acorde a las especificaciones técnicas, diseños estipulados y recomendaciones de Interventoría.

El informe mensual está conformado, por un resumen ejecutivo del mes, en el cual se presenta la descripción general del proyecto, el control de la programación, las actividades ejecutadas en el periodo y finalmente un registro fotográfico de las actividades realizadas.

De esta manera, con el presente informe se pretende proporcionar una visión global de las ejecuciones del contrato, dentro del periodo mencionado, en el que se analizan de manera conceptual y gráfica, los rendimientos o avance de la obra.

2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

2.1 DESCRIPCION GENERAL

Los cuerpos de agua proveen servicios ambientales que garantizan la disponibilidad del recurso hídrico, la diversidad de la flora y la fauna, la sostenibilidad de los territorios y la calidad de vida de sus habitantes, lo que significa que de su cuidado depende el correcto funcionamiento de cada uno de los ecosistemas terrestres.

En tal sentido, la ejecución de este proyecto es importante no solo para la ciudad, si no para el país en general, debido a que el distrito de Santa Marta representa un turístico, que genera fuentes de empleo a la región y divisas a la ciudad, pero debido a los graves problemas de socavación e inundación no se ha podido desarrollar todo el potencial que tiene. La desembocadura de estos ríos con el mar caribe representa un atractivo sin igual, que atrae casi que naturalmente al turista, que ven en estos parajes un sitio agradable, apacible y donde la calidez del nativo los hace regresar.

Con la ejecución de este proyecto no sólo se está contribuyendo al mejoramiento en la calidad de vida de la comunidad Santa Marta, sino que también contribuye con los procesos de restauración y recuperación de hábitats presentes en los cauces de estos ríos y en la zona costera del Mar Caribe donde la mayoría de ellos desembocan.
Además, con estas obras de mantenimiento en los ríos propuestos en la zona rural y urbana del Distrito de Santa Marta se contribuye que en temporadas de fuertes precipitaciones se mitiguen los riesgos por inundación a las que se encuentran expuestas las comunidades que colindan con las rondas hídricas de estos, así mismo, contribuye a la perduración en el tiempo del proyecto que actualmente se está ejecutando denominado: “**INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALE**S”.
El proyecto busca mantener estos cuerpos de agua en un escenario integral-colectivo sostenible de la ciudad, que resalte a Santa Marta y su carácter transversal. Por consiguiente, este escenario abrirá espacio a todas las personas y los invitará a participar de él y a usarlo permanentemente de manera sostenible.
Además de lo anteriormente expuesto, el presente proyecto se encuentra enmarcado en el enfoque hacia los 500 años buscando la preservación y valorización de la biodiversidad del distrito, con los mantenimientos permanentes en sus cuerpos de agua prestar servicios turísticos de calidad, además con este proyecto se contribuye al desarrollo urbano, social, económico sostenible y adaptado al cambio climático.

2.2 LOCALIZACIÓN

El Distrito de Santa Marta está conformado por un mar territorial, un área montañosa correspondiente a la Sierra Nevada, cuerpos de agua interiores, las islas y bahías localizadas en el mar territorial y en los cuerpos de agua, el suelo consolidado constituido por una zona costera y una zona continental, el suelo no consolidado constituido por la zona de Bajamar, el subsuelo y el espacio aéreo asociado.
Limita Por el Norte y el Oeste con el Mar Caribe, al sur los municipios de Ciénaga y Aracataca y por el oriente los departamentos de la Guajira y Cesar. Sus coordenadas geográficas son: 11º 14’ 50” de latitud norte y 74º 12’ 06” de latitud oeste. Dista de Bogotá 992 Km; de Riohacha 166 Km y de Barranquilla 93 Km. Cuenta con una extensión total de 2,393.35 Km2, de los cuales 55.10 Km2 pertenecen a zona urbana y 2,338.25 km2 a zona rural. La altura promedio de la ciudad es de 2 msnm, pero con una diferencia de altura que va, en el territorio del municipio, desde el nivel del mar hasta los 5.775 msnm en el Pico Cristóbal Colón, que es el más elevado de toda Colombia ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta (PDD Santa Marta, 2023).

Ilustración 1. Localización general del proyecto, Distrito de Santa Marta. Fuente: Propia.



2.2.1 Localización Especifica del Proyecto

Los cuerpos de agua a intervenir serán definidos año a año por la entidad (CORPAMAG), soportado en los informes técnicos, así como en el concepto expedido por la INTERVENTORIA.

El mantenimiento se realizará en los siguientes cuerpos de agua:

- RIO MANZANARES
- RIO GAIRA
- RIO PIEDRAS
- RIO GUACHACA
- RIO MENDIGUACA
- RIO BURITACA
- RIO DON DIEGO

Y otros cuerpos de agua que puedan ser priorizados dentro del Distrito de Santa Marta.

Ilustración 2. Ubicación de los cuerpos de agua que se tiene proyectado su intervención. Fuente: Propia.



Para la vigencia **2025** se escogieron 2 cuerpos de agua para su respectiva intervención que son **Quebrada Bureche** y **Río Piedras.** A continuación, se da una descripción de ambos puntos de obra.

2.2.2 Inventario y estado inicial del sitio donde se ejecutarán las obras

QUEBRADA BURECHE

El cuerpo se encuentra desembocando en el Río Gaira, en el tramo 3 de geocontenedores, esta obra fue planteada con el fin de buscar que las aguas de la quebrada viertan sin formar ningún cambio de margen en el rio. Este fue planteado para traer todas las aguas desde la calzada troncal del caribe y después verter de forma segura y se le tiene que hacer mantenimiento periódico para que siga funcionando.

Normalmente los mantenimientos recibidos por la quebrada se limitaban mayormente a limpieza manual y retiro de residuos, pero esta vez se decidió darle un mayor trabajo con el uso de maquinaria amarilla para además de lo anteriormente mencionado retirar el sedimento que ha ido acumulando por años.

Ilustración 3. Recorrido de campo en Quebrada Bureche. Fuente: Propia.



Ilustración 4. Estado de Box en Quebrada Bureche. Fuente Propia.



RÍO PIEDRAS

La cuenca del Río Piedras hace parte de la ecorregión Sierra Nevada de Santa Marta y de su Macrocuenca del Caribe y en su parte baja se ubica en la ecorregión Sistema Costero, dos de las cinco ecorregiones definidas por la Corporación Autónoma Regional CORPAMAG, para el territorio del Departamento del Magdalena. La cuenca cubre un área aproximada de 161.22 Km2, hace parte del área municipal del Distrito de Santa Marta, y en ella se ubican los poblados de San Martín, El Recreo, San Isidro, Los Remedios, La Estrella, La Esmeralda, La Revuelta, El Trompito, Las Piedras y Los Naranjos, entre otros.

A principios de año 2025 se presentaron grandes lluvias en la sierra nevada de Santa Marta lo que ocasiono crecientes súbitos en los cuerpos de aguas del distrito. Uno de los más afectados fue el Río Piedras, siendo el punto más crítico ubicado en la Vereda Los Najando Corregimiento de Guachaca donde se generó una socavación extrema que erosiono gran parte del margen derecho en dirección aguas abajo aproximadamente 2km antes de la desembocadura al mar. Además de la perdida de la orilla antigua y la perdida de infraestructura la socavación se acercó peligrosamente a la vía nacional que va de Santa Marta a Riohacha, lo que puede generar un problema futuro.

Ilustración 5 Evento climático a inicios de año 2025. Fuente: Derecho de petición radicado a la corporación por la Junta de acción comunal de la Vereda Los Naranjos.

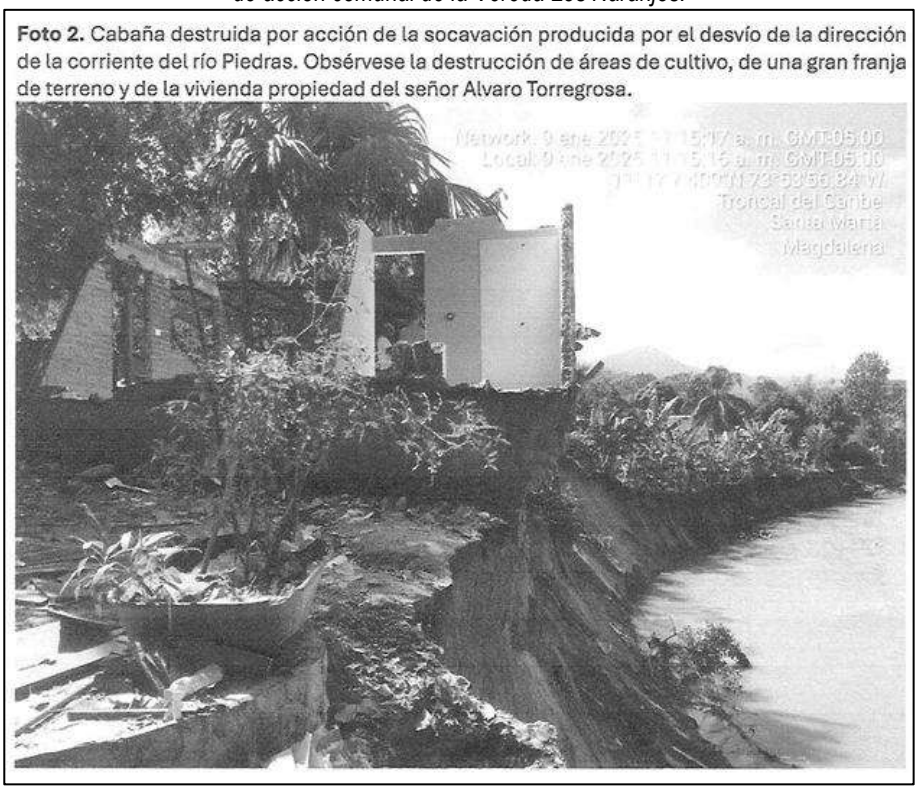


Ilustración 6 Toma aérea con dron del punto crítico. Fuente: Propia.

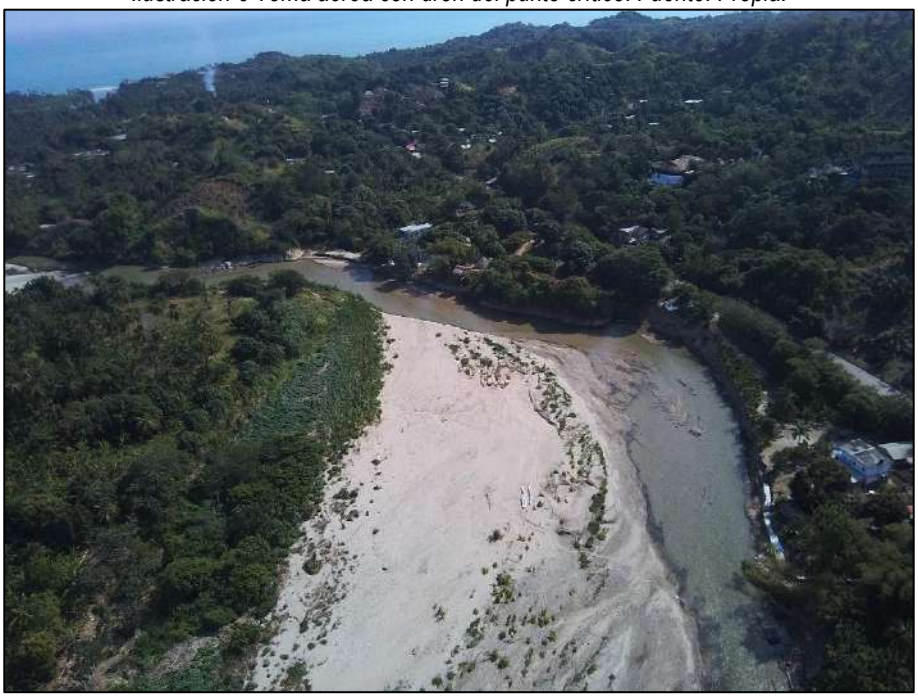


Ilustración 7 Registro fotográfico de visita de personal de obra al Rio piedras. Fuente Propia.



2.3 ALCANCE Y CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

El proyecto tiene como alcance, las "**INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES**" para mitigar los fenómenos de inundación debido a las fuertes lluvias recurrentes en el Distrito de Santa Marta, y además del mantenimiento de los cuerpos hídricos, cumpliendo los estándares ambientales de la corporación.

Con motivo de la recuperación de la capacidad hidráulica y la limpieza del cauce, se tienen programadas actividades de: Remoción de sedimentos a máquina, Que busca el retiro de todo material depositado en el cauce, junto con esta actividad se tiene el retiro en volquetas del material removido; Limpieza de vegetación dentro del cauce, este es un trabajo manual y tiene como propósito el despeje del cuerpo de agua de todo tipo de maleza que genere obstrucciones.

Así mismo se construirán obras de protección (Muros en Geocontenedores) en la margen donde se requiera protección, el material proveniente de la excavación será dispuesto como material de relleno de los geocontenedores.

Las estructuras estarán constituidas con Geobolsas relleno con material de sitio con cuatro niveles, cada nivel de 1.25 metros (Altura inicial 1.45m) para una altura total de 5,75 metros. Estos Geocontenedores tendrán en su parte inferior un geomanto antisocavante para evitar la erosión en su base. Adicionalmente, en la parte de contacto con el agua tendrá un geomanto protector generar vegetación a lo largo

del tiempo. En la parte posterior del relleno se proveerá de un geotextil no tejido para evitar migración de finos.
Las obras de protección consistirán en un Muro en Geocontenedores ensamblado con tensores internos en geotextil de poliéster; Manto Antisocavación ensamblado en geotextil de poliéster de 89 KN/m; Manto para el Control de Erosión permanente, Tipo TRM 50; Geotextil Tejido de Poliéster, resistencia método tira ancha de 40 KN/m y Relleno con Material del Sitio.
Estas obras serán complementadas con la implementación de la Revisión y Ajustes a Estudios y/o Diseños y la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Jurídica.
Para lo cual, se ejecutarán las siguientes actividades:

- Remoción Mecánica De Sedimentos Mediante El Uso De Excavadora Sobre Orugas.
- Dragado Mecánico De Sedimentos Mediante Uso De Excavadora.
- Cargue, Retiro Y Disposición Final De Material Proveniente De La Remoción Y Excavaciones.
- Limpieza Manual De Vegetación.
- Muro En Geocontenedores Ensamblado Con Tensores Internos En Geotextil. Incluye: Relleno Con Material Proveniente De La Excavación, Formaletería Y Costuras.
- Manto Antisocavación Ensamblado En Geotextil. Incluye: Inyección De Arena Proveniente De La Excavación En Lastre Inferior.
- Manto Para El Control De Erosión Permanente, Tipo Trm 50.
- Geotextil Tejido De Poliéster.
- Protocolo De Ahuyentamiento Y Rescate Fauna En El Marco De La Ejecución Del Proyecto.
- Implementación De Estrategia De Sensibilización Y Participación Ambiental Dirigido A La Comunidad En La Zona De Influencia Del Proyecto.
- Diseño De Sistema De Alerta Temprana.
- Implementación De Sistema De Alerta Temprana.

A continuación, se describen los componentes analizados para la ejecución del contrato en mención:

- COMPONENTE TOPOGRÁFICO

En el informe topográfico contiene los criterios desarrollados en los levantamientos que se realizaron en el distrito de Santa Marta. El estudio topográfico, consta con la descripción topográfica y batimétrica del área propuesta para el proyecto, brindando información a nivel de detalle debidamente geo-referenciada a partir de la colección de datos de la red local geodésica de proyecto. Sin embargo, de este componente se obtiene que:
El máximo error de cierre para las poligonales de los levantamientos de replanteo del eje del canal y estructuras será mínimo de 1:2500 en distancia y e=10N, en ángulo, expresado en segundos, siendo “N” el número de vértices de la poligonal. El máximo error de cierre en las nivelaciones para el control de las excavaciones expresado en milímetros será de 50K, siendo “K” la longitud en kilómetros de las líneas de nivelación. En ninguna circunstancia se permitirá utilizar equipo con sistema de posicionamiento global como instrumento de nivel. En la localización de los puntos para sondeos el error máximo admisible es de ±0.80 m.

- COMPONENTE ESTUDIO DE SUELO, GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO

Se presenta el informe de Estudio de suelos, geológico y geotécnico donde se relaciona la evaluación geotécnica inicial y la investigación del subsuelo para identificar la estratigrafía y determinar los parámetros geotécnicos de la zona, además se incluyen registros de la exploración en campo con la información de las muestras de material tomadas.
De igual manera se observa que no se evidencio en ninguno de los sondeos realizados la presencia del nivel freático, así como la examinación de la sismicidad de la zona ante posibles amenazas, además incluye las recomendaciones que deben seguirse durante la ejecución de las obras, teniendo en cuenta la posibilidad de cambio de las condiciones del proyecto. Sin embargo, de este componente se obtiene que:

1. Debido a la homogeneidad de los materiales encontrados en la exploración, no fue necesario hacer zonificaciones geotécnicas, sino que se consideró realizar una sola caracterización geotécnica para todo el lote.

2. Se realizó diseño geotécnico de una estructura de contención para el control de inundaciones generados por una creciente del río. Para todos los casos se encontraron factores de seguridad superiores a los mínimos exigidos en la normatividad colombiana tanto en condiciones estáticas como pseudo estáticas.

3. Los materiales producto de las excavaciones a realizar para construir la cimentación podrán ser empleados como material de relleno en razón a su buena capacidad mecánica y su estabilidad volumétrica.

Es importante tener en cuenta la posible variabilidad del perfil estratigráfico en otros sectores del río, lo que genera por ende otras propiedades geomecánicas de los materiales. Lo anterior no indica cambios en los diseños, ya que el trabajo de campo, los resultados de laboratorio y el análisis de éstos, permitieron concluir teniendo en cuenta condiciones desfavorables. De todas formas, se deberá tener presente que, si durante la ejecución de los trabajos se encuentran en la zona condiciones del subsuelo muy diferentes a las descritas como típicas en el informe, o se generan variaciones sustanciales del proyecto que afecten de una u otra manera las recomendaciones emitidas, se deberá informar oportunamente para complementar las conclusiones y recomendaciones consignadas en el informe.

- COMPONENTE ESTUDIO HIDROLÓGICO – HIDRÁULICO

Para estimar los caudales picos del Río Piedras, se generará modelo lluvia-escorrentía; que permita, con base en las características de cuenca y de laslluvias característica de diferentes períodos de retorno, estimar el caudal de pico de escorrentía para cada de estos períodos. Para tal efecto, se emplearán herramientas informáticas.

Caracterización de la Cuenca.

Ilustración 8. Localización de la Cuenca del Río Piedras. Fuente: Propia




La cuenca cuenta con área aproximada de 159.7 km2. La longitud del río Piedras es de 37.8 kilómetros Los principales afluentes del río Piedras son: Las Manzanares, Paloquemao, Santa Teresa, Jordán, San Luis, Alicia, La Sirena, entre otros. Las cuencas objeto de estudio son clasificadas como pequeñas debido a que su área se encuentra entre 2500 y 25000 Ha.

- COMPONENTE ESTUDIO ESTRUCTURAL

En el estudio estructural fue necesario para determinar el dimensionamiento y el refuerzo necesario para resistir las acciones de las cargas producidos por las acciones de las fuerzas externas. En este orden de ideas, este estudio contiene el diseño de las estructuras de contención con Geobolsas, con el fin de proteger la orilla ante las crecientes que se vienen presentando.

Ilustración 9. Figura representativa de muro en Geocontenedor. Fuente: Propia.

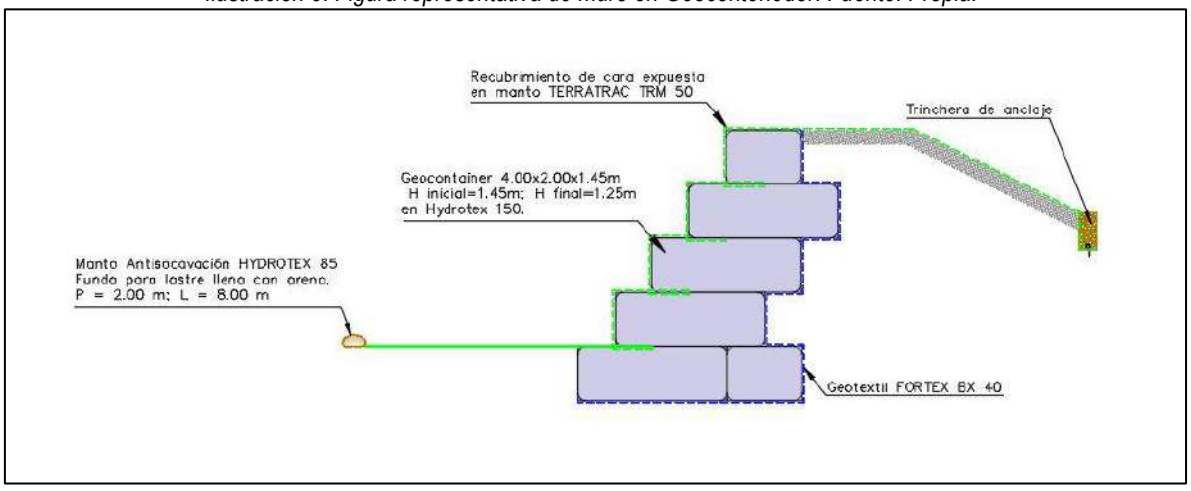

Según el estudio se concluye que:

- El análisis de estabilidad de geobolsas se hace basado con el peso unitario saturado, la cual sería el caso para la condición más crítica.
- Se deben respetar los materiales, las dimensiones, ángulo de inclinación de la estructura, con el fin de garantizar la estabilidad estructural para el cual fue chequeado los geocontenedores,
- Se verificó que la configuración de los Geocontenedores cumple con las condiciones de estabilidad exigidos en la normativa vigente colombiana NSR 2010.

- Las cargas actuantes sobre las estructuras se basaron del estudio de suelos, hipótesis de niveles de agua de acuerdo con el flujo de agua en el rio, para lo cual, si existe alguna condición diferente en el sitio, se debe consultar con el ingeniero estructural con el fin de revisar cualquier cambio que se pueda presentar.

- Los Geocontenedores se deben llenar mecánicamente, de manera que cuando el primer nivel está semi-sumergido, la medida que se llena con arena y se desplaza el agua, no depende del flujo a través del geotextil, ya que es muy pequeño.

- El sistema de anclaje de cualquier tipo de recubrimiento o geotextil de control de erosión se debe realizar con el mismo peso del elemento, pues ello significa evitar la perforación del geotextil. Son actividades previas para considerar durante la conformación del geocontenedor pues este último es el sistema de anclaje del geotextil o manto de recubrimiento.

CANTIDADES DE OBRA CONTRACTUALES PERIODO VIGENCIA 2025

Ilustración 10 Presupuesto de obra correspondiente al periodo 2025.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA
NIT. 800.099.287-4

FORMATO OFERTA ECONOMICA

LICITACION DE OBRA PUBLICA No. LP 006 DE 2023
"INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES"

AÑO 2025

ITEM	ESP.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
I. PRELIMINARES						**$ 31,513,384.00**
1.1	P - 1.1	Movilización y Desmovilización de Equipos	und	8.0	$ 3,939,173.00	$ 31,513,384.00
II. MANTENIMIENTO HIDRAULICO						**$ 7,480,285,719.18**
2.1	P - 2.1	Remoción Mecanica de Sedimentos Mediante el Uso de Excavadora sobre Orugas. Incluye: Seguimiento y Control Topografico	m3	92,648.54	$ 16,507.00	$ 1,529,349,449.78
2.3	P - 2.3	Cargue, Retiro y Disposicion Final de Material proveniente de la remoción y Excavaciones. Incluye: Disposicion en Escombrera Certificada	m3	92,648.54	$ 42,500.00	$ 3,937,562,950.00
2.4	P - 2.4	Limpieza Manual de vegetación	mes	12.0	$ 49,385,635.00	$ 592,627,620.00
2.5	P - 2.5	Muro en Geocontenedores ensamblado con tensores internos en geotextil. Incluye: Relleno con Material Proveniente de la Excavación, Formaletería y Costuras.	m3	6,000.0	$ 160,377.00	$ 962,262,000.00
2.6	P - 2.6	Manto Antisocavación ensamblado en geotextil. Incluye: Inyección de Arena proveniente de la excavación en Lastre Inferior	m2	2,250.0	$ 33,138.00	$ 74,560,500.00
2.7	P - 2.7	Manto para el Control de Erosión permanente, Tipo TRM 50	m2	7,031.30	$ 45,978.00	$ 323,285,111.40
2.8	P - 2.8	Geotextil Tejido de Poliéster	m2	5,156.30	$ 11,760.00	$ 60,638,088.00

TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 7,511,799,103.18**

Aministración (23%)	$ 1,727,713,794.00
Imprevistos (2%)	$ 150,235,982.00
Utilidad (5%)	$ 375,589,955.00
IVA (19%) sobre la Utilidad	$ 71,362,091.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**$ 2,324,901,822.00**

VALOR TOTAL DE LA OBRA CIVIL	**$ 9,836,700,925.18**

III. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS						**$ 1,134,038,192.00**
3.1	P - 3.1	Rescate de Fauna Acuatica y Terrestre	und	1.0	$ 237,598,855.00	$ 237,598,855.00
3.3	P - 3.3	Implementacion de Estrategia de Sensibilización y Participación Ambiental Dirigido a la Comunidad en la Zona de Influencia del Proyecto	und	8.0	$ 37,443,694.00	$ 299,549,552.00
3.4	P - 3.4	Diseño de sistema de alerta temprana Río Gaira.	und	1.0	$ 225,174,735.00	$ 225,174,735.00
3.4.1	P - 3.4	Implementación del sistema de alerta temprana Río Guachaca.	Glb	1.0	$ 371,715,050.00	$ 371,715,050.00

IVA. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA	**$ 215,467,256.48**

VALOR TOTAL OBRA AÑO 2025	**$ 11,186,206,374.00**

3 ESTADO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS

3.1 CONTRATO DE OBRA

3.1.1 INFORMACION BÁSICA CONTRATO DE OBRA Nº LP-006-2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO ICASM2023
REPRESENTANTE LEGAL:	DIXON ENRIQUE VALVERDE MARTINEZ
OBJETO:	INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	19 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR DEL CONTRATO:	$ 330.530.495.016,00
FECHA DE INICIACIÓN:	19 DE MARZO DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	147 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO:	19 DE JUNIO DE 2036
PERIODO ACTUAL:	**2025**
CUERPO DE AGUA A INTERVENIR:	**QUEBRADA BURECHE, RIO PIEDRAS**
VALOR DEL PERIODO:	$ 11.186.206.374,00
FECHA DE INICIO DE PERIODO:	20 DE MARZO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO DEL PERIODO:	31 DE DICIEMBRE DE 2025

Tabla 1. Datos generales de contrato de Obra Pública No. LP 006 2023, Periodo 2025.

4 ACTIVIDADES DE OBRA

4.1 ACTIVIDADES DE ORDEN TECNICO

Se iniciaron las jornadas de sensibilización ambiental y a las actividades de monitoreo de fauna en la desembocadura del Rio Piedras. Se movilizo la primera máquina al sitio.

Semana No. 29 (29/09/2025 - 05/10/2025)

1. El 30 de septiembre de 2025 se dio continuidad a las acciones contempladas en el componente de implementación de las Estrategias de Sensibilización y Participación Ambiental, dirigidas a la IED Quinto Centenario. Durante esta jornada se desarrolló la actividad educativa ambiental “Con la Vista al Río”, además de un espacio dedicado al manejo adecuado y aprovechamiento de los residuos sólidos y una sesión teórico-práctica de caracterización de estos materiales.

2. El 1 de octubre de 2025 se prosiguió con las actividades definidas en el mismo componente, dirigidas al CEDI Orinoco, sede Los Cocos (Sede No. 2). En esta jornada se llevó a cabo la sensibilización ambiental “Con la Vista al Río”, junto con actividades relacionadas con la gestión adecuada y el aprovechamiento de residuos sólidos y un ejercicio teórico-práctico de caracterización de dichos residuos.
3. El 3 de octubre de 2025 se continuó con las actividades programadas dentro del componente, esta vez orientadas a la comunidad del barrio Milagro II. La jornada incluyó capacitaciones sobre el manejo y aprovechamiento de residuos sólidos y una práctica de caracterización de estos materiales.
4. Se avanzó en el levantamiento de actas de vecindad en el sector de la vereda Los Naranjos.
5. Se llevó a cabo la instalación de cámaras trampa destinadas al monitoreo de la fauna silvestre presente en el área de intervención.
6. El 29 de septiembre de 2025 se realizó un recorrido conjunto entre el contratista, Parques Nacionales Naturales y la interventoría, con el fin de verificar las zonas destinadas para la liberación de fauna y los puntos de ubicación de las cámaras trampa.
7. El 1 de octubre de 2025 continuó la movilización de maquinaria necesaria para ejecutar las actividades correspondientes al capítulo de mantenimiento hidráulico establecido en el presupuesto.
8. Se dio inicio a las labores de remoción mecánica de sedimentos en el río Piedras.

Semana No. 30 (06/10/2025 - 12/10/2025)

9. El 6 de octubre de 2025 se dio continuidad a las actividades incluidas en el componente de implementación de las Estrategias de Sensibilización y Participación Ambiental, orientadas a la JAC de la vereda Los Naranjos. Esto incluyó la jornada educativa ambiental “Con la Vista al Río”, enfocada en la conservación y uso responsable del recurso hídrico y pesquero.
10. Se avanzó con las labores de remoción mecánica de sedimentos en el río Piedras, utilizando maquinaria adecuada para despejar los materiales acumulados en el cauce. Estas actividades se realizaron con el propósito de mejorar el flujo hidráulico, prevenir posibles obstrucciones y mitigar riesgos asociados a desbordamientos o afectaciones en la dinámica del río.
11. Se llevó a cabo la instalación de un hogar de paso temporal destinado a la fauna, el cual fue ubicado estratégicamente para

ofrecer refugio y protección a las especies que pudieran verse afectadas por las actividades desarrolladas en la zona.

12. Se prosiguió con la elaboración de actas de vecindad en el sector de la vereda Los Naranjos.

13. El 10 de octubre de 2025 se realizó una reunión con la comunidad ubicada en la margen izquierda del río Piedras (sector El Zaino).

Semana No. 31 (13/10/2025 - 19/10/2025)

1. El 15 de octubre de 2025 se dio continuidad a las acciones previstas dentro del componente de implementación de las Estrategias de Sensibilización y Participación Ambiental, dirigidas a la IED Quinto Centenario. Durante esta jornada de acompañamiento se desarrollaron las actividades de cierre de la formación ambiental, incluyendo ejercicios de transformación de material reciclable, una jornada de sensibilización “Ambiental y Cultural” orientada a promover prácticas que contribuyan significativamente al cuidado y protección de los cuerpos de agua, y una jornada de adaptación al cambio climático relacionada con estos ecosistemas.
2. El 16 de octubre de 2025 se realizó una visita por parte del equipo de supervisión del contrato.
3. El 16 de octubre de 2025 se prosiguió con las actividades establecidas en el componente de implementación de las Estrategias de Sensibilización y Participación Ambiental, en esta ocasión dirigidas al CEDI Orinoco Los Cocos Sede No. 2. En la jornada de acompañamiento se realizaron las actividades de cierre del proceso educativo ambiental, mediante la transformación de residuos reciclables, la jornada de sensibilización **“Ambiental y Cultural”** orientada a fomentar acciones de protección de los cuerpos de agua, y la jornada de adaptación al cambio climático asociada a dichos recursos naturales.
4. El 17 de octubre de 2025 se continuó con las actividades contempladas en el mismo componente, esta vez orientadas a la comunidad del barrio Milagro II. Se llevó a cabo la jornada educativa ambiental **“Con la Vista al Río”**, junto con una jornada de acompañamiento que incluyó actividades de cierre basadas en la transformación de material reciclable.
5. Se avanzó con los trabajos de remoción mecánica de sedimentos en el río Piedras.
6. Se efectuó el seguimiento y monitoreo de las cámaras trampa instaladas por el contratista.
7. En respuesta al oficio enviado por el Consorcio ICASM223, referente a la revisión de los drenajes existentes en la vía de la

Troncal del Caribe, a la altura de la zona intervenida sobre el río Piedras, se remitió dicha solicitud a la entidad contratante, con el fin de gestionar el apoyo necesario para establecer comunicación con la concesión Santa Marta–Paraguachón.

Semana No. 32 (20/10/2025 - 26/10/2025)

1. El 20 de octubre de 2025 se dio continuidad a las actividades previstas dentro del componente de implementación de las Estrategias de Sensibilización y Participación Ambiental, dirigidas a la JAC de la vereda Los Naranjos. En esta jornada se trabajó en la conservación de la fauna y la flora presentes en los cuerpos de agua.
2. El 22 de octubre de 2025 tuvo lugar una reunión presencial entre la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, el contratista de obra, la interventoría y la comunidad de El Zaino, en respuesta a la solicitud presentada por la JAC de este sector. El encuentro tuvo como finalidad aclarar las inquietudes planteadas y socializar el alcance de las intervenciones previstas en el río Piedras a la altura de la vereda Los Naranjos.
3. El 23 de octubre de 2025 se prosiguió con las acciones contempladas en dicho componente, esta vez orientadas a la JAC del barrio Manzanares. Se desarrolló la jornada educativa ambiental **“Con la Vista al Río”**, enfocada en la sensibilización de la comunidad.
4. El 24 de octubre de 2025 se continuaron las actividades del componente de implementación de Estrategias de Sensibilización y Participación Ambiental, dirigidas a la IED Liceo del Sur. Durante la jornada se abordó la gestión del riesgo de desastres asociados a los cuerpos de agua y se realizó un taller para fortalecer los contenidos de educación ambiental incluidos en las cartillas **“Aprendiendo para proteger las fuentes hídricas”**.
5. Se avanzó en los trabajos de remoción mecánica de sedimentos en el río Piedras.
6. Se efectuó la revisión de las cámaras trampa instaladas en la zona.

Ilustración 11. Movilización de maquinaria amarilla - Vereda de Los Naranjos. Fuente: Propia.



Ilustración 12. Instalación de cámaras trampa con Guardabosques de parque - Rio Piedras. Fuente: Propia.



Ilustración 13. Jornadas de sensibilización a las comunidades del Distrito. Fuente: Propia.



4.1.1 INFORME DE REFERENCIAS TOPOGRAFICAS VERIFICADAS DENTRO DEL PERIODO.

Ilustración 14. Actividades de topografía y toma de niveles en Rio Piedras. Fuente: Propia.



Se continua con los levantamientos topográficos en Rio Piedras para replanteo.

4.1.2 INFORMES TÉCNICOS DESARROLLADOS Y/O APROBADOS EN EL PERIODO.

- Informe Semanal de Obra.

Los informes semanales de obras correspondiente al periodo de ejecución son los siguientes:

SEMANA	ARCHIVO
SEMANA 29	INFORME SEMANAL N°29 (29SEP-05OCT)
SEMANA 30	INFORME SEMANAL N°30 (6OCT-12OCT)
SEMANA 31	INFORME SEMANAL N°31 (13OCT-19OCT)
SEMANA 32	INFORME SEMANAL N°32 (20OCT-26OCT)

Tabla 2. Informes Semanales.

Los informes se encuentran plasmados en el ***"Anexo No.1 Informes Semanales"*** del presente Informe.

4.1.3 PERSONAL DE OBRA

A continuación, se presenta el personal mínimo de obra en el proyecto.

CARGO	NOMBRES
Director de Obra	Luis Fernando Ochoa Marulanda
Especialista Ambiental	Rosa Elvira Villamizar Sierra
Especialista Hidráulico	Christian Dario López Clavijo
Ingeniero Topógrafo	Angela María Fernández Fajardo
Trabajador Social	Andrés Felipe Giraldo Pérez
Profesional SST	Ana Milagro Marenco Caballero
Gerente del Proyecto	Eugenio José Prada Daza

Tabla 3. Personal de mínimo Obra.

(Ver Anexo No.3 Personal de Obra)

4.1.4 EQUIPO DE OBRA

A continuación, se presenta el equipo y maquinaria de obra mínimo para la ejecución del contrato.

MAQUINARIA:

MAQUINA	MARCA	MODELO	POTENCIA
Excavadora	HYUNDAI	HX220S	148HP

Tabla 4. Relación Maquinara de Obra.

EQUIPO DE TOPOGRAFIA:

EQUIPO	ESPECIFICACIONES	MARCA
Receptor GNSS Y Rover	REF GALAXY G7	SOUTH
GPS: GNSS RTK	S900A	STONEX

Tabla 5. Relación de Equipos de Topografía.

(Ver Anexo No.5 Maquinaria y Equipo de Obra)

4.1.5 ACTIVIDADES REALIZADAS

Actividades Preliminares:

1. Movilización y Desmovilización de Equipos

Mantenimiento Hidráulico:

1. Remoción Mecanica de Sedimentos Mediante el Uso de Excavadora sobre Orugas. Incluye: Seguimiento y Control Topográfico: Se iniciaron actividades de remoción mecánica de sedimentos en el Río Piedras.

Actividades Complementarias:

1. Rescate de Fauna acuática y Terrestre: Se continua con las actividades de rescate y ahuyentamiento de fauna silvestre en el Río Piedras.

2. Implementación De Estrategia De Sensibilización Y Participación Ambiental Dirigido A La Comunidad En La Zona De Influencia Del Proyecto.

4.1.5.1 MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS

Durante el periodo correspondiente al mes de octubre, se realizaron actividades de mantenimiento hidráulicos y complementarias. Las memorias de cantidades se relacionan en el ***"Anexo No. 8 Memorias de Cantidades"***.

4.1.6 SEGUIMIENTO AL AVANCE DE OBRA Y LA PROGRAMACION

SEMANA	FECHA		% PROGRAMADO EN LA SEMANA	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO EN LA SEMANA	% EJECUTADO ACUMULADO	ADELANTO (+) Ó ATRASO (-)
	DEL	AL					
29	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	5 DE OCTUBRE DE 2025	3.86	35.06	1.81	22.78	-12.28
30	6 DE OCTUBRE DE 2025	12 DE OCTUBRE DE 2025	3.86	38.92	1.61	24.38	-14.55
31	13 DE OCTUBRE DE 2025	19 DE OCTUBRE DE 2025	4.13	43.05	0.8	25.19	-17.86
32	20 DE OCTUBRE DE 2025	26 DE OCTUBRE DE 2025	5.96	49.01	0.73	25.92	-23.09

Tabla 6. Resumen del cumplimiento a la programación durante el periodo.

Gráfico 1. Porcentaje Programado vs Ejecutado en las semanas del mes. Fuente: Propia

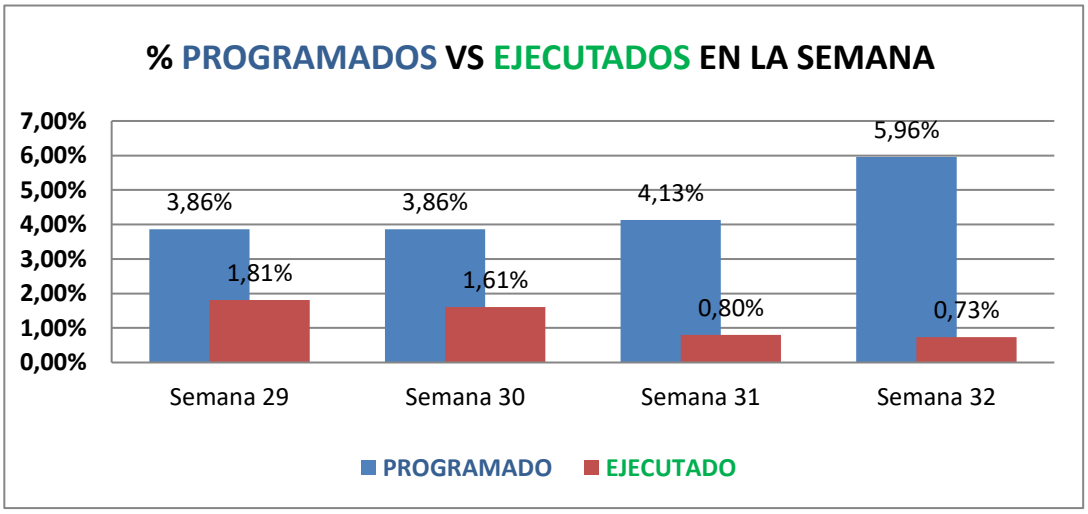


Gráfico 2. Porcentaje Acumulado de vs Programado vs Ejecutado. Fuente: Propia.


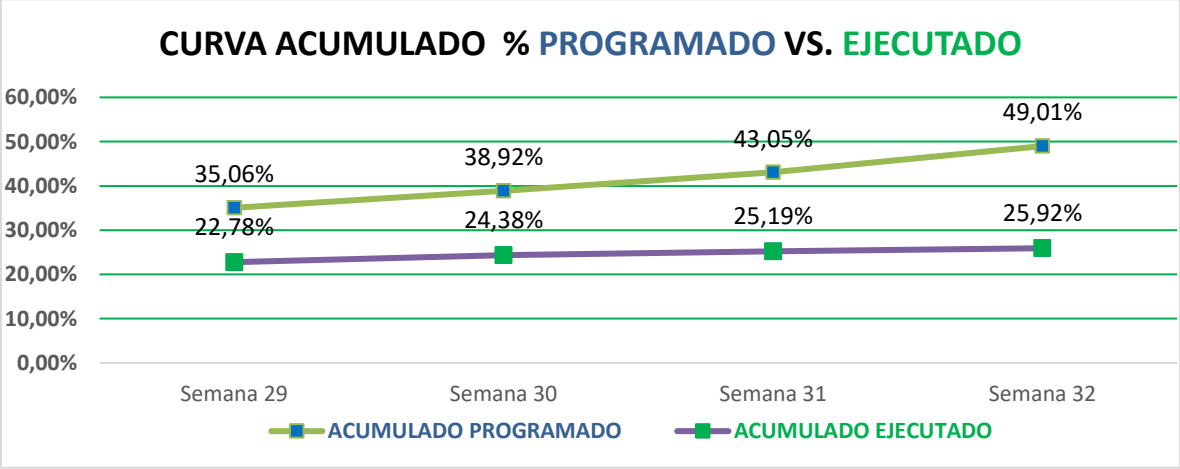


Gráfico 3. Porcentaje de Adelanto o Atraso de la Programación del proyecto. Fuente: Propia.

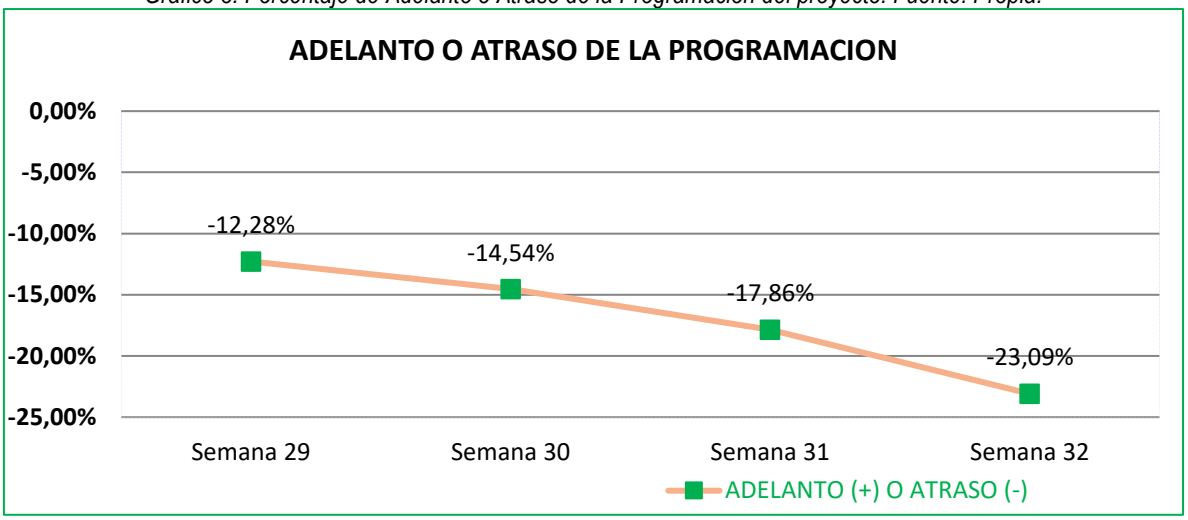


4.1.7 BITÁCORA DE OBRA.

Durante el periodo correspondiente al mes de septiembre se realizaron actividades de obra y complementarios. La Bitácora se relaciona en el ***"Anexo No.2 Bitácora de Obra"***.

4.1.8 CONTROL DEL ESTADO DEL TIEMPO

El registro del estado del tiempo del periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2025 hasta el 31 de octubre de 2025. Se relaciona la información registrada en el ***"Anexo No.4 Estado General del Tiempo"***

Gráfico 4. Estado del Tiempo en el Mes. Fuente: Propia.

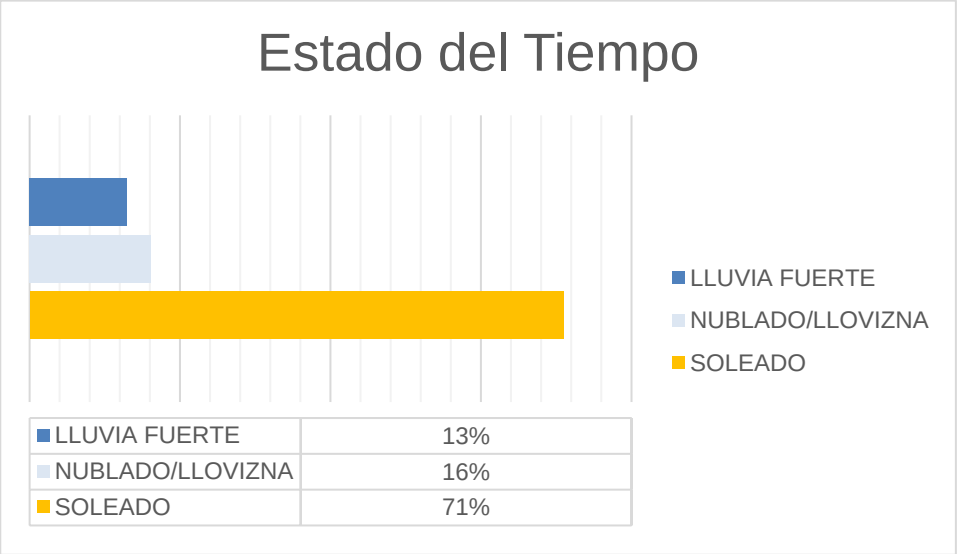

4.1.9 CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA

El control de los equipos utilizados en obra se relaciona en el ***"Anexo No.5 Maquinaria y Equipo de Obra"***, adjunto en los anexos del presente informe.

4.1.10 CONTROL DE PERSONAL

El control del personal en obra se relaciona en el ***"Anexo No.6 Seguridad social del personal"*** adjunto en los anexos del presente informe.

4.2 ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO

4.2.1 CONTROL DE PÓLIZAS

4.2.1.1 Control de Pólizas Contrato de Obra No. LP-006-2023

A continuación, se relaciona la información de las pólizas vigentes que amparan el contrato de obra de acuerdo con el acta de inicio.

Garantía de cumplimiento según acta de inicio

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	
No. DE POLIZA	CG-1064219	
FECHA DE EXPEDICIÓN	**20/05/2025**	
AMPARO	VIGENCIA	

	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	19/03/2025	30/09/2026	$ 1.118.620.637,40
PRESTACIONES SOCIALES	19/03/2025	19/03/2029	$ 559.310.318,70
ESTABILIDAD DE LA OBRA	13/03/2026	19/03/2028	$ 186.046.649,30

Garantía de responsabilidad civil extracontractual según acta de inicio

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADOS S.A		
No. DE POLIZA	75-40-101054945		
FECHA DE EXPEDICIÓN	**20/05/2025**		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	19/03/2025	19/03/2026	$ 711.750.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	19/03/2025	19/03/2026	$ 711.750.000,00
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS	19/03/2025	19/03/2026	$ 711.750.000,00

Tabla 7. Póliza del Contrato no. LP 006 DE 2023.

4.2.2 CONTROL DE DISPOSICIONES LABORALES

4.2.2.1 CONTRATO DE OBRA

Se relaciona la seguridad social del personal durante el periodo **Anexo No.6**.

4.2.3 CORRESPONDENCIA

OFICIOS ENVIADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA A INTERVENTORIA PERIODO: 1 DE OCTUBRE DE 2025 HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2025			
FECHA	**REFERENCIA**	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**
03/10/2025	Contrato No. LP 006 DE 2023	ICASM-115	Respuesta a Oficio ISM-048-2025 - Solicitud Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales.
03/10/2025	Contrato No. LP 006 DE 2023	ICASM-116	Respuesta a Oficio ISM-047-2025 - Solicitud Informe Mensual No. 6 Vigencia

			2025
06/10/2025	Contrato No. LP 006 DE 2023	ICASM-117	Respuesta a Oficio ISM-042-2025 - Solicitud Paz y Salvos Vigencia 2023-2024.
07/10/2025	Contrato No. LP 006 DE 2023	ICASM-118	Solicitud de acompañamiento para revisión de drenajes.
09/10/2025	Contrato No. LP 006 DE 2023	ICASM-119	Respuesta a Oficio ISM-045-2025 - Revisión Cambio Hoja de Vida Especialista Ambiental.
28/10/2025	Contrato No. LP 006 DE 2023	ICASM-120.	Solicitud de Balance de Mayores y Menores cantidades N. 1 - Vigencia 2025.
29/10/2025	Contrato No. LP 006 DE 2023	ICASM-121	Solicitud Reemplazo de Personal Mínimo Requerido.

Tabla 8. Relación de correspondencia durante el periodo.

4.2.4 ESTADO DEL TRÁMITE DE LOS PERMISOS

No se han transmitido permisos en este periodo.

4.2.5 REUNIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- El día 10 de octubre de 2025, se realizó reunión con la comunidad asentada en la margen izquierda del río piedras (El Zaino), para socializarles acerca del proyecto y el alcance de este.

- El 16 de octubre de 2025 se llevó a cabo una visita por parte de la supervisión del contrato con el fin de verificar los avances alcanzados hasta la fecha y revisar las gestiones realizadas.

- El día 22 de octubre de 2025 se realizó reunión presencial entre la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, el contratista de obra, la interventoría y la comunidad de El Zaino, atendiendo al requerimiento recibido por parte de la JAC de este sector con el objetivo de responder los interrogantes planteados en la solicitud y socializar el alcance de las intervenciones del río piedras a la altura de la Vereda Los Naranjos.

- El 24 de octubre se realizó una verificación técnica en los tramos Río Piedras y Buritaca, identificándose puntos críticos de erosión y socavación asociados al estrechamiento del cauce, drenajes que ingresan al río y al empotramiento del muro en geocontenedores, los cuales fueron registrados mediante GPS

y levantamientos con dron. En Buritaca, la comunidad expuso los riesgos por socavación en la desembocadura del río, situación que fue corroborada en campo por CORPAMAG, contratista e interventoría. Como resultado, se acordó incluir los drenajes y el empalme de la quebrada principal con el muro, verificar el estado inicial del geocontenedor y solicitar formalmente la intervención para evaluar su inclusión en la vigencia 2026 del contrato.

- El día 28 de octubre de 2025 se realizó recorrido en campo entre la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, el contratista de obra, la interventoría y la comunidad de El Zaino, atendiendo a los compromisos adquiridos durante el comité del pasado 22 de octubre de 2025.

4.3 INFORME EJECUTIVO ESPECIALISTA HIDRAULICO.

En el marco de la vigencia 2025 se realizó el acompañamiento técnico a las actividades ejecutadas durante el mes de octubre en el Distrito de Santa Marta. Durante este periodo se dio inicio a labores asociadas al componente hidráulico, destacándose particularmente las actividades de remoción de sedimentos en los sectores intervenidos.

Estas acciones permiten mejorar la conducción del flujo, optimizar la capacidad hidráulica del cauce y reducir el riesgo de obstrucciones o represamientos en puntos críticos. El acompañamiento consistió en verificar que los procedimientos se realizaran conforme a las especificaciones técnicas, garantizando que la remoción se ejecutara de manera segura, controlada y con criterios de eficiencia.

En términos generales, las actividades adelantadas aportan al adecuado funcionamiento del sistema hidráulico intervenido y constituyen un avance significativo dentro de la programación prevista para la vigencia.

Se realizó remoción mecánica de sedimento en los tramos comprendidos entre las abscisas: 0+820.00-1+140.00.

4.4 ACTIVIDADES DE COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO

COMPONENTE GESTION AMBIENTAL.

Se llevaron a cabo las actividades planteadas en las Medidas de Manejo Ambiental del contrato, tales como manejo de residuos sólidos, manejo de sustancias

químicas, manejo de residuos líquidos peligrosos, y cobertura vegetal, protección de fauna y ecosistemas sensibles.

En el "Anexo No.9 Gestión Ambiental" se pueden encontrar El Informe De Seguimiento Ambiental AL PIMMA junto con sus anexos.

COMPONENTE SST

Durante el período actual, se llevaron a cabo todas las actividades planteadas en el área de seguridad y salud en el trabajo. Se realizaron charlas dirigidas al personal de obra, se realizaron inspecciones de elementos de seguridad ubicados en los equipos, orden y aseo, uso de EPP, y estado general, además de realizarse la entrega de los EPP necesarios.

En el "Anexo No.10 Componente SST" se pueden encontrar El Informe De Seguimiento.

COMPONENTE SOCIAL

Durante el periodo se llevaron a cabo todas las actividades planteadas en la gestión social, incluyendo atención comunitaria, programa de comunicación y divulgación, atención de PQRS, ejecución de actas de vecindad.

En el "Anexo No.11 Componente Social" se pueden encontrar El Informe De Gestión Social.

ACTIVIDADES DE RESCATE DE FAUNA

Durante el periodo se llevaron a cabo actividades de rescate y Ahuyentamiento en las zonas intervenidas.

En el "Anexo No.12 Rescate" se pueden encontrar El Informe de Manejo de Fauna Silvestre.

ACTIVIDADES DE JORNADAS SE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL


Durante el mes de octubre se desarrollaron diversas actividades con las comunidades ubicadas en las zonas de intervención del proyecto. Estas jornadas estuvieron orientadas a fortalecer los procesos de educación y sensibilización

ambiental, promoviendo buenas prácticas y una mayor comprensión sobre la importancia del cuidado y manejo adecuado del entorno

En el "Anexo No.13 PIESPA" se pueden encontrar El Informe de las Jornadas de Sensibilización Ambiental.

4.5 ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO

Gráfico 5.Avance Financiero de Ejecutado Vs Pagado Mensual. Fuente: Propia.

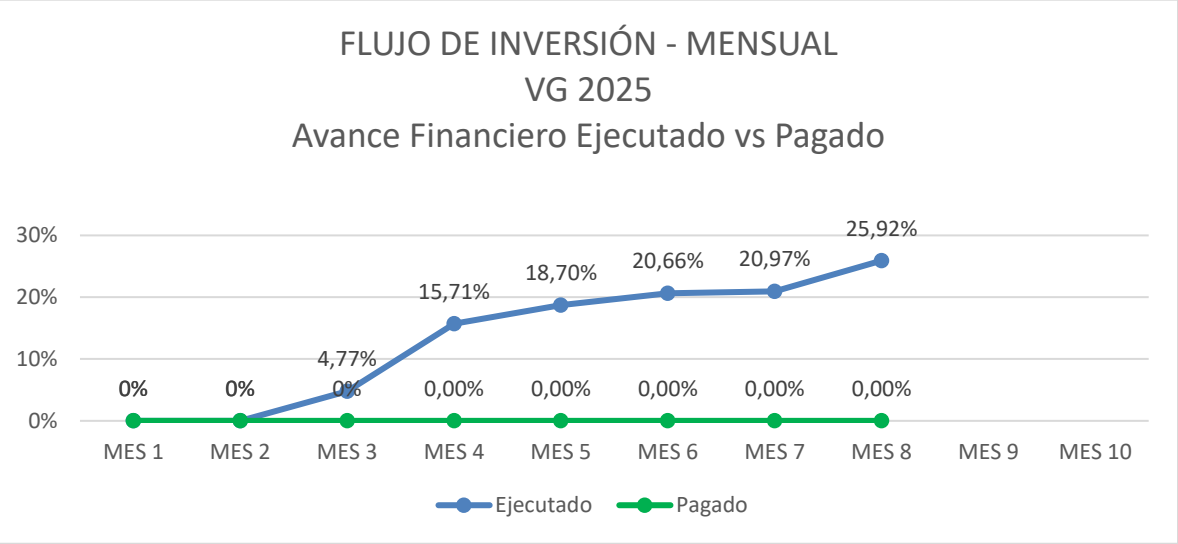

4.5.1 ACTAS PARCIALES DE COBRO

-Acta de obra del Mes de Octubre. ***Ver "Anexo No. 14 Acta de obra".***

4.5.1.1 Actas de Cobro de Contratista de Obra y cobros realizados


%	DESCRIPCION DEL PAGO	VALOR	VALOR PAGADO	ESTADO
4.77	Acta parcial de obra No 11	$ 533.402.230,00	-	Pendiente de Pago
0.37	Acta parcial de obra No 12	$ 1.223.746.330,00	-	Pendiente de Pago
2.99	Acta parcial de obra No 13	$ 334.274.374,00	-	Pendiente de Pago
1.96	Acta parcial de obra No 14	$ 219.574.756,00	-	Pendiente de Pago
0.31	Acta parcial de obra No 15	$ 34.457.679,00	-	Pendiente de Pago

Tabla 9. Descripción de pagos o cobros realizados por el contratista de obra.

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el mes de octubre 2025 de ejecución del contrato No. LP 006 DE 2023 que tiene como objeto “INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES”. se concluye: El presente informe comprende el periodo desde el 1 de octubre del 2025 al 31 de octubre de 2025. Se continúa con el desarrollo de las actividades complementarias y se da inicio a las actividades de obra como lo es la remoción mecánica de sedimentos.

Responsable:



LUIS FERNANDO OCHOA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO ICASM2023
TP. 13202-33067 BLV

ANEXO No. 1

INFORMES SEMANALES

Dirección: Calle 24 No 2-66 Ed. Cámara de Comercio, Santa Marta
Email: consorcioicasm@gmail.com

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA No. 29

INFORMACION DEL PROYECTO

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO ICASM2023 **CONTRATO No:** LP 006 DE 2023

INTERVENTORIA: INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S **CONTRATO No:** CM 007 DE 2023

SEMANA No: 29 **Del:** 29 de septiembre de 2025 **Al:** 5 de octubre de 2025

SUPERVISOR DEL CONTRATO: Francisco Jairo Sánchez De la Hoz **TIEMPO TRANSCURRIDO DE OBRA:** 201 días

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA		
Contratista:		Consorcio ICASM2023	Interventoría:		Interventores e Ingeniería S.A.S
Contrato No:		LP 006 DE 2023	Contrato No:		CM 007 DE 2023
Valor inicial:	$	330530495016	Valor inicial:	$	23163036792
Valor Actualizado:	$	330530495016	Valor Actualizado:	$	23163036792
Plazo inicial:		Ciento cuarenta y siete (147) meses	Plazo inicial:		Ciento cuarenta y siete (147) meses
Plazo Actualizado:		Ciento cuarenta y siete (147) meses	Plazo Actualizado:		Ciento cuarenta y siete (147) meses
Fecha de inicio:		19 de marzo de 2024	Fecha de inicio:		19 de marzo de 2024
Fecha de vencimiento:		19 de junio de 2036	Fecha de vencimiento:		19 de junio de 2036
VIGENCIA ACTUAL: 2025					
Valor de vigencia:	$	11186206374	Valor inicial:	$	782829600
Plazo de vigencia:		nueve (9) meses	Plazo inicial:		nueve (9) meses
Fecha de inicio:		19 de marzo de 2025	Plazo Actualizado:		19 de marzo de 2025
Fecha de vencimiento:		31 de diciembre de 2025	Fecha de vencimiento:		31 de diciembre de 2025

ACTIVIDADES DE OBRA REALIZADAS EN LA SEMANA

El 1 de octubre se recibe la llegada de 2 excavadoras.
Se inicio con la actividad de remoción en la segunda isla.
Se inician con las jornadas de PIESPA para las comunidades de; IED Liceo del Sur, IED Quinto Centenario, CED Intercultural Orinoco sede #2.

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SST, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE RESCATE DE LA SEMANA

Se realizaron recolección de actas de vecindad en la vereda los Naranjos, Rio Piedras.
Se realiza la instalación de 5 cámaras trampa junto con guardabosques de Parque Tayrona.
Se realizan Charlas de SST donde se trataron temas como: Importancia de análisis de trabajo seguro (ATS), Prevención de Accidentes por Distracción en el Trabajo, Uso Seguro de Herramientas.


ACTIVIDADES DE OBRA PROGRAMADAS PARA LA PROXIMA SEMANA

Se programa mas actividades de remoción de sedimentos y conformación de relleno para el muro.

PORCENTAJE DE AVANCE

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
OBRA PROGRAMADO(%):	3.86%	35.06%	**OBRA EJECUTADO(%):**	1.81%	22.78%
VALOR BASICO($):	$ 432,150,532.95	$ 3,921,877,108.09	**VALOR BASICO($):**	$ 202,470,051.93	$ 2,547,925,420.97

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

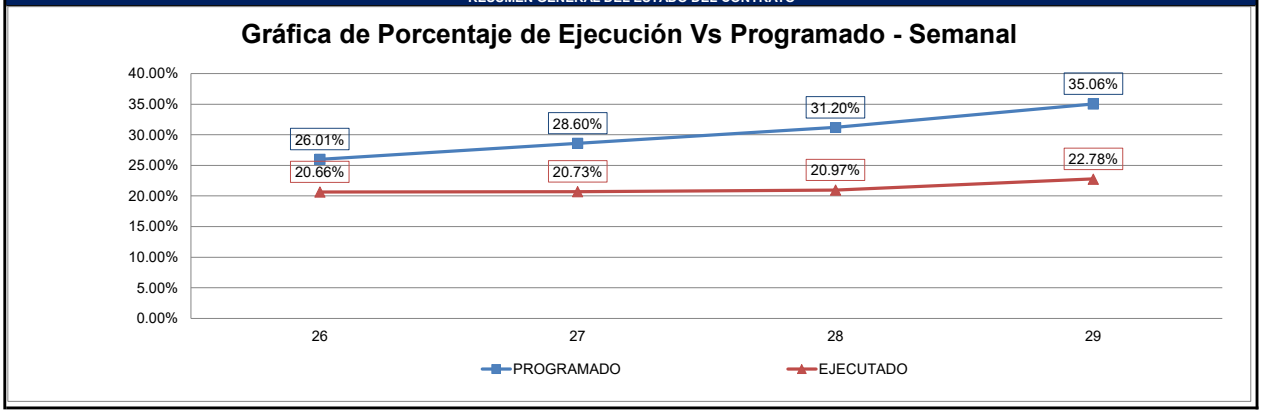

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Movilización de maquinaria Amarilla - Vereda Los Naranjos, Rio Piedras



Charlas de SST con personal de campo - Vereda Los Naranjos, Rio Piedras



Instalación de cámaras trampa con Guardabosques de parque - Rio Piedras



Actividades de remoción de sedimentos en segunda Isla - Río Piedras



Actividades de remoción de sedimentos en segunda Isla - Río Piedras



Jornada del PIESPA con Comunidad Milagro II



Jornada del PIESPA con IED Quinto Centenario



Jornada del PIESPA con CED Intercultural Orinoco sede #2

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE OBRA

Firma:
Nombre: Luis Fernando Ochoa
Cedula: 73.113.864 de Cartagena

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA No. 30

INFORMACION DEL PROYECTO

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO ICASM2023 **CONTRATO No:** LP 006 DE 2023

INTERVENTORIA: INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S **CONTRATO No:** CM 007 DE 2023

SEMANA No: 30 **Del:** 6 de octubre de 2025 **Al:** 12 de octubre de 2025

SUPERVISOR DEL CONTRATO: Francisco Jairo Sánchez De la Hoz **TIEMPO TRANSCURRIDO DE OBRA:** 208 días

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA		
Contratista:		Consorcio ICASM2023	Interventoría:		Interventores e Ingeniería S.A.S
Contrato No:		LP 006 DE 2023	Contrato No:		CM 007 DE 2023
Valor inicial:	$	330530495016	Valor inicial:	$	23163036792
Valor Actualizado:	$	330530495016	Valor Actualizado:	$	23163036792
Plazo inicial:		Ciento cuarenta y siete (147) meses	Plazo inicial:		Ciento cuarenta y siete (147) meses
Plazo Actualizado:		Ciento cuarenta y siete (147) meses	Plazo Actualizado:		Ciento cuarenta y siete (147) meses
Fecha de inicio:		19 de marzo de 2024	Fecha de inicio:		19 de marzo de 2024
Fecha de vencimiento:		19 de junio de 2036	Fecha de vencimiento:		19 de junio de 2036
VIGENCIA ACTUAL: 2025					
Valor de vigencia:	$	11186206374	Valor inicial:	$	782829600
Plazo de vigencia:		nueve (9) meses	Plazo inicial:		nueve (9) meses
Fecha de inicio:		19 de marzo de 2025	Plazo Actualizado:		19 de marzo de 2025
Fecha de vencimiento:		31 de diciembre de 2025	Fecha de vencimiento:		31 de diciembre de 2025

ACTIVIDADES DE OBRA REALIZADAS EN LA SEMANA

Se continua con la actividad de remoción en la segunda isla y el Repaleo de este a la margen derecha del rio en dirección aguas abajo.
Se realiza reunión con personal del margen izquierdo del cauce sobre temas referentes a las actividades que se desarrollan.
Se continua con las jornadas de PIESPA para las comunidades de: Comunidad de Los Naranjos.

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SST, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE RESCATE DE LA SEMANA

Se realizaron recolección de actas de vecindad en la vereda los Naranjos, Rio Piedras.
Se realizan actividades de ahuyentamiento de fauna silvestre.
Se realizan Charlas de SST donde se trataron temas como: Importancia del mantenimiento preventivo, Manejo seguro de equipos y maquinaria, Inducción y reinducción ambiental , Pausas activas y ergonomía.


ACTIVIDADES DE OBRA PROGRAMADAS PARA LA PROXIMA SEMANA

Se programa mas actividades de remoción de sedimentos y conformación de relleno para el muro.

PORCENTAJE DE AVANCE

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
OBRA PROGRAMADO(%):	3.86%	38.92%	**OBRA EJECUTADO(%):**	1.61%	24.38%
VALOR BASICO($):	$ 432,150,532.95	$ 4,354,027,641.04	**VALOR BASICO($):**	$ 179,776,032.42	$ 2,727,701,453.39

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

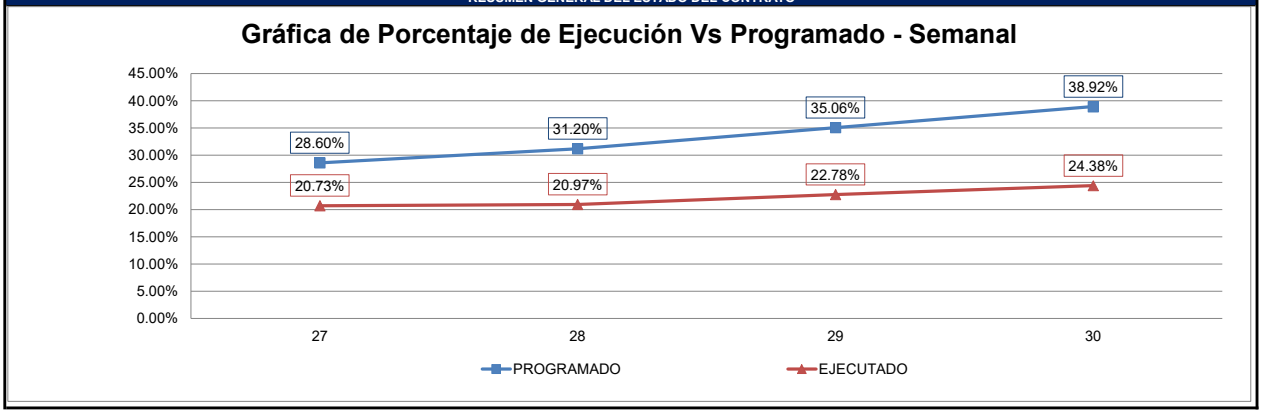

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Actividades de remoción de sedimentos en segunda Isla - Río Piedras



Charlas de SST con personal de campo - Vereda Los Naranjos, Rio Piedras



Cavf de obra - Rio Piedras



Actividades de remoción de sedimentos en segunda Isla - Río Piedras



Preparación de manto antisocavacion en campamento - Río Piedras



Reunión solicitada por dueños de predios colindantes al cauce - Río Piedras



Jornada del PIESPA con Comunidad de Los Naranjos



Recolección de actas de vecindad - Vereda Los Naranjos, Río Piedras

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE OBRA

Firma:

Nombre: Luis Fernando Ochoa

Cedula: 73.113.864 de Cartagena

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA No. 31

INFORMACION DEL PROYECTO

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO ICASM2023 **CONTRATO No:** LP 006 DE 2023

INTERVENTORIA: INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S **CONTRATO No:** CM 007 DE 2023

SEMANA No: 31 **Del:** 13 de octubre de 2025 **Al:** 19 de octubre de 2025

SUPERVISOR DEL CONTRATO: Francisco Jairo Sánchez De la Hoz **TIEMPO TRANSCURRIDO DE OBRA:** 215 días

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA		
Contratista:		Consorcio ICASM2023	Interventoría:		Interventores e Ingeniería S.A.S
Contrato No:		LP 006 DE 2023	Contrato No:		CM 007 DE 2023
Valor inicial:	$	330530495016	Valor inicial:	$	23163036792
Valor Actualizado:	$	330530495016	Valor Actualizado:	$	23163036792
Plazo inicial:		Ciento cuarenta y siete (147) meses	Plazo inicial:		Ciento cuarenta y siete (147) meses
Plazo Actualizado:		Ciento cuarenta y siete (147) meses	Plazo Actualizado:		Ciento cuarenta y siete (147) meses
Fecha de inicio:		19 de marzo de 2024	Fecha de inicio:		19 de marzo de 2024
Fecha de vencimiento:		19 de junio de 2036	Fecha de vencimiento:		19 de junio de 2036
VIGENCIA ACTUAL: 2025					
Valor de vigencia:	$	11186206374	Valor inicial:	$	782829600
Plazo de vigencia:		nueve (9) meses	Plazo inicial:		nueve (9) meses
Fecha de inicio:		19 de marzo de 2025	Plazo Actualizado:		19 de marzo de 2025
Fecha de vencimiento:		31 de diciembre de 2025	Fecha de vencimiento:		31 de diciembre de 2025

ACTIVIDADES DE OBRA REALIZADAS EN LA SEMANA

Se continua con la actividad de remoción en la segunda isla y el Repaleo de este a la margen derecha del rio en dirección aguas abajo.

Se continua con las jornadas de PIESPA para las comunidades de: Comunidad de Milagro II; IED Quinto Centenario; CEDI Orinoco "Los Cocos" .

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SST, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE RESCATE DE LA SEMANA

Se realizaron recolección de actas de vecindad en la vereda los Naranjos, Rio Piedras.

Se realizan actividades de ahuyentamiento de fauna silvestre.

Se realizan Charlas de SST donde se trataron temas como: Botiquin y primeros auxilios básicos


ACTIVIDADES DE OBRA PROGRAMADAS PARA LA PROXIMA SEMANA

Se programa mas actividades de remoción de sedimentos y conformación de relleno para el muro.

PORCENTAJE DE AVANCE

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
OBRA PROGRAMADO(%):	4.13%	43.05%	**OBRA EJECUTADO(%):**	0.80%	25.19%
VALOR BASICO($):	$ 461,639,926.91	$ 4,815,667,567.95	**VALOR BASICO($):**	$ 89,786,438.30	$ 2,817,487,891.69

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

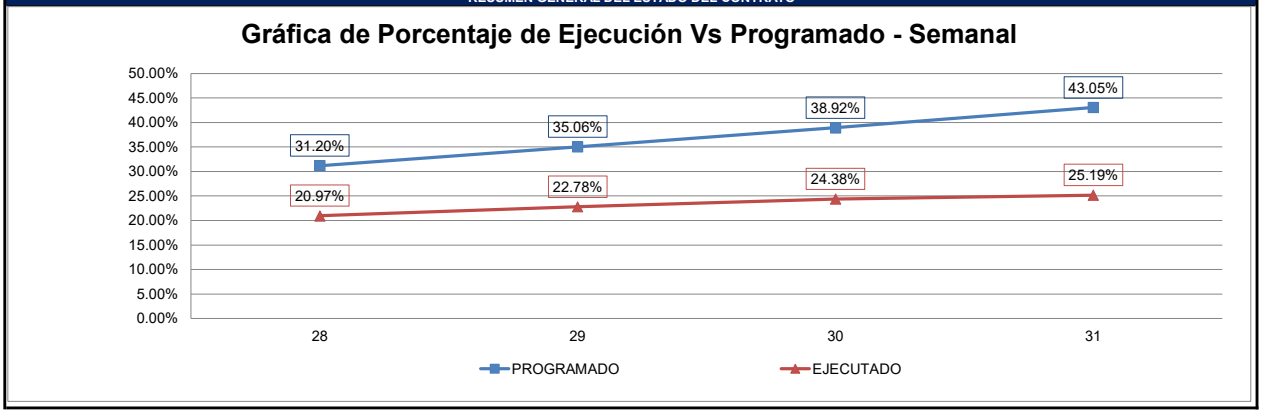

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Actividades de remoción de sedimentos en segunda Isla - Río Piedras



Charlas de SST con personal de campo - Vereda Los Naranjos, Rio Piedras



Cavf de obra - Rio Piedras



Actividades de remoción de sedimentos en segunda Isla - Río Piedras



Preparación de manto antisocavacion en campamento - Río Piedras



Reunión solicitada por dueños de predios colindantes al cauce - Río Piedras



Jornada del PIESPA con Comunidad de Milagro II



Recolección de actas de vecindad - Vereda Los Naranjos, Río Piedras

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE OBRA

Firma:
Nombre: Luis Fernando Ochoa
Cedula: 73.113.864 de Cartagena

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA No. 32

INFORMACION DEL PROYECTO

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO ICASM2023 **CONTRATO No:** LP 006 DE 2023

INTERVENTORIA: INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S **CONTRATO No:** CM 007 DE 2023

SEMANA No: 32 **Del:** 20 de octubre de 2025 **Al:** 26 de octubre de 2025

SUPERVISOR DEL CONTRATO: Francisco Jairo Sánchez De la Hoz **TIEMPO TRANSCURRIDO DE OBRA:** 222 días

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA		
Contratista:		Consorcio ICASM2023	Interventoría:		Interventores e Ingeniería S.A.S
Contrato No:		LP 006 DE 2023	Contrato No:		CM 007 DE 2023
Valor inicial:	$	330530495016	Valor inicial:	$	23163036792
Valor Actualizado:	$	330530495016	Valor Actualizado:	$	23163036792
Plazo inicial:		Ciento cuarenta y siete (147) meses	Plazo inicial:		Ciento cuarenta y siete (147) meses
Plazo Actualizado:		Ciento cuarenta y siete (147) meses	Plazo Actualizado:		Ciento cuarenta y siete (147) meses
Fecha de inicio:		19 de marzo de 2024	Fecha de inicio:		19 de marzo de 2024
Fecha de vencimiento:		19 de junio de 2036	Fecha de vencimiento:		19 de junio de 2036
VIGENCIA ACTUAL: 2025					
Valor de vigencia:	$	11186206374	Valor inicial:	$	782829600
Plazo de vigencia:		nueve (9) meses	Plazo inicial:		nueve (9) meses
Fecha de inicio:		19 de marzo de 2025	Plazo Actualizado:		19 de marzo de 2025
Fecha de vencimiento:		31 de diciembre de 2025	Fecha de vencimiento:		31 de diciembre de 2025

ACTIVIDADES DE OBRA REALIZADAS EN LA SEMANA

Se continua con la actividad de remoción en la segunda isla y el Repaleo de este a la margen derecha del rio en dirección aguas abajo.
Se continua con las jornadas de PIESPA para las comunidades de: Comunidad de Manzanares; Comunidad de Los Naranjos; IED Liceo del Sur.
El 22 se realizo socializacion del proyecto con la comunidad Los Zaino en instalaciónes de Corpamag.
El 25 se realizo visita técnica con hidraulico de Obra, para iniciar muro en geocontenedor. Continuado con una visita a Rio Buritaca por solicitud de la comunidad de la zona.

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SST, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE RESCATE DE LA SEMANA

Se realizaron recolección de actas de vecindad en la vereda los Naranjos, Rio Piedras.
Se realizan actividades de ahuyentamiento de fauna silvestre, se realizo inspeccion de camaras trampa
Se realizan Charlas de SST donde se trataron temas como: Protección contra caídas de objetos;Hábitos de vida Saludable;Comunicación efectiva en seguridad;Transporte y almacenamiento de materiales; Uso, Cuidado y Responsabilidad de Dotación.


ACTIVIDADES DE OBRA PROGRAMADAS PARA LA PROXIMA SEMANA

Se programa mas actividades de remoción de sedimentos y conformación de relleno para el muro.
Se programa el inicio del muro en geocontenedor.

PORCENTAJE DE AVANCE

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
OBRA PROGRAMADO(%):	5.96%	49.01%	**OBRA EJECUTADO(%):**	0.73%	25.92%
VALOR BASICO($):	$ 666,180,549.42	$ 5,481,848,117.37	**VALOR BASICO($):**	$ 81,977,348.33	$ 2,899,465,240.02

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

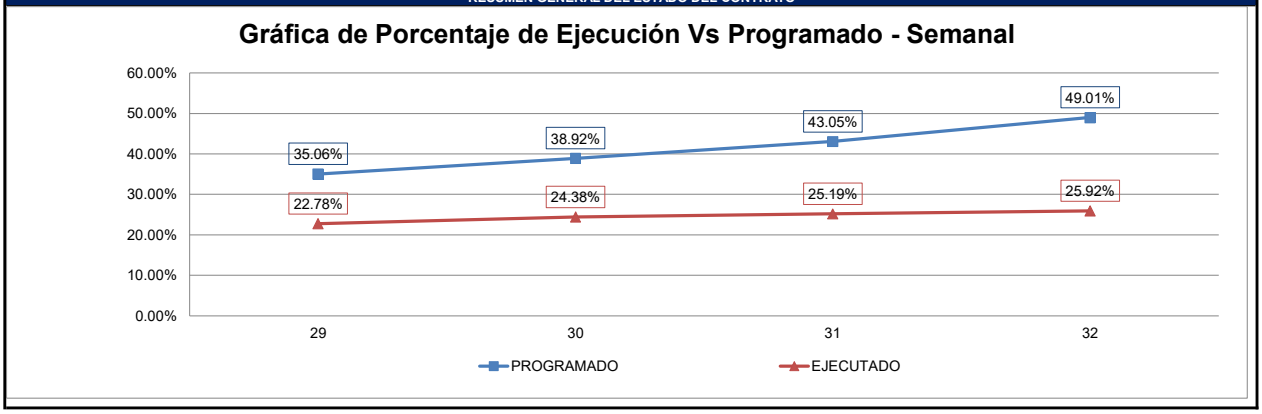

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Actividades de remoción de sedimentos en segunda Isla - Río Piedras



Actividades de remoción de sedimentos en segunda Isla - Río Piedras



Visita Técnica en Obra - Rio Piedras



Visita Técnica en Obra - Rio Buritaca



Socialización del Proyecto a comunidad de Los Zaino de zona de Parques - Corpamag



Levantamiento Topográfico y calculo de cantidades - Río Piedras



Jornada del PIESPA con Comunidad de Los Naranjos



Jornada del PIESPA con IED Liceo del Sur

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE OBRA

Firma:
Nombre: Luis Fernando Ochoa
Cedula: 73.113.864 de Cartagena

ANEXO No. 2

BITÁCIRA DE OBRA

sólidos. Se realiza recolección de actas de vecindad en la Vereda de Los Naranjos. **Personal:** (1) Conductor, (1) Coordinador de obra, (1) Residente de Obra, (1) Especialista Hidráulico de Obra, (1) Comisión de Topografía, (2) Trabajador Social, (1) Técnico SISO, (1) Biólogo, (1) Especialista Ambiental, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Especialista Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráuloco de Interventoría, (1) Trabajador Social de Interventoría, (1) Auxiliar SISO de interventoría, (2) Ayudantes, (1) Veterinario, (1) Operador de maquinaria. **Equipo:** Computador portátil de obra e interventoría, vehículo de obra e interventoría, Equipo de topografía, (1) Excavadora, (1) GPS.

Edilberto Olivera
Res. Interventoría

Jonathan A. Cano E
Res. Contratista

Miércoles, 1 de octubre 2025: **Clima:** Se inició el día soleado - seco, sin precipitaciones. **Actividades:** Se realizó la movilización de 2 excavadoras al campamento de obra de Río Piedras. Se realizan actividades de monitoreo de fauna en la zona de influencia del proyecto. Se realizó charla SST donde se habló sobre: Importancia de análisis de trabajo seguro (ATS). Se realizan jornadas del PIESPA con la comunidad de CEDI Orinoco Los Cocos (Sede Nb. 2), cuya temática corresponde a: Jornada de sensibilización educativa Ambiental; Jornada de sensibilización para el manejo adecuado y aprovechamiento de los residuos sólidos; Jornado teorico-práctica para la caracterización de los residuos sólidos. **Personal:** (1) Conductor, (1) Coordinador de obra, (1) Residente de Obra, (1) Especialista Hidráulico de Obra, (1) Comisión de Topografía, (2) Trabajador Social, (1) Técnico SISO, (1) Biólogo, (1) Especialista Ambiental, (1) Residente de interventoría, (1) Conductor de interventoría, (1) Especialista Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría, (1) Trabajador Social de Interventoría, (1) Auxiliar SISO de interventoría, (2) Ayudantes, (1) Veterinario, (3) Operador de maquinaria. **Equipo:** Computador portátil de obra e interventoría, vehículo de obra e interventoría, Equipo de topografía, (2) Excavadoras, (1) GPS.

Edilberto Olivera
Res. Interventoría

Jonathan A. Cano E
Res. Contratista

Jueves, 2 de Octubre 2025: **Clima:** Se inició el día soleado - seco, sin precipitaciones. **Actividades:** Se da inicio a las actividades de remoción y repaleo de sedimentos en el tramo K0+820 - K1+120. Se realizan actividades de monitoreo de fauna en la zona de influencia del proyecto. Se realizó charla SST donde se habló sobre: Prevención de accidentes por distracción en el trabajo. **Personal:** (1) Conductor, (1) Coordinador de obra, (1) Residente de Obra, (1) Especialista Hidráulico de obra, (1) Comisión de topografía, (2) Trabajador Social, (1) Tecnico SISO, (1) Biólogo, (1) Especialista Ambiental, (1) Residente de Interventoria, (1) Conductor de Interventoría, (1) Especialista Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría, (1) Trabajador Social de Interventoría, (1) Auxiliar SISO de interventoría, (2) Ayudantes, (1) Veterinario, (3) Operador de maquinaria. **Equipo:** Computador portátil de obra e interventoría, vehí-

culo de obra e interventoría; Equipo de topografía, (3) Excavadora, (1) GPS.

Edilberto Olivera
Res. Interventoría

Jonathan A. Cano E
Res. contratista

Viernes, 3 de octubre 2025: Clima: Se presentaron lluvias durante el día. Actividades: Se realizan actividades de remoción y repaleo de sedimentos en el tramo K0+820 - K1+120. Se realizan actividades de monitoreo de Fauna en la zona de influencia del proyecto. Se realizó charla SST donde se habló sobre: Uso seguro de herramientas, se realiza corte y bordado de manto anti socavación. Se realizan jornadas del PIESPA con la comunidad de Milagro II, cuya temática corresponde a: Jornada de sensibilización para el manejo adecuado y aprovechamiento de los residuos sólidos; Jornada teorico-práctica para la caracterización de los residuos sólidos. Personal: (1) Conductor, (1) Coordinador de obra, (1) Residente de obra, (1) Especialista hidráulico de obra, (1) Comisión de topografía, (2) Trabajador social, (1) Técnico SISO, (1) Biólogo, (1) Especialista Ambiental, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Especialista Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría, (1) Trabajador Social de Interventoría, (1) Auxiliar SISO de interventoría, (2) Ayudantes, (1) Veterinario, (3) Operador de máquinaria. Equipo: Computador portátil de obra e interventoría, vehiculo de obra e interventoría, Equipo de topografía, (3) Excavadora, (1) GPS.

Edilberto Olivera
Res. Interventoría

Jonathan A. Cano E
Res. contratista

Sábado, 4 de octubre 2025: Clima: Se inició el día soleado-seco, sin precipitaciones. Actividades: Se realizan actividades de remoción y repaleo de sedimentos en el tramo K0+820 - K1+120. Se realizan actividades de monitoreo de fauna en la zona de influencia del proyecto con la instalación de cámaras trampa en zona de parques y cerca de la desembocadura. Se realizó recolección de actas de veciadad. Personal: (1) Conductor, (1) Coordinador de Obra, (1) Residente de Obra, (1) Especialista Hidráulico de Obra, (1) Comisión de Topografía, (2) Trabajados Social, (1) Técnico SISO, (1) Biólogo, (1) Especialista Ambiental, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de interventoría, (1) Especialista Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría, (1) Trabajador Social de Interventoría, (1) Auxiliar SISO de interventoría, (2) Ayudantes, (1) Veterinario, (3) Operador de maquinaria. Equipo: Computador portátil de obra e interventoría, vehículo de obra es interventoría, Equipo de topografía, (3) Excavadora, (1) GPS.

Edilberto Olivera
Res. Interventoría

Jonathan A. Cano E
Res. contratista

Domingo, 5 de octubre 2025: No se realizaron actividades.

Edilberto Olivera
Res. Interventoría

Jonathan A. Cano E
Res. contratista

Semana No. 30 (6 de octubre 2025 - 12 de octubre 2025).

Lunes, 6 de octubre 2025: Clima: Se inició el día soleado, se presentaron precipitaciones fuertes en la tarde. Actividades: Se realizan actividades de remoción y repaleo de sedimentos en el tramo K0+820 - K1+120. Se realizan actividades de monitoreo de fauna en la zona de influencia del proyecto. Se realizó charla SST donde se habló sobre: Importancia del mantenimiento preventivo; se realiza corte y bordado de manto antisocavación. Se realizan Jornadas de PIESPA con la comunidad de JAC Los Naranjos, cuya temática corresponde a: Jornada de sensibilización educativa Ambiental; Jornada de sensibilización para la conservación y aprovechamiento del recurso hídrico y pesquero. Personal: (1) Conductor, (1) Coordinador de obra, (1) Residente de obra, (1) Especialista hidráulico de obra, (1) Comisión de topografía, (2) Trabajador Social, (1) Técnico SISO, (1) Biólogo, (1) Especialista Ambiental, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de interventoría, (1) Especialista Ambiental de interventoría, (1) Especialista Hidráulico de interventoría, (1) Trabajador social de interventoría, (1) Auxiliar SISO de interventoría, (2) Ayudantes, (1) Veterinario, (3) Operador de maquinaria. Equipo: Computador portátil de obra e interventoría, vehículo de obra e interventoría, Equipo de topografía, (3) Excavadora, (1) GPS.

Edilberto Olivera
Res. Interventoría

Jonathan A. Cano E
Res. Contratista

Martes, 7 de octubre 2025: Clima: Se inició el día nublado - húmedo, sin precipitaciones. Actividades: Se realizan actividades de remoción y repaleo de sedimentos en el tramo K0+820 - K1+120. Se realizan actividades de monitoreo de fauna en la zona de influencia del proyecto. Se realizó charla SST donde se habló sobre: Manejo seguro de equipos y maquinaria. Se realiza: corte y bordado de manto antisocavación. Personal: (1) Conductor, (2) Coordinador de obra, (1) Residente de obra, (1) Especialista Hidráulico de Obra, (1) Comisión de Topografía, (2) Trabajador Social, (1) Técnico SISO, (1) Biólogo, (1) Especialista Ambiental, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Especialista Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de interventoría, (1) Trabajador Social de interventoría, (1) Auxiliar SISO de interventoría, (2) Ayudantes, (1) Veterinario, (3) Operador de maquinaria. Equipo: Computador portátil de obra e interventoría, vehículo de obra e interventoría, Equipo de topografía, (3) Excavadora, (1) GPS.

Edilberto Olivera
Res. Interventoría

Jonathan A. Cano E
Res. Contratista

Miércoles, 8 de octubre 2025: Clima: Se inició el día nublado - húmedo, con precipitaciones. Actividades: Se realizan actividades de remoción y repaleo de sedimentos en el tramo K0+820 - K1+120. Se realizan actividades de monitoreo de Fauna en la zona de influencia del proyecto. Se realiza corte y bordado de manto antisocavación. Personal: (1) Conductor, (1) Coordinador de obra, (1) Residente de obra, (1) Especialista Hidráulico de Obra, (1) Comisión de Topografía, (2) Trabajador Social, (1) Técnico SISO, (1) Biólogo, (1) Especialista Ambiental, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Especialista Ambiental

de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría, (1) Trabajador Social de Interventoría, (1) Auxiliar SISO de interventoría, (3) Ayudantes, (1) Veterinario, (2) Operador de maquinaria. **Equipo:** Computador portátil de obra e interventoría, vehículo de obra e interventoría, Equipo de topografía, (3) Excavadora, (1) GPS.

Edilberto Olivero
Res. Interventoría

Jonathan A. Cano E
Res. contratista

Jueves 9, de octubre 2025: Clima: Se inició el día nublado y por las tardes precipitaciones. **Actividades:** Se realizan actividades de remoción y repaleo de sedimentos en el tramo K0+820 - K1+120. Se realizan actividades de monitoreo de fauna en la zona de influencia del proyecto. Se realizó charla SST donde se habló sobre: Inducción y reinducción ambiental. Se realiza corte y bordado de manto antisocavación. Se realiza reunión con personal de las fincas del margen izquierdo del río, se socializó el proyecto y su alcance. **Personal:** (1) Conductor, (1) Coordinador de obra, (1) Residente de Obra, (1) Especialista Hidráulico de Obra, (1) Comisión de Topografía, (2) Trabajador Social, (1) Técnico SISO, (1) Biólogo, (1) Especialista Ambiental, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Especialista Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría, (1) Trabajador Social de Interventoría, (1) Auxiliar SISO de interventoría, (3) Ayudantes, (1) Veterinario, (3) Operador de maquinaria. **Equipo:** Computador portátil de obra e interventoría, vehículo de obra e interventoría, Equipo de topografía, (3) Excavadora, (1) GPS.

Edilberto Olivero
Res. Interventoría

Jonathan A. Cano E
Res. contratista

Viernes, 10 de octubre 2025: Clima: Se inició el día nublado - húmedo, con precipitaciones leves. **Actividades:** Se realizan actividades de remoción y repaleo de sedimentos en el tramo K0+820-K1+120. Se realizan actividades de monitoreo de Fauna en la zona de influencia del proyecto. Se realizó charla SST donde se habló sobre: Pausas activas y ergonomía. Se realiza corte y bordado de manto antisocavación. **Personal:** (1) Conductor, (1) Coordinador de Obra, (1) Residente de obra, (1) Especialista Hidráulico de Obra, (1) Comisión de Topografía, (2) Trabajador Social, (1) Técnico SISO, (1) Biólogo, (1) Especialista Ambiental, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Especialista Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de interventoría, (1) Trabajador Social de Interventoría, (1) Auxiliar SISO de Interventoría, (3) Ayudantes, (1) Veterinario, (3) Operador de maquinaria. **Equipo:** Computador portátil de obra e interventoría, vehículo de obra e interventoría, Equipo de topografía, (3) Excavadora, (1) GPS.

Edilberto Olivero
Res. Interventoría

Jonathan A. Cano E
Res. contratista

Sábado, 11 de octubre 2025: Clima: Se inició el día soleado - seco, sin precipitaciones. **Actividades:** Se realizan actividades de remoción y repaleo de sedimentos en el tramo K0+820 - K1+120. Se realizan

actividades de monitoreo de Fauna en la zona de influencia del proyecto. Se realiza corte y bordeado de manto antisocavación. **Personal**: (1) Conductor, (1) Coordinador de Obra, (1) Residente de Obra, (1) Especialista Hidráulico de Obra, (1) Comisión de Topografía, (2) Trabajador Social, (1) Técnico SISO, (1) Biólogo, (1) Especialista Ambiental, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Especialista Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría, (1) Trabajador Social de Interventoría, (1) Auxiliar SISO de Interventoría, (3) Ayudantes, (1) Veterinario, (3) Operador de maquinaria. **Equipo**: Computador portátil de obra e interventoría, vehículo de obra e interventoría, Equipo de topografía, (3) Excavadora, (1) GPS.

Edilberto Olivera
Res. Interventoría

Jonathan A. Cano E
Res. contratista

Domingo, 12 de Octubre 2025: No se realizaron actividades.

Edilberto Olivera
Res. Interventoría

Jonathan A. Cano E
Res. contratista

Semana No. 31 (13 de octubre 2025- 19 de octubre 2025)

Lunes, 13 de octubre 2025: No se realizaron actividades

Edilberto Olivera
Res. Interventoría

Jonathan A. Cano E
Res. contratista

Martes, 14 de octubre 2025: Clima: Se inició el día soleado - seco, sin precipitaciones. **Actividades**: Se realizan actividades de remoción y Repaleo de sedimentos en el tramo K0+820 - K1+120. Se realizan actividades de monitoreo de Fauna en la zona de influencia del proyecto. Se realizo charla SST donde se habló sobre: Botiquín y primeros auxilios básicos. Se realiza corte y bordeado de manto anti socavación. **Personal**: (1) Conductor, (1) coordinador de obra; (1) Especialista Hidraulico de obra, (1) Comisión de Topografía, (2) Trabajador Social, (1) Técnico SISO, (1) Biólogo, (1) Especialista Ambiental, (1) Residente de interventoría, (1) conductor de interventoría, (1) Especialista Ambiental de interventoría, (1) Especialista Hidráulico de interventoría, (1) Trabajador social de interventoría, (1) Auxiliar SISO de interventoría, (3) Ayudantes, (1) veterinaria, (3) Operador de maquinaria. **Equipo**: Computador portátil de obra e interventoría, vehículo de obra e interventoría, Equipo de topografía, (3) excavadora, (1) GPS.

Edilberto Olivera
Res. Interventoría

Jonathan A. Cano E
Res. contratista

Miércoles, 15 de octubre 2025: Clima: Se inició el día soleado-seco, sin precipitaciones. **Actividades:** Se realizan actividades de remoción y Repaleo de sedimentos en el tramo K0+820 - K1+120. Se realizan actividades de monitoreo de fauna en la zona de influencia del proyecto. Se realiza corte y bordado de manto anti socavación. Se realizan las jornadas del PIESPA con la comunidad de IED Quinto centenario, cuya temática corresponde a: Actividades de cierre de jornada educativa ambiental, a través de la transformación del material reciclable, Jornada de sensibilización "Ambiental y Cultural" para la construcción de acciones que generen grandes cambios en el cuidado y protección de los cuerpos de agua y jornada de Adaptación al cambio climático asociado a los cuerpos de agua. **Personal:** (1) Conductor, (1) Coordinador de obra, (1) Residente de obra, (1) Especialista Hidráulico de obra, (1) Comisión de Topografía, (2) Trabajador Social, (1) Técnico SISO, (1) Biólogo, (1) Especialista Ambiental, (1) Residente Interventoría (1) Conductor de interventoría, (1) Especialista Ambiental de interventoría, (1) Especialista Hidráulico de interventoría, (1) Trabajador Social de interventoría, (1) Auxiliar SISO de interventoría, (3) Ayudantes, (1) veterinaria, (3) operador de maquinaria. **Equipo:** Computador portátil de obra e interventoría, Vehículo de obra e interventoría, Equipo de topografía, (3) Excavadora, (1) GPS.

Ejecuta
Ed. Liberto Olivera.
Res. Interventoría

Jonathan A. Cano E
Res. contratista

Jueves, 16 de Octubre 2025: Clima: Se inició el día nublado-húmedo, y por la tarde precipitaciones. **Actividades:** Se realizan actividades de remoción y Repaleo de sedimentos en el tramo K0+820 - K1+120. Se realizan actividades de monitoreo de fauna en la zona de influencia del proyecto. Se realiza corte y bordado de manto anti socavación. Se realizan las jornadas del PIESPA con la comunidad IED Orinoco Los Cocos (Sede No.2), cuya temática corresponde a: de Acompañamiento - Actividades de cierre de jornada educativa ambiental, a través de la transformación del material reciclable, Jornada de sensibilización "Ambiental y Cultural" para la construcción de acciones que generen grandes cambios en el cuidado y protección de los cuerpos de agua y jornadas de Adaptación al cambio climático asociado a los cuerpos de agua. **Personal:** (1) Conductor, (1) Coordinador de obra, (1) Residente de obra, (1) Especialista Hidráulico de obra, (1) Comisión de Topografía, (2) Trabajador Social, (1) Técnico SISO, (1) Biólogo, (1) Especialista Ambiental, (1) Residente de interventoría, (1) Conductor de interventoría, (1) Especialista Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de interventoría, (1) Trabajador Social de interventoría, (1) Auxiliar SISO de interventoría, (3) Ayudantes, (1) veterinaria, (3) operador de maquinaria. **Equipo:** Computador portátil de obra e interventoría, vehículo de obra e interventoría, Equipo de topografía, (3) Excavadora, (1) GPS.

Eduardo Heriberto Olivera
Res. Interventoría

Jonathan A. Lara E
Res. contratista

Viernes, 17 de octubre 2025: Clima: Se inició el día soleado-seco, sin precipitaciones. **Actividades:** Se realizan actividades de remoción y Repaleo de sedimentos en el tramo K0+820-K1+120. Se realizan actividades de monitoreo de Fauna en la zona de influencia del proyecto. Se realiza corte y bordeado de manto anti socavación. Se realizan las jornadas del PIESPA con la comunidad de Milagro II, cuya temática corresponde a:-Jornada de Sensibilización educativa ambiental "Con la vista al río" y jornada de Acompañamiento-Actividades de cierre de jornada educativo ambiental, a través de la transformación del material reciclable. **Personal:** (1)Conductor, (1)Coordinador de obra, (1)Residente de obra, (1)Especialista Hidráulico de obra, (1)Comisión de topografía, (2)Trabajador Social, (1)Técnico SISO, (1)Biólogo, (1)Especialista Ambiental, (1)Residente de interventoría, (1)Conductor de interventoría, (1)Especialista Ambiental de interventoría, (1)Especialista Hidráulico de interventoría, (1)Trabajador Social de interventoría, (1)Auxiliar SISO de interventoría, (3)Ayudantes, (1)veterinaria, (3)Operador de maquinaria **Equipo:** Computador portátil de obra e interventoría, vehículo de obra e interventoría, Equipo de topografía, (3)Excavadora, (1)GPS.

Eduardo Heriberto Olivera.
Res. Interventoría

Jonathan A. Lara E
Res. contratista

Sábado, 18 de Octubre 2025: Clima: Se inicia el día soleado-seco, sin precipitaciones. **Actividades:** Se realizan actividades de remoción y Repaleo de sedimentos en el tramo K0+820-K1-120. Se realizan actividades de monitoreo de Fauna en la zona de influencia del proyecto. Se realiza corte y bordeado de manto anti socavación. **Personal:** (1) Conductor, (1)Coordinador de Obra, (1) Residente de obra, (1)Especialista Hidráulico de obra, (1) Comisión de Topografía, (2) Trabajador Social, (1) Técnico SISO, (1)Biólogo, (1)Especialista Ambiental, (1)Residente de interventoría, (1)Conductor de interventoría, (1)Especialista Ambiental de interventoría, (1)Especialista Hidráulico de interventoría, (1)Trabajador Social de interventoría, (1) Auxiliar SISO de interventoría, (3)Ayudantes, (1) veterinaria, (3) Operador de maquinaria. **Equipo:** Computador portátil de obra e interventoría, vehículo de obra e interventoría, equipo de topografía, (3)Excavadora, (1)GPS.

Eduardo Heriberto Olivera.
Res. Interventoría

Jonathan A. Lara E
Res. contratista

Domingo, 19 de octubre 2025: No se realizaron actividades.

Edilberto Olivera
Res. Interventoría

Jonathan A. Cano E
Res. contratista

Semana No. 32 (20 de Octubre 2025 - 26 de Octubre 2025)

Lunes, 20 de Octubre 2025: Clima: Se inició el día nublado, se presentaron precipitaciones en la tarde. Actividades: Se realizan actividades de remoción y Repoleo de sedimentos en el tramo K0+820 - K1+120. Se realizan actividades de monitoreo de fauna en la zona de influencia del proyecto. Se realizo charla SST donde se habló sobre: Protección contra caídas de objetos. Se realiza corte y bordado de manto anti socavación. Se realizan las Jornadas del PIESPA con la comunidad de JAC Los Naranjos, cuya temática corresponde a: Jornada de sensibilización para la conservación de la fauna y flora existentes en los cuerpos de agua. Personal: (1) Conductor, (1) Coordinador de obra, (1) Residente de obra, (1) Especialista Hidráulico de obra, (1) Comisión de Topografía, (2) Trabajador Social, (1) técnico SISO, (1) Biólogo, (1) Especialista Ambiental, (1) Residente de interventoría, (1) Conductor de interventoría, (1) Especialista Ambiental de interventoría, (1) Especialista Hidráulico de interventoría, (1) Trabajador Social de interventoría, (1) Auxiliar SISO de interventoría, (3) Ayudantes, (1) veterinaria, (3) Operador de maquinaria. Equipo: Computador portátil de obra e interventoría, vehículo de obra e interventoría, Equipo de topografía, (3) Excavadora, (1) GPS

Edilberto Olivera
Res. Interventoría

Jonathan A. Cano E
Res. contratista

Martes, 21 de Octubre 2025: Clima: Se inició el día nublado-húmedo, sin precipitaciones. Actividades: Se realizan actividades de remoción y Repoleo de sedimentos en el tramo K0+820 - K1+120. Se realizan actividades de monitoreo de Fauna en la zona de influencia del proyecto. Se realizo Charla SST donde se habló sobre: Hábitos de vida saludable. Se realiza corte y bordado de manto anti socavación. Personal: 1) Conductor, 1) Coordinador de Obra, (1) Residente de obra, (1) Especialista Hidráulico de obra, (1) Comisión de Topografía, (2) Trabajador Social, (1) Técnico SISO, (1) Biólogo, (1) Especialista Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de interventoría, (1) Trabajador Social de interventoría, (1) Auxiliar SISO de interventoría, (3) Ayudantes, (1) Veterinaria, (3) Operador de maquinaria. Equipo: Computador portátil de obra e interventoría, vehículo de obra e interventoría, Equipo de topografía, (3) Excavadora, (1) GPS.

Edilberto Olivera
Res. Interventoría

Jonathan A. Cano E
Res. contratista

Miercoles, 22 de Octubre 2025: Clima: Se inicio el día Soleado - Seco, Sin precipitaciones.

Actividades: Se realizan actividades de remoción y Repaleo de sedimientos en el tramo K0+820-K1+120. Se realizan actividades de monitoreo de Fauna en la zona de influencia del proyecto. Se realiza charla SST donde se habla sobre comunicación efectiva en seguridad. Se realiza corte y bordado de manto anti socavación.

Personal: (1) Conductor, (1) Coordinador de obra, (1) Residente de obra, (1) Especialista Hidráulico de obra, (1) Comisión de topografía, (2) Trabajador Social, (1) Técnico SISO, (1) Biólogo, (1) Especialista Ambiental, (1) Residente de interventoría, (1) Conductor de interventoría, (1) Especialista Ambiental de interventoría, (1) Especialista Hidráulico de interventoría, (1) Trabajador social de interventoría, (1) Auxiliar SISO de interventoría, (3) Ayudantes, (1) Veterinario, (3) Operador de maquinaria **Equipo:** Computador portátil de obra e interventoría, vehículo de obra e interventoría, Equipo de topografía, (3) Excavadora, (1) GPS

Edilberto Olivera. Res. Interventoría

Jonathan A. Cano E. Res. Contratista

Jueves, 23 de Octubre 2025: Clima: Se inició el día soleado - seco, sin precipitaciones.

Actividades: Se realizan actividades de remoción y Repaleo de sedimentos en el tramo K0+820-K1+120. Se realizan actividades de monitoreo de Fauna en la zona de influencia del proyecto. Se realizo charla SST donde se habló sobre: Transporte y almacenamiento de materiales. Se realiza corte y bordado de manto anti socavación. Se realizan las jornadas del PIESPA con la comunidad de JAC Llanzaneres, cuya temática corresponde a: Jornada de sensibilización educativa ambiental "CON VISTA AL RIO." **Personal:** (1) Conductor, (1) Coordinador de obra, (1) Residente de obra, (1) Especialista Hidráulico de obra, (1) Comisión de Topografía, (2) Trabajador social, (1) Técnico SISO, (1) Biólogo, (1) Especialista Ambiental, (1) Residente de interventoría, (1) Conductor de interventoría, (1) Especialista Ambiental de interventoría, (1) Especialista Hidráulico de interventoría, (1) Trabajador social de interventoría, (1) Auxiliar SISO de interventoría, (3) Ayudantes, (1) Veterinario, (2) Operador de maquinaria. **Equipo:** Computador portátil de obra e interventoría, vehículo de obra e interventoría, Equipo de topografía, (2) Excavadoras, (1) GPS, (2) Cámara trampa.

Edilberto Olivera. Res. Interventoría

Jonathan A. Cano E. Res. Contratista

Viernes, 24 de Octubre 2025: Clima: Se inició el día soleado - seco, sin precipitaciones.

Actividades: Se realizan actividades de remoción y Repaleo de sedimentos en el tramo K0+820-K1+120. Se realizan actividades de monitoreo de Fauna en la zona de influencia del proyecto. Se realizo charla SST donde se habló sobre: Uso, ajuste y

Responsabilidad sobre la dotación. Se realiza corte y bordado de manto anti socavación. Se realizan las jornadas del PIESPA con la comunidad de IED Liceo del Sur, cuya temática corresponde a: Jornada de sensibilización para la gestión del riesgo de desastres, asociados a los cuerpos de agua; Taller para el fortalecimiento de las temáticas educativo ambientales contenidas en los cartillas "Aprendiendo para proteger las fuentes Hídricas". Se realizó visita técnica con especialista hidráulico de obra a punto de inicio de geocontenedores en río Piedras, y visita de estado de Río Buitrago. **Personal:** (1) Conductor, (1) Coordinador de obra, (1) Residente de obra, (1) Especialista Hidráulico de obra, (1) Comisión de topografía, (2) Trabajador Social, (1) Técnico SISO, (1) Biólogo, (1) Especialista Ambiental, (1) Residente de interventoría, (1) Conductor de interventoría, (1) Especialista Ambiental de interventoría, (1) Especialista Hidráulico de interventoría, (1) Trabajador Social de interventoría, (1) Auxiliar SISO de interventoría, (3) Ayudantes, (1) veterinaria, (3) operador de maquinaria. **Equipo:** Computador portátil de obra e interventoría, vehículo de obra e interventoría, Equipo de topografía, (2) Excavadora, (1) GPS.

Edilberto Olivera. Res. Interventoría

Jonathan A. Lara E. Res. contratista

Sábado, 25 de octubre 2025: Clima: Se inicia el día soleado-seco, sin precipitaciones. **Actividades:** Se realizan actividades de remoción y Reporles de sedimentos en el tramo K0+020 - K1+120. Se realizan actividades de monitoreo de Fauna. En la zona de influencia del proyecto, se realiza revisión de estado de cámaras trampa. Se realiza corte y bordado de manto anti socavación. **Personal:** (1) Conductor, (1) Coordinador de obra, (1) Residente de obra, (1) Especialista Hidráulico de obra, (1) Comisión de Topografía, (2) Trabajador Social, (1) Técnico SISO, (1) Biólogo, (1) Especialista Ambiental, (1) Residente de interventoría, (1) Conductor de interventoría, (1) Especialista Ambiental de interventoría, (1) Especialista Hidráulico de interventoría, (1) Trabajador Social de interventoría, (1) Auxiliar SISO de interventoría, (3) Ayudantes, (1) veterinaria, (3) operador de maquinaria. **Equipo:** Computador portátil de obra e interventoría, vehículo de obra e interventoría, Equipo de topografía, (2) Excavadora, (1) GPS.

Edilberto Olivera. Res. Interventoría

Jonathan A. Lara E. Res. contratista

Domingo, 26 de Octubre 2025: No se realizaron actividades.

Efraín Heriberto Olivera. Res. Interventoría

Jonathan A. Cano E. Res. contratista

Semana No 33 (27 de Octubre 2025 - 2 de noviembre 2025).

Lunes, 27 de Octubre 2025: Clima: Se inició el día soleado-seco, sin precipitaciones. Actividades: Se realizan actividades de remoción y Repaleo de sedimentos en el tramo K0+820 - K1+120. Se realizan actividades de monitoreo de Fauna en la zona de influencia del proyecto, se realiza captura y reubicación de caiman Crocodilus que se encontraba en la zona de intervención. Se realiza charla SST donde se habló sobre: Capacitación por parte de psicóloga de la ARL Sura. Se realiza corte y bordado de manto antisocavación. Personal: (1) Conductor, (1) Coordinador de obra, (1) Especialista Hidráulica de obra, (1) Comisión de Topografía, (2) Trabajador Social, (1) Técnico SISO, (1) Biólogo, (1) Especialista Ambiental, (1) Residente de interventoría, (1) Conductor de interventoría, (1) Especialista Ambiental de interventoría, (1) Especialista Hidráulica de interventoría, (1) Trabajador social de interventoría, (1) Auxiliar SISO de interventoría, (5) Ayudantes, (1) Veterinaria, (3) Operador de maquinaria. Equipo: Computador portátil de obra e interventoría, Vehículo de obra e interventoría, Equipo de topografía, (2) Excavadoras, (1) GPS.

Efraín Heriberto Olivera. Res. Interventoría

Jonathan A. Cano E. Res. contratista

Martes, 28 de Octubre 2025: Clima: Se inició el día soleado y por la tarde precipitaciones. Actividades: Se realizan actividades de remoción y Repaleo de sedimentos en el tramo K0+820 - K1+120. Se realizan actividades de monitoreo de Fauna en la zona de influencia del proyecto. Se realiza corte y bordado de manto anti socavación. Se realizan las jornadas del PIESPA con la comunidad de CEDI Orinoco los Cocos (Sede No 2), cuya temática corresponde a: Jornada de sensibilización para la gestión del riesgo de desastres asociados a los cuerpos de agua. Se realizo recorrido de campo en predios de la comunidad de los Toino en Parque Tayrona como parte del compromiso adquirido de seguimiento en la reunión organizada en Corpamag. Personal: (1) Conductor, (1) Coordinador de obra, (1) Residente de obra, (1) Especialista Hidráulica de obra, (1) Comisión de Topografía, (1) Trabajador Social, (1) Técnico SI (1) Biólogo, (1) Especialista Ambiental, (1) Residente de interventoría, (1) Conductor de interventoría (1) Especialista Ambiental de interventoría, (1) Especialista Hidráulica de interventoría, (1) Trabajad Social de interventoría, (1) Auxiliar SISO de interventoría (5) Ayudantes, (1) veterinaria, (3) operador de maquinaria. Equipo: Computador portátil de obra e interventoría vehículo de obra e interventoría, Equipo de topografía, (2) Excavadoras, (1) GPS.

Efraín Fabián Oliveros
Res. Interventoría

Jonathan A. Cano E
Res. contratista

Miércoles, 29 de Octubre 2025: Clima: Se inicia el día soleado-seco sin precipitaciones. **Actividades:** Se realizan actividades de remoción y Reparleo de sedimentación en el tramo K0+820 - K1+120. Se realizan actividades de monitoreo de Fauna en la zona de influencia del proyecto. Se realiza charla SST donde se habló sobre: Seguridad en labores de mantenimiento. Se realiza corte y bordado de manto anti socavación. Se realizan las jornadas del PIESPA con la comunidad de IED Quinto Centenario, cuya temática corresponde a: Jornada de sensibilización para la gestión del riesgo de desastres, asociados a los cuerpos de agua; Taller para el fortalecimiento de los temas educativos ambientales contenidos en las cartillas: "Aprendiendo para proteger las fuentes Hídricas." **Personal:** (1) Conductor, (1) Coordinador de obra, (1) Residente de Obra, (1) Especialista Hidráulico de de obra, (1) Comisión de Topografía, (1) Trabajador Social, (1) Técnico SISO, (1) Biólogo, (1) Especialista Ambiental, (1) Residente de interventoría, (1) Conductor de interventoría, (1) Especialista Ambiental de interventoría, (1) Especialista Hidráulico de interventoría, (1) Trabajador social de interventoría, (1) Auxiliar SISO de interventoría, (5) Ayudantes, (1) Veterinaria, (3) Operador de maquinaria. **Equipo:** Computador portátil de obra e interventoría, vehículo de obra e interventoría, Equipo de topografía, (2) excavadora, (1) GPS.

Efraín Fabián Oliveros
Res. Interventoría

Jonathan A. Cano E
Res. contratista

Jueves, 30 de Octubre 2025: Clima: Se inició el día soleado-seco, sin precipitaciones. **Actividades:** Se realizan actividades de remoción y Reparleo de sedimentos en el tramo K0+820 - K1+120. Se realizan actividades de monitoreo de Fauna en la zona de influencia del proyecto. Se realizo charla SST donde se habló sobre: Análisis de trabajo seguro (ATS). Se realiza corte y bordado de manto anti socavación. Se realiza el inicio de la instalación del muro en gavacontenedor desde la abscisa K0+830 con la instalación del primer nivel. **Personal:** (1) conductor, (1) Coordinador de obra, (1) Residente de obra, (1) Especialista Hidráulico de obra, (1) Comisión de Topografía, (1) Trabajador social, (1) Técnico SISO, (1) Biólogo, (1) Especialista Ambiental, (1) Residente de interventoría, (1) Conductor de interventoría, (1) especialista Ambiental de interventoría, (1) Especialista Hidráulico de interventoría, (1) Trabajador social de interventoría, (1) Auxiliar SISO de interventoría, (5) Ayudantes, (1) Veterinaria, (3) Operador de maquinaria. **Equipo:** Computador portátil de obra e interventoría, Vehículo de oba e interventoría, equipo de topografía, (2) Excavadora, (1) GPS.

Eduardo Heriberto Olivera
Res. Interventoría

Jonathan A. Lara E
Res. contratista

Viernes, 31 de octubre 2025: Clima: Se inicia el día soleado - seco, sin precipitaciones. Actividades: Se realizan actividades de remoción y Repaleo de sedimentos en el tramo K0+820 - K1+120. Se continua con la instalación de muro en geocontenedor, con la instalación de sacos en el primer nivel con sus respectivos mantos. Se realizan actividades de monitoreo de Fauna en la zona de influencia del proyecto. Se realizo charla SST donde se hablo sobre: Prohibición de la cacería furtiva y protección de fauna silvestre. Se realiza corte y bordado de imprimación. Se realizan las jornadas del PIESPA con la comunidad de IED Milagro II, cuya temática corresponde a: Jornada de sensibilización para la gestión del riesgo de desastres, asociados a los cuerpos de agua. Taller para el fortalecimiento de los temas educativos ambientales contenidos en las cartillas "Aprendiendo para proteger las fuentes Hídricas." Se realizo recorrido de campo en Rio Tanzanares acompañado con personal de Pacsa, Atesa y Gestión ambiental Corpamag, para identificar puntos de posible limpieza manual. **Personal:** (1) Conductor, (1) Coordinador de obra, (1) Residente de obra, (1) Especialista Hidráulico de obra, (1) Comisión de topografía, (1) Trabajador Social, (1) Técnico SISO, (1) Biólogo, (1) Especialista Ambiental, (1) Residente de interventoría, (1) Conductor de interventoría, (1) Especialista Ambiental de interventoría, (1) Especialista Hidráulico de interventoría, (1) Trabajador social de interventoría, (1) Auxiliar SISO de interventoría, (5) Ayudantes, (1) veterinario, (3) Operador de maquinaria. **Equipo** Computador portátil de obra e interventoría, vehículo de obra e interventoría, Equipo de topografía, (2) Excavadora, (1) GPS.

Eduardo Heriberto Olivera
Res. Interventoría

Jonathan A. Lara E
Res. contratista

ANEXO No. 3

PERSONAL DE OBRA

Dirección: Calle 24 No 2-66 Ed. Cámara de Comercio, Santa Marta
Email: consorcioicasm@gmail.com

ANEXO No.3
CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO ICASM2023

ENTIDAD EJECUTORA: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG)

MES DEL INFORME: 8 **CONTRATO DE OBRA No.** LP 006 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO ICASM2023

VIGENCIA: 2025 **PROYECTO:** INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CM 007 DE 2023 **INTERVENTOR:** INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S

NOMBRE	CARGO	oct-25																														
		M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ANA MILAGRO MARENCO CABALLERO	Profesional SST	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
LUIS FERNANDO OCHOA MARULANDA	Director de obra	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
JONATHAN ANTONIO CARO ESCOBAR	Residente de Obra	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
ROSA ELVIRA VILLAMIZAR	Especialista Ambiental	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
DANILO GREGORIO RODRIGUEZ CORREA	Especialista Hidraulico	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
ANDRES FELIPE GIRALDO PEREZ	Trabajador Social	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
ANGELA MARIA FERNANDEZ FAJARDO	Ing. Topografo	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
SANTIAGO JOSE OSPINO URUEÑA	Coordinador de Obra	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
RAFAEL PACHECO DE LEON	Inspector de Obra	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
DAYANA CERVANTES GIRALDO	Técnico SST	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
DAXY NIZAYEN AGUAS BELEÑO	Ingeniera Ambiental	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
LUISA FERNANDA CAMACHO ARCILA	Aux. Trabajador Social	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X				
ANDRES PONTON ALBOR	Biologo	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
SERGIO ANDRÉS MENDIVIL RIVAS	Biologo	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
ABDON SEGUNDO PERALTA ATENCIO	Veterinario	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
JOSE FELIPE VENECIA MONTENEGRO	Aux. topográfo	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
YEISON ATENCIO BARRIOS	Oficial de obra	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
JOSE FERNANDO PADILLA GUTIERREZ	Oficial de obra	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
JAVIER HERRERA	Ayudante																								X	X		X	X	X	X	X
NESTOR HERRERA	Ayudante							X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
YEISON HERRERA	Ayudante																								X	X		X	X	X	X	X
HAIDER FARID URIELES CARRILLO	Operador	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
OLIVER JOSÉ BARRIOS CONTRERAS	Operador	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
AGUSTIN ORTIZ PACHECO	Operador		X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
GUSTAVO ERNESTO COTES RODRIGUEZ	Conductor	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X

OBSERVACIONES: **NINGUNA**

Firma:
Nombre: JONATHAN ANTONIO CARO ESCOBAR
Residente de Obra
T.P. 08202-242612 ATL

Firma
Nomb EDILBERTO SMITH OLIVEROS ZAMORA
Residente de Interventoría
Matrícula N 08202-181155 ATL

ANEXO No. 4

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Dirección: Calle 24 No 2-66 Ed. Cámara de Comercio, Santa Marta
Email: consorcioicasm@gmail.com

ANEXO No.4
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CONSORCIO ICASM2023

FECHA: 31 (Día) OCTUBRE (Mes) 2025 (Año)

ENTIDAD EJECUTORA: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG)

CONTRATO DE OBRA No: LP 006 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO ICASM2023 **VIGENCIA:** 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: CM 007 DE 2023 **INTERVENTOR:** INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S **INFORME MENSUAL No.** 8

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	oct-25																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	22	24	24	22	23	22	23	23	24	24	24	24	24	23	24	24	24	22	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	731
Nublado / Llovizna			1			1	1	1	1	1						1				1	1											9
Lluvia Fuerte			1			1		1												1												4
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744

NOTA: EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre: JONATHAN ANTONIO CARO ESCOBAR
Residente de Obra
Matrícula No.: 08202-242612 ATL

Firma
Nombre: EDILBERTO SMITH OLIVEROS ZAMORA
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 08202-181155 ATL

ANEXO No. 5

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA

Dirección: Calle 24 No 2-66 Ed. Cámara de Comercio, Santa Marta
Email: consorcioicasm@gmail.com

ANEXO No.5
MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATO DE OBRA

ENTIDAD EJECUTORA: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG)

MES DEL INFORME 8 **CONTRATO DE OBRA No.** LP 006 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO ICASM2023

VIGENCIA: 2025 **PROYECTO:** INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CM 007 DE 2023 **INTERVENTOR:** INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO	oct-25																														
	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
EXCAVADORA HYNDAI HX220S	I	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
EXCAVADORA HYNDAI R220LC-9S	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
EXCAVADORA HYNDAI HX220S	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	I	I	I		I	I	I	I	I
EQUIPO DE TOPOGRAFÍA	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES: ACTIVO=A, EN REPARACIÓN=R, INACTIVO=I.

Firma:
Nombre: JONATHAN ANTONIO CARO ESCOBAR
Residente de Obra
T.P. 08202-242612 ATL

Firma
Nomt EDILBERTO SMITH OLIVEROS ZAMORA
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 08202-181155 ATL

ANEXO No. 6

SEGURIDAD SOCIAL

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1083009348
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANA MILAGRO MARENCO CABALLERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CALLE 76 65 43	TELÉFONO:	3008654
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7991410931**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/12		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1922098142	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 99.100
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 99.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1083009348	MARENCO CABALLERO ANA MILAGRO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	5	$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 504.900

Certificado de Aportes

Se certifica que ANDRES FELIPE GIRALDO PEREZ identificado(a) con CC 1082968730 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO ICASM 2023 NI 901782970

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-10	2025-11	1921778433	9494434666	E	2025-11-12																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$1,423,500	$227,800
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,423,500	$99,100
CCF	CAJAMAG	30	4%	$1,423,500	$57,000
EPS	SANITAS	30	4%	$1,423,500	$57,000

Este certificado se expide el día 2025-11-19 a las 10:27.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **ANGELA MARIA FERNANDEZ FAJARDO**, identificada con **CC** número **52934912**, aportó por **ANGELA MARIA FERNANDEZ FAJARDO** identificado(a) con **CC** número **52934912** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para el periodo de pensión de 2025-10 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,423,500	0.12500	$178,000	$0	$0	Octubre - 2025	90798691	31/10/2025	No
231001	Colfondos	59															0		30	$1,423,500	0.16000	$227,800	$0	$0	Octubre - 2025	90798691	31/10/2025	No
14-11	ARL SURA	59															0		30	$1,423,500	0.00522	$7,500	$0	$0	Octubre - 2025	90798691	31/10/2025	No

PAGADA

El presente certificado se expide a los **31** días del mes **October** de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

icontec ISO 9001 CO-SC5852-16
icontec ISO / IEC 27001 CO-SI006-1

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	84456544
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CHRISTIAN DARO LOPEZ CLAVIJO
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA	DEPARTAMENTO:	MAGDALENA
DIRECCIÓN:	MZ 18 CASA 8 CISNE	TELÉFONO:	4000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4629514216**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/06			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9994593164

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 300.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300.800	$ 0	$ 300.800
SUBTOTALES:										**$ 300.800**	**$ 0**	**$ 300.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 235.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 235.000	$ 0	$ 0	$ 235.000
SUBTOTALES:													**$ 235.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 235.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 45.800	$ 45.800	$ 0	$ 0	$ 45.800
SUBTOTALES:									**$ 45.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 45.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 84456544	LOPEZ CLAVIJO CHRISTIAN DARIO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.880.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.880.000	$ 300.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 300.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.880.000	$ 235.000	$ 0	$ 235.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.880.000	84456544	$ 45.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 581.600

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-14, 02:15:34 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1077257182

Periodo Cotización: octubre de 2025 **Periodo Servicio:** octubre de 2025

PAGADO 14/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EUGENIO JOSE PRADA DAZA		
Documento	CC19145528	**Dirección**	CL 76 #54 - 11
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6692364
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 19145528	EUGENIO JOSE PRADA DAZA	57	02																	0	0	30	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 1.800.000	$ 225.000	0,522	$ 1.800.000	$ 9.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 234.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 0	$ 0	$ 225.000	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 234.400	$ 700	$ 235.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Certificado de Aportes

Se certifica que JONATHAN ANTONIO CARO ESCOBAR identificado(a) con CC 1129567184 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO ICASM 2023 NI 901782970

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-10	2025-11	1921778433	9494434666	E	2025-11-12																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,300,000	$368,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$2,300,000	$160,100
CCF	CAJAMAG	30	4%	$2,300,000	$92,000
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$2,300,000	$92,000

Este certificado se expide el día 2025-11-19 a las 10:28.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que PANAMERICAN DREGING & ENGINEERING S.A.S identificado(a) con NI 806003450 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUIS FERNANDO OCHOA MARULANDA identificado(a) con CC 73113864

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9494595002	1928045726	E	2025-11-14	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	$7,700,000	4%	$308,000
9494595002	1928045726	E	2025-11-14	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	$7,700,000	16%	$1,232,000
9494595002	1928045726	E	2025-11-14	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-10	30																	$7,700,000		$38,500
9494595002	1928045726	E	2025-11-14	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-10	30																	$7,700,000		$38,500
9494595002	1928045726	E	2025-11-14	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-10	30																	$0	0%	$0
9494595002	1928045726	E	2025-11-14	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-10	30																	$0	0%	$0
9494595002	1928045726	E	2025-11-14	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	$7,700,000	4.35%	$335,000
9494595002	1928045726	E	2025-11-14	CCF	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	$7,700,000	4%	$308,000

Este certificado se expide el día 2025-11-21 a las 08:27.

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1082980516		VILLAMIZAR SIERRA ROSA ELVIRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 33A #17-92	SANTA MARTA-MAGDALENA	4000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1918126931	9494355164	I	2025/11/07	2025/11/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	3	$414,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	1082980516 VILLAMIZAR ROSA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1082980516		VILLAMIZAR SIERRA ROSA ELVIRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 33A #17-92	SANTA MARTA-MAGDALENA	4000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1918126931	9494355164	I	2025/11/07	2025/11/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	3	$414,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$500	$0	$228,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$500	$0	$228,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$100	$0	$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$400	$0	$178,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$400	$0	$178,400
TOTAL				**1**	**$413,300**	**$1,000**	**$0**	**$414,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901782970	2	CONSORCIO ICASM 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 24 #2-66	SANTA MARTA-MAGDALENA	4229885	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1921778433	9494434666	E	2025/11/20	2025/11/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$6,558,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (15 Afiliados)																								**$20,491,100**	**$3,279,000**			**$21,991,100**	**$880,200**			**$21,931,788**	**$877,800**			**$21,991,100**		**$1,521,100**		**$0**	**$0**		**$6,558,100**
Centro de Trabajo: Principal (15 Afiliados)																								**$20,491,100**	**$3,279,000**			**$21,991,100**	**$880,200**			**$21,931,788**	**$877,800**			**$21,991,100**		**$1,521,100**		**$0**	**$0**		**$6,558,100**
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (15 Afiliados)																								**$20,491,100**	**$3,279,000**			**$21,991,100**	**$880,200**			**$21,931,788**	**$877,800**			**$21,991,100**		**$1,521,100**		**$0**	**$0**		**$6,558,100**
1	CC	1051677523	AGUAS DAXY																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
2	CC	1192808247	ATENCIO YEISON																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
3	CC	1083033467	CAMACHO LUISA		X															X	23030 1	27	$1,281,150	$205,000	ESSC24	27	$1,281,150	$51,300	CCF33	27	$1,364,188	$54,600	14-11	27	$1,281,150	6.960%	$89,200	27	$0	$0	Si	$400,100
4	CC	1129567184	CARO JONATHAN																		23030 1	30	$2,300,000	$368,000	EPS010	30	$2,300,000	$92,000	CCF33	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	6.960%	$160,100	30	$0	$0	Si	$712,100
5	CC	1004424744	CERVANTES DAYANA																		23030 1	27	$1,281,150	$205,000	EPS010	27	$1,281,150	$51,300	CCF33	27	$1,281,150	$51,300	14-11	27	$1,281,150	6.960%	$89,200	27	$0	$0	Si	$396,800
6	CC	1004424744	CERVANTES DAYANA											X							23030 1	3	$142,350	$22,800	EPS010	3	$142,350	$5,700	CCF33	0	$0	$0	14-11	3	$142,350	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$28,500
7	CC	1082968730	GIRALDO ANDRES																		23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
8	CC	1082848976	HERRERA JAVIER	X																	23030 1	8	$379,600	$60,800	EPS005	8	$379,600	$15,200	CCF33	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	6.960%	$26,500	8	$0	$0	Si	$117,700
9	CC	7960241	HERRERA NESTOR	X																	23030 1	25	$1,186,250	$189,800	EPS037	25	$1,186,250	$47,500	CCF33	25	$1,186,250	$47,500	14-11	25	$1,186,250	6.960%	$82,600	25	$0	$0	Si	$367,400
10	CC	1082850481	HERRERA YEISON	X																	23030 1	8	$379,600	$60,800	ESSC24	8	$379,600	$15,200	CCF33	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	6.960%	$26,500	8	$0	$0	Si	$117,700
11	CC	1083019606	OSPINO SANTIAGO																		23030 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF33	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
12	CC	12542537	PACHECO RAFAEL																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF33	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	Si	$224,400
13	CC	19597805	PADILLA JOSE																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
14	CC	72247345	PERALTA ABDON																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
15	CC	1083003795	PONTON ANDRES							X											23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF33	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
16	CC	1082986414	VENECIA JOSE																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Total			**Afiliados(15)**																					$20,491,100	$3,279,000			$21,991,100	$880,200			$21,931,788	$877,800			$21,991,100		$1,521,100		$0	$0		$6,558,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901782970	2	CONSORCIO ICASM 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 24 #2-66	SANTA MARTA-MAGDALENA	4229885	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1921778433	9494434666	E	2025/11/20	2025/11/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$6,558,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$3,279,000	$0	$0	$3,279,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$2,823,400	$0	$0	$2,823,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,521,100	$0	$0	$1,521,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	$1,521,100	$0	$0	$1,521,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$877,800	$0	$0	$877,800
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	15	$877,800	$0	$0	$877,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				15	$880,200	$0	$0	$880,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$180,500	$0	$0	$180,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$149,000	$0	$0	$149,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$224,500	$0	$0	$224,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$269,200	$0	$0	$269,200
TOTAL				**15**	**$6,558,100**	**$0**	**$0**	**$6,558,100**

Certificado de Aportes

Se certifica que AGUSTIN ORTIZ PACHECO identificado(a) con CC 85463020 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INVERSIONES B&D S.A.S. NI 901361588

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-10	2025-11	1976449623	9494634107	E	2025-12-03	X								X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	29	16%	$2,957,498	$473,200
ARL	COLMENA	29	6.96%	$2,957,498	$205,900
CCF	CAJAMAG	29	4%	$2,957,498	$118,300
EPS	COOSALUD MOVILIDAD	29	4%	$2,957,498	$118,300

Este certificado se expide el día 2025-12-02 a las 05:17.

Certificado de Aportes

Se certifica que HAIDER FARID URIELES CARRILLO identificado(a) con CC 85372107 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INVERSIONES B&D S.A.S. NI 901361588

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-10	2025-11	1976449623	9494634107	E	2025-12-03									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$2,764,146	$442,300
ARL	COLMENA	30	6.96%	$2,764,146	$192,400
CCF	CAJAMAG	30	4%	$2,764,146	$110,600
EPS	SALUD TOTAL	30	4%	$2,764,146	$110,600

Este certificado se expide el día 2025-12-02 a las 05:16.

Certificado de Aportes

Se certifica que OLIVER JOSE BARRIOS CONTRERAS identificado(a) con CC 1065574822 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INVERSIONES B&D S.A.S. NI 901361588

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-10	2025-11	1976449623	9494634107	E	2025-12-03									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$3,029,577	$484,800
ARL	COLMENA	30	6.96%	$3,029,577	$210,900
CCF	CAJAMAG	30	4%	$3,029,577	$121,200
EPS	SALUD TOTAL	30	4%	$3,029,577	$121,200

Este certificado se expide el día 2025-12-02 a las 05:19.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 12552112		COTES RODRIGUEZ GUSTAVO ERNESTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 23 nO 2a-06 oficina 301	SANTA MARTA-MAGDALENA	4378806	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	31887375	9493418152	I	2025/11/06	2025/10/29	BANCO DE OCCIDENTE	0	$178,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$178,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$178,000
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)																						$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$178,000
1	CC	12552112	COTES GUSTAVO																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$178,000			0	$0	$0			0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$178,000
Total	**Afiliados(1)**																						$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$178,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 12552112		COTES RODRIGUEZ GUSTAVO ERNESTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 23 nO 2a-06 oficina 301	SANTA MARTA-MAGDALENA	4378806	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	31887375	9493418152	I	2025/11/06	2025/10/29	BANCO DE OCCIDENTE	0	$178,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$178,000	$0	$0	$178,000

ANEXO No. 8

MEMORIAS DE CANTIDADES

Dirección: Calle 24 No 2-66 Ed. Cámara de Comercio, Santa Marta
Email: consorcioicasm@gmail.com

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO: "INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES" Contrato de Obra No. LP 006 de 2023	**ACTA**	16	**VIGENCIA**	2025	**FECHA**	31/10/2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ICASM2023	**NIT O C.C.**	901.782.970-2	**CONTRATO**	LP 006 DE 2023		
INTERVENTOR	INTERVENTORES E INGENIERIA SAS	**NIT O C.C.**	901.433.145-6	**CONTRATO**	CM 007 DE 2023		

CAPÍTULO	**PRELIMINARES**	**ITEM**	**Movilización y Desmovilización de Equipos**	**UNIDAD**	**Und**





DESCRIPCIÓN			**CANTIDAD**
RIO PIEDRAS			
Retroexcavadora Hyundai	HX220S		1,00
Retroexcavadora Hyundai	R220LC-9S		1,00
		TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**5,00**
		FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	**3,00**
		TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**2,00**

Firma: _____
Nombre: LUIS FERNANDO OCHOA MARULANDA
DIRECTOR DE OBRA
Matricula No. 13202-33067 BLV

Firma: _____
Nombre: FRANCISCO ALFONSO FERNANDEZ SALTAREN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Matricula No. 08202-187374 ATL

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO: "INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES" Contrato de Obra No. LP 006 de 2023	**ACTA**	16	**VIGENCIA**	2025	**FECHA**	31/10/2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ICASM2023	**NIT O C.C.**	901.782.970-2	**CONTRATO**	LP 006 DE 2023		
INTERVENTOR	INTERVENTORES E INGENIERIA SAS	**NIT O C.C.**	901.433.145-6	**CONTRATO**	CM 007 DE 2023		

CAPÍTULO	**MANTENIMIENTO HIDRAULICO**	**ITEM**	**Remoción Mecanica de Sedimentos Mediante el Uso de Excavadora sobre Orugas. Incluye: Seguimiento y Control Topografico**	**UNIDAD**	**M3**







LOCALIZACIÓN	**LONGITUD**	**ÁREA**	**VOLÚMEN ACUMULADO**	**VOLÚMEN TOTAL**
RIO PIEDRAS				
k0+820,00	15,80	0,00	0,00	0,00
k0+840,00	14,80	306,00	306,00	306,00
k0+860,00	16,28	310,80	616,80	616,80
k0+880,00	25,68	419,60	1036,40	1036,40
k0+900,00	43,02	687,00	1723,40	1723,40
k0+920,00	49,32	923,40	2646,80	2646,80
k0+940,00	54,96	1042,80	3689,60	3689,60
k0+960,00	69,57	1245,30	4934,90	4934,90
k0+970,00	98,56	840,65	5775,55	5775,55
k0+980,00	86,95	927,55	6703,10	6703,10
k1+000,00	86,95	1739,00	8442,10	8442,10
k1+020,00	98,75	1857,00	10299,10	10299,10
k1+040,00	93,41	1921,60	12220,70	12220,70
k1+060,00	101,36	1947,70	14168,40	14168,40
k1+080,00	102,42	2037,80	16206,20	16206,20
k1+100,00	156,83	2592,50	18798,70	18798,70
k1+120,00	94,34	2511,70	21310,40	21310,40

Observaciones: Las áreas reportadas corresponden a un valor parcial de la cantidaa total de cada sección transversal.

TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**32597,31**
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	**11286,91**
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**21310,40**

Firma: _____
Nombre: LUIS FERNANDO OCHOA MARULANDA
DIRECTOR DE OBRA
Matricula No. 13202-33067 BLV

Firma: _____
Nombre: FRANCISCO ALFONSO FERNANDEZ SALTAREN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Matricula No. 08202-187374 ATL

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO: "INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES" Contrato de Obra No. LP 006 de 2023	**ACTA**	15	**VIGENCIA**	2025	**FECHA**	31/10/2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ICASM2023	**NIT O C.C.**	901.782.970-2	**CONTRATO**	LP 006 DE 2023		
INTERVENTOR	INTERVENTORES E INGENIERIA SAS	**NIT O C.C.**	901.433.145-6	**CONTRATO**	CM 007 DE 2023		

CAPÍTULO	**PRELIMINARES**	**ITEM**	**Rescate de Fauna Acuatica y Terrestre**	**UNIDAD**	**Und**



DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**
RIO PIEDRAS	
Actividades de ahuyentamiento y rescate de fauna silvestre	0,16
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**0,68**
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	**0,52**
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**0,16**

Firma: _____
Nombre: LUIS FERNANDO OCHOA MARULANDA
DIRECTOR DE OBRA
Matricula No. 13202-33067 BLV

Firma: _____
Nombre: FRANCISCO ALFONSO FERNANDEZ SALTAREN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Matricula No. 08202-187374 ATL

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO: "INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES" Contrato de Obra No. LP 006 de 2023	ACTA	16	VIGENCIA	2025	FECHA	31/10/2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ICASM2023	NIT O C.C.	901.782.970-2	CONTRATO	LP 006 DE 2023		
INTERVENTOR	INTERVENTORES E INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	901.433.145-6	CONTRATO	CM 007 DE 2023		

CAPÍTULO	PRELIMINARES	ITEM	Implementacion de Estrategia de Sensibilización y Participación Ambiental Dirigido a la Comunidad en la Zona de Influencia del Proyecto	UNIDAD	Und









DESCRIPCIÓN		CANTIDAD
DISTRITO DE SANTA MARTA		
Jornada de sensibilización educativa Ambiental	CEDI Orinoco Los Cocos (Sede No. 2)	0,04
	JAC Los Naranjos	0,04
	Comunidad El Milagro II	0,04
	JAC Manzanares	0,04
Jornada de sensibilización para la conservación y aprovechamiento del recurso hídrico y pesquero.	JAC Los Naranjos	0,04
Jornada de sensibilización para la conservación de la fauna y flora existentes en los cuerpos de agua.	JAC Los Naranjos	0,04
Jornada de sensibilización para el manejo adecuado y aprovechamiento de los residuos sólidos	CEDI Orinoco Los Cocos (Sede No. 2)	0,04
	Comunidad El Milagro II	0,04
Jornada teórico-practico para la caracterización de los residuos sólidos.	CEDI Orinoco Los Cocos (Sede No. 2)	0,04
	Comunidad El Milagro II	0,04
Acompañamiento - Actividades de cierre de jornada educativa ambiental, a través de la transformación del material reciclable.	IED Quinto Centenario	0,04
	Comunidad El Milagro II	0,04
	CEDI Orinoco Los Cocos (Sede No. 2)	0,04
Jornada de sensibilización "Ambiental y Cultural" para la construcción de acciones que generen grandes cambios en el cuidado y protección de los cuerpos de agua.	IED Quinto Centenario	0,04
	CEDI Orinoco Los Cocos (Sede No. 2)	0,04
Jornada de sensibilización para la adaptación al cambio climático asociados a los cuerpos de agua.	IED Quinto Centenario	0,04
	CEDI Orinoco Los Cocos (Sede No. 2)	0,04
Jornada de sensibilización para la gestión del riesgo de desastres, asociados a los cuerpos de agua.	IED Liceo del Sur	0,04
	CEDI Orinoco Los Cocos (Sede No. 2)	0,04
	IED Quinto Centenario	0,04
	Comunidad El Milagro II	0,04
Taller para el fortalecimiento de los temas educativos ambientales contenidos en las cartillas "Aprendiendo para proteger las fuentes Hídricas"	IED Liceo del Sur	0,04
	IED Quinto Centenario	0,04
	Comunidad El Milagro II	0,04
	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**1,25**
	FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	**0,40**
	TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**0,85**

Firma: _____
Nombre: LUIS FERNANDO OCHOA MARULANDA
DIRECTOR DE OBRA
Matricula No. 13202-33067 BLV

Firma: _____
Nombre: FRANCISCO ALFONSO FERNANDEZ SALTAREN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Matricula No. 08202-187374 ATL

ANEXO No. 9

INFORME GESTIÓN AMBIENTAL

Dirección: Calle 24 No 2-66 Ed. Cámara de Comercio, Santa Marta
Email: consorcioicasm@gmail.com

EMPRESA CONSTRATISTA: **CONSORCIO ICASM2023** CONTRATANTE: **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA – CORPAMAG.**	CONTRATO DE OBRA No: **LP 006 de 2023** **RESUMEN EJECUTIVO:** Se presenta en este documento el informe de seguimiento al Programa de Implementación de Medidas de Manejo Ambiental (PIMMA).
PROYECTO: Intervenciones a los cuerpos de agua del Distrito de Santa Marta para el mantenimiento y preservación de sus condiciones hidráulicas y ambientales.	INFORME AMBIENTAL No. **006** Vigencia 2025 PERIODO REPORTADO: **Octubre de 2025**



CONTENIDO

LISTA DE TABLAS....3
LISTA DE FIGURAS....4
1. PRESENTACIÓN....5
2. INTRODUCCIÓN....6
3. ALCANCE....7
4. OBJETIVO GENERAL....7
4.1. Objetivos Específicos....7
5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO....8
5.1. Estado de Ejecución....8
5.2. Actividades (Río Piedras)....8
6. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO....8
6.1. Localización General del Proyecto....8
6.2. Ubicación Geográfica....9
6.3. Área de Intervención....10
7. SEGUIMIENTO DE LAS FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL DEL PIMMA....12
7.1. Programas del Medio Abiótico.....12
7.1.1. P-MA-P1 Programa de control de calidad de aire y ruido.....12
7.1.2. P-MA-P2 Programa de protección de suelos.....19
7.1.3. P-MA-P3 Programa de control de la calidad del agua superficial....23
7.2. Programas del Medio Biótico....26
7.2.1. P-MB-P1 Programa de protección de fauna y flora....26
7.3. Programas del Medio Socioeconómico....32
7.3.1. P-MS-P1 Programa socioeconómico y cultural....32
7.3.2. P-MS-P2 Programa de manejo de residuos.....37
8. OTRAS MEDIDAS AMBIENTALES....39
8.1. Rescate de Fauna Acuática y Terrestre....39
8.2. Implementación de la estrategia de sensibilización y participación ambiental dirigido a la comunidad en la zona de influencia del proyecto.....40
9. CONTROL DEL DOCUMENTO....42
10. ANEXOS....42

LISTA DE TABLAS

Tabla No 1. Información básica de la organización. 5
Tabla No 2. Ficha de seguimiento al Programa de control de la calidad del aire y ruido 12
Tabla No 3. Maquinaria y equipos en el frente de obra 12
Tabla No 4. Ficha de seguimiento al Programa de control de protección de suelos 19
Tabla No 5. Ficha de seguimiento al Programa de control de la calidad del agua..... 23
Tabla No 6. Ficha de seguimiento al Programa de protección de fauna y flora. 26
Tabla No 7. Ficha de seguimiento al Programa socioeconómico y cultural 33
Tabla No 8. Ficha de seguimiento al Programa de manejo de residuos. 37
Tabla No 9. Actividades estrategia de participación ambiental..... 40
Tabla No 10. Control de documento 42

LISTA DE FIGURAS

Figura No. 1. Localización de la zona de estudio, Santa Marta, Magdalena. 9
Figura No. 2. Localización de la Cuenca Río Piedras 10
Figura No. 3. Zona de intervención 11
Figura No. 4. Movilización de maquinaria 13
Figura No. 5. Maquinaria ingresada en octubre 13
Figura No. 6. Inspecciones de preoperacionales 14
Figura No. 7. Material removido 14
Figura No. 8. Almacenamiento de materiales de obra 15
Figura No. 9. Disposición de residuos ordinarios en ruta de recolección 16
Figura No. 10. Punto ecológico en el frente de obra 16
Figura No. 11. Charla dirigida a operadores de la maquinaria 17
Figura No. 12. Áreas señalizadas "Uso de elementos de protección personal" 18
Figura No. 13. Abastecimiento de combustible 20
Figura No. 14. Contenedor de residuos peligrosos 21
Figura No. 15. Verificación del Kit para control de derrame 22
Figura No. 16. Actividades de control topográfico 24
Figura No. 17. Sanitarios disponibles en el frente de obra 25
Figura No. 18. Demarcación de áreas de trabajo 27
Figura No. 19. Actividades de ahuyentamiento en el área de influencia del proyecto 28
Figura No. 20. Charlas y capacitaciones componente ambiental 29
Figura No. 21. Atención al personal de Parques Nacionales Naturales 29
Figura No. 22. Levantamiento línea base Biota 30
Figura No. 23. Reubicación de fauna silvestre 31
Figura No. 24. Inducciones y reinducciones ambientales 33
Figura No. 25. Entrega de elementos de protección personal 34
Figura No. 26. Charlas del área de SST 34
Figura No. 27. Socialización del proyecto con la comunidad de El Zaino 35
Figura No. 28. Levantamiento de Actas de Vecindad 35
Figura No. 29. Render de la valla a instalar 36
Figura No. 30. Jornadas de orden y aseo 38
Figura No. 31. Materiales utilizados en actividades de obra 39
Figura No. 32. Revisión y seguimiento de cámaras trampas 40
Figura No. 33. Socialización del componente de Educación Ambiental 41

1. PRESENTACIÓN

Mediante este documento se presenta el **sexto** informe de seguimiento de la vigencia 2025 correspondiente al Programa de Implementación de Medidas de Manejo Ambiental (PIMMA) del proyecto "*INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES"*, como uno de los compromisos del CONSORCIO ICASM 2023, en el marco del desarrollo del Contrato No. LP 006 de 2023 suscrito con la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG).

En la Tabla No.1, se presenta los datos básicos de la empresa contratista que ejecuta el proyecto en las áreas que serán descritas posteriormente en este documento:

Tabla No 1. Información básica de la organización.

INFORMACIÓN ORGANIZACIONAL	
Nombre	CONSORCIO ICASM2023
NIT	901782970 - 2
Dirección	Calle 24 No. 2 – 66, Oficina 901, Edificio Cámara de Comercio
Teléfono	304 486 3945
Representante legal	Dixon Enrique Valverde Martínez
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	
Departamento	Magdalena
Municipio	Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta

2. INTRODUCCIÓN

Los proyectos de ingeniería se han convertido a través del tiempo en una solución a las diversas amenazas a las que están expuestas las poblaciones vulnerables de un territorio específico, las obras construidas contemplan muros de contención ensamblado con tensores internos en geotextil de poliéster de diversos materiales rellenos con material proveniente de la excavación, formaletería y costuras, priorizando cada vez más aquellos que no representan una alta contaminación para el medio ambiente y que contribuyen a solucionar la problemática presentada, otra opción que es usada principalmente en los cuerpos de agua lóticos, es aumentar la profundidad del lecho mediante remoción con maquinaria, de esta forma se garantiza el retiro de sedimentos o cualquier otro material que interfiera en la capacidad de transporte de agua.

Los ríos y humedales han sido señalados por los expertos como los mayores proveedores de servicios ecosistémicos. Son sumideros de carbono y estabilizadores climáticos esenciales a escala mundial, ejercen un papel importante en la mitigación de las inundaciones y las sequías, nos proveen de aguas limpias, protegen las costas y recargan los acuíferos subterráneos, sustentan una gran geodiversidad, desempeñan un papel imprescindible en el paisaje al proporcionar hábitats únicos y en la prestación de servicios recreativos y culturales a la sociedad. Sin embargo, los ecosistemas acuáticos es uno de los que más agresiones recibe en todo del mundo.

Es así como, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG) elaboró las medidas de manejo ambiental para prevenir, controlar, mitigar y/o compensar los impactos negativos, atribuidos al desarrollo del proyecto "*INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES*.

En este sentido, surgió la necesidad de construir el Programa de Implementación de las Medidas de Manejo Ambiental que hace parte de los requerimientos para el CONSORCIO ICASM 2023, en desarrollo del Contrato No. LP 006 de 2023 suscrito con la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG); que tiene como objeto la ejecución del proyecto "*INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES"*.

Con el fin de realizar seguimiento al Programa de Implementación de las Medidas de Manejo Ambiental y con el propósito de garantizar una mejor calidad, supervisión, seguimiento y control en las etapas de ejecución y operación del proyecto, el CONSORCIO ICASM2023 en el transcurso del periodo de operación debe elaborar y presentar mensualmente los informes de seguimiento y cumplimiento ambiental.

3. ALCANCE

El presente documento corresponde al Informe de Seguimiento Ambiental No. **006** del proyecto "*INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES"* vigencia 2025, el cual tiene como finalidad documentar las actividades realizadas en el marco de la implementación del programa de las medidas de manejo ambiental durante el periodo reportado.

En el mes de **octubre** de 2025, el proyecto se encuentra en fase de ejecución y las actividades son desarrolladas en la cuenca baja del Río Piedras del Distrito de Santa Marta, por consiguiente, se detalla el seguimiento y aplicación de las medidas de manejo ambiental aplicadas en el área de influencia de la zona intervenida para minimizar los impactos ambientales negativos. Las intervenciones para esta vigencia se enfocan en el mantenimiento de las condiciones hidráulicas del río Piedras a través de la remoción mecánica de sedimentos, elaboración de muro geocontenedores y sensibilización comunitaria.

En conjunto, el informe busca proporcionar un panorama detallado de los avances logrados durante el periodo y las medidas ambientales adoptadas para garantizar la conservación y protección del estado actual del cuerpo de agua a intervenir.

4. OBJETIVO GENERAL

Validar el cumplimiento de la implementación de las medidas y acciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto "*INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES",* en el mes de **octubre** de la vigencia del 2025.

4.1. Objetivos Específicos

- Especificar las acciones y las estrategias implementadas de conformidad a las medidas propuestas en las fichas técnicas del Programa de Manejo Ambiental del proyecto.

- Verificar el cumplimiento de las metas y acciones contempladas en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto.

- Relacionar los soportes técnicos, documentales, evidencias, registros fotográficos y otros que validen el seguimiento y cumplimiento de la implementación de las Medidas de Manejo Ambiental del proyecto.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

5.1. Estado de Ejecución

Durante el periodo reportado, **octubre** de 2025, el proyecto se encuentra en fase de ejecución bajo condiciones normales.

5.2. Actividades (Río Piedras)

Se dio inicio con la construcción de obras de protección (Muros en Geocontenedores) en la margen u orilla derecha (sentido de flujo). El material proveniente de la excavación en la adecuación de terreno previo al inicio de la construcción de los geocontenedores será dispuesto como material de relleno en la elaboración de estos. A continuación, se relacionan las acciones implicadas para el desarrollo de la actividad:

- Socialización con las comunidades del área de influencia del proyecto.
- Remoción mecánica de sedimentos mediante el uso de excavadora sobre orugas. Incluye: seguimiento y control topográfico.
- Elaboración de muro en geocontenedores ensamblado con tensores internos en geotextil. Incluye: Relleno con material proveniente de la excavación, formaletería y costuras.
- Manto antisocavación ensamblado en geotextil. Incluye: Inyección de arena proveniente de la excavación en lastre inferior.
- Manto para el control de erosión permanente, tipo TRM 50.
- Geotextil tejido de poliéster.
- Implementación del protocolo de protección y ahuyentamiento de fauna silvestre.
- Aplicación de mezcla fértil y semillas.
- Implementación de la estrategia de educación ambiental.

6. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

6.1. Localización General del Proyecto

El Distrito de Santa Marta está conformado por un mar territorial, un área montañosa correspondiente a la Sierra Nevada, cuerpos de agua interiores, las islas y bahías localizadas en el mar territorial y en los cuerpos de agua, el suelo consolidado constituido por una zona costera y una zona continental, el suelo no consolidado constituido por la zona de Bajamar, el subsuelo y el espacio aéreo asociado.

Limita Por el Norte y el Oeste con el Mar Caribe, al sur los municipios de Ciénaga y Aracataca y por el oriente los departamentos de la Guajira y Cesar. Sus coordenadas geográficas son: 11º 14’ 50” de latitud norte y 74º 12’ 06” de latitud oeste. Dista de Bogotá 992 Km; de Riohacha 166 Km y de Barranquilla 93 Km. Cuenta con una extensión total de 2,393.35 Km^2, de los cuales 55.10 Km2 pertenecen a zona urbana y 2,338.25 km^2 a zona rural.

La altura promedio de la ciudad es de 2 msnm, pero con una diferencia de altura que va, en el territorio del municipio, desde el nivel del mar hasta los 5.775 msnm en el Pico Cristóbal Colón, que es el más elevado de toda Colombia ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta (PDD Santa Marta, 2023).

Figura No. 1. Localización de la zona de estudio, Santa Marta, Magdalena.



Fuente: Adaptado de Google Maps

La ciudad cuenta con una estructura ecológica principal biodiversa, con un 51,43% del territorio clasificado como áreas protegidas, que equivale a 120.751,6 Ha de éstos, el 2,14% son humedales, el 8,97% páramos, el 11,92% bosque seco, el 0,06% manglares y el 23,09% son ecosistemas estratégicos. El 82,42% del territorio está amenazado por fenómenos hidrometereológicos y la mayor parte de los desastres en Santa Marta se deben a incendios forestales (47,92%) e inundaciones (46,88%).

El Distrito de Santa Marta hace parte de las cinco grandes subregiones socio-ecológicas en las que se encuentra dividido el Departamento, junto con Ciénaga, Pueblo Viejo y Sitionuevo integran la subregión Marino – Costera, caracterizándose Santa Marta por una lata presión turística y problemas severos de erosión costera.

6.2. Ubicación Geográfica

El proyecto se desarrolla en el Distrito de Santa Marta, específicamente en la cuenca baja del río Piedras.

La cuenca del Río Piedras se localiza en el Departamento del Magdalena en la vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, en su flanco norte. La cuenca limita por el norte con la cuenca de pequeños cauces del Parque Tayrona, que vierte sus aguas al mar Caribe; por el este con la cuenca del río Mendihuaca y el mar Caribe, por el sur con las cuencas de los ríos Guachaca y Gaira y por el Oeste con la cuenca del río Manzanares. El cauce principal de la cuenca es el río Piedras que tiene una longitud aproximada de 32,81 km, nace al norte en la parte alta de la vertiente al norte de la Cuchilla de San Lorenzo, entre el Cerro El Guaco y la Cuchilla Piedras Blancas en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, en un paisaje de montaña con un relieve de filas y vigas a una elevación aproximada de 2.400 msnm, y desemboca en el mar Caribe en la línea costera al este de Punta Castillete cerca al sitio Los Naranjos en el municipio de Santa Marta; el área hace parte de la Macrocuenca Hidrográfica del Caribe de la Sierra Nevada de Santa Marta. La cuenca tiene una gran

variedad de pendientes y elevaciones, las que sumadas a las características geológicas de la zona determinan la orientación del cauce del río y de sus tributarios.

La cuenca del Río Piedras hace parte de la ecorregión Sierra Nevada de Santa Marta y de su Macrocuenca del Caribe y en su parte baja se ubica en la ecorregión Sistema Costero, dos de las cinco ecorregiones definidas por la Corporación Autónoma Regional CORPAMAG, para el territorio del Departamento del Magdalena. La cuenca cubre un área aproximada de 161.22 km^2, hace parte del área municipal del Distrito de Santa Marta, y en ella se ubican los poblados de San Martín, El Recreo, San Isidro, Los Remedios, La Estrella, La Esmeralda, La Revuelta, El Trompito, Las Piedras y Los Naranjos, entre otros

Figura No. 2. Localización de la Cuenca Río Piedras




Fuente: Adaptado en Google Earth de Diagnóstico Ambiental POT Santa Marta 2020-2032, 2025

6.3. Área de Intervención

El proyecto se desarrolla en el Distrito de Santa Marta, específicamente en la cuenca baja del río Piedras, desde el puente de la vereda Los Naranjos, que intercepta en la Ruta Nacional 90, hasta el 1,6 Km con dirección hacia la desembocadura.

Figura No. 3. Zona de intervención

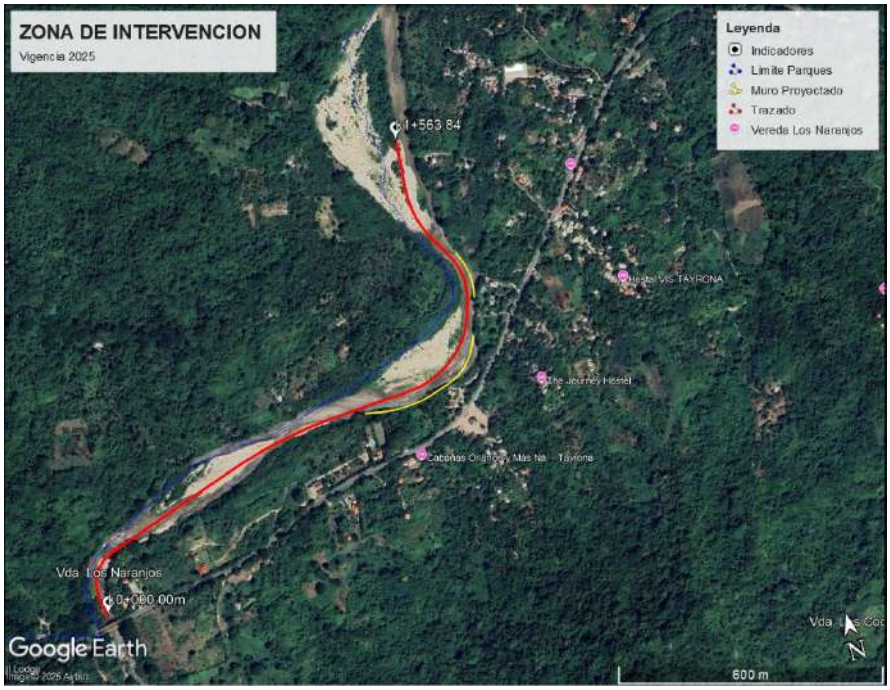

Fuente: Adaptado en Google Earth, Consorcio ICASM2023

7. SEGUIMIENTO DE LAS FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL DEL PIMMA

Durante el desarrollo de este numeral se presentará la descripción de la ejecución de las fichas de manejo ambiental del Programa de Implementación de las Medidas de Manejo Ambiental (PIMMA) del proyecto *"INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES".*

7.1. Programas del Medio Abiótico.

7.1.1. P-MA-P1 Programa de control de calidad de aire y ruido.

Tabla No 2. Ficha de seguimiento al Programa de control de la calidad del aire y ruido

FICHA DE SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL MEDIO ABIÓTICO							CODIGO: P-MA-P1
Programa 1: Programa de control de la calidad del aire y ruido							
TIPO DE MEDIDA							
Prevención	X	Mitigación	X	Control	X	Compensación	
1. Medidas para el control de la alteración de la calidad del aire							

1.1. Mantenimiento de la maquinaria y equipos para maximizar la eficiencia de la combustión y minimizar la emisión de contaminantes.

El 01 de octubre de 2025 se registró el ingreso de dos (2) maquinas al frente de obra, para un total de tres (3) maquinas; las actividades con maquinaria amarilla iniciaron el 02 de octubre de la presente anualidad. A continuación**,** se relacionan los equipos utilizados *(En el Anexo A se relacionan las guías de movilización y documentos de la maquinaria presente en el frente de obra)*.

Tabla No 3. Maquinaria y equipos en el frente de obra

MAQUINARIA Y EQUIPOS EN EL FRENTE DE OBRA			
DESCRIPCION	MARCA	MODELO/PLACA	SERIAL
Excavadora	HYUNDAI	HX220S	HHKHK606PE0002692
Excavadora	HYUNDAI	HX220S	HHKHK606VE0002147
Excavadora	HYUNDAI	R220LC-9S	HBRR220CHE0001460
GPS RTK topográfico de precisión	STONEX	S980	S989282100017
GPS RTK topográfico de precisión	STONEX	S900	S911312121756
Controlador GPS	STONEX	BA5200	N.A.
Camioneta	NISSAN	2015 / SVR312	3N6DD25T4ZK943144

Figura No. 4. Movilización de maquinaria



Figura No. 5. Maquinaria ingresada en octubre



Los preoperacionales de la maquinaria se realizan en compañía del operador previa ejecución de funciones, a fin de identificar fallas físicas existentes o potenciales en el cuerpo de la máquina que puedan derivar en reparaciones, accidentes o tiempo de inactividad.

Figura No. 6. Inspecciones de preoperacionales



1.2. <u>Si el proyecto se llega a ejecutar en temporada seca, se mantendrán húmedas las áreas de trabajo para minimizar la dispersión de polvo.</u>

Durante el periodo reportado no se realizó la humectación del terreno, debido a que no se dio inicio a las actividades de movilización, cargue y transporte de sedimentos.

Las actividades con maquinaria amarilla desarrolladas durante el periodo fueron ejecutadas directamente en el cauce, lo que garantiza una distancia prudente entre la operación y las comunidades aledañas del sector. Asimismo, el material removido presenta condiciones de humedad propias de sus características naturales.

Figura No. 7. Material removido



1.3. <u>Se establecerán lugares adecuados para almacenaje, mezcla y carga de los materiales y/o insumos, de modo que se evite la dispersión de polvo debido a dichas</u>

operaciones, igualmente se deberá controlar la altura de carga y descarga de materiales de modo que se minimice la dispersión de polvo al ambiente.

Para el periodo reportado no se realizó compra de materiales pétreos que requirieran el acopio y aplicación de medidas de prevención y control de material particulado.

***1.4. Los camiones que transporten materiales o desechos que puedan emitir polvo serán cubiertos con lonas*.**

Para el periodo reportado no se realizó cargue, transporte y disposición de materiales que generen partículas al ambiente.

1.5. Se cubrirán y confinarán los materiales almacenados para evitar el arrastre de polvo por acción de viento o lluvia.

Se delimitó un espacio temporal para el almacenamiento de los materiales no pétreos y equipos utilizados en obra, el cual cuenta con protección para evitar la exposición a las lluvias.

Figura No. 8. Almacenamiento de materiales de obra



1.6. Se prohíbe realizar incineración de desperdicios en el área de influencia del proyecto

El programa de capacitaciones ambientales dirigida a los trabajadores incluye en sus temáticas la disposición adecuada de los residuos y la prohibición de incineración de desperdicios en el área de influencia del proyecto.

Los residuos ordinarios son dispuestos en los contenedores cercanos al área del proyecto, los cuales son presentados en el horario establecido por la empresa de servicio de aseo ATESA, estos son depositados en bolsas negras.

Figura No. 9. Disposición de residuos ordinarios en ruta de recolección



2. Medidas para el control en la generación de olores molestos

2.1. Mantenimiento preventivo de la flota vehicular debidamente documentado, para maximizar la eficiencia de la combustión y minimizar la emisión de gases contaminantes que puedan generar olores molestos.

Los vehículos que ingresen para las operaciones de transporte y disposición de remoción de sedimentos y otras actividades deberán presentar su certificación vigente de gases contaminantes Tecnomecánica.

2.2. Se dispondrán de puntos ecológicos en los frentes de trabajo

En el frente de trabajo se cuenta con un punto ecológico con canecas de tres (3) colores: blanco, negro y verde; de acuerdo con lo establecido en la Resolución No 2184 de 2019, por medio de la cual se adopta el código de colores para la separación de residuos sólidos.

Figura No. 10. Punto ecológico en el frente de obra



3. Medidas para el control del incremento de los niveles de ruido

3.1. Limitar el tiempo de exposición del personal que se vea afectado por actividades considerablemente ruidosas.

Mientras la maquinaria se encuentra en funcionamiento, el personal de obra guarda mínimo un radio de distanciamiento de aproximadamente de 5 m sumado al radio de giro de la máquina. Esta distancia permite la movilidad segura del trabajador alrededor de la máquina y evita accidentes por contacto, con el fin de evitar accidentes laborales y la exposición a ruido excesivo.

Así mismo, la profesional de SST dirige el programa de pausas activas dentro de la jornada laboral, mediante la realización de diferentes tipos de ejercicios con el fin de prevenir lesiones osteo-musculares, la fatiga o tensión acumulada por el desarrollo de las labores.

Figura No. 11. Charla dirigida a operadores de la maquinaria



3.2. Siempre que se pueda los trabajos deberán realizarse en horarios diurnos.

Las actividades del proyecto se ejecutarán en horario diurno de acuerdo con el horario contemplado en el Artículo 160 de la Ley 2101 de 2021 sancionada por el Congreso de la República de Colombia.

3.3. Evitar el uso innecesario de bocinas y sirenas.

Las actividades que se desarrollaran no requieren del manejo de este tipo de elementos.

3.4. Proveer a los trabajadores de equipo personal de protección auditiva.

Se realizó la entrega de los elementos de protección personal conforme al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), teniendo en cuenta las actividades desarrolladas durante la ejecución del proyecto. El profesional de SST se encarga de señalizar los espacios de trabajo y de realizar el seguimiento al uso adecuado de los elementos entregados.

Figura No. 12. Áreas señalizadas "Uso de elementos de protección personal"



3.5. Velocidad máxima permitida de 15 Km/hora

Una vez se inicie el ingreso de vehículos al área del proyecto, la velocidad de circulación de vehículos y maquinaria no deberá superar los 15 km/h. Esta información será socializada durante las jornadas de inducción y reinducción del personal de obra.

No.	ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO			
		SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
1	Mantenimientos a maquinaria y equipos de trabajo	X			
2	Control de material particulado	X			
3	Lugares adecuados para manejo de los materiales y/o insumos	X			
4	Prohibición incineración	X			
5	Velocidad máxima de 15 Km/hora	X			
6	Disposición adecuada de residuos	X			
7	Prohibición quemas	X			
8	Proveer equipos de protección personal auditiva a trabajadores que lo requieran	X			

META	INDICADOR	OBSERVACIONES
Mantenimiento del 90% de los vehículos según el grado de requerimiento	$\frac{\text{No. de mantemientos realizados}}{\text{No. de mantenimientos programados}} x100$	No se han ejecutado mantenimientos.
Certificación del 100% de los vehículos	$\frac{\text{No. de vehículos con SOAT y técnico} - \text{mecánica}}{\text{No total de vehículos}} x100$	

	$\frac{1}{1}x100 = 100\%$	

7.1.2. P-MA-P2 Programa de protección de suelos.

Tabla No 4. Ficha de seguimiento al Programa de control de protección de suelos

FICHA DE SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL MEDIO ABIÓTICO								CODIGO: P-MA-P2
Programa 2: Programa de control de protección de suelos								
TIPO DE MEDIDA								
Prevención	X	Mitigación	X	Control	X	Compensación		
4. Medidas para la conservación de suelos (erosión y sedimentación):								
4.1. Realizar en la medida de lo posible, las operaciones de mayor movimiento y perturbación de tierras durante los periodos de menor lluvia (para evitar escorrentías) priorizando el inicio de estas operaciones en los sectores de mayor pendiente. Durante la presencia de precipitaciones se suspenden todas las actividades de obra e intervención, incluyendo las que requieren uso de maquinaria amarilla, esta última con el fin de evitar alteraciones significativas en el terreno debido a que el peso de la maquinaria trabajando en condiciones de un suelo saturado de agua y con pendientes pronunciadas puede generar desprendimientos de tierras, alterando significativamente las orillas de los cauces lo que puede ocasionar zanjas de escorrentías no contempladas en la intervención.								
5. Medidas para el control de la compactación de suelos:								
5.1. Restringir la operación de vehículos, maquinaria y equipo de movimiento de tierras al mínimo, concentrando su tránsito sobre el alineamiento de los caminos de acceso y que se restrinja al mínimo el número de vehículos a la zona directa de ejecución del proyecto. En el lugar de operaciones circulan solo vehículos, maquinaria y equipos de trabajo para la de ejecución del proyecto. El traslado de la maquinaria se realiza dos (2) veces al día, desde la zona de parqueo a su punto de operación y viceversa. El área de ingreso es variable casi diariamente, por lo que es indispensable que la maquinaria varíe su punto de trabajo durante la fase de mantenimiento con maquinaria y elaboración de muro geocontenedores. ***5.2. Realizar la mayor cantidad de operaciones durante la estación seca, ya que al entrar la estación lluviosa la compactación de los suelos es mucho mayor.*** En atención a esta medida, durante las precipitaciones moderadas e intensas se suspenden todas las actividades de intervención incluyendo las que implican el uso de maquinaria amarilla con el fin de evitar la modificación de la estructura del suelo, debido a que el suelo húmedo es más propenso a la compactación, ya que las partículas pueden moverse con mayor facilidad bajo presión, presión que en este caso podría ser ejercida por el peso de la maquinaria, lo que resultaría en un proceso de compresión del suelo, reduciendo la porosidad, la infiltración de agua y aireación del terreno.								
6. Medidas para controlar la contaminación del suelo:								

6.1. Mantenimiento del equipo rodante y maquinaria, de modo que no se produzcan fugas o pérdidas de combustible o lubricantes.

Durante el periodo reportado no se realizaron mantenimientos preventivos y/o correctivos.

6.2. Los combustibles y lubricantes serán dispuestos en contenedores adecuados.

El suministro de combustible de la maquinaria amarilla se realiza a través de la prestación del servicio de la COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES Y GASES DEL CARIBE S.A.S (E.D.S El Líbano); el proceso es realizado a través del vehículo operativo de la estación de servicio que cuenta con capacidad de almacenamiento en su tanque posterior de 2218L. La EDS cuenta con el plan de contingencias para tales fines, y mediante el Radicado No 230525008 presentó ante el DADSA la solicitud de evaluación del trámite, sin embargo**,** la entidad no ha dado respuesta oportuna al requerimiento. Así mismo, en el Anexo E. se relaciona la autorización del Ministerio de Energía para la EDS como distribuidor minorista en calidad de comercializador industrial de combustibles líquidos derivados del petróleo a través del vehículo de placa TZW-137. Se anexa documentación del vehículo con su respectivo certificado vigente de revisión tecnomecánica, como también el soporte de entrega y el pago por concepto de evaluación del plan ante la autoridad ambiental distrital.

Figura No. 13. Abastecimiento de combustible



El proyecto tiene una caneca de 55L de color roja con el respectivo rotulo para realizar el almacenamiento temporal en el frente de obra de residuos sólidos peligrosos

6.3. Recolectar los lubricantes y grasas, así como también los envases empaques y embalajes de estos después de las acciones de mantenimiento de equipos que sean necesarios, para disponerlos con gestores autorizados

El proyecto cuenta en el frente de obra con una caneca de 55L de color roja para el almacenamiento temporal de residuos peligrosos. Los cuales serán dispuestos con los gestores autorizados por la autoridad ambiental.

Figura No. 14. Contenedor de residuos peligrosos



6.4. Se atenderá cualquier derrame de combustible o hidrocarburo inmediatamente

Para el periodo reportado no se presentó contingencia relacionada al derrame de combustible u otra sustancia de características peligrosas. Actualmente se cuenta con tres (3) kits para el control de derrame debidamente equipados para atender cualquier situación que se pueda presentar.

6.5. En caso de contaminación de agua por alguna contingencia de contaminación por sustancia química, se delimitará para evitar la contaminación de los suelos.

Para el periodo reportado no se presentó contingencia relacionada al derrame de combustible u otra sustancia de características peligrosas.

6.6. Se deberán realizar capacitaciones a todo el personal para que conozcan los procedimientos al respecto.

Se adjunta en el Anexo C el formato de registro y contenido de las capacitaciones en temas ambientales impartidas al personal de la obra para el periodo reportado.

6.7. Manejar un kit de emergencia dentro de la maquinaria para el caso que se presenten derrames

Se cuenta en el frente de obra con tres (3) kits para el control de derrames uno por cada máquina, los cuales deben permanecer en la maquinas con todos sus elementos esenciales y en óptimas condiciones. Durante los preoperacionales se verifica que este se encuentre en el interior de la maquina junto con los demás elementos para la atención a emergencia, como extintor y botiquín de primeros auxilios. Por otra parte, cuando un elemento del kit para el control de derrame se utiliza debe ser reemplazado.

Figura No. 15. Verificación del Kit para control de derrame



6.8. Se efectuará un monitoreo de calidad de sedimentos en tres (3) puntos previamente georreferenciados por cada cuerpo de agua a intervenir en dos (2) momentos, es decir, antes y después de la ejecución del proyecto.

Se presentó el informe inicial de caracterización fisicoquímica de aguas y sedimentos del Río Piedras, realizado previo a la ejecución del proyecto. El análisis fue ejecutado por la sociedad LABORATORIOS NANCY FLOREZ GARCÍA S.A.S.

No.	ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO			
		SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
1	Mantenimientos a maquinaria y equipos de trabajo	X			No se han realizado mantenimientos.
2	Manejo apropiado de combustibles y lubricantes	X			
3	Kit para el control de derrames	X			
4	Atención de derrames	X			No se presento contingencias
5	Realizar la separación de residuos sólidos en los puntos ecológicos y disposición final en los sitios autorizados	X			
6	Monitoreo a calidad de sedimentos	X			Actividad realizada previa a la ejecución de la intervención.

META	INDICADOR	OBSERVACIONES
Mantenimiento del 90% de los vehículos según el grado de requerimiento	$\frac{\text{No. de mantemientos realizados}}{\text{No. de mantenimientos programados}} x100$	No se han realizado mantenimientos.

Certificación del 100% de los vehículos	$\frac{\text{No. de vehículos con SOAT y técnico – mecánica}}{\text{No. total de vehículos}} x100$ $\frac{1}{1} x100 = 100\%$	
Instalación del 100% de puntos ecológicos requeridos	$\frac{\text{No. de puntos ecológicos instalados}}{\text{No. de puntos ecológicos requeridos}} x100$ $\frac{1}{1} x100 = 100\%$	El proyecto cumple la meta establecida.
Gestión integral del 100% de los residuos generados durante el desarrollo de las obras.	$\frac{\text{No. de actividades ejecutadas}}{\text{No. de actividades programadas}} x100$ $\frac{2}{2} x100 = 100\%$	El proyecto cumple la meta establecida.
Realización del 100% de los monitoreos de la calidad de sedimentos programados	$\frac{\text{No. de monitoreos de calidad de sedimentos realizados}}{\text{No. de monitoreos de calidad de sedimentos programados}} x100$ $\frac{1}{1} x100 = 100\%$	

7.1.3. P-MA-P3 Programa de control de la calidad del agua superficial

Tabla No 5. Ficha de seguimiento al Programa de control de la calidad del agua

FICHA DE SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL MEDIO ABIÓTICO								CODIGO: P-MA-P3
Programa 3: Programa de control de la calidad del agua superficial								
TIPO DE MEDIDA								
Prevención	X	Mitigación	X	Control	X	Compensación		
7. Medidas para mitigar la alteración del régimen de drenaje de las aguas								
7.1. Los cortes y rellenos se realizarán de manera que no obstruyan el normal escurrimiento de las aguas superficiales								
Las intervenciones se realizarán con las precauciones y especificaciones técnicas del proyecto, con el fin de evitar obstrucciones en el escurrimiento de las aguas o modificación de taludes o pendientes.								

Figura No. 16. Actividades de control topográfico



7.2. No se permitirá el vertimiento de basura, o cualquier otro tipo de desecho (troncos, maderas, hierba, etc.) que puedan represar las aguas de escorrentías.

El proyecto cuenta con un punto ecológico en el frente de obra para manejar los residuos ordinarios que se generan producto de las actividades. Así mismo, el proyecto contempla en su parte técnica la disposición adecuada de sedimentos y escombros.

7.3. Evitar la circulación de equipo pesado en áreas fuera de los sitios de trabajo, para evitar la compactación innecesaria de suelos ya que se impermeabilizan y aumenta la escorrentía.

La maquinaria usada se limitará a realizar las labores dentro de las zonas del proyecto y cuerpo de agua intervenido.

8. Medidas para el control de la alteración del nivel freático local

8.1. No obstaculizar la infiltración natural de las aguas superficiales.

Las intervenciones se realizarán con las precauciones y especificaciones técnicas del proyecto, con el fin de evitar obstrucciones en el escurrimiento de las aguas o modificación de taludes o pendientes.

8.2. Construir las obras de drenaje y cunetas que sean estrictamente necesarias para evitar un escurrimiento acelerado de las aguas superficiales, de modo que no sea afectado el mecanismo de alimentación de las aguas subterráneas.

Para el periodo reportado no ha sido necesario construir obras de drenaje como tampoco cunetas.

9. Medidas para mitigar el deterioro de la calidad de las aguas superficiales

9.1. Instalación de baterías sanitarias portátiles en los frentes de trabajo

Para el periodo reportado se contrataron dos (2) cabañas en el sector, las cuales cuentan con servicio de sanitario para el personal de obra. Los baños están conformados por dos (2) baterías sanitarias que cumplen con los requisitos básicos para un funcionamiento adecuado.

Figura No. 17. Sanitarios disponibles en el frente de obra



9.2. Evitar la acumulación de basura o desechos tóxicos que al contacto con el agua pueda contaminarla y esta a su vez al filtrarse en suelos pueda contaminar aguas subterráneas.

El proyecto cuenta en el frente de obra con una caneca de 55L de color roja para el almacenamiento temporal de residuos peligrosos. Los cuáles serán dispuestos con los gestores autorizados por la autoridad ambiental.

9.3. En el evento de realizar lavado de maquinarias se debe dirigir las aguas producto de esta actividad, a un sistema de retención de sedimentos y separador de grasas y aceites.

Para el periodo reportado no se ha requerido realizar lavado de la maquinaria amarilla usada para las actividades del proyecto.

9.4. Se suspenderá la operación de remoción, y se efectuará la reparación inmediata de las averías en la tubería de descarga o en sus uniones, que originen descargas incontroladas fuera del sitio aprobado para el vertimiento.

Durante el levantamiento de las Actas de Vecindad no se identificaron redes de acueducto y alcantarillado o gas en las áreas específicas de intervención del proyecto.

9.5. Se efectuará un monitoreo de calidad de agua y sedimentos en tres (3) puntos previamente georreferenciados por cada cuerpo de agua a intervenir en dos (2) momentos, es decir, antes y después de la ejecución del proyecto.

Se presentó el informe de caracterización fisicoquímica de aguas y sedimentos del Río Piedras realizado previo a la ejecución de las actividades. El análisis fue realizado mediante la recolección de muestras en tres (3) puntos ejecutados por la sociedad LABORATORIOS NANCY FLOREZ GARCÍA S.A.S.

No.	ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO			
		SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
1	No se obstruirán pasos de agua	X			
2	Se instalarán baterías sanitarias portátiles	X			Se cuenta con dos baños sanitarios en el frente de obra.

3	Se dispondrá adecuadamente los residuos sólidos y líquidos	X			
4	Kit para el control de derrames	X			
5	Atención de derrames	X			Para la presente vigencia no se ha presentado contingencias.
6	Supervisión del suministro de combustibles	X			
7	Monitoreo de la calidad de las aguas superficiales	X			
8	Movilización y desmovilización de equipos	X			Se registro el ingreso de dos (2) máquinas.

META	INDICADOR	OBSERVACIONES
Realización del 100% de los monitoreos de la calidad del agua programados.	$\frac{\text{No. de monitoreos de calidad de agua realizados}}{\text{No. de monitoreos de calidad de agua programados}} x100$ $\frac{1}{1} x100 = 100\%$	El proyecto cumple la meta establecida.
Gestión integral del 100% de los residuos generados durante el desarrollo de las obras.	$\frac{\text{No. de actividades ejecutadas}}{\text{No. de actividades programadas}} x100$ $\frac{2}{2} x100 = 100\%$	El proyecto cumple la meta establecida.

7.2. Programas del Medio Biótico

7.2.1. P-MB-P1 Programa de protección de fauna y flora.

Tabla No 6. Ficha de seguimiento al Programa de protección de fauna y flora.

FICHA DE SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL MEDIO BIÓTICO								CODIGO: P-MB-P1
Programa 1: Programa de protección de fauna y flora.								
TIPO DE MEDIDA								
Prevención	X	Mitigación	X	Control	X	Compensación	X	
10. Medidas para mitigar la afectación de la flora presente en el área de influencia								
10.1. Delimitación del área de labores del proyecto								
La profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo con los profesionales ambientales y residente de obra realizan la planificación de la implementación de la señalización y acordonamiento de zonas de trabajo.								

Figura No. 18. Demarcación de áreas de trabajo



10.2. Se determinarán los individuos forestales que podrían ser eliminados para la ejecución de las actividades que componente el proyecto.

Para el periodo reportado no se requiere la intervención de especies arbóreas.

10.3. Evitar acumular la biomasa vegetal en sitios no autorizados.

Para el periodo reportado no se requirió la intervención de especies arbóreas que generen residuos de material vegetal.

10.4. No depositar los restos vegetales en sitios donde se obstruyan cauces de agua y que finalmente pueden ser arrastrados hacia los cuerpos de agua.

Para el periodo reportado no se requirió la intervención de especies arbóreas que generen residuos de material vegetal.

10.5. En ninguna circunstancia se depositará vegetación en áreas donde se obstruyan canales de drenaje, sin embargo, en algunos casos se podrá utilizar la vegetación como barrera para control de erosión.

Para el periodo reportado no se requirió la intervención de especies arbóreas que generen residuos de material vegetal.

10.6. Cuando sea estrictamente necesario la poda de árboles, las mismas se realizarán por personal capacitado

Para el periodo reportado no se requirió la intervención de especies arbóreas.

11. Medidas para el control a la perturbación de la fauna silvestre

11.1. Realizar labores de preferencia en horarios diurnos, ya que durante la noche se incrementa el ruido

Las actividades del proyecto se ejecutarán en horario diurno de acuerdo con el horario contemplado en el Artículo 160 de la Ley 2101 de 2021 sancionada por el Congreso de la República de Colombia.

11.2. Dirigir las luces si se labora de noche, hacia los sitios específicos de trabajo, evitando la iluminación de los hábitats de la fauna.

Las actividades del proyecto se ejecutarán en horario diurno de acuerdo con el horario contemplado en el Artículo 160 de la Ley 2101 de 2021 sancionada por el Congreso de la República de Colombia.

11.3. Minimizar lo más posible la intensidad lumínica utilizada

Las actividades se realizaron en horario diurno por lo cual no se requirió el uso de luces o reflectores.

11.4. Evitar los ruidos innecesarios por silbatos, bocinas sirenas, pitos, motores encendidos, etc.

Para el periodo reportado se llevó a cabo la actividad de ahuyentamiento sonoro; la técnica se aplicó previamente al inicio de labores de la maquinaria, por medio de disturbios prolongados de 5 minutos utilizando para tal una corneta o vuvuzela de amplio alcance, con el fin de determinar a su vez la presencia de la fauna dispuesta en el área del recorrido.

Figura No. 19. Actividades de ahuyentamiento en el área de influencia del proyecto



11.5. Mantener los equipos en buenas condiciones y disponer de sistemas de escapes adecuados y eficaces.

Se presentarán los soportes de mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos y maquinarias una vez sean requeridos.

11.6. Mantenimiento periódico a la maquinaria y equipos a motor que sean empleados durante las actividades del proyecto

Se presentarán los soportes de mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos y maquinarias una vez sean requeridos.

12. Medidas para el control al incremento de la cacería furtiva

12.1. Prohibir a los trabajadores la práctica de cacería furtiva

Dentro de las jornadas de capacitación ambiental, se incluyen charlas orientadas a la preservación y conservación de la flora y fauna silvestre, las cuales son impartidas por los profesionales ambientales en campo.

Figura No. 20. Charlas y capacitaciones componente ambiental



12.2. Prohibir o regular el uso de armas de fuego dentro del área del proyecto.

En la actividad de inducción al personal de obra se incluye la prohibición del uso de armas de fuego en el área del proyecto y/o área de trabajo.

12.3. Coordinar con las autoridades competentes la vigilancia del área para evitar, en lo posible, la entrada de cazadores furtivos.

Para el periodo reportado no hubo presencia de cazadores furtivos.

Por otra parte, se atendió requerimiento presencial al personal de la autoridad ambiental Parques Nacionales Naturales, respecto al estado de avance del proyecto y el seguimiento a las medidas ambientales implementadas en el área de influencia para la protección de fauna silvestre.

Figura No. 21. Atención al personal de Parques Nacionales Naturales



12.4. Implementar un programa de capacitación y educación ambiental para los trabajadores, antes de iniciar los trabajos estos deben recibir información acerca de la normatividad referente a la importancia de la protección de los recursos naturales

En el componente ambiental del proyecto se contemplan las capacitaciones en temas ambientales dirigida a todo el personal en obra, estas se desarrollan de manera presencial abordando las diferentes temáticas que se relacionan en el Plan de Implementación y Seguimiento de las Medidas de Manejo Ambiental implementadas.

13. Medidas para el rescate y salvamento de especies

13.1. Salvamento de especies, que brinde atención temporal a las especies.

El proyecto cuenta con un equipo profesional en campo que brinda atención oportuna a las especies que se rescatan en el área de labores. Se presenta equipo en el informe de agosto de seguimiento al PROTOCOLO ADOPTADO PARA EL MANEJO DE FAUNA SILVESTRE ASOCIADO A LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL CONSORCIO ICASM 2023.

Figura No. 22. Levantamiento línea base Biota



13.2. Coordinar con la autoridad ambiental, para garantizar la reubicación inmediata y adecuada de especies.

Para el presente periodo se realizó el rescate en caliente de una (1) especie; una (1) Babilla, *(Caiman crocodilus)* hallado cerca de la zona de carga y repaleo de material para llenado, el cual fue reubicado aguas abajo del Río Piedras, sector San Martín.

La ampliación de este componente está relacionada con sus respectivos soportes en el informe de agosto de seguimiento al PROTOCOLO ADOPTADO PARA EL MANEJO DE FAUNA SILVESTRE ASOCIADO A LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL CONSORCIO ICASM 2023.

Figura No. 23. Reubicación de fauna silvestre



13.3. Identificar y adoptar esquemas de cooperación, que faciliten el rescate, atención y rehabilitación de especies

Para esta actividad se acogió el Protocolo de CORPAMAG para el manejo de fauna silvestre, el cual fue adaptado para las obras ejecutadas por el CONSORCIO ICASM 2023, dentro del cual se contemplan las acciones desarrolladas para garantizar que se salvaguarde la fauna presente en el área de labores.

No.	ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO			
		SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
1	Demarcar el área de desarrollo de actividades	X			
2	Establecer avisos de conservación de fauna silvestre	X			
3	Prohibir a los trabajadores la práctica de cacería furtiva	X			
4	Evitar acumular la biomasa vegetal en sitios no autorizados, y en lo posible mezclarla con el suelo para su aprovechamiento	X			Para el periodo reportado no se requiere la intervención de especies arbóreas.
5	En caso de que se necesite podar individuos forestales, dicha actividad deberá efectuarse con personal idóneo.	X			Para el periodo reportado no se requiere realizar poda de individuos arbóreos.
6	En lo posible todas las labores serán realizadas en horarios diurnos, en caso de que sea necesaria la operación nocturna dirigir las luces hacia los sitios específicos de trabajo, evitando la iluminación de los hábitats de la fauna	X			

7	Mantenimientos a maquinaria y equipos de trabajo	X			No se han realizado mantenimientos.
8	Evitar los ruidos innecesarios por silbatos, bocinas sirenas, pitos, motores encendidos, etc.	X			
9	Educación ambiental para los trabajadores sobre protección de los recursos naturales.	X			
10	En caso de intervenir árboles, se realizará la compensación forestal en una relación de 1:4	X			Para el periodo reportado no se requiere la intervención de especies arbóreas.

META	INDICADOR	OBSERVACIONES
Mantenimiento del 90% de los vehículos según el grado de requerimiento	$\frac{\text{No. de mantemientos realizados}}{\text{No. de mantenimientos programados}} x100$	No se han realizado mantenimientos.
Compensación forestal del 100% de los árboles extraídos	$\frac{\text{No. de árboles intervenidos}}{\text{No. de árboles inventariados}} x100$	Para este mes no se requiere la intervención de individuos arbóreos.
Utilizar como mínimo el 50% de la madera extraída.	$\frac{\text{Volumen total de madera donada o usada para el proyecto}}{\text{Volumen total de madera extraída.}} x10$	Para este mes no se requiere la intervención de individuos arbóreos.
Contratar al 85% del personal de monitoreo del protocolo de ahuyentamiento y rescate fauna silvestre.	$\frac{\text{Equipo profesional contratado}}{\text{Equipo profesional requerido}} x100$ $\frac{1}{1} x100 = 100\%$	
Ejecutar el 100% de los métodos de ahuyentamiento de la fauna silvestre presentes en las áreas de la obra.	$\frac{\text{No. de técnicas de ahuyentamiento efectuadas}}{\text{No. de técnicas de ahuyentamiento propuestas}} x100$ $\frac{1}{1} x100 = 100\%$	
Rescatar y reubicar el 100% de los individuos de fauna silvestre que no pudieron ser ahuyentados.	$\frac{\text{No. de especies reubicadas}}{\text{No. de especies capturadas}} x100$ $\frac{1}{1} x100 = 100\%$	

7.3. Programas del Medio Socioeconómico

7.3.1. P-MS-P1 Programa socioeconómico y cultural

Tabla No 7. Ficha de seguimiento al Programa socioeconómico y cultural

FICHA DE SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL MEDIO SOCIOECONÓMICO							CODIGO: P-MS-P1
Programa 1: Programa socioeconómico y cultural							
TIPO DE MEDIDA							
Prevención	X	Mitigación	X	Control	X	Compensación	
14. Medidas para reducir el incremento en el riesgo de accidentes laborales							

14.1. Educación y formación ambiental en los temas relacionados con las fichas de manejo ambiental.

Para el periodo reportado se realizaron charlas y capacitaciones ambientales a los trabajadores, relacionadas con la importancia de las fuentes hídricas, identificación de cuerpos de agua, como educar y sensibilizar en cuanto a las acciones para la conservación y protección de estas. Se anexa el soporte del registro de asistencia. (Anexo C)

Figura No. 24. Inducciones y reinducciones ambientales



14.2. Uso de los elementos de protección individual.

Se le entrego al personal de obra los elementos de protección personal. Se anexan soportes en el área de Salud y Seguridad en el Trabajo.

Figura No. 25. Entrega de elementos de protección personal



14.3. Prohibido el consumo de bebidas alcohólicas.

Dentro de las charlas efectuadas a los trabajadores por la profesional SST se socializa acerca de la prohibición de consumos de bebidas alcohólicas. Esta información se encuentra ampliada en el informe de Salud y Seguridad en el Trabajo.

Figura No. 26. Charlas del área de SST



14.4. El personal debe contar con afiliación a una entidad prestadora del servicio de salud (EPS) y a la aseguradora de riesgos profesionales (ARP).

En el informe de seguridad y salud en el trabajo se relacionan las planillas de seguridad social vigentes y las afiliaciones correspondientes al mes.

14.5. Asistencia a las reuniones de socialización de proyecto.

Para el periodo reportado se realizaron dos (2) reuniones de socialización del proyecto, una, como atención a la solicitud formal presentada por la comunidad del sector El Zaino ante CORPAMAG, referente a la solicitud de información relacionada con el estado de ejecución del proyecto y medidas

ambientales adoptadas, y la segunda, una socialización del proyecto con los propietarios y/o encargados de los predios ubicados en el marguen izquierdo de Río Piedras.

Figura No. 27. Socialización del proyecto con la comunidad de El Zaino



Por otra parte, se levantaron actas de vecindad en el área directa de influencia del proyecto. Los soportes correspondientes a estas actividades se presentan como documentos adjuntos en el informe realizado por el área de Gestión Social.

Figura No. 28. Levantamiento de Actas de Vecindad



14.6. <u>Se ubicará una valla fija (1) de tipo informativo en la cual se presentará el nombre del contratista, el tiempo de ejecución de las obras y los responsables del proyecto, etc. (de acuerdo con especificaciones). Esta se instalará en un lugar de fácil visibilidad tanto para peatones como para los conductores de los diferentes vehículos que transiten por la zona.</u>

En el periodo reportado se gestionó el permiso de instalación ante el propietario del predio seleccionado para la ubicación de la valla. Este documento será aportado para radicar la solicitud ante la Autoridad Ambiental competente e iniciar el trámite de autorización para la instalación de una Valla informativa. (En el Anexo D se presenta la autorización del propietario para la instalación del elemento informativo.

Figura No. 29. Render de la valla a instalar



15. Medidas para controlar la migración y el establecimiento de asentamientos humanos:

15.1. Prohibir que en las instalaciones del proyecto se mantenga personal que no ha sido contratado directamente para trabajar en la obra.

Para el periodo reportado no se presentaron inconvenientes en cuanto a la presencia de personas externas a la obra.

No.	ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO			
		SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
1	Educación y formación ambiental en los temas relacionados con las fichas de manejo ambiental.	X			
2	Uso de los elementos de protección individual	X			
3	Prohibido el consumo de bebidas alcohólicas	X			
4	Prohibido hacer fuego en el área de influencia del proyecto	X			
5	Afiliación del personal a EPS y ARP	X			
6	Asistencia a reuniones de socialización	X			
7	Contar con valla del proyecto	X			La solicitud se encuentra en trámite para radicación ante la autoridad ambiental.
8	Restricción de personal no contratado en zona de trabajo	X			
META	**INDICADOR**				**OBSERVACIONES**

Efectuar el 100% de las actividades establecidas	$\frac{\text{No. de actividades ejecutadas}}{\text{No. de actividades que aplican}} x100$ $\frac{8}{8} x100 = 100\%$	

7.3.2. P-MS-P2 Programa de manejo de residuos.

Tabla No 8. Ficha de seguimiento al Programa de manejo de residuos.

FICHA DE SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL MEDIO SOCIOECONÓMICO								CODIGO: P-MB-P2
Programa 2: Programa de manejo de residuos.								
TIPO DE MEDIDA								
Prevención	X	Mitigación	X	Control	X	Compensación		
16. Manejo de residuos sólidos								

16.1. Formar a los trabajadores sobre residuos sólidos

En el programa de capacitaciones e inducciones ambientales se contemplan socializaciones relacionadas con el manejo adecuado de residuos sólidos. En el Anexo C se presentan los soportes de capacitaciones ambientales con relación a la gestión adecuada de residuos sólidos.

16.2. Contar con puntos ecológicos en obra.

El proyecto cuenta con la instalación de un (1) punto ecológico.

16.3. Eliminación apropiada de residuos sólidos.

- Se realiza la disposición adecuada de residuos ordinarios con la empresa de servicio de aseo ATESA.

- Los residuos peligrosos serán dispuestos una vez se tenga una cantidad considerable, esta actividad se realizará mediante gestores autorizados por la autoridad ambiental, para lo cual se presentarán los soportes correspondientes.

- Una vez se inicie la actividad de cargue y transporte de sedimentos, estos serán dispuestos en sitios autorizados por la autoridad ambiental, para lo cual se presentará la documentación correspondiente.

Figura No. 30. Jornadas de orden y aseo



17. Manejo de residuos líquidos

17.1. Realizar manejo apropiado de los residuos sanitarios o aguas residuales se generarán como resultado de la actividad humana durante el proyecto.

Se contrataron dos (2) cabañas del sector para el uso de sanitarios por parte de los trabajadores de obra.

18. Manejo de residuos peligrosos

18.1. Los residuos peligrosos deben ser recolectados de manera apropiada.

El proyecto de obra cuenta con una caneca para la disposición de residuos peligrosos líquidos.

18.2. En caso de que sea posible hacer devolución al proveedor de materiales y residuos que lo permitan.

Para el periodo reportado no se realizó devolución de materiales para ser incorporados en el sistema de logística inversa. A continuación**,** se relacionan los materiales utilizados.

- Manto Antisocavación ensamblado en geotextil de poliéster.
- Hilo de Poliéster 100.
- Geomanto para control de erosión, Tipo TRM Terratrac.
- Geotextil tejido en poliéster.

Figura No. 31. Materiales utilizados en actividades de obra



No.	ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO			
		SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
1	Realizar la separación de residuos sólidos en los puntos ecológicos y disposición final en los sitios autorizados	X			
2	Se instalarán baterías sanitarias portátiles	X			

META	INDICADOR	OBSERVACIONES
Gestión integral del 100% de los residuos generados durante el desarrollo de las obras.	$\frac{\text{No. de actividades ejecutadas}}{\text{No. de actividades programadas}} x100$ $\frac{2}{2} x100 = 100\%$	El proyecto cumple la meta establecida.

8. OTRAS MEDIDAS AMBIENTALES

8.1. Rescate de Fauna Acuática y Terrestre

Para esta actividad se estableció el PROTOCOLO ADOPTADO PARA EL MANEJO DE FAUNA SILVESTRE ASOCIADO A LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL CONSORCIO ICASM2023, del cual se presenta un informe mensual correspondiente a las actividades implementadas.

Figura No. 32. Revisión y seguimiento de cámaras trampas



8.2. Implementación de la estrategia de sensibilización y participación ambiental dirigido a la comunidad en la zona de influencia del proyecto.

El PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN AMBIENTAL se encuentra en fase de ejecución, a continuación, se relacionan las jornadas desarrolladas durante el mes de octubre.

Tabla No 9. Actividades estrategia de participación ambiental

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PIESPA - OCTUBRE 2025			
JORNADA		COMUNIDAD	FECHA
1.1.	Jornada de sensibilización educativa Ambiental	CEDI Orinoco Los Cocos (Sede No. 2)	1/10/2025
		JAC Los Naranjos	6/10/2025
		Comunidad El Milagro II	17/10/2025
		JAC Manzanares	23/10/2025
1.2.	Jornada de sensibilización para la conservación y aprovechamiento del recurso hídrico y pesquero.	JAC Los Naranjos	6/10/2025
1.3	Jornada de sensibilización para la conservación de la fauna y flora existentes en los cuerpos de agua.	JAC Los Naranjos	20/10/2025
2.1.	Jornada de sensibilización para el manejo adecuado y aprovechamiento de los residuos sólidos	CEDI Orinoco Los Cocos (Sede No. 2)	1/10/2025
		Comunidad El Milagro II	3/10/2025
2.2.	Jornada teórico-practico para la caracterización de los residuos sólidos.	CEDI Orinoco Los Cocos (Sede No. 2)	1/10/2025
		Comunidad El Milagro II	3/10/2025

2.3.	Acompañamiento - Actividades de cierre de jornada educativa ambiental, a través de la transformación del material reciclable.	IED Quinto Centenario	15/10/2025
		CEDI Orinoco Los Cocos (Sede No. 2)	16/10/2025
		Comunidad El Milagro II	17/10/2025
3.1.	Jornada de sensibilización “Ambiental y Cultural” para la construcción de acciones que generen grandes cambios en el cuidado y protección de los cuerpos de agua.	IED Quinto Centenario	15/10/2025
		CEDI Orinoco Los Cocos (Sede No. 2)	16/10/2025
3.2.	Jornada de sensibilización para la adaptación al cambio climático asociados a los cuerpos de agua.	IED Quinto Centenario	15/10/2025
		CEDI Orinoco Los Cocos (Sede No. 2)	16/10/2025
3.3.	Jornada de sensibilización para la gestión del riesgo de desastres, asociados a los cuerpos de agua.	IED Liceo del Sur	24/10/2025
		CEDI Orinoco Los Cocos (Sede No. 2)	28/10/2025
		IED Quinto Centenario	29/10/2025
		Comunidad El Milagro II	31/10/2025
4.1.	Taller para el fortalecimiento de los temas educativos ambientales contenidos en las cartillas “Aprendiendo para proteger las fuentes Hídricas”	IED Liceo del Sur	24/10/2025
		IED Quinto Centenario	29/10/2025
		Comunidad El Milagro II	31/10/2025

Figura No. 33. Socialización del componente de Educación Ambiental



9. CONTROL DEL DOCUMENTO

Tabla No 10. Control de documento

Fecha de elaboración: Octubre, 2025.	
Elaborado por:	Aprobado por:
ING. ROSA VILLAMIZAR SIERRA Ingeniera ambiental y Sanitaria	**ING. SANTIAGO OSPINO URUEÑA** Coordinador de proyecto

10. ANEXOS

Anexo A: Documentos maquinaria

Anexo B: Soportes de Tecnomecánica

Anexo C: Soportes de inducción y capacitación ambiental

Anexo D: Documentos previos valla informativa

Anexo E: Documentos suministro de combustible

MINISTERIO DE TRANSPORTE

GUÍA DE MOVILIZACIÓN O TRÁNSITO DE LA MAQUINARIA

ENTIDAD **PORTAL WEB**

NRO. de GUIA 584358

NRO. TARJETA DE REGISTRO DE LA MAQUINARIA: 97670	**TIPO DE DOCUMENTO DEL SOLICITANTE:** Cédula Ciudadanía	**NÚMERO DE DOCUMENTO DEL SOLICITANTE:** 1062404515
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE: CARLOS DIONICIO RAMIREZ ZARATE		**NRO. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE LA MAQUINARIA:** MC479514
VIN: HHKHK606PE0002692	**CHASIS:** HHKHK606PE0002692	**MOTOR:** 84956822
SERIE: HHKHK606PE0002692	**SUBPARTIDA ARANCELARIA:** 8429520000	**IDENTIFICACIÓN DEL GPS:** 4764383535
EMPRESA DE HABILITACIÓN DEL GPS: TRACKING SOLUTIONS T.S.O	**FECHA EXPEDICIÓN:** 24/09/2025	**FECHA VENCIMIENTO:** 22/10/2025
ORIGEN: VALLEDUPAR	**DESTINO:** SANTA MARTA	
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA: desde valledupar hasta quebrada don diego		
COLOR: AMARILLO	**USO:** construcion	**FIRMA FUNCIONARIO EXPEDIDOR**

Transporte

RUNT

MINISTERIO DE TRANSPORTE

GUÍA DE MOVILIZACIÓN O TRÁNSITO DE LA MAQUINARIA

ENTIDAD PORTAL WEB

NRO. de GUIA 586817

NRO. TARJETA DE REGISTRO DE LA MAQUINARIA: 93266	**TIPO DE DOCUMENTO DEL SOLICITANTE:** Cédula Ciudadanía	**NÚMERO DE DOCUMENTO DEL SOLICITANTE:** 1000589246
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE: CONSORCIO ICASM 2023		**NRO. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE LA MAQUINARIA: MC399296**
VIN:0002147	**CHASIS: HHKHK606VE0002147**	**MOTOR:849**
SERIE: HHKHK606VE0002147	**SUBPARTIDA ARANCELARIA:** 8429590000	**IDENTIFICACIÓN DEL GPS:352556102304230**
EMPRESA DE HABILITACIÓN DEL GPS: TRACKING SOLUTIONS T.S.O	**FECHA EXPEDICIÓN:** 30/9/2025	**FECHA VENCIMIENTO:** 30/10/2025
ORIGEN: SANTA MARTA	**DESTINO:** RIOHACHA	
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA: VIAS NACIONALES		
COLOR: AMARILLO	**USO:** CONSTRUCCION	**FIRMA FUNCIONARIO EXPEDIDOR**

Transporte

RUNT

MINISTERIO DE TRANSPORTE

GUÍA DE MOVILIZACIÓN O TRÁNSITO DE LA MAQUINARIA

ENTIDAD PORTAL WEB

NRO. de GUIA 586819

NRO. TARJETA DE REGISTRO DE LA MAQUINARIA: 94432	**TIPO DE DOCUMENTO DEL SOLICITANTE:** Cédula Ciudadanía	**NÚMERO DE DOCUMENTO DEL SOLICITANTE:** 1000589246
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE: CONSORCIO ICASM 2023		**NRO. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE LA MAQUINARIA: MC429119**
VIN:0001460	**CHASIS: HBRR220CHE0001460**	**MOTOR:36734672**
SERIE: HBRR220CHE0001460	**SUBPARTIDA ARANCELARIA:** 8429590000	**IDENTIFICACIÓN DEL GPS:352556102304230**
EMPRESA DE HABILITACIÓN DEL GPS: TRACKING SOLUTIONS T.S.O	**FECHA EXPEDICIÓN:** 30/9/2025	**FECHA VENCIMIENTO:** 30/10/2025
ORIGEN: SANTA MARTA	**DESTINO:** RIOHACHA	
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA: VIAS NACIONALES		
COLOR: AMARILLO	**USO:** CONSTRUCCION	**FIRMA FUNCIONARIO EXPEDIDOR**

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 97670

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC479514	HYUNDAI	HX220S	2022

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	EXCAVADORA	HHKHK606PE0002692

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	84956822	ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
21260 Kg	3110 mm	2990 mm	9570 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
B&P CONSTRUCCIONES S.A.S.	NIT 900.481.955

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN



LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

PRENDA-COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

U TEC CONT/VIG/ REG TTOYTTE SANTA MARTA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
12-05-2022	12-05-2022	******
ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	352022000149432	12/05/2022

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM0200033900

A DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

2022

ación reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario
352022000149432-0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	11. Apellidos y nombres o Razón Social
890903024	1	COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S. A.S.

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cod. Ciudad Municipio
CL 11 SUR CR 50 50	3606161	35	05	001

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
900081359	1	Agencia de Aduanas ML S.A.S. Nivel 1	26	513

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
16777256	Carmona Montes Robert

Clase de artículo	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Anticipada	3	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

Cod. lugar ingreso las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BUN	99900	No. 116575012282368	2022 - 04 - 08	No. EUKOULCB1804601	2022 - 01 - 30

Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48.Cod.País Exportador
HYUNDAI CORPORATION	SEOUL	190

Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
S, YULGOK-RO, JONGNO-GU	82-2-390-1061

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ [illegible]
V22AAS0116005	2022 - 01 - 30	190	1	472	5	NAVES S.A.	3.798,94

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8429520000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	190	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	dcms.	72. Peso neto kgs.	dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	190	18,320.30		18,317.98		PK	18	3	U	1.00

78.Valor FOB USD	79. Valor fletes USD	80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD	84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
96,244.00	6,300.00	45.23	8.39	6,353.62	0.00	102,597.62	X	XXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No.	90. Cód.Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	389,758,099	0	0	0
I.V.A.	19.00	389,758,099	74,054,000	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0
Sancion	0	0	0	0	
Rescate	0	0	0	0	
		Total	74,054,000		

91. Descripción de las mercancías(No incluir la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, serialres y otros) (Si el campo es insuficiente continúe al respaldo de este formulario)

De: 13MDEBU03220417, Nro Pedido / Orden Compra:MAQ20220008-H, Declaración: 3/9; Codigo Usuario Apto: U00719 ; Codigo Usuario Sa[illegible] Riesgo: U00719 ; MERCANCIA NUEVA, NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0272 DE 2018 Y AL DECRETO 1881 DE 2021 ART 2; Nombre Comercial: EXCAV[illegible] DORA, Marca C: HYUNDAI, Ref: HX220S , Mod: HX220S , Otras Caracteristicas: PRODUCTO: EXCAVADORA ,SERIAL: HHKHK606PE0002692, [illegible] DESTINO: INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, SERIAL MOTOR: 84956822, NUMERO VIN: HHKHK606PE0002692, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU NORMA[illegible] FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA, CANTIDAD: 1 UNIDADES; ; XXXXXXXXXXXXX

COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S.
NIT. 890903024-1
CONTAMOS CON UNA RED NACIONAL DE SERVICIOS
Sede Principal: CL 11 SUR 50 50,MEDELLIN Colombia
Teléfono: 57 4 - 3606161
www.navitrans.com.co

Sede de Venta: CL 30 14 101 , SOLEDAD - COLOMBIA, Tel:367 86 86
Responsables de IVA. Por favor no efectuar retencion de IVA. Grandes Contribuyentes Resolución 9061 Diciembre 10 de 2020
Favor no efectuar Retencion en la Fuente somos Autorretenedores Resol No. 000117 Agosto 17/93
Agentes Retenedores de IVA. Autorretenedores del CREE (Art 3 del DR 882 de 2013). Código CIIU 4511. Tarifa 0.40%
En Cali somos Autorretenedores de ICA Resol. 275 de Agosto 2 de 2002
En Yumbo somos Autorretenedores de ICA Resol. 003 de Marzo 4/2014
En Medellin somos Autoretenedores
Autorización numeración de facturación No. 18764024150892 del 2022-01-17 vigente hasta 2023-07-17 del ATSD140001 al ATSD160000
Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

B&P CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT/Cédula: 900481955-6
CL 24 2 66 O F 709 - SANTA MARTA, MAGDALENA, COLOMBIA
Teléfono:
Tercero Relacionado: B&P CONSTRUCCIONES S.A.S.
Email:
contabilidad@bypconstrucciones.com;facturacionelectronica@bypconstrucciones.com
Condición Pago: Contado

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.	FECHA GENERACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	PEDIDO DE VENTAS	NUMERO DE PLANILLA	PAGINACIÓN
ATSD143952	04/05/2022 11:30:04	04/05/2022	OV-3161598	55235630	1 de 1

MARCA	PLACA	LÍNEA	MODELO	CANTIDAD (UND)	TIPO DE MOTOR	A. MODELO
HYUNDAI		HX220S	HX220S	1.00 (94)	MOT-2	2022
N° MOTOR	**FECHA MFTO**	**LEVANTE**	**No. ADHESIVO DE PAGO**	**SERIE No.**	**VIN**	**COLOR**
84956822	01/04/2022	352022000153974	92352200693411		HHKHK606PE0002692	
CÓDIGO	**DESCRIPCION**		**VALOR UNITARIO**	**DIVISA**	**TOTAL**	
HX220S	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HX220S		545.378.151,26	COP	545.378.151,00	

DISCRIMINACION DE LA PARTICIPACION		PORCENTAJE	VALOR
900481955	B&P CONSTRUCCIONES S.A.S.	100,00	545,378,151.00

Total Nro Líneas: 1

OBSERVACIONES:
Visite nuestro sitio web www.navitrans.com.co.

Forma Pago : Instrumento no definido

%IVA	BASE	IMPUESTO
IVA 19,00%	545.378.151,00	103.621.848,69

SUBTOTAL	545.378.151,00
DESCUENTO	
IVA	103.621.848,69
IMPOCONSUMO	
RETERENTA	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL FACTURA COP	649.000.000,00

Esta factura de Venta es negociable según la ley 1231 de 2008. El comprador, titular de la factura, hace constar con su firma que acepta el contenido de la factura y el recibo de la mercancía; igualmente acepta ser consultado y reportado en caso de incumplimiento a cualquier central de riesgo. Navitrans S.A.S no se hace responsable por reparaciones o instalaciones realizadas por terceros. DESPUES DE 30 DIAS CALENDARIO NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. Garantía de repuestos: 6 meses. Es condición para el reconocimiento de la garantía que el repuesto haya sido contramarcado por Navitrans S.A.S, lo cual el comprador debe verificar al momento de la entrega del bien adquirido. Con la aceptación de la factura autorizo a NAVITRAN S.A.S. para que ejerza el derecho de retención de todos los bienes a los que la misma se refiere, mientras su importe no sea cancelado. Los equipos marca CASE están equipados con llantas de uso genérico, no aptas para condiciones y aplicaciones de uso especiales. INGRESE A NUESTRA PAGINA WEB donde encontrará los términos de la garantía. CONSULTE SUS DERECHOS COMO CONSUMIDOR Y LOS MECANISMOS DE PROTECCION EN LA LEY 1480 DEL 2011 Y EN LA CIRCULAR UNICA DE LA SIC. VISITE NUESTRA PAGINA WEB WWW.NAVITRANS.COM.CO (http://WWW.NAVITRANS.COM.CO)

CONSIGNACIÓN NACIONAL EN CUALQUIER OFICINA DE: BBVA Recaudo: 305114753 BANCO DE OCCIDENTE Recaudo: 9221 BANCOLOMBIA Recaudo: 5474 BANCO CAJA SOCIAL Recaudo: 01842 AV. VILLAS Recaudo: 477002257 BANCO DE BOGOTA Recaudo: 393008180 CORPBANCA Recaudo: 2249 BANCO GNB SUDAMERIS Recaudo: 63015390 DAVIVIENDA Recaudo: 1000595

CUFE:73159749aae029aaf7ac4fb871d1ca8812c2c2a4d33dce377d6661dc0039b28759493b766d02fdbecc55c64ce7767158
Fecha de Validación: 2022-05-04 11:32:33-05:00
Tipo de operación: Estándar - 10
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 93266

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC399296	HYUNDAI	HX220S	2022

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	EXCAVADORA	HHKHK606VE0002147

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	84948558	ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
21260 Kg	3110 mm	2990 mm	9570 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
B&P CONSTRUCCIONES S.A.S.	NIT 900.481.955

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN



LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

PRENDA-COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

U TEC CONT/VIG/ REG TTOYTTE SANTA MARTA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
08-02-2022	08-02-2022	******
ORIGEN	**DEC. IMPORTACIÓN**	**FECHA DE LEVANTE**
IMPORTACIÓN	352021000510095	18/01/2022

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM02000033863

COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S.
NIT: 890903024-1
CONTAMOS CON UNA RED NACIONAL DE SERVICIOS
Sede Principal: CL 11 SUR 50 50 MEDELLIN Colombia
Teléfono: 57 4 - 3606161
www.navitrans.com.co



Sede de Venta: CL 30 14 101 , SOLEDAD - COLOMBIA, Tel 367 88 88
Responsables de IVA. Por favor no efectuar retencion de IVA. Grandes Contribuyentes Resolución 0061 Diciembre 10 de 2020
Favor no efectuar Retencion en la Fuente somos Autorretenedores Resol No. 000117 Agosto 17/93
Agentes Retenedores de IVA. Autorretenedores del CREE (Art 3 del DR 882 de 2013). Código CIIU 4511. Tarifa 0.40%
En Cali somos Autorretenedores de ICA Resol. 275 de Agosto 2 de 2002
En Yumbo somos Autorretenedores de ICA Resol. 003 de Marzo 4/2014
En Medellin somos Autoretenedores
Autorización numeración de facturación No. 18764024150892 del 2022-01-17 vigente hasta 2023-07-17 del ATSD140001 al ATSD160000
Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

B&P CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT/Cédula: 900481955-6
CL 24 2 66 O F 709 - SANTA MARTA, MAGDALENA, COLOMBIA
Teléfono:
Tercero Relacionado: B&P CONSTRUCCIONES S.A.S.
Email:
contabilidad@bypconstrucciones.com,facturacionelectronica@bypconstrucciones.com
Condición Pago: CREDITO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.	FECHA GENERACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	PEDIDO DE VENTAS	NUMERO DE PLANILLA	PAGINACIÓN
ATSD140295	25/01/2022 09:55:13	25/02/2022	OV-3109538	82325867	1 de 1

MARCA	PLACA	LÍNEA	MODELO	CANTIDAD (UND)	TIPO DE MOTOR	A. MODELO
HYUNDAI		HX220S	HX220S	1.00 (94)	MOT-2	2022
N° MOTOR	**FECHA MFTO**	**LEVANTE**	**No. ADHESIVO DE PAGO**	**SERIE No.**	**VIN**	**COLOR**
84948558	27/12/2021	352022000025848	92352102347223		HHKHK606VE0002147	
CÓDIGO	**DESCRIPCION**		**VALOR UNITARIO**	**DIVISA**	**TOTAL**	
HX220S	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HX220S		543.277.310,99	COP	514.285.714,00	

DISCRIMINACION DE LA PARTICIPACION		PORCENTAJE	VALOR
900481955	B&P CONSTRUCCIONES S.A.S.	100,00	514.285.714,00

Total Nro Lineas: 1

OBSERVACIONES:
Visite nuestro sitio web www.navitrans.com.co.

Fecha Venc.	Vr. Cuota
25/02/2022	204000000.00
25/03/2022	204000000.00
25/04/2022	204000000.00

%IVA	BASE	IMPUESTO
IVA 19,00%	514.285.714,00	97.714.285,66

SUBTOTAL	543.277.311,00
DESCUENTO	28.991.597,00
IVA	97.714.285,66
IMPOCONSUMO	
RETERENTA	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL FACTURA COP	612.000.000,00

Esta factura de Venta es negociable según la ley 1231 de 2008. El comprador, titular de la factura, hace constar con su firma que acepta el contenido de la factura y el recibo de la mercancía; igualmente acepta ser consultado y reportado en caso de incumplimiento a cualquier central de riesgo. Navitrans S.A.S no se hace responsable por reparaciones o instalaciones realizadas por terceros. DESPUES DE 30 DIAS CALENDARIO NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. Garantía de repuestos: 6 meses. Es condición para el reconocimiento de la garantía que el repuesto haya sido contramarcado por Navitrans S.A.S, lo cual el comprador debe verificar al momento de la entrega del bien adquirido. Con la aceptación de la factura autorizo a NAVITRAN S.A.S. para que ejerza el derecho de retención de todos los bienes a los que la misma se refiere, mientras su importe no sea cancelado. Los equipos marca CASE están equipados con llantas de uso genérico, no aptas para condiciones y aplicaciones de uso especiales. INGRESE A NUESTRA PAGINA WEB donde encontrará los términos de la garantía. CONSULTE SUS DERECHOS COMO CONSUMIDOR Y LOS MECANISMOS DE PROTECCION EN LA LEY 1480 DEL 2011 Y EN LA CIRCULAR UNICA DE LA SIC. VISITE NUESTRA PAGINA WEB WWW.NAVITRANS.COM.CO (http://WWW.NAVITRANS.COM.CO)

CONSIGNACIÓN NACIONAL EN CUALQUIER OFICINA DE: BBVA Recaudo: 305114763 BANCO DE OCCIDENTE Recaudo: 9221 BANCOLOMBIA Recaudo: 5474 BANCO CAJA SOCIAL Recaudo: 01842 AV. VILLAS Recaudo: 477002257 BANCO DE BOGOTA Recaudo: 393668180 CORPBANCA Recaudo: 2249 BANCO GNB SUDAMERIS Recaudo: 63015390 DAVIVIENDA Recaudo: 1002595

CUFE:91646b5c2df90295f72591b3b594bcb1945da9ef3297f0eccacb3d1edc80335e76717e6afe7dd10e0fc2732f67e0cb6e
Fecha de Validación: 2022-01-25 09:54:37-05:00
Tipo de operación: Estándar - 10
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-9

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario
352021000510095-8

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 890903024 | 6. DV: 1 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S. A.S.

13. Dirección: CL 11 SUR CR 50 50 | 15. Teléfono: 3606161 | 12. Cód. Admón.: 35 | 16. Cód. Dpto: 05 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900081359 | 25. DV: 1 | 26. Razón social del declarante autorizado: Agencia de Aduanas ML S.A.S. Nivel 1 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 513

29. Número documento de identificación: 16777256 | 30. Apellidos y nombres: Carmona Montes Robert

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Anticipada	3	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BUN	20950	No. 116575012055750	2022 - 01 - 09	No. EUKOULCB1781382	2021 - 11 - 03

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT CO LTD

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 75 YULGOK-RO, JONGNO-GU, SEOUL 03958 | 47. Ciudad: SEOUL | 48. Cod.País Exportador: 190

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
CV21JAS0116008	2021 - 10 - 22	190	1	077	5	AGENCIA OCEANICA OCEANIC LTDA.	3,997.09

50. E-mail: 02-2134-1114

S

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
8429520000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	190	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	190	20,158.52	20,158.52	PK	24	1	U	1.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
92,330.00	6,300.00
80. Valor Seguros USD	**81. Valor Otros Gastos USD**
43.39	5.25
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	**83. Ajuste valor USD**
6,348.64	0.00
84. Valor aduana USD	**85. Código registro o licencia**	**86. Número**
98,678.64	X	XXXXXXXXX
87. Cod. oficina	**88. Año**	**89. Programa No**	**90. Cód Interno del Producto**
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 394,427,405	94 0	95 0	96 0
I.V.A.	97 19.00	98 394,427,405	99 74,941,000	100 0	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 74,941,000		126 0

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

Do: 13MDEBU12210319, Nro Pedido / Orden Compra:MAQ20210035-H, Declaración: 6/12; Codigo UAP: 1516 ; MERCANCIA NUEVA, NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0272 DE 2018; Nombre Comercial: EXCAVADORA SOBRE ORUGAS, Marca C: HYUNDAI, Ref: HX220S , Mod: HX220S , Otras Caracteristicas: PRODUCTO: EXCAVADORA SOBRE ORUGAS,SERIAL: HHKHK606VE0002147, USO O DESTINO: INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, SERIAL MOTOR: 84948558, NUMERO VIN: HHKHK606VE0002147, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA, CANTIDAD: 1 UNIDADES; ; XXXXXXXXXXXXXX

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 94432

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC429119	HYUNDAI	R220LC-9S	2022

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	EXCAVADORA	HBRR220CHE0001460

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	36734672	ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
22500 Kg	3030 mm	3090 mm	9530 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
B&P CONSTRUCCIONES S.A.S.	NIT 900.481.955

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN



LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

PRENDA-COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

U TEC CONT/VIG/ REG TTOYTTE SANTA MARTA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
02-03-2022	02-03-2022	******
ORIGEN	**DEC. IMPORTACIÓN**	**FECHA DE LEVANTE**
IMPORTACIÓN	482022000060812	17/02/2022

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM02000033878

DIAN

Declaración de Importación

Privada **500**

1. Año **2022**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario **482022000060812-4**

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 890903024 | 6. DV: 1 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S. A.S.

13. Dirección: CL 11 SUR CR 50 50 | 15. Teléfono: 3806161 | 12. Cód. Admón.: 48 | 16. Cód. Dpto: 05 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900081359 | 25. DV: 1 | 26. Razón social del declarante autorizado: Agencia de Aduanas ML S.A.S. Nivel 1 | 27. Tipo usuario: 28 | 28. Cód. usuario: 513

29. Número documento de identificación: 73198744 | 30. Apellidos y nombres: Torres Rodriguez Eduardo Enrique

31. Clase Importación	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación No.	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Anticipada	3	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
CTG	25506	No. 116575012129752	2022 - 02 - 08	No. NYKS780011703	2022 - 01 - 27

47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
SEOUL	190

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT CO., LTD | 50. E-mail: 82-31-8006-6519

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 12th Fl. Hyundai Bldg. 75, Yulgok | 58. Tasa de cambio $ cvs.: 3,944.04

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
CV22AAS0116003	2022 - 01 - 21	105	1	077	5	NAVEMAR SAS	105	XXX

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Mercancía	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad doms.
	8429520000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	U	1.00

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. doms.	72. Peso neto kgs. doms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas
01	01	190	22,536.76	22,496.48	PK	12	1

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD	80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD	84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número	87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
101,960.00	4,783.16	47.92	0.00	4,831.08	0.00	106,791.08	X	XXXXXXXXX	99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	421,188,291	0	0	0
I.V.A.	19.00	421,188,291	80,026,000	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	
Rescate	0	0	0	0	
		Total	80,026,000		0

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

Do: 13MDECT01220917, Nro Pedido / Orden Compra:MAQ20220004-H, Declaración: 3/12; Codigo UAP: 1516 ; MERCANCIA NUEVA, NOS ACOGEMO
S AL DECRETO 0272 DE 2018, Y AL DECRETO 1881 DE 2021 ART. 2; Nombre Comercial: EXCAVADORA SOBRE ORUGAS, Marca C: HYUNDAI, Ref: R2
20LC-9S , Mod: R220LC-9S , Otras Caracteristicas: PRODUCTO: EXCAVADORA SOBRE ORUGAS, SERIAL: HBRR220CHE0001460, USO O DESTINO: IN
DUSTRIAL PARA LA CONSTRUCCION Y EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL, SERIAL MOTOR: 36734672, NUMERO VIN: HBRR220CHE0001460, INCLUYE
ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO, CANTIDAD: 1 UNIDADES; : XXXXXXXXXXXXXX

COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S.
NIT. 900655824-1
CONTRATISTA RED NACIONAL DE SERVICIOS
Sede Principal: CL 11 SUR 52 50 MEDELLIN Colombia
Teléfono: 57 4 - 3509181
www.navitrans.com.co



B&P CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT/Cédula: 900481855-8
CL 24 2 66 O F 708 - SANTA MARTA, MAGDALENA, COLOMBIA
Teléfono:
Tercero Relacionado: B&P CONSTRUCCIONES S.A.S
Email:
contabilidad@bypconstrucciones.com,facturacionelectronica@bypconstrucciones.com
Condición Pago: CREDITO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.	FECHA GENERACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	PEDIDO DE VENTAS	NUMERO DE PLANILLA	PAGINACIÓN
[illegible]	[illegible]	[illegible]	OV-3125836	52325967	1 de 1

MARCA	PLACA	LÍNEA	MODELO	CANTIDAD (UND)	TIPO DE MOTOR	A. MODELO
HYUNDA		R220LC-9SS	R220LC-9SS	1.00 (84)	MOT-2	2022
No. MOTOR	FECHA MTTO	LEVANTE	No. ADHESIVO DE PAGO	SERIE No.	VIN	COLOR
[illegible]	[illegible]	[illegible]	92482200370504		HBRR220CHE0001460	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		VALOR UNITARIO	DIVISA	TOTAL	
R220LC-9SS	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS R220LC-9SS		560.084.033,60	COP	542.016.807,00	

DISCRIMINACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE	VALOR
[illegible] B&P CONSTRUCCIONES S.A.S	100,00	542,016,807.00

Línea Nro Unidad: 1

%IVA	BASE	IMPUESTO
IVA 19,00%	542.016.807,00	102.983.193,33

SUBTOTAL	560.084.034,32
DESCUENTO	18.067.227,00
IVA	102.983.193,33
IMPOCONSUMO	
RETERENTA	
RETENA	
RETENCA	
TOTAL FACTURA COP	644.000.000,00

Navitrans S.A.S.
NIT. 890.903.024-1
MEDELLÍN 15

[illegible]

RESOLUCIÓN NO. 1538
(04 SEP. 2023)

"Por medio de la cual se llevan a cabo una modificación del vehículo de placas MC429119"

El Suscrito **SECRETARIO DE MOVILIDAD MULTIMODAL Y SOSTENIBLE**, del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y en especial las conferidas por el Decreto Distrital 312 del 29 de Diciembre de 2016, Decreto 1079 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 769 de 2002, en sus Artículos 3 determina que en el ámbito distrital son autoridades de tránsito los organismos de tránsito de carácter Distrital.

Que el parágrafo 1 del artículo 3 de la ley 769 de 2002 manifiesta al tenor: "***Parágrafo 3°.*** *Las autoridades, los organismos de tránsito, las entidades públicas o privadas que constituyan organismos de apoyo, serán vigiladas y controladas por la Superintendencia de Puertos y Transporte.*"

Que los principios rectores del código nacional de tránsito son: seguridad de los usuarios, calidad, oportunidad, cubrimiento, libertad de acceso, plena identificación, libre circulación, educación y descentralización, tal como lo establece el artículo 1°. De la ley 769 de 2002.

Que el día **5/09/2023** solicitó **B&P CONSTRUCCIONES S.A.S.**, identificado(a) con C.C. **900481955** quien figura como propietario(a) del vehículo de placas **MC429119**; En el sistema RUNT ***ACTUALIZAR INFORMACION DEL AUTOMOTOR EN MENCION.***

DATOS ACTUALES	DATOS CORRECTOS
NRO. IDENTIFICACIÓN DEL GPS 863427042337411	*NRO. IDENTIFICACIÓN DEL GPS 358077093314645*
EMPRESA DE HABILITACIÓN GPS: SPECTRUM GLOBAL CONTROL S.A.S.	*EMPRESA DE HABILITACIÓN GPS: TRACKING SOLUTION TSO MOBILE S.A.S*

Que la Circular Radicado MT No.20174000494331 del Ministerio de Transporte establece el procedimiento para corregir y completar la información cargada en el sistema RUNT de los vehículos de transporte terrestre y puntualiza en el punto 2 la necesidad de emitir un Acto Administrativo motivado para realizar dicha corrección.

RESOLUCIÓN NO. 1538
(04 SEP. 2023)

Que con el fin de no hacer más gravosa la situación, este despacho en mérito de lo anteriormente expuesto.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Efectúese la corrección; **ACTUALIZAR** ***NRO. IDENTIFICACIÓN DEL GPS 358077093314645, EMPRESA DE HABILITACIÓN GPS***: **TRACKING SOLUTION TSO MOBILE S.A.S** del vehículo **MC429119.**

ARTICULO SEGUNDO: Se ordena a la concesión SIETT migre esta información al Registro Único Nacional de Transito "RUNT" para que se lleve a cabo los ajustes en el sistema con relación al tema en particular.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese de la presente decisión a **B&P CONSTRUCCIONES S.A.S.,** identificado(a) con C.C. 900481955 quien figura como propietario(a) del vehículo de placas **MC429119,** de acuerdo al artículo 67 de la ley 1437 del 2011.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

04 SEP. 2023

Dado en Santa Marta, a los _____ del mes de _____ de _____.

ERNESTO MARIO CASTRO CORONADO
SECRETARIO DE MOVILIDAD MULTIMODAL Y SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

Proyectó	ARIANA SAUMET – JEFE DE SISTEMAS	
Revisó		

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 183913891

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: TOTALCHECK S.A.S

NIT: 900085332

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-035-001

Fecha de expedición: 2025/09/13

Fecha de vencimiento: 2026/09/13

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SVR312

CLASE: CAMIONETA

MARCA: NISSAN

MODELO: 2015

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 2389

NRO. MOTOR: KA24-787116A

NRO. CHASIS: 3N6DD25T4ZK943144

VIN: 3N6DD25T4ZK943144

LÍNEA: D22/NP300

COLOR: PLATA

NOMBRE PROPIETARIO: GUSTAVO E. COTES R.

FIRMA DEL RESPONSABLE

FERNANDO AUGUSTO GARCIA COLONNA

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO / MES / DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)
2025-09-12	2025-09-13	2026-09-12

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
1508006479134000	SVR312	CARGA O MIXTO	PUBLICO	2389	2015

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHICULO	CARROCERÍA
2	NISSAN	D22/NP300	ESTACAS

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
KA24787116A	3N6DD25T4ZK943144	3N6DD25T4ZK943144	1.01

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
CORTES RODRIGUEZ, GUSTAVO	*******383	CC	12552112	SANTA MARTA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	15	13921	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
310	$ 580700	$ 301900	$ 2400

TOTAL A PAGAR

$ 885000

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] / 701,68 [2] UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750

Decreto 2644 de 2022: Tarifas diferenciales y ajuste con base en la UVT 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920.

- Es obligatorio **portar la póliza del SOAT**, sin importar el medio de entrega seleccionado por La Previsora S.A.
- La autoridad de transito podrá requerir la póliza en cualquier momento. Esta podrá ser presentada en los siguientes formatos: **Digital:** a través de correo electrónico o mensaje de texto (SMS) o **Físico:** impresa en papel común.
- Si tiene inquietudes sobre el proceso, puede comunicarse desde su teléfono móvil marcando al #345 para recibir la asesoría necesaria.

Circular Externa 013 de 2024 emitida por la **Superintendencia Financiera de Colombia**, se permite que la vigencia mínima del SOAT para **vehículos extranjeros que circulen en zonas de frontera** sea **diaria**. Los vehículos que no reúnan los dos anteriores supuestos, deben regirse por las disposiciones del numeral 2 del artículo 193 de EOSF, en virtud del cual la vigencia mínima del SOAT debe ser anual.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10030166472

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SVR312	NISSAN	D22/NP300	2015

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.389	PLATA	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	ESTACAS	GASOLINA	1012

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
KA24-787116A	N	3N6DD25T4ZK943144

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
3N6DD25T4ZK943144	N	3N6DD25T4ZK943144	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
COTES RODRIGUEZ GUSTAVO ERNESTO	C.C. 12552112

MINISTERIODETRANSPORTEMINISTERIODETRANSPORTEMINISTERIODETRANSPORTEM

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
143

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
03201500095357 7

VE
I

FECHA IMPORT.
07/07/2015

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA
27/08/2015

FECHA EXP. LIC. TTO.
04/10/2023

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYMOV CUND/LA CALERA





LT07002723564

Powered by CamScanner

CONSORCIO ICASM2023	FORMATO REGISTRO CAPACITACIÓN	CÓDIGO: AMB_FRC_001 VERSIÓN: 001 FECHA: 25-06-2024

PROYECTO: "INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES"

CONSECUTIVO No.	001	**No. DE PARTICIPANTES**	9	**FECHA**	23-10-2025	**HORA**	7:00 a.m
TEMA	Implementación de las Medidas de Manejo Ambiental del proyecto.						
OBJETIVO	Socializar las actividades relacionadas con las Medidas de Manejo Ambiental del proyecto.						
LUGAR	Río Piedras, Vereda Los Naranjos						
PROFESIONAL RESPONSABLE	Cindy Rodríguez M.			**CARGO**	Ingeniera Ambiental.		

REGISTRO DE ASISTENCIA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Yeison Alzate	1092808242	Oficios	
2	Felipe Venecia	1082986414	TOPO	
3	DAYANA CERVANTES	1.004.424744	AUX SST	DAYANA C
4	José Padilla.	1067805.	Oficios.	José
5		1082848986	AYUDANTE	
6	Jaime HERRERA			
7	NESTOR HERRERA	7960241	AYUDANTE	
8	JUDSON JAVIER HERRERA B.	1082850481	AYUDANTE	
9	CARLOS DANATO B	84453847	AYUDANTE	CARLOS
10				
11	Valerie Gomez Dominguez	1083029949	Ing Amb-Soc Interv	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

FIRMA PROFESIONAL RESPONSABLE

Anexo: Registro fotográfico

CONSORCIO ICASM2023

FORMATO REGISTRO CAPACITACIÓN

CÓDIGO: AMB_FRC_001
VERSIÓN: 001
FECHA: 25-06-2024

PROYECTO: "INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES"

CONSECUTIVO No.	002	**No. DE PARTICIPANTES**	8	**FECHA**	28-10-25	**HORA**	7:15
TEMA	Gestión integral de los residuos sólidos y líquidos.						
OBJETIVO	Manejar y disponer adecuadamente los residuos generados en obra.						
LUGAR	Río Piedras, Vereda Los Naranjos						
PROFESIONAL RESPONSABLE	Cindy Rodríguez M.			**CARGO**	Ingeniera Ambiental.		

REGISTRO DE ASISTENCIA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Yeison Atencia	1192808247	Obrero	
2	Jesus HERRERA	70828489		
3	Jessid David Herrera	1082850481	Ayudante	
4	Jose Padilla	14597805		
5	DAYANA CERVANTES	1.004424.744	AUX SST	DAYANA C
6	NESTOR HERRERA	7960241		
7	Alvaro De la Hoz G	1221964601	INT. SST	Alvaro De la Hoz G
8	FELIPE VENECIA	1082986414	TOPO	FELIPE V.
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

FIRMA PROFESIONAL RESPONSABLE

Anexo: Registro fotográfico

CONSORCIO
ICASM2023

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

MANEJO Y DISPOSICIÓN ADECUADA DE LOS RESIDUOS EN OBRA

Proyecto: Intervenciones a los cuerpos de agua del Distrito de Santa Marta para el mantenimiento y preservación de sus condiciones hidráulicas y ambientales
Empresa: Consorcio ICASM2023

Nombre del trabajador: Yelsin Atencio

Cargo: AYU. oficial

Fecha: 31/10/2025

**Instrucciones: ** Marque con una (X) la respuesta correcta. Cada pregunta vale 2 puntos. Puntaje total: 10 puntos.

1. 1. ¿Cuál de los siguientes residuos NO debe mezclarse con los demás?

- a) Plástico y papel
- b) Restos de comida
- X Aceites usados y trapos contaminados ✓

2. 2. ¿Qué debemos hacer con los residuos reciclables (botellas, cartón, chatarra)?

- a) Tirarlos junto con los ordinarios
- X b) Separarlos y llevarlos al punto de acopio ✓
- c) Quemarlos o enterrarlos

3. 3. ¿Dónde deben almacenarse los residuos peligrosos como aceites y filtros?

- a) En cualquier recipiente cerca del río
- b) En una caneca común
- X c) En recipientes cerrados y rotulados, bolsas de color rojo ✓

4. 4. ¿Qué acción ayuda a prevenir la contaminación del río?

- X a) Lavar herramientas dentro del río
- b) Usar zonas de lavado con sedimentadores X
- c) Dejar los escombros cerca del agua

5. 5. ¿De quién es la responsabilidad del manejo adecuado de residuos?

- X a) Solo del supervisor ambiental
- b) Solo del operador de maquinaria
- c) De todos los trabajadores de la obra X

PUNTAJE OBTENIDO: 6 / 10

CONSORCIO
ICASM2023

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS
MANEJO Y DISPOSICIÓN ADECUADA DE LOS RESIDUOS EN OBRA

Proyecto: Intervenciones a los cuerpos de agua del Distrito de Santa Marta para el mantenimiento y preservación de sus condiciones hidráulicas y ambientales
Empresa: Consorcio ICASM2023

Nombre del trabajador: José Padilla

Cargo: Oficial

Fecha: 31/10/2025

**Instrucciones: ** Marque con una (X) la respuesta correcta. Cada pregunta vale 2 puntos. Puntaje total: 10 puntos.

1. 1. ¿Cuál de los siguientes residuos NO debe mezclarse con los demás?

- a) Plástico y papel
- b) Restos de comida
- c) Aceites usados y trapos contaminados ✓

2. 2. ¿Qué debemos hacer con los residuos reciclables (botellas, cartón, chatarra)?

- a) Tirarlos junto con los ordinarios
- b) Separarlos y llevarlos al punto de acopio ✓
- c) Quemarlos o enterrarlos

3. 3. ¿Dónde deben almacenarse los residuos peligrosos como aceites y filtros?

- a) En cualquier recipiente cerca del río
- b) En una caneca común
- c) En recipientes cerrados y rotulados, bolsas de color rojo ✓

4. 4. ¿Qué acción ayuda a prevenir la contaminación del río?

- a) Lavar herramientas dentro del río
- b) Usar zonas de lavado con sedimentadores
- c) Dejar los escombros cerca del agua X

5. 5. ¿De quién es la responsabilidad del manejo adecuado de residuos?

- a) Solo del supervisor ambiental
- b) Solo del operador de maquinaria
- c) De todos los trabajadores de la obra X

PUNTAJE OBTENIDO: 6 / 10

CONSORCIO
ICASM2023

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

MANEJO Y DISPOSICIÓN ADECUADA DE LOS RESIDUOS EN OBRA

Proyecto: Intervenciones a los cuerpos de agua del Distrito de Santa Marta para el mantenimiento y preservación de sus condiciones hidráulicas y ambientales
Empresa: Consorcio ICASM2023

Nombre del trabajador: NESTOR

Cargo: AYUDANTE

Fecha: 31/10/2025

**Instrucciones: ** Marque con una (X) la respuesta correcta. Cada pregunta vale 2 puntos. Puntaje total: 10 puntos.

1. 1. ¿Cuál de los siguientes residuos NO debe mezclarse con los demás?

- a) Plástico y papel
- b) Restos de comida
- c) Aceites usados y trapos contaminados X

2. 2. ¿Qué debemos hacer con los residuos reciclables (botellas, cartón, chatarra)?

- a) Tirarlos junto con los ordinarios
- X b) Separarlos y llevarlos al punto de acopio
- c) Quemarlos o enterrarlos

3. 3. ¿Dónde deben almacenarse los residuos peligrosos como aceites y filtros?

- a) En cualquier recipiente cerca del río
- b) En una caneca común
- X c) En recipientes cerrados y rotulados, bolsas de color rojo

4. 4. ¿Qué acción ayuda a prevenir la contaminación del río?

- a) Lavar herramientas dentro del río
- X b) Usar zonas de lavado con sedimentadores
- c) Dejar los escombros cerca del agua

5. 5. ¿De quién es la responsabilidad del manejo adecuado de residuos?

- a) Solo del supervisor ambiental
- b) Solo del operador de maquinaria
- X c) De todos los trabajadores de la obra

PUNTAJE OBTENIDO: 10 / 10

CONSORCIO
ICASM2023

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS
PREVENCIÓN DEL TRÁFICO DE FAUNA SILVESTRE EN OBRA

Proyecto: Intervenciones a los cuerpos de agua del Distrito de Santa Marta para el mantenimiento y preservación de sus condiciones hidráulicas y ambientales
Empresa: Consorcio ICASM2023

Nombre del trabajador: DAYANA CERVANTES

Cargo: AUX SST

Fecha: 31/10/2025

Instrucciones: Marque con una (X) la respuesta correcta. Cada pregunta vale 2 puntos. Puntaje total: 10 puntos.

1. 1. Según el artículo 328A del Código Penal, el tráfico de fauna silvestre puede ser sancionado con:

- a) Una amonestación escrita.
- b) Una multa pequeña sin cárcel.
- c) Prisión entre 60 y 135 meses y multa de 300 a 40.000 salarios mínimos. X

2. 2. ¿Qué acción se considera tráfico de fauna silvestre?

- a) Reportar la presencia de un animal al supervisor ambiental.
- b) Alejarse del animal sin tocarlo.
- c) Capturar, transportar o vender animales sin permiso de la autoridad. X

3. 3. Si un trabajador encuentra un animal silvestre herido en la zona de obra, debe:

- a) Llevarlo a su casa para cuidarlo.
- b) No tocarlo y avisar al profesional ambiental o supervisor. X
- c) Tomarle una foto y publicarla en redes.

4. 4. ¿Qué entidad es la encargada de autorizar el rescate o traslado de fauna silvestre?

- a) El capataz o jefe de obra.
- b) La autoridad ambiental (Corpamag o Policía Ambiental). X
- c) Cualquier trabajador que quiera ayudar.

5. 5. ¿Cuál de las siguientes prácticas es correcta en campo?

- a) No manipular ni trasladar fauna silvestre y reportar los hallazgos. X
- b) Capturar iguanas o aves para tener como mascota.
- c) Guardar animales para liberarlos después.

PUNTAJE OBTENIDO: 10 / 10

CONSORCIO
ICASM2023

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS
PREVENCIÓN DEL TRÁFICO DE FAUNA SILVESTRE EN OBRA

Proyecto: Intervenciones a los cuerpos de agua del Distrito de Santa Marta para el mantenimiento y preservación de sus condiciones hidráulicas y ambientales
Empresa: Consorcio ICASM2023

Nombre del trabajador: José Padilla.

Cargo: 2025 - 10 - 31

Fecha: _____

Instrucciones: Marque con una (X) la respuesta correcta. Cada pregunta vale 2 puntos. Puntaje total: 10 puntos.

1. 1. Según el artículo 328A del Código Penal, el tráfico de fauna silvestre puede ser sancionado con:

- a) Una amonestación escrita.
- b) Una multa pequeña sin cárcel.
- (X) c) Prisión entre 60 y 135 meses y multa de 300 a 40.000 salarios mínimos.

2. 2. ¿Qué acción se considera tráfico de fauna silvestre?

- a) Reportar la presencia de un animal al supervisor ambiental.
- b) Alejarse del animal sin tocarlo.
- (X) c) Capturar, transportar o vender animales sin permiso de la autoridad.

3. 3. Si un trabajador encuentra un animal silvestre herido en la zona de obra, debe:

- a) Llevarlo a su casa para cuidarlo.
- (X) b) No tocarlo y avisar al profesional ambiental o supervisor.
- c) Tomarle una foto y publicarla en redes.

4. 4. ¿Qué entidad es la encargada de autorizar el rescate o traslado de fauna silvestre?

- a) El capataz o jefe de obra.
- (X) b) La autoridad ambiental (Corpamag o Policía Ambiental).
- c) Cualquier trabajador que quiera ayudar.

5. 5. ¿Cuál de las siguientes prácticas es correcta en campo?

- (X) a) No manipular ni trasladar fauna silvestre y reportar los hallazgos.
- b) Capturar iguanas o aves para tener como mascota.
- c) Guardar animales para liberarlos después.

PUNTAJE OBTENIDO: 10 / 10

CONSORCIO
ICASM2023

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS
PREVENCIÓN DEL TRÁFICO DE FAUNA SILVESTRE EN OBRA

Proyecto: Intervenciones a los cuerpos de agua del Distrito de Santa Marta para el mantenimiento y preservación de sus condiciones hidráulicas y ambientales
Empresa: Consorcio ICASM2023

Nombre del trabajador: NESTOR HERRERA
Cargo: AYODANTE
Fecha: 31/10/2025

Instrucciones: Marque con una (X) la respuesta correcta. Cada pregunta vale 2 puntos. Puntaje total: 10 puntos.

1. 1. Según el artículo 328A del Código Penal, el tráfico de fauna silvestre puede ser sancionado con:

- a) Una amonestación escrita.
- b) Una multa pequeña sin cárcel.
- X c) Prisión entre 60 y 135 meses y multa de 300 a 40.000 salarios mínimos. ✓

2. 2. ¿Qué acción se considera tráfico de fauna silvestre?

- a) Reportar la presencia de un animal al supervisor ambiental.
- b) Alejarse del animal sin tocarlo.
- X c) Capturar, transportar o vender animales sin permiso de la autoridad. ✓

3. 3. Si un trabajador encuentra un animal silvestre herido en la zona de obra, debe:

- a) Llevarlo a su casa para cuidarlo.
- X b) No tocarlo y avisar al profesional ambiental o supervisor. ✓
- c) Tomarle una foto y publicarla en redes.

4. 4. ¿Qué entidad es la encargada de autorizar el rescate o traslado de fauna silvestre?

- a) El capataz o jefe de obra.
- X b) La autoridad ambiental (Corpamag o Policía Ambiental). ✓
- c) Cualquier trabajador que quiera ayudar.

5. 5. ¿Cuál de las siguientes prácticas es correcta en campo?

- X a) No manipular ni trasladar fauna silvestre y reportar los hallazgos. ✓
- b) Capturar iguanas o aves para tener como mascota.
- c) Guardar animales para liberarlos después.

PUNTAJE OBTENIDO: 10 / 10

CONSORCIO
ICASM2023

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS
PREVENCIÓN DEL TRÁFICO DE FAUNA SILVESTRE EN OBRA

Proyecto: Intervenciones a los cuerpos de agua del Distrito de Santa Marta para el mantenimiento y preservación de sus condiciones hidráulicas y ambientales
Empresa: Consorcio ICASM2023

Nombre del trabajador: Jesús Javier Herrera R.

Cargo: AYUDANTE

Fecha: 31/10/2025

Instrucciones: Marque con una (X) la respuesta correcta. Cada pregunta vale 2 puntos. Puntaje total: 10 puntos.

1. 1. Según el artículo 328A del Código Penal, el tráfico de fauna silvestre puede ser sancionado con:

- a) Una amonestación escrita.
- b) Una multa pequeña sin cárcel.
- X c) Prisión entre 60 y 135 meses y multa de 300 a 40.000 salarios mínimos.

2. 2. ¿Qué acción se considera tráfico de fauna silvestre?

- a) Reportar la presencia de un animal al supervisor ambiental.
- b) Alejarse del animal sin tocarlo.
- X c) Capturar, transportar o vender animales sin permiso de la autoridad.

3. 3. Si un trabajador encuentra un animal silvestre herido en la zona de obra, debe:

- a) Llevarlo a su casa para cuidarlo.
- X b) No tocarlo y avisar al profesional ambiental o supervisor.
- c) Tomarle una foto y publicarla en redes.

4. 4. ¿Qué entidad es la encargada de autorizar el rescate o traslado de fauna silvestre?

- a) El capataz o jefe de obra.
- X b) La autoridad ambiental (Corpamag o Policía Ambiental).
- c) Cualquier trabajador que quiera ayudar.

5. 5. ¿Cuál de las siguientes prácticas es correcta en campo?

- X a) No manipular ni trasladar fauna silvestre y reportar los hallazgos.
- b) Capturar iguanas o aves para tener como mascota.
- c) Guardar animales para liberarlos después.

PUNTAJE OBTENIDO: 10 / 10

CONSORCIO
ICASM2023

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS
PREVENCIÓN DEL TRÁFICO DE FAUNA SILVESTRE EN OBRA

Proyecto: Intervenciones a los cuerpos de agua del Distrito de Santa Marta para el mantenimiento y preservación de sus condiciones hidráulicas y ambientales
Empresa: Consorcio ICASM2023

Nombre del trabajador: Yelsin Atencio

Cargo: El que cose las bolsa

Fecha: 2025/10/31

Instrucciones: Marque con una (X) la respuesta correcta. Cada pregunta vale 2 puntos. Puntaje total: 10 puntos.

1. 1. Según el artículo 328A del Código Penal, el tráfico de fauna silvestre puede ser sancionado con:

- a) Una amonestación escrita.
- b) Una multa pequeña sin cárcel.
- X c) Prisión entre 60 y 135 meses y multa de 300 a 40.000 salarios mínimos.

2. 2. ¿Qué acción se considera tráfico de fauna silvestre?

- a) Reportar la presencia de un animal al supervisor ambiental.
- b) Alejarse del animal sin tocarlo.
- X c) Capturar, transportar o vender animales sin permiso de la autoridad.

3. 3. Si un trabajador encuentra un animal silvestre herido en la zona de obra, debe:

- a) Llevarlo a su casa para cuidarlo.
- X b) No tocarlo y avisar al profesional ambiental o supervisor.
- c) Tomarle una foto y publicarla en redes.

4. 4. ¿Qué entidad es la encargada de autorizar el rescate o traslado de fauna silvestre?

- a) El capataz o jefe de obra.
- X b) La autoridad ambiental (Corpamag o Policía Ambiental).
- c) Cualquier trabajador que quiera ayudar.

5. 5. ¿Cuál de las siguientes prácticas es correcta en campo?

- X a) No manipular ni trasladar fauna silvestre y reportar los hallazgos.
- b) Capturar iguanas o aves para tener como mascota.
- c) Guardar animales para liberarlos después.

PUNTAJE OBTENIDO: 10 / 10

CONSORCIO
ICASM2023

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS
PREVENCIÓN DEL TRÁFICO DE FAUNA SILVESTRE EN OBRA

Proyecto: Intervenciones a los cuerpos de agua del Distrito de Santa Marta para el mantenimiento y preservación de sus condiciones hidráulicas y ambientales
Empresa: Consorcio ICASM2023

Nombre del trabajador: Jaime HERRERA

Cargo: Ayudante

Fecha: 31/10/2025

Instrucciones: Marque con una (X) la respuesta correcta. Cada pregunta vale 2 puntos. Puntaje total: 10 puntos.

1. 1. Según el artículo 328A del Código Penal, el tráfico de fauna silvestre puede ser sancionado con:

- a) Una amonestación escrita.
- b) Una multa pequeña sin cárcel.
- X c) Prisión entre 60 y 135 meses y multa de 300 a 40.000 salarios mínimos.

2. 2. ¿Qué acción se considera tráfico de fauna silvestre?

- a) Reportar la presencia de un animal al supervisor ambiental.
- b) Alejarse del animal sin tocarlo.
- X c) Capturar, transportar o vender animales sin permiso de la autoridad.

3. 3. Si un trabajador encuentra un animal silvestre herido en la zona de obra, debe:

- a) Llevarlo a su casa para cuidarlo.
- X b) No tocarlo y avisar al profesional ambiental o supervisor.
- c) Tomarle una foto y publicarla en redes.

4. 4. ¿Qué entidad es la encargada de autorizar el rescate o traslado de fauna silvestre?

- a) El capataz o jefe de obra.
- X b) La autoridad ambiental (Corpamag o Policía Ambiental).
- c) Cualquier trabajador que quiera ayudar.

5. 5. ¿Cuál de las siguientes prácticas es correcta en campo?

- X a) No manipular ni trasladar fauna silvestre y reportar los hallazgos.
- b) Capturar iguanas o aves para tener como mascota.
- c) Guardar animales para liberarlos después.

PUNTAJE OBTENIDO: 10 / 10

CONSORCIO ICASM2023	**FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN AMBIENTAL**	**Código:** AMB-REG-IND-V02
		Versión: 002
		FECHA: 01-09-2025

PROYECTO: "INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES"

LUGAR	Rio Pedro	**FECHA**	09/10/2025
PROFESIONAL RESPONSABLE	Cindy Rodríguez M.	**CARGO**	Ingeniera Ambiental
TRABAJADOR EVALUADO	Nestor Herrera.	**CARGO**	Ayudante de obra.

Lea cada afirmación y marque con una (**x**) si es Verdadero o Falso según corresponda.

No.	PREGUNTA	VERDADERO	FALSO
1	Es responsabilidad de todos los trabajadores reportar si hay un derrame o accidente ambiental de inmediato.	V	
2	El uso de equipos de protección personal es obligatorio en todas las actividades de la obra.	V	
3	Ante la presencia de fauna silvestre en el área de trabajo, se debe capturar y trasladar sin aviso.		X
4	Está permitido y es adecuado lavar herramientas o equipos con aceites y combustibles dentro del río.		X
5	Los residuos generados en la obra pueden arrojarse al río siempre y cuando sean biodegradables.		X
6	La tala o poda de árboles sin autorización de las autoridades ambientales está prohibida.	V	
7	El respeto por el recurso hídrico es un compromiso ambiental y laboral de cada trabajador.	V	
8	El cargue de combustible de las máquinas debe realizarse dentro del río para mayor facilidad.		X
9	Los trabajadores están obligados a separar adecuadamente los residuos (aprovechables y no).	V	
10	El ruido excesivo y la contaminación del aire afectan a las comunidades y a la fauna del área.	V	
CALIFICACIÓN Número total de preguntas acertadas / Número total de preguntas		10/10.	
FIRMA Y CÉDULA DEL TRABAJADOR EVALUADO		Nestor : 7960241	

CONSORCIO ICASM2023	**FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN AMBIENTAL**	**Código:** AMB-REG-IND-V02 **Versión:** 002 **FECHA:** 01-09-2025

PROYECTO: "INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES"

LUGAR	Río Piedras	**FECHA**	1-10-2025
PROFESIONAL RESPONSABLE	Cindy Rodríguez M.	**CARGO**	Ingeniera Ambiental
TRABAJADOR EVALUADO	Dayana Cervantes	**CARGO**	Aux SST

Lea cada afirmación y marque con una (**x**) si es Verdadero o Falso según corresponda.

No.	PREGUNTA	VERDADERO	FALSO
1	Es responsabilidad de todos los trabajadores reportar si hay un derrame o accidente ambiental de inmediato.	X	
2	El uso de equipos de protección personal es obligatorio en todas las actividades de la obra.	X	X
3	Ante la presencia de fauna silvestre en el área de trabajo, se debe capturar y trasladar sin aviso.		X
4	Está permitido y es adecuado lavar herramientas o equipos con aceites y combustibles dentro del río.		X
5	Los residuos generados en la obra pueden arrojarse al río siempre y cuando sean biodegradables.		X
6	La tala o poda de árboles sin autorización de las autoridades ambientales está prohibida.	X	
7	El respeto por el recurso hídrico es un compromiso ambiental y laboral de cada trabajador.	X	
8	El cargue de combustible de las máquinas debe realizarse dentro del río para mayor facilidad.		X
9	Los trabajadores están obligados a separar adecuadamente los residuos (aprovechables y no).	X	
10	El ruido excesivo y la contaminación del aire afectan a las comunidades y a la fauna del área.	X	
CALIFICACIÓN Número total de preguntas acertadas / Número total de preguntas		9/10-	
FIRMA Y CÉDULA DEL TRABAJADOR EVALUADO		Dayana Cervantes 1.004.424.744	

CONSORCIO ICASM2023	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN AMBIENTAL	Código: AMB-REG-IND-V02 Versión: 002 FECHA: 01-09-2025

PROYECTO: "INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES"

LUGAR	Río Piedras	**FECHA**	23 / octubre / 2025
PROFESIONAL RESPONSABLE	Cindy Rodríguez M.	**CARGO**	Ingeniera Ambiental
TRABAJADOR EVALUADO	Javier Herrera Muñoz	**CARGO**	Ayudante de obra

Lea cada afirmación y marque con una (x) si es Verdadero o Falso según corresponda.

No.	PREGUNTA	VERDADERO	FALSO
1	Es responsabilidad de todos los trabajadores reportar si hay un derrame o accidente ambiental de inmediato.	X	
2	El uso de equipos de protección personal es obligatorio en todas las actividades de la obra.	X	X
3	Ante la presencia de fauna silvestre en el área de trabajo, se debe capturar y trasladar sin aviso.		X
4	Está permitido y es adecuado lavar herramientas o equipos con aceites y combustibles dentro del río.		X
5	Los residuos generados en la obra pueden arrojarse al río siempre y cuando sean biodegradables.	X	
6	La tala o poda de árboles sin autorización de las autoridades ambientales está prohibida.	X	
7	El respeto por el recurso hídrico es un compromiso ambiental y laboral de cada trabajador.		X
8	El cargue de combustible de las máquinas debe realizarse dentro del río para mayor facilidad.	X	X
9	Los trabajadores están obligados a separar adecuadamente los residuos (aprovechables y no).	X	
10	El ruido excesivo y la contaminación del aire afectan a las comunidades y a la fauna del área.	X	
CALIFICACIÓN Número total de preguntas acertadas / Número total de preguntas			
FIRMA Y CÉDULA DEL TRABAJADOR EVALUADO		Javier Herrera 1082848976	

7/10

CONSORCIO ICASM2023	**FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN AMBIENTAL**	**Código:** AMB-REG-IND-V02 **Versión:** 002 **FECHA:** 01-09-2025

PROYECTO: "INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES"

LUGAR	Río Piedras	**FECHA**	23 / octubre / 2025
PROFESIONAL RESPONSABLE	Cindy Rodríguez M.	**CARGO**	Ingeniera Ambiental
TRABAJADOR EVALUADO	Yeison Herrera Paternina	**CARGO**	Ayudante de obra

Lea cada afirmación y marque con una (**x**) si es Verdadero o Falso según corresponda.

No.	PREGUNTA	VERDADERO	FALSO
1	Es responsabilidad de todos los trabajadores reportar si hay un derrame o accidente ambiental de inmediato.	X	
2	El uso de equipos de protección personal es obligatorio en todas las actividades de la obra.	X	
3	Ante la presencia de fauna silvestre en el área de trabajo, se debe capturar y trasladar sin aviso.		X
4	Está permitido y es adecuado lavar herramientas o equipos con aceites y combustibles dentro del río.		X
5	Los residuos generados en la obra pueden arrojarse al río siempre y cuando sean biodegradables.		X
6	La tala o poda de árboles sin autorización de las autoridades ambientales está prohibida.	X	
7	El respeto por el recurso hídrico es un compromiso ambiental y laboral de cada trabajador.	X	
8	El cargue de combustible de las máquinas debe realizarse dentro del río para mayor facilidad.		X
9	Los trabajadores están obligados a separar adecuadamente los residuos (aprovechables y no).	X	
10	El ruido excesivo y la contaminación del aire afectan a las comunidades y a la fauna del área.	X	
CALIFICACIÓN Número total de preguntas acertadas / Número total de preguntas			
FIRMA Y CÉDULA DEL TRABAJADOR EVALUADO			1082850481

10/10

CONSORCIO
ICASM2023

ICASM-122

Santa Marta D.T.C.H., 30 de octubre de 2025.

Señor
JORGE RUEDA
Propietario de la finca San José
Dirección: Pr 31+800, Ruta 9008, vereda Los Naranjos

Asunto: Solicitud para instalación de valla informativa

Referencia: Proyecto "INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO DE PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES"

Cordial saludo,

En calidad de representante legal del CONSORCIO ICASM2023 identificado con NIT No. 901782970-2, me permito solicitar amablemente autorización de su parte para la instalación de una valla informativa en la entrada de la finca San José, localizada en el Pr 31+800, Ruta 9008, vereda Los Naranjos, área rural del Distrito de Santa Marta, en las coordenadas: Latitud 11.283410 N, Longitud -73.903159 W. Lo anterior, con el objeto de radicar el permiso de publicidad exterior visual ante la autoridad ambiental distrital DADSA.

Esta valla informativa se instalará en el marco del proyecto de la referencia, formulado por la CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA – CORPAMAG en concordancia de las funciones establecidas a las corporaciones a través de la Ley 99 de 1993. El proyecto para la vigencia 2025 proyecta una intervención de 1.6 km en la cuenca baja del río Piedras.

Una vez finalizado el proyecto en la zona se garantizará el retiro y disposición del elemento publicitario.

La presente se firma en la vereda Los Naranjos del Distrito de Santa Marta a los 30 días del mes de octubre de 2025.

Firma solicitante

DIXON VALVERDE MARTINEZ
Representante Legal
CONSORCIO ICASM2023

Firma y cedula del encargado de autorización

JORGE RUEDA
Propietario
FINCA SAN JOSÉ

Dirección: Calle 24 No 2-66 Ed. Camara de Comercio, Santa Marta
Email: consorcioicasm@gmail.com


Scanned with CamScanner

Localización

	
Imagen No. 001 *Descripción: Localización valla (Vista sentido Santa Marta – Guajira)*	*Imagen No. 002* *Descripción: Localización valla (Vista sentido Guajira - Santa Marta)*

CONSORCIO
ICASM2023

INFORMACIÓN DISEÑO VALLA INFORMATIVA
Número de vallas (Unidad): Uno (1)
Medidas (m): 3 m x 2 m
Área (m2): 6 m2
Lugar: Entrada de la Finca San José
Ubicación: Pr 31+800, Ruta 9008, vereda Los Naranjos
Sentido Riohacha – Santa Marta
Coordenadas geograficas: Latitud 11.283410 N, Longitud -73.903159 W
Santa Marta – Magdalena

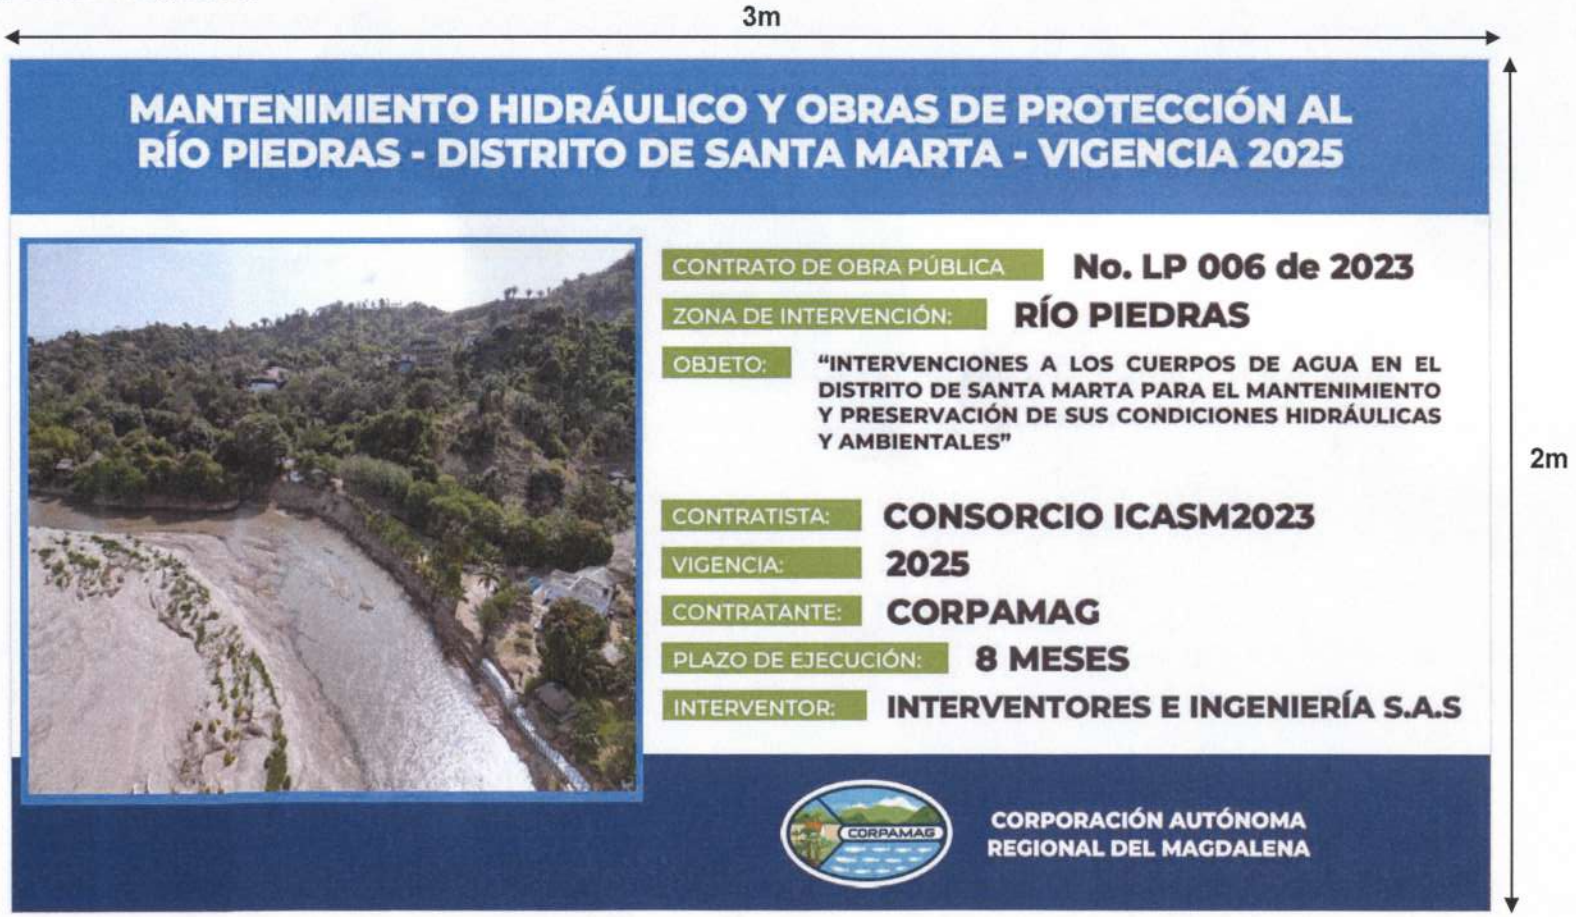

Dirección: Calle 24 No 2-66 Ed. Cámara de Comercio, Santa Marta
Email: consorcioicasm@gmail.com

EDICTO

LA OFICINA ASESORA JURÍDICA

HACE SABER

Que en relación con la empresa COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES Y GASES DEL CARIBE S.A.S., el Director de Hidrocarburos profirió una resolución cuyo encabezamiento y parte resolutiva se transcribe a continuación para notificar de acuerdo con el artículo 28 la Ley 10 de 1961.

RESOLUCIÓN NÚMERO 00695 DEL 06 DE OCTUBRE DE 2021

Por la cual se autoriza a COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES Y GASES DEL CARIBE S.A.S., C.C.G.C. S.A.S., como distribuidor minorista en calidad de comercializador industrial

EL DIRECTOR DE HIDROCARBUROS
RESUELVE:

Artículo 1. Autorizar a la empresa COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES Y GASES DEL CARIBE S.A.S., con NIT 900.662.992-6, para que actúe como distribuidor minorista en calidad de comercializador industrial de combustibles líquidos derivados del petróleo, a través del vehículo de placa TZW-137, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta resolución.

Parágrafo: El registro de posteriores vehículos que requiera la citada empresa para el desarrollo de la actividad de comercializador industrial, podrá hacerse bajo el trámite directo en el Sistema de Información de Combustibles, SICOM, allegando previamente los documentos pertinentes para la verificación del Grupo de Downstream de la Dirección de Hidrocarburos.

Artículo 2. La empresa COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES Y GASES DEL CARIBE S.A.S. deberá dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Artículo 2.2.1.1.2.2.3.92 del Decreto 1073 de 2015 y demás normas que las modifiquen o sustituyan.

Artículo 3. La empresa COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES Y GASES DEL CARIBE S.A.S. deberá dar cumplimiento a lo señalado en la Resolución 31348 del 24 de julio de 2015, modificada por la Resolución 31100 del 16 de marzo de 2020, que establece los procedimientos y condiciones operativas del Sistema de Información de Combustibles, SICOM, expedida por la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía y las demás normas que la modifiquen o sustituyan, en lo que aplique a la calidad de agente que aquí se autoriza.

Artículo 4. La empresa COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES Y GASES DEL CARIBE S.A.S. deberá solicitar de manera oportuna a la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, o quien haga sus veces, la aprobación de las modificaciones que se requieran respecto a la presente autorización, remitiendo los documentos pertinentes para verificar el cumplimiento de los requisitos legales y posteriormente informar al SICOM.

Artículo 5. Por la Oficina Asesora Jurídica notificar a la empresa COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES Y GASES DEL CARIBE S.A.S., al correo ssgranabastos@hotmail.com de acuerdo con la información registrada en la solicitud y RUES.

Parágrafo. Si no pudiere llevarse a cabo la notificación personal, se surtirá por Edicto en la forma y por el lapso estipulado en el artículo 28 de la Ley 10 de 1961.

Artículo 6. Contra la presente resolución procede recurso de reposición, el cual deberá interponerse ante este Despacho dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 28 de la Ley 10 de 1961.

Artículo 7. En firme esta resolución, por el Grupo de Downstream remítase copia al Sistema de Información de Combustibles, SICOM, para la actualización correspondiente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FDO: JOSE MANUEL MORENO C.
Director de Hidrocarburos

Para notificar la anterior providencia se fija el presente Edicto en el lugar público (página web de Minminas) y su vigencia será por el término de cinco (05) días hábiles a partir del **VEINTE (20) de Octubre de 2021** a las 7:00 a.m., con la advertencia de que contra la providencia transcrita procede recurso de reposición el cual puede ser interpuesto dentro de los diez (10) días siguientes a la presente notificación ante la Dirección de Hidrocarburos.

ALEXIS VLADIMIR ORTIZ S.
Auxiliar Administrativo
Of. Asesora Jurídica
19.10.2021

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:

TZW137

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10022145850

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Público

CLASE DE VEHÍCULO:

CAMIONETA

Información general del vehículo

MARCA:

CHEVROLET

LÍNEA:

NHR

MODELO:

2021

COLOR:

BLANCO NIEBLA

NÚMERO DE SERIE:

9GDNLR771MB005199

NÚMERO DE MOTOR:

4L2053

NÚMERO DE CHASIS:

9GDNLR771MB005199

NÚMERO DE VIN:

9GDNLR771MB005199

CILINDRAJE:

2999

TIPO DE CARROCERÍA:

TANQUE

TIPO COMBUSTIBLE:

DIESEL

FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):

01/02/2021

AUTORIDAD DE TRÁNSITO:

U TEC CONT/VIG/ REG TTOyTTE SANTA MARTA

GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:

NO

CLÁSICO O ANTIGUO:

NO

REPOTENCIADO:

NO

REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN MOTOR

REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN CHASIS

REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN SERIE

REGRABACIÓN VIN (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN VIN

VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):

NO

PUERTAS:

Para conocer el historial de propietarios

*Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí*

(https://www.runt.gov.co/actores/ciudadano/consulta-historico-vehicular)

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:

2218

PESO BRUTO VEHICULAR:

4100

CAPACIDAD DE PASAJEROS:

CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:

NÚMERO DE EJES:

2

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
107010633780100	19/12/2024	20/12/2024	19/12/2025	310	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	VIGENTE
1508005555754000	19/12/2023	20/12/2023	19/12/2024	310	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	NO VIGENTE
15651500117510	16/12/2022	17/12/2022	16/12/2023	310	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
82346806	06/12/2021	07/12/2021	06/12/2022	310	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	NO VIGENTE
80229380	29/01/2021	26/11/2020	25/11/2021	310	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	NO VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	17/02/2024	17/02/2025	CDA SUPER CARS E.U.	SI	171856241	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	17/02/2023	17/02/2024	CDA SUPER CARS E.U.	NO	164750273	SI	

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

✔ Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Normalización y Saneamiento

Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

Permiso de circulación restringida (PCR)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 179607452

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DEL MAGDALENA

NIT: 900122353

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-044-005

Fecha de expedición: 2025/02/17

Fecha de vencimiento: 2026/02/17

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	TZW137	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	CHEVROLET	**MODELO:**	2021
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	2999	**NRO. MOTOR:**	4L2053
NRO. CHASIS:	9GDNLR771MB005199	**VIN:**	9GDNLR771MB005199
LÍNEA:	NHR		
COLOR:	BLANCO NIEBLA		

NOMBRE PROPIETARIO: COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES Y GASES DEL CARIBE S.A.S.-CCGC S.A.S.

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ

*** BANCO GNB SUDAMERIS ***
NIT. 860.050.750-1
Oficina : 701 PRINCIPAL SANTA MARTA
Fecha : 19/09/2023 Hora : 09:20:46
Cajero : LEM Caja : 345
Control : 442847-I

---

735 DADSA

3.800.739,00

Ref1: 15300
Ref2: 900662992
Ref3: COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBL
Ref4:

TOTAL 3.800.739,00

Efectivo. 3.800.739,00
Vlr. Recibido. 3.800.739,00
Vlr. Cambio. 0,00
Cant. Recaudos. 1,00

Antes de retirarse de la ventanilla por favor revise que el detalle de la transacción registrado en este comprobante, est, correcto.

Para cualquier reclamo debe presentar este recibo y la(s) factura(s) original(es) correspondiente(s) aquí relacionada(s)

O ADMINISTRATIVO DISTRITAL
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL "DADSA"
Nit. 819.006.386-6
ERA 12 26-16 BAVARIA TEL:3015936801
ENTIDAD OFICIAL

RVICIOS AMBIENTALES 15300

COMBUSTIBLES Y
72 B Santa Helena

FECHA DE EMISION : 2023/06/15
FECHA DE VENCIMIENTO: 2023/06/23

VENDEDOR :01 10:48
DOCUMENTO CONTABLE : 10- 15300

A FACTURA	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR SUBTOTAL
08 JUNIO 2023	1.0	3,800,739.00	3,800,739.00

S SERVICIOS DE EVALUACION Y/O.
CULO 338 DE LA CONSTITUCION...
5 LEY 633 DE 2020 Y RESOLUCION
DEL MEDIO AMBIENTE.....

CANCELADA EN SU TOTALIDAD,...

CTICAR RETENCION EN LA FUENTE

SUBTOTAL :	$	3,800,739.00
DESCUENTO:	$	0.00
TOTAL :	$	3,800,739.00
I.V.A. :	$	0.00
IMPOCON :	$	0.00
RET.STE :	$	0.00
RET.IVA :	$	0.00
A PAGAR :	$	3,800,739.00

OS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESO

OBSERVACIONES:CONSIGNAR EN CUENTA CTE No.701001638 BANCO GNB SUDAMERIS.

FIRMA ENTIDAD

RECIBIDO
Fecha
Nombre
Firma cc.

SOFTWARE CONTABLE Y FACTURACION "ACON".AUTOR:JUAN CONRADO MORENO NIT.73118288-8.....

GNB SUDAMERIS OFI: 701 RECAUDO 345 CAJ LEM
19/09/23 / 09:20:45 / 50 / 505 / 1
CTA 701001638
TOTAL/$ 3.800.739,00

Señores
Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental – DADSA
La Ciudad

Ref.: SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN POR SERVICIOS DE EVALUACIÓN.

Información General

Nombre Completo:	Comercializadora de combustibles y gases del Caribe SAS.		
C.C.: NIT: ✓ No.	900682992-6	De:	
Nombre del Representante Legal:	Orlando José Pedrozo Hanas		
C.C. No.	72.302.495.	De:	Barranquilla - Atlantico
Dirección de Correspondencia:			
Dirección de Correspondencia alterna:			
Teléfono:	605-3857899	Celular:	3207682431
Correo Electrónico:			

Datos del proyecto, obra o actividad que requiere el permiso

Lugar del Proyecto	Municipio:	Santa Marta	
Corregimiento:	Magdalena	Comuna:	9- URBANO.
Ubicación Geoespacial	Geográfica:	11,13531° N, 74,21300° O	

Breve descripción del Proyecto	Estación de Servicio - Comercio al por menor de combustible para automotores.

Valor del Proyecto * acuda al instructivo que se encuentra en el reverso para calcular el valor total del proyecto

Valor en números	1.100.000.000	Valor pesos colombianos
Valor en letras	Mil cien millones de pesos M/le.	

Tipos de permisos requeridos a la corporación

Licencia ambiental y/o modificación de la licencia ambiental.	
Planes de Manejo Ambiental.	
Diagnóstico de Alternativas Ambientales.	
Plan de manejo, recuperación o restauración ambiental – PMRRA.	
Permiso de exploración de aguas subterráneas, Renovación o Modificación.	
Concesión de aguas subterráneas. Renovación o Modificación.	
Permiso de Vertimientos. Renovación o Modificación.	
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV-.	
Permiso de Ocupación De Cauces. Renovación o Modificación.	
Permiso de emisiones atmosféricas para fuentes fijas Renovación o Modificación.	

DADSA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Radicado No. 2305250000
Fecha. 25-mayo-2023
Hora 10:53 am
Asunto solicitud
No de Folios 15 + Libro
Radicado por Liliana G.

Adecuación y restauración de suelo.	
Permiso o autorización de tala, poda, transplante o reubicación de árboles.	
Permiso de aprovechamiento forestal.	
Permiso para aprovechamiento de fauna silvestre.	
Registro de operación de empresas forestales.	
Seguimiento al manejo de residuos peligrosos RESPEL.	
Evaluación y seguimiento de proyectos de instalación de antenas radioeléctricas o de telecomunicaciones, celulares o similares.	
Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua.	
Seguimiento ambiental a proyectos de construcción de obra civil.	
Salvoconducto único nacional para la movilización de especímenes de la diversidad biológica y flora silvestre.	
Evaluación de Planes de Contingencia.	✓
Evaluación de estudios de emisiones con miras a verificar el cumplimiento de las normas de emisiones.	
Certificación en materia de Revisión de Gases -por Equipo-.	
Registro de elementos de publicidad exterior visual.	
Evaluación de estudios de ruido	
Viabilidad Ambiental. Decreto 2324 de 1.984 (DIMAR).	
Investigación científica.	
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS).	
Permiso o autorización para el transporte y disposición final de material sobrante de excavación y construcción.	
Demás instrumentos de manejo y control ambiental establecidos en la ley y los reglamentos.	

Atentamente,

Firma Representante Legal
C.C. 72302495

Firma Contador
C.C. 72315290
TP. 122828-T
Presentar copia de la tarjeta profesional.

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

122828-T



FABIO ENRIQUE
MORALES MARENCO
C.C. 72315290
RESOLUCION INSCRIPCION 331 FECHA 2006/11/30
UNIVERSIDAD C. U. DE LA COSTA

PRESIDENTE

HECTOR JAIME CORREA PINZON 137898

FIRMA DEL TITULAR 43974

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

LOGOFORMS S.A. 1066 09/2006

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **72.302.495**

RETAMOZO LLAMAS

APELLIDOS

ORLANDO JOSE

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-MAY-1977**

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1,65 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

08-JUN-1995 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-0300150-00248481-M-0072302495-20100806 **00233**01138A 1 3510890126

Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
Fecha de expedición: 05/05/2023 - 09:51:32
Recibo No. 10206972, Valor: 7,200
CODIGO DE VERIFICACIÓN: PV506FD5FF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.camarabaq.org.co/ y digite el código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

"LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRICULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO"

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

C E R T I F I C A

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social:
COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES Y GASES DEL CARIBE S.A.S. - CCGC S.A.S.
Sigla: CCGC S.A.S.
Nit: 900.662.992 - 6
Domicilio Principal: Soledad

MATRÍCULA

Matrícula No.: 581.033
Fecha de matrícula: 08 de Octubre de 2013
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación de la matrícula: 31 de Marzo de 2023
Grupo NIIF: 3. GRUPO II.

UBICACIÓN

Direccion domicilio principal: CL63 AV MURILLO CR1 300
Municipio: Soledad - Atlantico
Correo electrónico: ssgranabastos01@hotmail.com
Teléfono comercial 1: 3857899
Teléfono comercial 2: 3857837
Teléfono comercial 3: No reportó

Direccion para notificación judicial: CL 110 AV.CIRCUNVALAR # 43C - 735
Municipio: Barranquilla - Atlantico

Correo electrónico de notificación: ssgranabastos01@hotmail.com
Teléfono para notificación 1: 3857899
Teléfono para notificación 2: 3857837
Teléfono para notificación 3: No reportó

LA PERSONA JURIDICA SI AUTORIZÓ PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 291 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO Y 67 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CONSTITUCIÓN

Constitución: que por Documento Privado del 03/09/2013, del Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 08/10/2013 bajo el número 260.364 del libro IX, se constituyó la sociedad:denominada COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES Y GASES DEL CARIBE S.A.S. - CCGC S.A.S.

TERMINO DE DURACIÓN

Duración: La sociedad no se haya disuelta y su duración es indefinida
"QUE A LA FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, NO APARECEN
INSCRIPCIONES QUE DEN CUENTA DEL ESTADO DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, RAZÓN POR LA QUE LA SOCIEDAD NO SE HAYA DISUELTA.

"

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto: OBJETO SOCIAL: De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 1258 de 2.008, la sociedad podrá realizar cualquier tipo de actividad comercial o civil, lícita. Sin perjuicio de lo anterior, la sociedad desarrollará especialmente lo siguiente: 1) La distribución minorista de combustibles líquidos derivados del petróleo a través de una estación de servicio o cómo comercializador industrial mediante estaciones de servicios o carrotanques, 2) La industria, comercialización e intermediación en el mercado de combustibles líquidos, grasas, aceites y demás productos derivados del petróleo destinados al servicio de automotores en todas sus manifestaciones y 2) La industria, comercio e intermediación en el mercado de automotores en todas sus manifestaciones. En consecuencia la sociedad podrá: a) comercializar a nivel industrial combustibles líquidos. b) Organizar, adquirir, crear, enajenar, dar o tomar en tenencia, posesión o administración, variar su ubicación, radicación, destinación o adherencia, integrar y desmembrar toda clase de bienes muebles, inmuebles o inmateriales, establecimientos mercantiles, civiles, fabriles, docentes y demás, tales como estaciones, subestaciones, redes y similares para la conducción y suministro de combustibles y aceites en general toda clase de elementos, derivados del petróleo o no, necesarios para el funcionamiento o mantenimiento de automotores de toda clase y naturaleza; estaciones de servicio de lavado, engrase y rectificación de motores, balanceo, cambio o suministro de llantas y demás, con destino a toda clase de vehículos automotores; talleres de diagnóstico; mantenimiento preventivo o correctivo, repotenciación y/o

reparación de toda clase de vehículos automotores, exhibición, compraventa, intermediación, administración de concesiones y demás tanto para vehículos automotores como elementos de refacción o mantenimiento de los mismos; tramitación de licencias, concesiones y similares para la conducción, administración y en general toda clase de actividades conexas, necesarias para el cumplimiento de sus objetivos. c) Crear, aceptar, avalar, fiar, endosar, reponer, cancelar, reivindicar, dar o recibir en garantía o procuración hacer efectivos, judicial extrajudicialmente, toda clase de títulos incorporativos, declarativos o representativos de valor y adquirir, ceder, endosar y hacer efectivos toda clase de obligaciones comerciales, civiles o administrativas, relativas al cumplimiento de sus objetivos y constituir cauciones o garantías sobre los mismos. d) Importar, exportar, definitiva o temporalmente, por todo sistema legalmente admisible, toda clase de bienes o servicios necesarios o productos de sus actividades para el cumplimiento de los anteriores objetivos. e) Adquirir enajenar o gravar, cuotas sociales de participación o de capital y acciones de toda clase de sociedades o entidades, mercantiles, civiles o administrativas, cuyos objetivos sean compatibles directa o indirectamente por similitud o complementariedad, con los propios o incorporadas o fusionarse con ellas, de acuerdo con los estatutos f) comprar, almacenar, distribuir y comercializar al por menor de Gas Natural comprimido para uso vehicular en los suitidores dispuestos para tal fin. g) comprar, vender, almacenar, distribuir y comercializar al por mayor de combustible, aceites, lubricantes, y demás relacionados, a nivel nacional e internacional h) comprar, vender, distribuir; importar y exportar aceites, lubricantes y toda clase de productos para el mantenimiehto de vehículos automotores. i) En general, realizar o celebrar toda clase de actos o contratos necesarios para el cumplimiento de su objeto.

CAPITAL

** Capital Autorizado **

Valor	:	$300.000.000,00
Número de acciones	:	300.000,00
Valor nominal	:	1.000,00

** Capital Suscrito/Social **

Valor	:	$300.000.000,00
Número de acciones	:	300.000,00
Valor nominal	:	1.000,00

** Capital Pagado **

Valor	:	$300.000.000,00
Número de acciones	:	300.000,00
Valor nominal	:	1.000,00

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

REPRESENTACIÓN LEGAL

ADMINISTRACIÓN: Son funciones de la Asamblea General de Accionistas, las siguientes entre otras: Autorizar la enajenación, el arrendamiento o entrega a cualquier otro título de la totalidad o de parte sustancial de la empresa social. La representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales estará a cargo de un GERENTE. El Gerente tendrá Un (1) Suplente, quien lo reemplazará en sus faltas absolutas o temporales. En caso de falta absoluta o temporal del Gerente, el Suplente, con las limitaciones establecidas en los presentes estatutos, llevará la representación legal de la compañia. Son funciones del Gerente las siguientes entre otras: Constituir para propósitos concretos los apoderados especiales que juzgue necesarios para representar a la sociedad judicial o extrajudicialmente; celebrar todos los actos y contratos necesarios para que la empresa desarrolle planamente sus fines, sin restricción o limitación de ninguna naturaleza.

NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL

Nombramiento realizado mediante Documento Privado del 03/09/2013, otorgado en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 08/10/2013 bajo el número 260.364 del libro IX.

Cargo/Nombre	Identificación
Gerente	
Retamozo Llamas Orlando Jose	CC 72302495
Suplente del Gerente	
Velez Angulo Luis Fernando	CC 72152170

REVISORÍA FISCAL

Nombramiento realizado mediante Acta número 6 del 28/11/2017, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 27/12/2017 bajo el número 335.700 del libro IX:

Cargo/Nombre	Identificación
Revisor Fiscal	
Fernandez Vera Jorge Humberto	CC 72150668

REFORMAS DE ESTATUTOS

La sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos:

Documento	Número	Fecha	Origen	Insc.	Fecha	Libro
Acta	6	28/11/2017	Asamblea de Accionista	335.701	27/12/2017	IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a

la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos.
Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Barranquilla, los sábados NO son días hábiles.
Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad Principal Código CIIU: 4731
Actividad Secundaria Código CIIU: 4732

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIOo

A nombre de la sociedad figura(n) matriculado(s)en esta Cámara de Comercio
el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s):

Nombre:
SUPER STATION GRANABASTOS
Matrícula No: 581.034
Fecha matrícula: 08
de Octubre de 2013
Último año renovado: 2023
Dirección: CL 63 AV MURILLO CR
1-300
Municipio: Soledad - Atlantico

Que de acuerdo con nuestras inscripciones, los bienes sujetos a registro mercantil relacionados en el presente certificado, se encuentran libres de embargos.

C E R T I F I C A

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución N. 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA - RSC

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado en el formualario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria: 12.519.062.933,00
Actividad económica por la cual percibió mayores ingresos por actividad ordinaria en el periodo Código CIIU: 4731

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad hasta la fecha y hora de su expedición.

En la Cámara de Comercio de Barranquilla no aparecen inscripciones posteriores a las anteriormente mencionadas, de documentos referentes a reformas, o nombramiento de representantes legales, administradores o revisores fiscales, que modifiquen total o parcialmente el contenido.

Que la información anterior ha sido tomada directamente de los formularios de matrícula y sus renovaciones posteriores, diligenciados por el comerciante.

ALAN ERICK HERNANDEZ ALDANA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14860630789

(415)7707212489984(8020) 000001486063078 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 6 2 9 9 2	6	Impuestos de Barranquilla 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0 0 0 0 0	
73. Fecha	2 0 1 3 0 9 0 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 3 1 0 0 8	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 5 8 1 0 3 3	
78. Departamento	0 8	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 3 0 9 0 3
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 1 2 3 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14860630789

(415)7707212489984(8020) 000001486063078 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 6 2 9 9 2	6	Impuestos de Barranquilla	2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 3 1 0 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 2 3 0 2 4 9 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RETAMOZO	LLAMAS	ORLANDO	JOSE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 3 1 0 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 2 1 5 2 1 7 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VELEZ	ANGULO	LUIS	FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14860630789

(415)7707212489984(8020) **000001486063078 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 6 6 2 9 9 2	6	Impuestos de Barranquilla	2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 2 1 5 0 6 6 8		7 0 8 9 9 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
FERNANDEZ	VERA	JORGE	HUMBERTO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 7 1 2 2 7

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14860630789

(415)7707212489984(8020) **000001486063078 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 6 2 9 9 2	6	Impuestos de Barranquilla 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de combustible para automotores 4 7 3 1

162. Nombre del establecimiento: COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES Y GASES DEL CARIBE S.A.S. - EDS GRANABASTOS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Atlántico 0 8	Soledad 7 5 8

165. Dirección: CL 63 AV MURILLO 1 300

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	168. Teléfono	169. Fecha de cierre
5 8 1 0 3 4	2 0 1 3 1 0 0 8	3 8 5 7 8 9 9	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de combustible para automotores 4 7 3 1

162. Nombre del establecimiento: COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES Y GASES DEL CARIBE S.A.S. - EDS LIBANO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Magdalena 4 7	Santa Marta 0 0 1

165. Dirección: CL 53 43 57 VIA ALTERNA AL PUERTO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	168. Teléfono	169. Fecha de cierre
2 1 8 4 3 5	2 0 1 9 0 7 0 8	3 8 5 7 8 9 9	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CONSORCIO
ICASM2023

ANEXO No. 10

INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

INFORME DE SEGUIMIENTO No. 6

PROYECTO

"INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO PRESERVACIÓN DE Y SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES."

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

CONTRATISTA CONSORCIO ICASM 2023

SANTA MARTA MAGDALENA

OCTUBRE DE 2025

Tabla de contenido

1. INTRODUCCION 3

2. ALCANCE 3

3. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST 3

3.1 EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO 3

3.2 AFILIACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 4

3.3 REPORTE DE LICENCIAS, ENFERMEDADES Y ACCIDENTES DEL PERSONAL DEL PROYECTO 4

3.3.1 Reporte de licencias 4

3.3.2 Reporte de accidentes laborales. 4

3.3.3 Reporte de enfermedades laborales presentadas. 4

3.3.4 Reporte de enfermedades no laborales presentadas. 4

3.4 PERFIL DEMOGRÁFICO 5

3.5 PROGRAMA DE INDUCCIONES Y CAPACITACIONES 7

3.5.1 Entrega De Elementos De Protección Personal. 7

3.6 CHARLAS DE SEGURIDAD. 8

3.7 SEÑALIZACIÓN DE OBRA 13

3.8 LIMPIEZA, ORDEN Y ASEO 15

3.9 MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRA 16

3.9.1 Inspecciones preoperacionales. 16

3.10 INSPECCIÓN DE KIT ANTIDERRAMES 16

1. INTRODUCCION

La Seguridad y Salud en el Trabajo, representa una de las herramientas de gestión más importantes para mejorar la calidad de vida laboral de los trabajadores de una empresa, mediante la aplicación de las medidas establecidas en un plan de seguridad y salud en el trabajo, se logra una reducción de los costos generados por los accidentes y las enfermedades laborales, mejorar la calidad de los servicios y ante todo generar ambientes sanos y seguros para los trabajadores.

El Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST está orientado a lograr una adecuada administración de riesgos que permita mantener el control permanente de los mismos en los diferentes oficios y que contribuya al bienestar físico, mental y social del trabajador y al funcionamiento de los recursos e instalaciones.

El presente documento, es el soporte documental de la gestión SST desarrollada durante el periodo No.6 de seguimiento al plan de seguridad y salud en el trabajo; integrando registros fotográficos, soportes escritos e indicadores que permiten evaluar la gestión en cada uno de los programas y subprogramas SST establecidos para el proyecto.

2. ALCANCE

El presente documento comprende el seguimiento de todos los programas SST establecidos en el plan de seguridad y salud en el trabajo del proyecto “INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO PRESERVACIÓN DE Y SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES. En el periodo comprendido del 01 de octubre 2025 al 31 octubre del año 2025.

3. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST

A continuación, se presenta el reporte de la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo durante el periodo reportado del mes de octubre de 2025.

3.1 EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO

Se realizó el ingreso de 3 trabajador, el cual, por medio de un centro médico autorizado, se les practicó los exámenes médicos correspondientes con el fin de verificar el estado de salud y determinar si se encontraba apto para desarrollar las actividades propias del cargo a desempeñar. El concepto de aptitud se determinó con base en los siguientes exámenes practicados:

- Examen médico laboral con énfasis osteomuscular.

- Audiometría.
- Visiometría.

Anexo 1 Resultados de los exámenes de ingreso realizados en el periodo del documento reportado.

3.2 AFILIACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

En el periodo reportado del mes de octubre de 2025 se realizo el ingreos de 2 trabajadores para el proyecto Rio Piedra.

Se verificó las afiliaciones a seguridad social de los trabajadores ingresados en el mes de octubre.

Anexo 2 Afiliaciones ARL.

3.3 REPORTE DE LICENCIAS, ENFERMEDADES Y ACCIDENTES DEL PERSONAL DEL PROYECTO

3.3.1 Reporte de licencias

Durante el periodo no se reportó ninguna licencia de paternidad

3.3.2 Reporte de accidentes laborales.

Durante el periodo no se reportó ningún accidente laboral.

3.3.3 Reporte de enfermedades laborales presentadas.

Durante el periodo no se presentaron enfermedades relacionadas con la actividad desarrollada por los trabajadores del proyecto.

3.3.4 Reporte de enfermedades no laborales presentadas.

Durante el periodo se presento una incapacidad por enfermedad no raboral.

Reporte de incapacidades médicas.

Durante el periodo del mes de octubre, se reporto la ausencias de uno de los colaboradres, ya que se genero una incapcidad medica por una enfermedad no laborar, donde la fecha de incio fue el dia 15/10/2015 y finalizo el dia 17/10/2025.

Anexo 3 Incapacidad y epicrisis.

3.4 PERFIL DEMOGRÁFICO


Durante del periodo reportado de octubre se reporta MOC y MONC que hacen parte de la empresa CONSORCIO ICASM 2023 y subcontratistas:

PERSONAL DE OBRA	CANTIDAD
AYUDANTE DE OBRA	3
OFICIAL DE OBRA	2
ESPECIALISTA HIDRAULICO	1
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1
ESPECIALISTA SST	1
INGENIERO RESIDENTE	1
DIRECTOR DE OBRA	1
COORDINADOR DE OBRA	1
AUXILIAR AMBIENTAL	1
INSPECTOR DE OBRA	1
AUXILIAR SST	1
OPERADOR DE EQUIPO PESADO	3
RESIDENTE DE OBRA	1
RESIDENTE SOCIAL	1
TRABAJADORA SOCIAL	1
ING. TOPOGRAFO	1
TOPOGRAFO	1
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	1
BIOLOGO	2
VETERINARIO	1
CONDUCTOR	1
Total, general	**27**



El proyecto **INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO PRESERVACIÓN DE Y SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES**, lo conforman su mayoría hombres ocupando un 93% en la conformación de personal del proyecto.

SEXO	CANTIDAD
H	25
M	2
TOTAL	27

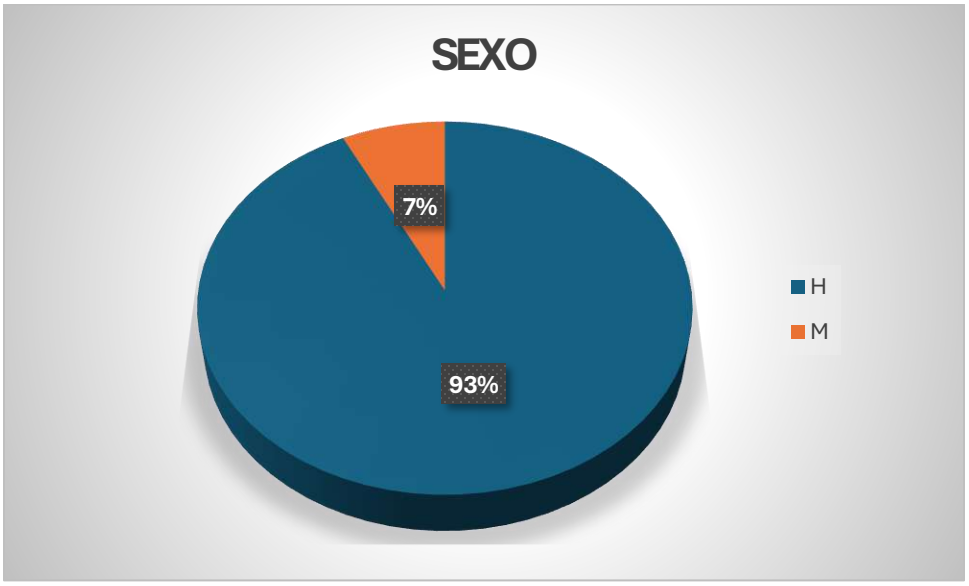

3.5 PROGRAMA DE INDUCCIONES Y CAPACITACIONES

Durante el periodo del mes octubre del 2025 se reportó el ingreso de 3 colaboradores, por lo cual se realizaron inducciones de seguridad.



Ilustración 1 Induccion de seguridad y salud en el trabajo.

3.5.1 Entrega De Elementos De Protección Personal.

Durante el periodo de reporte se realizo la entrega de dotación y elementos de protección personal a los colaboradores del CONSORCIO ICASM 2023

- Guantes de (carnaza según la actividad)
- Botas de cahucho
- Camisa
- Pantalón (Jean)
- Gafas



Anexo 4 Formato de entrega de dotación.

Ilustración 2 Entrega de dotación y elementos de protección personal.

3.6 CHARLAS DE SEGURIDAD.

Se realizaron charlas al personal de obra con el fin de abarcar temas de importancia que contribuyan a mejorar el desempeño de manera segura de cada uno de los trabajadores. Con forme a eso apoyando a cada una de las actividades realizadas en la obra.

Organizando el cronograma de actividades logramos trasmitirle al trabajador conocimientos y que identifiquen riesgos en obra, para cada una de las actividades establecidas.

Tabla 1 Charlas y capacitacione.

CHARLAS Y CAPACITACIONES	FECHA
Importancia de análisis de trabajo seguro	**1 de octubre 2025**
Prevención de Accidentes por Distracción en el Trabajo. 	**2 de octubre 2025**

Uso Seguro de Herramientas. 	**3 de octubre 2025**
Importancia del mantenimiento preventivo. 	**6 de octubre 2025**
Manejo seguro de equipos y maquinaria. 	**7 de octubre 2025**
Inducción y reinduccion ambiental. 	**9 de octubre 2025**

Pausas activas y ergonomía. 	**10 de octubre 2025**
Botiquín y primeros auxilios básicos. 	**14 de octubre 2025**
Protección contra caídas de objetos 	**20 de octubre 2025**
Hábitos de vida saludable. 	**21 de octubre 2025**

Comunicación efectiva en seguridad. 	**22 de octubre 2025**
Transporte y almacenamiento de materiales 	**23 de octubre 2025**
Uso, Cuidado y Responsabilidad sobre la Dotación. 	**24 de octubre 2025**
Capacitación por parte de Psicóloga de la ARL Sura. Temas: 1) Estres laboral y 2) Trabajo en equipo.	**27 de octubre 2025**

	
Seguridad en labores de mantenimiento. 	**29 de octubre 2025**
Analisis de trabajo seguro (ATS)	**30 de octubre 2025**
Prohibición de la casaría furtiva y protección de fauna silvestre. 	**31 de octubre 2025**

Anexo 5 Registro de Asistencia Charlas diarias.

3.7 SEÑALIZACIÓN DE OBRA

Señalización y demarcación

Se garantizó la instalación y permanencia de la señalización requerida en obra, las cuales fueron ubicadas según el criterio de los profesionales ambientales y de seguridad del proyecto.

Tabla 2 Señalización de obra – Uso de gafas y casco obligatorio.

USE PROTECCION DE OIDOS.	
	**Señalización “Use casco y use Gafas”, lugar de instalación: Santa Marta Magdalena.**

Tabla 3 Señalización de obra – Cinta de Peligro no pase.

SEÑALIZACION PELIGRO NO PASE	
	**Señalización “Cinta de Peligro no pase”, lugar de instalación: Santa Marta, Magdalena, ubicados al inicio y fin de la obra.**

Tabla 4 Señalización de obra – riesgo de caída

SEÑALIZACION RIESGO DE CAIDAS	
	**Señalización "Riesgo de caídas", lugar de instalación: Santa Marta, Magdalena por el edificio "Gaira".**

Tabla 5 Señalización de obra – ruta de evacuación y salida de emergencia.

SEÑALIZACION RUTA DE EVACUACION.	
	**Señalización "Ruta de evacuación y Salida de emergencia", lugar de instalación: Santa Marta, Magdalena por el edificio "Rio piedra".**

Se garantizó la presencia de los elementos de emergencia:

- Camilla, extintor y botiquín de primero auxilios



Ilustración 3 Camilla extintor y botiquín.

3.8 LIMPIEZA, ORDEN Y ASEO

Se realizaron jornadas de orden y aseo en el área de trabajo y en las instalaciones temporales usadas por el proyecto, actividades que fueron desarrolladas por los colaboradores bajo la supervisión del profesional ambiental y SST.

Tabla 6 jornadas de limpieza, orden y aseo.

JORNADAS DE LIMPIEZA EN LA OBRA.	
	Jornadas de limpieza, orden y aseo en la obra durante el mes de octubre.

3.9 MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRA

En la siguiente tabla se relaciona la maquinaria, equipos y vehículos presentes en el proyecto durante el periodo del mes de octubre del 2025.

Tabla 7 Maquinaria en obra.

MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRA	
MAQUINA	**CANTIDAD**
Excavadoras	3
TOTAL	3

3.9.1 Inspecciones preoperacionales.

Durante el periodo de reporte, se garantizó el diligenciamiento de los fromatos de inspección preoperacionales de la maquinaria, donde nos permite garantizar la seguridad y el buen funcionamiento de los equipos y maquinas.



Ilustración 4 Vigilancia de inspecciones preoperacionales

Anexo 6 Inspecciones de preoperacionales.

3.10 INSPECCIÓN DE KIT ANTIDERRAMES

Durante el periodo de reporte, se garantizó la presencia e inspección periódicas de kit básico para el control de derrames, los cuales se ubican en los frentes de obra e instalaciones temporales usadas por el proyecto.



Ilustración 5 inspección de kit antiderrames

Anexo 7 Inspección de kit antiderrames.

ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Induccion de segurirdad y salud en el trabajo. 7
Ilustración 2 Entrega de dotación y elementos de protección personal. 8
Ilustración 3 Camilla extintor y botiquín. 15
Ilustración 4 Vigilancia de inspecciones preoperacionales 16
Ilustración 5 inspección de kit antiderrames 16

TABLAS

Tabla 1 Charlas y capacitacione. 8
Tabla 2 Señalización de obra – Uso de gafas y casco obligatorio. 13
Tabla 3 Señalización de obra – Cinta de Peligro no pase. 13
Tabla 4 Señalización de obra – riesgo de caída 14
Tabla 5 Señalización de obra – ruta de evacuación y salida de emergencia. 14
Tabla 6 jornadas de limpieza, orden y aseo. 15

ANEXOS

Anexo 1 Resultados de los exámenes de ingreso realizados en el periodo del documento reportado. 4
Anexo 2 Afiliaciones ARL. 4
Anexo 3 Incapacidad y epicrisis. 4
Anexo 4 Formato de entrega de dotación. 8
Anexo 5 Registro de Asistencia Charlas diarias. 12
Anexo 6 Inspecciones de preoperacionales. 16
Anexo 7 Inspección de kit antiderrames. 16

LABORATORIO CLINICO GAMMA

Dra. Mey Lynn Britto Hernández
Medica Laboral
Nit: 1.082.837.089-7

CONCEPTO DE APTITUD MÉDICO LABORAL



FECHA **30-sep-2025** **HORA** 09:38:35
EMPRESA 9017829702 Consorcio ICASM 2023
DIRECCION:

INFORMACIÓN GENERAL:

Nombre del Trabajador: Yeison Javier Herrera Paternina
Documento de Identificación: CC Número: 1082850481 Sexo: Masculino
Fecha nacimiento: 12/08/2000 Teléfono: 3218212065
Edad: 25 años 1 mes 18 días Estado civil: Casado Estrato: 1
Escolaridad: Básica Secundaria Dirección: Kilómetro 32 Vereda Los Naranjos
Ocupación: Ayudante de obra
EPS: 0 COOSALUD
ARL: No Registra AFP: No registra

EXAMEN MEDICO LABORAL: **Ingreso**

Apto sin restricciones

Cargo/ Habilidad / Oficio a desempeñar: Ayudante de obra

Aptitudes Especificas:
NO APLICA

Restricciones:
SIN RESTRICCIONES

Recomendaciones

Ingresar al sistema de vigilancia osteomuscular.
Ingresar a SVE riesgo visual y control por optometría.

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"
LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS Y ESTARA DISPONIBLE PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 1918 DEL 2009

Médico

Firma

Nombre: MEY LYNN BRITTO HERNANDEZ
RM 44/604 Lic.SST: 1556/13
Especialidad: Medicina Laboral

LABORATORIO CLINICO GAMMA

Dra. Mey Lynn Britto Hernández
Medica Laboral
Nit: 1.082.837.089-7

CONCEPTO DE APTITUD MÉDICO LABORAL



FECHA **30-sep-2025** **HORA** 10:00:34
EMPRESA 9017829702 consorcio ICASM 2023
DIRECCION:

INFORMACIÓN GENERAL:

Nombre del Trabajador: Javier Alfonso Herrera Muñoz
Documento de Identificación: CC Número: 1082848976 Sexo: Masculino
Fecha nacimiento: 22/07/1973 Teléfono: 3107149135
Edad: 52 años 2 meses 8 días Estado civil: Unión libre Estrato: 1
Escolaridad: Básica Primaria Dirección: Vereda Los Naranjos Parque Tayrona
Ocupación: Ayudante de obra
EPS: 0 SANITAS
ARL: No Registra AFP: No registra

EXAMEN MEDICO LABORAL: **Ingreso**
Aplazado

Cargo/ Habilidad / Oficio a desempeñar: Ayudante de obra

Aptitudes Especificas:
NO APLICA

Restricciones:

Recomendaciones

Se remite a su EPS para realización de EKG.

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"
LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS Y ESTARA DISPONIBLE PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 1918 DEL 2009

Médico

Firma

Nombre: MEY LYNN BRITTO HERNANDEZ
RM 44/604 Lic.SST: 1556/13
Especialidad: Medicina Laboral

LABORATORIO CLINICO GAMMA

Dra. Mey Lynn Britto Hernández
Medica Laboral
Nit: 1.082.837.089-7

CONCEPTO DE APTITUD MÉDICO LABORAL



FECHA **30-sep-2025** **HORA** 08:13:47
EMPRESA 9017829702 consorcio ICASM 2023
DIRECCION:

INFORMACIÓN GENERAL:

Nombre del Trabajador: Néstor Tomas Herrera Muñoz
Documento de Identificación: CC Número: 7960241 Sexo: Masculino
Fecha nacimiento: 10/09/1977 Teléfono: 3215583606
Edad: 48 años 20 días Estado civil: Unión libre Estrato: 1
Escolaridad: Básica Primaria Dirección: Vereda Los Naranjos Parque Tayrona
Ocupación: Ayudante de obra
EPS: 045 mutual Ser
ARL: No Registra AFP: No registra

EXAMEN MEDICO LABORAL: **Ingreso**

Apto sin restricciones

Cargo/ Habilidad / Oficio a desempeñar: Ayudante de obra

Aptitudes Especificas:
NO APLICA

Restricciones:
SIN RESTRICCIONES

Recomendaciones

Control por EPS de lípidos, control por nutrición y estilos de vida saludable.
Control por optometría.
Realizar pausas activas durante la jornada laboral, uso de EPP.
Ingresar al sistema de vigilancia osteomuscular

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"
LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS Y ESTARA DISPONIBLE PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 1918 DEL 2009

Médico

Firma

Nombre: MEY LYNN BRITTO HERNANDEZ
RM 44/604 Lic.SST: 1556/13
Especialidad: Medicina Laboral

Medellín, 22 de October de 2025

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO ICASM 2023.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1082848976	HERRERA MUÑOZ JAVIER ALFONSO	23/10/2025		F1511e35	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 22/10/2025 15:27:14 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.119.145.96, 192.230.104.2, 172.16.42.57

Medellín, 04 de October de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO ICASM 2023.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C7960241	HERRERA MUÑOZ NESTOR TOMAS	06/10/2025		41148206	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 04/10/2025 09:28:23 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.119.145.96, 192.230.104.2, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 22 de October de 2025

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO ICASM 2023.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1082850481	HERRERA PATERNINA YEISON JAVIER	23/10/2025		[1]1361514	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 22/10/2025 15:30:27 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.119.145.96, 192.230.104.2, 172.16.42.57

Cajamag
NIT. 891.780.093-3

JEFE UNIDAD DE SUBSIDIO Y APORTES

CERTIFICA

Que una vez efectuada la verificación en nuestra base de datos, el(la) señor(a) HERRERA MUNOZ NESTOR TOMAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No 7960241, se encuentra afiliado a esta caja de compensación como trabajador dependiente con un estado ACTIVO. con categoria A, Presentando su ultima afiliacion para la empresa:

Nit	Razon Social	Fecha Afiliacion	Fecha Retiro
901782970	CONSORCIO ICASM 2023	2025-10-06	

Esta certificacion se expide en SANTA MARTA a solicitud del interesado el dia 18 de Octubre de 2025

MARTINA VICIOSO SANTODOMINGO
Jefe Unidad de Subsidio y Aportes

Esta certificacion es valida por treinta (30) días.

Cajamag
NIT. 891.780.093-3

JEFE UNIDAD DE SUBSIDIO Y APORTES

CERTIFICA

Que una vez efectuada la verificación en nuestra base de datos, el(la) señor(a) HERRERA PATERNINA YEISON JAVIER, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No 1082850481, se encuentra afiliado a esta caja de compensación como trabajador dependiente con un estado ACTIVO. con categoria A, Presentando su ultima afiliacion para la empresa:

Nit	Razon Social	Fecha Afiliacion	Fecha Retiro
901782970	CONSORCIO ICASM 2023	2025-10-23	

Esta certificacion se expide en SANTA MARTA a solicitud del interesado el dia 30 de Octubre de 2025

MARTINA VICIOSO SANTODOMINGO
Jefe Unidad de Subsidio y Aportes

Esta certificacion es valida por treinta (30) días.

Cajamag
NIT. 891.780.093-3

JEFE UNIDAD DE SUBSIDIO Y APORTES

CERTIFICA

Que una vez efectuada la verificación en nuestra base de datos, el(la) señor(a) HERRERA MUÑOZ JAVIER ALFONSO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No 1082848976, se encuentra afiliado a esta caja de compensación como trabajador dependiente con un estado ACTIVO. con categoria A, Presentando su ultima afiliacion para la empresa:

Nit	Razon Social	Fecha Afiliacion	Fecha Retiro
901782970	CONSORCIO ICASM 2023	2025-10-23	

Esta certificacion se expide en SANTA MARTA a solicitud del interesado el dia 10 de Noviembre de 2025

MARTINA VICIOSO SANTODOMINGO
Jefe Unidad de Subsidio y Aportes

Esta certificacion es valida por treinta (30) días.

CE-006 - 0000000100 – 2025

CERTIFICA

Que la(s) persona(s) relacionada(s) a continuación está(n) o ha(n) estado afiliada(s) a

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 1082848976
NOMBRES Y APELLIDOS	Herrera Muñoz,Javier Alfonso
TIPO DE AFILIADO	Titular
TIPO DE TRABAJADOR	Dependiente
FECHA DE AFILIACIÓN AL REGIMEN	10/08/2021
ESTADO DE AFILIACIÓN	Vigente
ESTADO DE SERVICIO	Habilitado
REGIMEN	Contributivo

La presente se expide a nombre de Herrera Muñoz,Javier Alfonso, a los 14 días del mes de noviembre del año 2025.

NOTA: Esta certificación no constituye aprobación de traslado, ni es documento válido para solicitar servicios médicos.

Banny Yeritza Sarmiento Vanegas
Coordinador Gestión de la Afiliación

COOSALUD
En Pos de tu bienestar

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

Para la atención de servicios de salud POS, el suscrito afiliado se encuentra registrado en la EPS con los siguientes datos.

Información del Cotizante y/o Cabeza de Familia										
Tipo Ident.	**Número de Ident.**	**Nombres**	**Apellidos**	**Fecha de Afiliación**	**Departamento**	**Ciudad**	**Dirección**	**Teléfono**	**Regimen**	**Estado**
CC	1082850481	YEISON JAVIER	HERRERA PATERNINA	12/07/2024 12:00:00 a. m.	MAGDALENA	SANTA MARTA	CRV 122 ESTE # 11		Contributivo	Activo

Informacion del Aportante				
NIT/CC	**Razon Social**	**Estado**	**Rango Cotizante**	**Fecha Vinculacion**
901782970	CONSORCIO ICASM 2023	N		23/10/2025

La anterior certificación se expide y firma, a los 10 días del mes de Noviembre de 2025, a solicitud del interesado y es válida hasta los 10 días del mes de Diciembre de 2025

Cordialmente,

CARLOS TORRES SALAZAR
SUBDIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NACIONAL

CERTIFICA QUE:

El(La) Señor(a) NESTOR TOMAS HERRERA MUÑOZ identificado(a) con CC 7960241 se encuentra afiliado a la EPS en condición de 1° COTIZANTE.

Fecha de Activación de	**01/06/2016**
Estado de la Afiliación:	**ACTIVO**
IPS:	**SUBSIDIADO-E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**
Categoría:	**A**

La presente certificación se expide a solicitud del(de la) interesado(a) en Bogotá para QUIEN INTERESE, a los 8 días del mes de octubre del año 2025.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

ESTA CERTIFICACIÓN NO APLICA PARA SERVICIOS MÉDICOS.
NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,

Gerencia de Afiliaciones
Nueva EPS S.A

INFORMACIÓN GENERAL

Admisión: AS155458
Paciente: CC 1004424744 - DAYANA CERVANTES GIRALDO
Fecha de Nacimiento: 03/01/2000
Dirección: CALLE 29C-CRA 21 C APTO 2
Entidad: EPS MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A

Fecha de Impresión: 15/10/2025 14:46
Fecha de Atención: 15/10/2025 14:44
Edad: 25 año(s), 9 mes(es) y 12 días. **Sexo:** F
Teléfono: 3145549966
Impreso por:

Registro para la Historia Clínica de Urgencia

DATOS DE LA CONSULTA

Remitido: **Contra referencia:** No
Tipo de Consulta: TCM02|Consulta Medicina General
Plan / Administradora: 8702|EPS MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A / EPS MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.
Glasgow: 15 **Valoración:** Alerta **Triage:** III|III

MOTIVO DE LA CONSULTA

"TENGO GRIPA"

ENFERMEDAD ACTUAL

PACIENTE CON CUADRO CLINICO DE 3 DIAS DE EVOLUCION CONSISTENTE EN INICIO CONGESTION NASAL CON RINORREA HIALINA ASOCIADO TOS SECA A HUMEDA CON EXPECTORACION HIALINA A VERDOSA , MALESTAR GENERAL , DESALIENTO, FIEBRE CUANTIFICADA 38.5°C HACE 24 HORAS , NIEGA DISNEA , NIEGA NAUSEAS , NIEGA VOMITOS , NIEGA DIARREA , NIEGA TAQUICARDIA , NIEGA TAQUIPNEA EN MANEJO CON DOLEX 1 G VO CADA 6 HORAS SIN MEJORIA CLINCA POR LO CUAL CONSULTA , CON ESQUEMA DE VACUNACION AL DIA. NIEGA ASISTENCIA A RIOS , FINCAS O ZONA RURAL NIEGACONTACTO CON PACIENTE POSITIVO PARA COVID, NIEGA VIAJE RECIENTE NIEGA NOXA DE CONTACTOEN NIÑOS ACTIVIDAD LABORAL DE SUS PADRES O CUIDADORES. MOTIVO POR LO QUE ACUDE A URGENCIAS

ANTECEDENTES

1. Patológicos (HTA, Diabetes):
2. Quirúrgicos:
3. Hospitalarios:
4. Transfusionales:
5. Tóxico-Alérgicos:
6. Farmacológicos:
7. Gineco-Obstétricos:
8. Traumáticos:
9. Otros:
10. Alergia-toxicidad a medicamentos:

FAMILIARES

REVISIÓN POR SISTEMA

Sistema afectado: **RESPIRATORIO**

EXAMENES FÍSICOS

F.Cardíaca:	89 xMin	**Temperatura:**	0 °C	**F.Respiratorias:**	15 xMin
Peso:	90 kg	**Talla :**	1.75 m	**Presión:**	
IMC:	29.39 Kg/m^2	**SMC:**	2.06 m_2	**Perímetro Cefálico:**	
Perímetro Torácico:		**Presión Arterial Media:**	80 mmHg		

Apariencia: ESTABLE
Cráneo, cara y cuello: NORMOCEFALO, OTOSCOPIA BILATERAL Y OROFARINGE NORMAL CUELLO MÓVIL SIN ADENOPATIAS NI MASAS.
Tórax: TÓRAX SIMÉTRICO, EXPANSIBLE, SIN TIRAJES, NO DOLOROSO, CON RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS, SIN SOPLOS, MURMULLO VESICULAR CONSERVADO SIN AGREGADOS.
Abdomen: ABDOMEN CON RUIDOS INTESTINALES PRESENTES, BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL, SIN MASAS NI MEGALIAS.
Piel y faneras: SIN LESIONES EN PIEL
Genito - urinario: No revisado
Extremidades: EXTREMIDADES EUTRÓFICAS, SIN EDEMAS, LLENADO CAPILAR MENOR A DOS SEGUNDOS.
Sistema nervioso central: ACTIVO- REACTIVO, PUPILAS ISOCÓRICAS Y NORMORREACTVAS A LA LUZ, SIN RIGIDEZ NUCAL NI OTROS SIGNOS MENÍNGEOS, SIN SIGNOS DE FOCALIZACIÓN, SIN DÉFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE.

Registro para la Historia Clínica de Urgencia

OBSERVACIONES Y RESULTADOS DE PARACLÍNICOS

SI

ANÁLISIS

Finalidad de la consulta: 10|No Aplica

Causa externa: 13|Enfermedad general

Tipo de diagnóstico principal: 1|Impresión diagnóstica


Diagnóstico principal: J00X - RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)

Plan de Tratamiento:
ANALGESIA E HIDRATACION
DICLOFENACO AMPOLLA 75 MG IM AHORA
DEXAMETASONA 8 MG IM AHORA
S/S RX DE TORAX AP Y LT
REVALORACION

Análisis: **PACIENTE ESTABLE HEMODINAMICAMENTE AFEBRIL TOLERANDO VIA ORAL SIN SIGNOS DEDIFICULTAD RESPIRATORIA CON CUADRO DE RINOFARINGITIS AGUDA ASOCIADO A SIGNOS DE BRONQUITIS AGUDA , RESTO DE EXAMEN FISICO NORMAL MOTIVO POR LO QUE SE DECIDE MANEJO DE SU CUADRO CLINICO AHORA CON ANALGESIA IM S/S RX DE TORAX AP Y LT , CSV Y CA REVALORACION**

Recomendaciones:

Destino del Paciente:



ALVARO GONZALES
MEDICINA GENERAL
1082867519

GESTIÓN SALUD S.A.S.
Nit: 806015201-3 **Cód. Habilitación:** 470010172201
Dirección: Avenida Libertador N 24- 107 **Teléfono:** 4368304

INFORMACIÓN GENERAL

Admisión: AS155458
Paciente: CC 1004424744 - DAYANA CERVANTES GIRALDO
Fecha de Nacimiento: 03/01/2000
Dirección: CALLE 29C-CRA 21 C APTO 2
Entidad: EPS MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A

Fecha de Impresión: 15/10/2025 15:24
Fecha de Atención: 15/10/2025 15:23
Edad: 25 año(s), 9 mes(es) y 12 días. **Sexo:** F
Teléfono: 3145549966
Impreso por:


Número - Ingreso: INC29311
Servicio: URGENCAIS
Responsable: DR. ALVARO GONZALEZ
Dianóstico: J00X : RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)

INCAPACIDAD POR:


72 HORAS
FECHA DE INICIO 15/10/2025
FECHA DE FINALIZACION 17/10/2025

OBSERVACIÓNES:

72 HORAS
FECHA DE INICIO 15/10/2025
FECHA DE FINALIZACION 17/10/2025



ALVARO GONZALES
MEDICINA GENERAL
1082867519



CONSORCIO
ICASM2023

ENTREGA DE DOTACIÓN AL PERSONAL

PROYECTO/BASE	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA	FECHA DE INGRESO (DD / MM / AA)
Proyecto Río Gaira Santa Marta	José padilla	1969454	8 / 10 / 25
CARGO: Oficial		**CÓDIGO**	**FECHA DE ENTREGA (DD / MM / AA)** 8 / 10 / 25

ELEMENTOS		SI	NO	N/A	CANT	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
CASCO		X			1	José Padilla	
GAFAS DE SEGURIDAD		X			1	José padilla	
PROTECTORES AUDITIVOS							
GUANTES DE CARNAZA							
CAMISA		X			1	José Padilla	
PANTALÓN		X			1	José Padilla	
BOTAS DE SEGURIDAD	CORTAS						
	SOLDADOR						
	CAUCHO						
ALCOHOL							
RESPIRADOR							
PASAMONTAÑAS							

Al recibir los elementos relacionados me comprometo a hacer un buen uso de ellos permanentemente.

	DAYANA CERVANTES 1.004424.444	

Scanned with CamScanner

CONSORCIO
ICASM2023

ENTREGA DE DOTACIÓN AL PERSONAL

PROYECTO/BASE	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA	FECHA DE INGRESO (DD / MM / AA)
Proyecto Rio Gaira Santa Marta	NESTOR HERRERA	7960241	24 / 10 / 25
CARGO: AYUDANTE		**CÓDIGO**	**FECHA DE ENTREGA** (DD / MM / AA): 24 / 10 / 2025

ELEMENTOS		SI	NO	N/A	CANT	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
CASCO		X			1	NESTOR	
GAFAS DE SEGURIDAD		X			1	NESTOR	
PROTECTORES AUDITIVOS							
GUANTES DE CARNAZA		/					
CAMISA		X			1	. NESTOR	
PANTALÓN		X			1	. NESTOR	
BOTAS DE SEGURIDAD	CORTAS						
	SOLDADOR						
	CAUCHO						
ALCOHOL							
RESPIRADOR							
PASAMONTAÑAS							

Al recibir los elementos relacionados me comprometo a hacer un buen uso de ellos permanentemente.

DAYANA CERVANTES
1.004.424.744

Scanned with CamScanner

CONSORCIO
ICASM2023

ENTREGA DE DOTACIÓN AL PERSONAL

PROYECTO/BASE	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA	FECHA DE INGRESO (DD MM AA)
Proyecto Rio Gaira Santa Marta	JAVIER ALFONSO HERRERA	1827848976	24 10 25
CARGO: AYUDANTE		**CÓDIGO**	**FECHA DE ENTREGA** (DD MM AA): 24 10 25

ELEMENTOS		SI	NO	N/A	CANT	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
CASCO		X			1		
GAFAS DE SEGURIDAD		X			1		
PROTECTORES AUDITIVOS							
GUANTES DE CARNAZA							
CAMISA		X			1		
PANTALÓN		X					
BOTAS DE SEGURIDAD	CORTAS				1		
	SOLDADOR						
	CAUCHO						
ALCOHOL							
RESPIRADOR							
PASAMONTAÑAS							

Al recibir los elementos relacionados me comprometo a hacer un buen uso de ellos permanentemente.

DAYANA
CERVANTES
1.004.424.144

Scanned with CamScanner

CONSORCIO
ICASM2023

ENTREGA DE DOTACIÓN AL PERSONAL

PROYECTO/BASE	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA	FECHA DE INGRESO (DD / MM / AA)
Proyecto Rio Gaira Santa Marta	Jeison Javier Herrera	1082824181	24 / 10 / 25
CARGO: AYUDANTE		**CÓDIGO**	**FECHA DE ENTREGA** (DD / MM / AA) 24 / 10 / 25

ELEMENTOS		SI	NO	N/A	CANT	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
CASCO		X			1		
GAFAS DE SEGURIDAD		X			1		
PROTECTORES AUDITIVOS							
GUANTES DE CARNAZA							
CAMISA		X			1		
PANTALÓN		X			1		
BOTAS DE SEGURIDAD	CORTAS						
	SOLDADOR						
	CAUCHO						
ALCOHOL							
RESPIRADOR							
PASAMONTAÑAS							

Al recibir los elementos relacionados me comprometo a hacer un buen uso de ellos permanentemente.

	DAYANA CERVANTES 1.004.424.744	

Scanned with CamScanner

CONSORCIO
ICASM2023

ENTREGA DE DOTACIÓN AL PERSONAL

PROYECTO/BASE	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA	FECHA DE INGRESO (DD / MM / AA)
Proyecto Rio Gaira Santa Marta	Yolsun Atencio Barrio	1192809747	24 / 10 / 25
CARGO: obrero		**CÓDIGO**	**FECHA DE ENTREGA** (DD / MM / AA): 24 / 10 / 25

ELEMENTOS		SI	NO	N/A	CANT	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
CASCO		-			1	Yolsun	
GAFAS DE SEGURIDAD		-			1	Yolsun	
PROTECTORES AUDITIVOS							
GUANTES DE CARNAZA							
CAMISA		-			1	Yolsun	
PANTALÓN		-			1	Yolsun	
BOTAS DE SEGURIDAD	CORTAS						
	SOLDADOR						
	CAUCHO						
ALCOHOL							
RESPIRADOR							
PASAMONTAÑAS							

Al recibir los elementos relacionados me comprometo a hacer un buen uso de ellos permanentemente.

	DAYANA CERVANTES 1004.424.744	

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ICASM

CONSORCIO
ICASM2023

REGISTRO DE ASISTENCIA

CHARLAS, CAPACITACIONES, INDUCCION, OTRO.

Charlas diarias	X	Capacitación		Inducción		Otro	

CIUDAD Y FECHA: Santa Marta, 2 de octubre 2025 **Ubicación:** Rio piedra

TEMA (S): Prevención de accidentes por distracción en el trabajo

INTRUCTOR: Dayana Cervantes **TIEMPO (MINUTOS)** 5 **Pag 1 de 1**

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FRIMA
1	Felipe Venecia	1082986414	TOPO	
2	Jesús Javier Herrera P.	1082850481	AYUDANTE	
3	Yeison Alonso	1192808749		
4	Jose P Padilla	14597805	OFICIAL	
5	NESTOR HERRERA	7960241	AYEU	
6	Jamilis HERRERA	1082848976	AYBOR	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

OBSERVACIONES:	Dayana Cervantes
	RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ICASM

CONSORCIO ICASM2023

REGISTRO DE ASISTENCIA

CHARLAS, CAPACITACIONES, INDUCCION, OTRO.

Charlas diarias	X	Capacitación		Inducción		Otro	

CIUDAD Y FECHA: Santa Marta, 3 de octubre 2025 Ubicación: Rio piedra

TEMA (S): Uso seguro de herramientas

INTRUCTOR: Dayana Cervantes TIEMPO (MINUTOS) 5 Pag 1 de 1

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FRIMA
1	Felipe Venecia	1082986414	TOPO	
2	Jesús Javier Herrera P.	1082850481	AUXILIAR	
3	Yeison Arango	1192808749		
4	Jose Padilla	1059780	OFICIAL	
5	NESTOR HERRERA	7960241	AYEU	
6	Jaime HERRERA	1082848976	AYBOT	
7	CARLOS DANTO	84453843	AYUDANTE	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

OBSERVACIONES:	Dayana Cervantes RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ICASM

CONSORCIO ICASM2023

REGISTRO DE ASISTENCIA

CHARLAS, CAPACITACIONES, INDUCCION, OTRO.

Charlas diarias	X	Capacitación		Inducción		Otro	

CIUDAD Y FECHA: Santa Marta, 6 de octubre 2025 Ubicación: Riopiedra

TEMA (S): Importancia del mantenimiento preventivo

INTRUCTOR: Dayana Cervantes TIEMPO (MINUTOS) 5 Pag 1 de 1

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FRIMA
1	Felipe Venecia	1082986414	TOPO	
2	Jesús Javier Herrera P.	1082850481	AYUDANTE	
3	Yeison Alonso	1192808249		
4	Jose Padilla	14597805	OFICIAL	Jose
5	NESTOR HERRERA	7960241	AYEU	
6	Javier HERRERA	1082848976	AYBOT	
7	CARLOS DAMATO	84453843	AYudante	CARLOS
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

OBSERVACIONES:	Dayana Cervantes RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

CONSORCIO
ICASM2023

CONSORCIO ICASM

REGISTRO DE ASISTENCIA

CHARLAS, CAPACITACIONES, INDUCCION, OTRO.

Charlas diarias	X	Capacitación		Inducción		Otro	

CIUDAD Y FECHA: Santa Marta, 7 de octubre 2026 Ubicación: Rio piedra

TEMA (S): Manejo seguro de equipos y maquinaria

INTRUCTOR: Dayana Cervantes TIEMPO (MINUTOS) 5 Pag 1 de 1

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FRIMA
1	Felipe Venecia	1082986414	TOPO	
2	Jasón Javier Herrera p.	1082850481	AYUDANTE	
3	Yeison Alonso	1192808249		
4	Jose Padilla	1059780[illegible]	OFICIAL	Jose
5	NESTOR HERRERA	7960241	AYEU	
6	Jamilis HERRERA	1082848976	AYBOT	
7	CARLOS DONATO	84453843	AYUDANTE	CARLOS
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

OBSERVACIONES:	Dayana Cervantes RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ICASM

CONSORCIO ICASM2023

REGISTRO DE ASISTENCIA

CHARLAS, CAPACITACIONES, INDUCCION, OTRO.

Charlas diarias	X	Capacitación		Inducción		Otro	

CIUDAD Y FECHA: Santa Marta, 9 de octubre 2025 Ubicación: Rio Piedra

TEMA (S): Induccion y reinduccion ambiental

INTRUCTOR: Dayana Cervantes TIEMPO (MINUTOS) 5 Pag 1 de 1

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FRIMA
1	FELIPE VERGARA	1082986414	TOPO	
2	Deisón Javier Herrera B.	1082850481	AYUDANTE	
3	Yeison Arrieta	1192809747		
4	José Padilla	14597805	OFICIAL	
5	NESTOR HERRERA	7960241	AYUD	
6	Jaider HERRERA	1082848976	AYUDT	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

OBSERVACIONES:	Dayana Cervantes RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ICASM

CONSORCIO ICASM2023

REGISTRO DE ASISTENCIA

CHARLAS, CAPACITACIONES, INDUCCION, OTRO.

Charlas diarias	X	Capacitación		Inducción		Otro	

CIUDAD Y FECHA: Santa Marta, 10 de octubre 2025 Ubicación: Río Piedra

TEMA (S): Pausas activas y ergonomia

INTRUCTOR: Dayana Cervantes TIEMPO (MINUTOS) 5 Pag 1 de 1

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FRIMA
1	Felipe Venecia	1082986414	TOPO	
2	Jeison Javier Herrera G.	1082850481	Ayudante	
3	Yuber Acuña	1192808242		
4	José Padilla	1957975CR	Oficial	
5	NESTOR HERRERA	7960241	AYEU	
6	Javier HERRERA	1082343976	AYUD	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

OBSERVACIONES:	Dayana Cervantes RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

CONSORCIO
ICASM2023

CONSORCIO ICASM

REGISTRO DE ASISTENCIA

CHARLAS, CAPACITACIONES, INDUCCION, OTRO.

Charlas diarias	X	Capacitación		Inducción		Otro	

CIUDAD Y FECHA: Santa Marta, 14/10/23 **Ubicación:** Rio Piedra

TEMA (S): Botiquin y Primeros auxilios basicos

INSTRUCTOR: Dayana Cervantes **TIEMPO (MINUTOS)** 5 **Pag** 1 **de** 1

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FRIMA
1	NESTOR HERRERA	7960241		NESTOR
2	Yoson Arrieta	1082808847		Yoson
3	José padilla	14597805	Oficios	José
4	JAVIER HERRERA	7082348976	HSE	
5	Yeison Javier Herrera G.	1082850481	AYUDANTE	
6	Felipe Venecia	1083986414	Topo	Felipe M.
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

OBSERVACIONES:	
	RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ICASM2023

CONSORCIO ICASM

REGISTRO DE ASISTENCIA

CHARLAS, CAPACITACIONES, INDUCCION, OTRO.

Charlas diarias	X	Capacitación		Inducción		Otro	

CIUDAD Y FECHA: Santa Marta, 20 de octubre 2025 Ubicación: Rio Piedra

TEMA (S): Proteccion contra caidas de objetos

INTRUCTOR: Dayana Cervantes TIEMPO (MINUTOS) 5 Pag 1 de 1

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FRIMA
1	Felipe Venecia	1082986414	TOPO	
2	Jesús David Herrera	1082850481	AYUDANTE	
3	Yatsuri Alendo	1192807247		
4	José Padilla	14697805	Oficial	
5	NESTOR HERRERA	7960241	AYEU	
6	Jandel HERRERA	1023487976	AYEU	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

OBSERVACIONES:	Dayana Cervantes RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

CONSORCIO
ICASM2023

CONSORCIO ICASM

REGISTRO DE ASISTENCIA

CHARLAS, CAPACITACIONES, INDUCCION, OTRO.

Charlas diarias	X	Capacitación		Inducción		Otro	

CIUDAD Y FECHA: Santa Marta, 21/10/25 Ubicación: RIO PIEDRA

TEMA (S): Habitos de vida Saludable

INTRUCTOR: Dayana Cervantes TIEMPO (MINUTOS) 5 Pag 1 de 1

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FRIMA
1	Jose padilla	1459780	Oficial	
2	Yesin Antonio	1142908449	Oficial	
3				
4	NESTOR HERRERA	7960241		
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

OBSERVACIONES:	DAYANA CERVANTES
	RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

CONSORCIO
ICASM2023

CONSORCIO ICASM

REGISTRO DE ASISTENCIA

CHARLAS, CAPACITACIONES, INDUCCION, OTRO.

Charlas diarias	X	Capacitación		Inducción		Otro	

CIUDAD Y FECHA: Santa Marta, 23/10/2025 Ubicación: Rio Piedra

TEMA (S): Transporte y Almacenamiento de materiales

INTRUCTOR: _____ TIEMPO (MINUTOS) _____ Pag __ de __

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FRIMA
1	José Padilla	19597805	OPU	
2	[illegible]	1192708247	Oficio	
3				
4	NESTOR HERRERA	7960241		
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

OBSERVACIONES:	RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ICASM

CONSORCIO ICASM2023

REGISTRO DE ASISTENCIA

CHARLAS, CAPACITACIONES, INDUCCION, OTRO.

Charlas diarias	X	Capacitación		Inducción		Otro	

CIUDAD Y FECHA: Santa Marta, 24 de octubre 2025 Ubicación: Rio Piedra

TEMA (S): Uso, Cuidado y Responsabilidad sobre la dotacion

INTRUCTOR: Dayana Cervantes TIEMPO (MINUTOS) 5 Pag 1 de 1

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FRIMA
1	FELIPE VENECIA	1082986414	RPO	FELIPE M.
2	Yeison Javier Herrera	1082850481	Ayudante	
3	Yaisun Alarcon	1192908247		Yaisun
4	José Davila-	1045978035	Oficial	José
5	NESTOR HERRERA	7960241	AYEU	
6	Jaider HERRERA	1082848976	AYEUT	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

OBSERVACIONES:	
	Dayana Cervantes RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ICASM

CONSORCIO ICASM2023

REGISTRO DE ASISTENCIA

CHARLAS, CAPACITACIONES, INDUCCION, OTRO.

Charlas diarias	X	Capacitación		Inducción		Otro	

CIUDAD Y FECHA: Santa Marta, 27 de octubre 2023 Ubicación: RIO PIEDRA

TEMA (S): Capacitacion por parte de Psicologa de la ARL sura.

Temas: 1) Estres laboral y 2) Trabajo en equipo

INTRUCTOR: Dayana Cervantes TIEMPO (MINUTOS) 5 Pag 1 de 1

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FRIMA
1	FELIPE VENECIA	1082986414	RIO	FELIPE V.
2	Yeison Javier Herrera	1082850481	Ayudante	
3	Yeison Arenas	1192908247		Yeison
4	JOSE DAVILA-	14597805	Oficial	JOSE
5	NESTOR HERRERA	79602411	AYEU	
6	Javier HERRERA	1082848976	AYEUT	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

OBSERVACIONES:	Dayana Cervantes RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ICASM2023

CONSORCIO ICASM

REGISTRO DE ASISTENCIA

CHARLAS, CAPACITACIONES, INDUCCION, OTRO.

Charlas diarias	X	Capacitación		Inducción		Otro	

CIUDAD Y FECHA: Santa Marta, 29/01/2025 Ubicación: RIO PIEDRA

TEMA (S): seguridad en labores de mantenimiendo

INTRUCTOR: Dayana Cervantes TIEMPO (MINUTOS) 5 Pag 1 de 1

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FRIMA
1	José Pantoja	1159t803	Oper	José
2	Yeison Acevedo	1192803842	oficial	Yeison
3				
4	WESTOK HERRERA	7960241		
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

OBSERVACIONES:	DAYANA CERVANTES RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

CONSORCIO
ICASM2023

CONSORCIO ICASM

REGISTRO DE ASISTENCIA

CHARLAS, CAPACITACIONES, INDUCCION, OTRO.

Charlas diarias	X	Capacitación		Inducción		Otro	

CIUDAD Y FECHA: Santa Marta, 31/10/2025 **Ubicación:** Rio Piedra

TEMA (S): Analisis de Trabajo seguro (ATS)

INTRUCTOR: Dayana Cervantes **TIEMPO (MINUTOS)** 5 **Pag** 1 **de** 1

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FRIMA
1	Deison Herrera B.	1082850481	Ayudante	
2				
3	Javier HERRERA	1082848976	AIN	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

OBSERVACIONES:	DAYANA CERVANTES

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ICASM2023

PRE-OPERACIONAL EXCAVADORA

FECHA: 2/10/2025 - 4/10/2025
NOMBRE DEL OPERADOR: Haider URIEGES.
NOMBRE INSPECTOR SST: Dayana Cervantes
C: CUMPLE, N/C: NO CUMPLE, N/A: NO APLICA FAVOR

SEMANA 1
UBICACIÓN: RIO PIEDRA
MARQUE UNA X EN CADA CASILLA SEGÚN CORRESPONDA

CONDICIONES GENERALES	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES 2/10/25			VIERNES 3/10/25			SABADO 4/10/25		
	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A
ORUGAS TENSIONADAS Y EN BUEN ESTADO										✓			✓			✓		
LUCES FRONTALES Y TRASERAS										✓			✓			✓		
ASIENTO EN BUEN ESTADO										✓			✓			✓		
INDICADORES										✓			✓			✓		
ESCALERAS Y APOYOS SEGUROS										✓			✓			✓		
ESPEJOS LATERALES										✓			✓			✓		
PALANCAS Y PEDALES EN BUEN ESTADO										✓			✓			✓		
PITO Y BATERIA										✓			✓			✓		
CONTROL DE FUGAS										✓			✓			✓		
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR ASEADO										✓			✓			✓		
ESTADO DE LAS MANGUERAS										✓			✓			✓		
ESTADO DEL BALDE										✓			✓			✓		
CINTURON DE SEGURIDAD										✓			✓			✓		
BOTIQUIN										✓			✓			✓		
EXTINTOR										✓			✓			✓		
FIRMA DIARIA OPERADOR										[signature]			[signature]			[signature]		
FIRMA DIARIA SST										DAYANA C			DAYANA C			DAYANA C		

OBSERVACIONES:
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO

NOMBRE Y FIRMA OPERARIO	NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR SST	
[signature]	DAYANA CERVANTES.	

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ICASM2023

PRE-OPERACIONAL EXCAVADORA

FECHA: 6/10/25 - 11/10/2025

NOMBRE DEL OPERADOR: Haider URIELES

SEMANA: 2

NOMBRE INSPECTOR SST: DAYANA CERVANTES

UBICACIÓN: Rio PIEDRA

C: CUMPLE, N/C: NO CUMPLE, N/A: NO APLICA FAVOR

MARQUE UNA X EN CADA CASILLA SEGÚN CORRESPONDA

CONDICIONES GENERALES	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
	6/10/25			7/10/25			8/10/25			9/10/25			10/10/25			11/10/25		
	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A
ORUGAS TENSIONADAS Y EN BUEN ESTADO	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
LUCES FRONTALES Y TRASERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
INDICADORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
ESCALERAS Y APOYOS SEGUROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
ESPEJOS LATERALES	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
PALANCAS Y PEDALES EN BUEN ESTADO	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
PITO Y BATERIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
CONTROL DE FUGAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR ASEADO	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
ESTADO DE LAS MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
ESTADO DEL BALDE	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
CINTURON DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
BOTIQUIN	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
EXTINTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
FIRMA DIARIA OPERADOR	[signature]			[signature]			[signature]			[signature]			[signature]			[signature]		
FIRMA DIARIA SST	DAYANA C			DAYANA C			DAYANA C			DAYANA C								
OBSERVACIONES:																		
LUNES																		
MARTES																		
MIÉRCOLES																		
JUEVES																		
VIERNES																		
SÁBADO																		

[signature] NOMBRE Y FIRMA OPERARIO	DAYANA CERVANTES. NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR SST	

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ICASM2023

PRE-OPERACIONAL EXCAVADORA

FECHA: 14/10/25 - 18/20/25

NOMBRE DEL OPERADOR: HAIDER URIELES

SEMANA 3

UBICACIÓN: RIO RIECRA

NOMBRE INSPECTOR SST: Dayana Cervantes

C: CUMPLE, N/C: NO CUMPLE, N/A: NO APLICA FAVOR

MARQUE UNA X EN CADA CASILLA SEGÚN CORRESPONDA

CONDICIONES GENERALES	LUNES			MARTES 14/10/25			MIERCOLES 15/10/25			JUEVES 16/10/25			VIERNES 17/10/25			SABADO 18/10/25		
	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A
ORUGAS TENSIONADAS Y EN BUEN ESTADO				/			/			/			/			/		
LUCES FRONTALES Y TRASERAS				/			/			/			/			/		
ASIENTO EN BUEN ESTADO				/			/			/			/			/		
INDICADORES				/			/			/			/			/		
ESCALERAS Y APOYOS SEGUROS				/			/			/			/			/		
ESPEJOS LATERALES				/			/			/			/			/		
PALANCAS Y PEDALES EN BUEN ESTADO				/			/			/			/			/		
PITO Y BATERIA				/			/			/			/			/		
CONTROL DE FUGAS				/			/			/			/			/		
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR ASEADO				/			/			/			/			/		
ESTADO DE LAS MANGUERAS				/			/			/			/			/		
ESTADO DEL BALDE				/			/			/			/			/		
CINTURON DE SEGURIDAD				/			/			/			/			/		
BOTIQUIN				/			/			/			/			/		
EXTINTOR				/			/			/			/			/		
FIRMA DIARIA OPERADOR																		
FIRMA DIARIA SST	Dayana C			Dayana C			Dayana C			Dayana C			Dayana C			Dayana C		

OBSERVACIONES:
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO

NOMBRE Y FIRMA OPERARIO	NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR SST	

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ICASM2023

PRE-OPERACIONAL EXCAVADORA

FECHA: 2/10/25 - 4/10/25

NOMBRE DEL OPERADOR: OLIVER BARRIO

NOMBRE INSPECTOR SST: Dayana Cervantes

SEMANA 1

UBICACIÓN: RIO GAIRA

C: CUMPLE, N/C: NO CUMPLE, N/A: NO APLICA FAVOR

MARQUE UNA X EN CADA CASILLA SEGÚN CORRESPONDA

CONDICIONES GENERALES	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES 2/10/25			VIERNES 3/10/25			SABADO 4/10/25		
	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A
ORUGAS TENSIONADAS Y EN BUEN ESTADO										X			X			X		
LUCES FRONTALES Y TRASERAS										X			X			X		
ASIENTO EN BUEN ESTADO										X			X			X		
INDICADORES										X			X			X		
ESCALERAS Y APOYOS SEGUROS										X			X			X		
ESPEJOS LATERALES										X			X			X		
PALANCAS Y PEDALES EN BUEN ESTADO										X			X			X		
PITO Y BATERIA										X			X			X		
CONTROL DE FUGAS										X			X			X		
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR ASEADO										X			X			X		
ESTADO DE LAS MANGUERAS										X			X			X		
ESTADO DEL BALDE										X			X			X		
CINTURON DE SEGURIDAD										X			X			X		
BOTIQUIN										X			X			X		
EXTINTOR										X			X			X		
FIRMA DIARIA OPERADOR										Oliver			Oliver			Oliver		
FIRMA DIARIA SST										DAYANA C			DAYANA C			DAYANA C		
OBSERVACIONES:																		
LUNES																		
MARTES																		
MIÉRCOLES																		
JUEVES																		
VIERNES																		
SÁBADO																		

Oliver
NOMBRE Y FIRMA OPERARIO

DAYANA CERVANTES
NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR SST

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ICASM2023

PRE-OPERACIONAL EXCAVADORA

FECHA: 6/10/25 - 11/10/25

NOMBRE DEL OPERADOR: OLIVER BARRIO

SEMANA 2

NOMBRE INSPECTOR SST: Dayana Cervantes

UBICACIÓN: RIO PIEDRA

C: CUMPLE, N/C: NO CUMPLE, N/A: NO APLICA FAVOR

MARQUE UNA X EN CADA CASILLA SEGÚN CORRESPONDA

CONDICIONES GENERALES	LUNES 6/10/25			MARTES 7/10/25			MIERCOLES 8/10/25			JUEVES 9/10/25			VIERNES 10/10/25			SABADO 11/10/25		
	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A
ORUGAS TENSIONADAS Y EN BUEN ESTADO	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
LUCES FRONTALES Y TRASERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
INDICADORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
ESCALERAS Y APOYOS SEGUROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
ESPEJOS LATERALES	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
PALANCAS Y PEDALES EN BUEN ESTADO	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
PITO Y BATERIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
CONTROL DE FUGAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR ASEADO	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
ESTADO DE LAS MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
ESTADO DEL BALDE	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
CINTURON DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
BOTIQUIN	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
EXTINTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
FIRMA DIARIA OPERADOR	Oliver			Oliver			Oliver			Oliver			Oliver			Oliver		
FIRMA DIARIA SST	DAYANA C			DAYANA C			DAYANA C			DAYANA C			DAYANA C			DAYANA C		
OBSERVACIONES:																		
LUNES																		
MARTES																		
MIÉRCOLES																		
JUEVES																		
VIERNES																		
SÁBADO																		

Oliver - [signature] NOMBRE Y FIRMA OPERARIO	DAYANA CERVANTES NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR SST	

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ICA ESM 2023

PRE-OPERACIONAL EXCAVADORA

FECHA: 14/10/25 - 18/10/25

SEMANA 3

NOMBRE DEL OPERADOR: OLIVER BARRIO

UBICACIÓN: RIO PIEDRA

NOMBRE INSPECTOR SST: Dayana Cervantes

C: CUMPLE, N/C: NO CUMPLE, N/A: NO APLICA FAVOR

MARQUE UNA X EN CADA CASILLA SEGÚN CORRESPONDA

CONDICIONES GENERALES	LUNES			MARTES 14/10/25			MIERCOLES 15/10/25			JUEVES 16/10/25			VIERNES 17/10/25			SABADO 18/10/25		
	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A
ORUGAS TENSIONADAS Y EN BUEN ESTADO				✓			✓			✓			✓			✓		
LUCES FRONTALES Y TRASERAS				✓			✓			✓			✓			✓		
ASIENTO EN BUEN ESTADO				✓			✓			✓			✓			✓		
INDICADORES				✓			✓			✓			✓			✓		
ESCALERAS Y APOYOS SEGUROS				✓			✓			✓			✓			✓		
ESPEJOS LATERALES				✓			✓			✓			✓			✓		
PALANCAS Y PEDALES EN BUEN ESTADO				✓			✓			✓			✓			✓		
PITO Y BATERIA				✓			✓			✓			✓			✓		
CONTROL DE FUGAS				✓			✓			✓			✓			✓		
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR ASEADO				✓			✓			✓			✓			✓		
ESTADO DE LAS MANGUERAS				✓			✓			✓			✓			✓		
ESTADO DEL BALDE				✓			✓			✓			✓			✓		
CINTURON DE SEGURIDAD				✓			✓			✓			✓			✓		
BOTIQUIN				✓			✓			✓			✓			✓		
EXTINTOR				✓			✓			✓			✓			✓		
FIRMA DIARIA OPERADOR				Oliver			Oliver			Oliver			Oliver			Oliver		
FIRMA DIARIA SST	Dayana C			Dayana C			Dayana C			Dayana C			Dayana C			Dayana C		

OBSERVACIONES:

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

NOMBRE Y FIRMA OPERARIO	NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR SST	
Oliver		

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ICASM2023

PRE-OPERACIONAL EXCAVADORA

FECHA: 20/10/25 - 25/10/25 **SEMANA** 4

NOMBRE DEL OPERADOR: OLIVER BARRIOS **UBICACIÓN:** RIO GAIRA

NOMBRE INSPECTOR SST: Dayana Cervantes

C: CUMPLE, N/C: NO CUMPLE, N/A: NO APLICA FAVOR

MARQUE UNA X EN CADA CASILLA SEGÚN CORRESPONDA

CONDICIONES GENERALES	LUNES 20/10/25			MARTES 21/10/25			MIERCOLES 22/10/25			JUEVES 23/10/25			VIERNES 24/10/25			SABADO 25/10/25		
	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A
ORUGAS TENSIONADAS Y EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X			X		
LUCES FRONTALES Y TRASERAS	X			X			X			X			X			X		
ASIENTO EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X			X		
INDICADORES	X			X			X			X			X			X		
ESCALERAS Y APOYOS SEGUROS	X			X			X			X			X			X		
ESPEJOS LATERALES	X			X			X			X			X			X		
PALANCAS Y PEDALES EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X			X		
PITO Y BATERIA	X			X			X			X			X			X		
CONTROL DE FUGAS	X			X			X			X			X			X		
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR ASEADO	X			X			X			X			X			X		
ESTADO DE LAS MANGUERAS	X			X			X			X			X			X		
ESTADO DEL BALDE	X			X			X			X			X			X		
CINTURON DE SEGURIDAD	X			X			X			X			X			X		
BOTIQUIN	X			X			X			X			X			X		
EXTINTOR	X			X			X			X			X			X		
FIRMA DIARIA OPERADOR	Oliver			Oliver			Oliver			Oliver			Oliver			Oliver		
FIRMA DIARIA SST	DAYANA C			DAYANA C			DAYANA C			DAYANA C			DAYANA C			DAYANA C		

OBSERVACIONES:
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO

Oliver NOMBRE Y FIRMA OPERARIO	DAYANA CERVANTES. NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR SST	

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ICASM2023

PRE-OPERACIONAL EXCAVADORA

FECHA: 2/10/25 - 4/10/25

SEMANA 1

NOMBRE DEL OPERADOR: AGUSTIN ORTIZ

UBICACIÓN: RIO PIEDRA

NOMBRE INSPECTOR SST: Dayana Cervantes

C: CUMPLE, N/C: NO CUMPLE, N/A: NO APLICA FAVOR

MARQUE UNA X EN CADA CASILLA SEGÚN CORRESPONDA

CONDICIONES GENERALES	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES 2/10/25			VIERNES 3/10/25			SABADO 4/10/25		
	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A
ORUGAS TENSIONADAS Y EN BUEN ESTADO										✓			✓			✓		
LUCES FRONTALES Y TRASERAS										✓			✓			✓		
ASIENTO EN BUEN ESTADO										✓			✓			✓		
INDICADORES										✓			✓			✓		
ESCALERAS Y APOYOS SEGUROS										✓			✓			✓		
ESPEJOS LATERALES										✓			✓			✓		
PALANCAS Y PEDALES EN BUEN ESTADO										✓			✓			✓		
PITO Y BATERIA										✓			✓			✓		
CONTROL DE FUGAS										✓			✓			✓		
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR ASEADO										✓			✓			✓		
ESTADO DE LAS MANGUERAS										✓			✓			✓		
ESTADO DEL BALDE										✓			✓			✓		
CINTURON DE SEGURIDAD										✓			✓			✓		
BOTIQUIN										✓			✓			✓		
EXTINTOR										✓			✓			✓		
FIRMA DIARIA OPERADOR										X			X			X		
FIRMA DIARIA SST										DAYANA C			DAYANA C			DAYANA C		

OBSERVACIONES:

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

Agustin ortiz

NOMBRE Y FIRMA OPERARIO

DAYANA CERVANTES.

NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR SST

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ICASM2023

PRE-OPERACIONAL EXCAVADORA

FECHA: 6/10/25 - 11/10/25

SEMANA: 2

NOMBRE DEL OPERADOR: AGUSTIN ORTIZ

UBICACIÓN: RIO QUEBRA

NOMBRE INSPECTOR SST: DAYANA CERVANTES

C: CUMPLE, N/C: NO CUMPLE, N/A: NO APLICA FAVOR

MARQUE UNA X EN CADA CASILLA SEGÚN CORRESPONDA

CONDICIONES GENERALES	LUNES 6/10/25			MARTES 7/10/25			MIERCOLES 8/10/25			JUEVES 9/10/25			VIERNES 10/10/25			SABADO 11/10/25		
	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A
ORUGAS TENSIONADAS Y EN BUEN ESTADO	/			/			/			/			/			/		
LUCES FRONTALES Y TRASERAS	/			/			/			/			/			/		
ASIENTO EN BUEN ESTADO	/			/			/			/			/			/		
INDICADORES	/			/			/			/			/			/		
ESCALERAS Y APOYOS SEGUROS	/			/			/			/			/			/		
ESPEJOS LATERALES	/			/			/			/			/			/		
PALANCAS Y PEDALES EN BUEN ESTADO	/			/			/			/			/			/		
PITO Y BATERIA	/			/			/			/			/			/		
CONTROL DE FUGAS	/			/			/			/			/			/		
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR ASEADO	/			/			/			/			/			/		
ESTADO DE LAS MANGUERAS	/			/			/			/			/			/		
ESTADO DEL BALDE	/			/			/			/			/			/		
CINTURON DE SEGURIDAD	/			/			/			/			/			/		
BOTIQUIN	/			/			/			/			/			/		
EXTINTOR	/			/			/			/			/			/		
FIRMA DIARIA OPERADOR	X Agustin			X Agustin			X Agustin			X Agustin			X Agustin			X Agustin		
FIRMA DIARIA SST	DAYANA C			DAYANA C			DAYANA C			DAYANA C								

OBSERVACIONES:

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

Agustin ortiz NOMBRE Y FIRMA OPERARIO	DAYANA CERVANTES NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR SST	

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ICASM2023

PRE-OPERACIONAL EXCAVADORA

FECHA: 14/10/25 – 18/10/25

SEMANA 3

NOMBRE DEL OPERADOR: AGUSTIN ORTIZ

UBICACIÓN: RIO FIERA

NOMBRE INSPECTOR SST: Dayana Cervantes

C: CUMPLE, N/C: NO CUMPLE, N/A: NO APLICA FAVOR

MARQUE UNA X EN CADA CASILLA SEGÚN CORRESPONDA

CONDICIONES GENERALES	LUNES			MARTES 14/10/25			MIERCOLES 15/10/25			JUEVES 16/10/25			VIERNES 17/10/25			SABADO 18/10/25		
	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A
ORUGAS TENSIONADAS Y EN BUEN ESTADO				X			X			X			X			X		
LUCES FRONTALES Y TRASERAS				X			X			X			X			X		
ASIENTO EN BUEN ESTADO				X			X			X			X			X		
INDICADORES				X			X			X			X			X		
ESCALERAS Y APOYOS SEGUROS				X			X			X			X			X		
ESPEJOS LATERALES				X			X			X			X			X		
PALANCAS Y PEDALES EN BUEN ESTADO				X			X			X			X			X		
PITO Y BATERIA				X			X			X			X			X		
CONTROL DE FUGAS				X			X			X			X			X		
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR ASEADO				X			X			X			X			X		
ESTADO DE LAS MANGUERAS				X			X			X			X			X		
ESTADO DEL BALDE				X			X			X			X			X		
CINTURON DE SEGURIDAD				X			X			X			X			X		
BOTIQUIN				X			X			X			X			X		
EXTINTOR				X			X			X			X			X		
FIRMA DIARIA OPERADOR				X			X			X			X			X		
FIRMA DIARIA SST	Dayana C			Dayana C			Dayana C			Dayana C			Dayana C			Dayana C		

OBSERVACIONES:

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

Agustin Ortiz

NOMBRE Y FIRMA OPERARIO

DAYANA CERVANTES

NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR SST

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ICASM2023

PRE-OPERACIONAL EXCAVADORA

FECHA: 20/10/25 - 25/10/25

SEMANA 4

NOMBRE DEL OPERADOR: AGUSTIN ORTIZ

UBICACIÓN: RIO PIEDRA

NOMBRE INSPECTOR SST: Dayana Cervantes

C: CUMPLE, N/C: NO CUMPLE, N/A: NO APLICA FAVOR

MARQUE UNA X EN CADA CASILLA SEGÚN CORRESPONDA

CONDICIONES GENERALES	LUNES 20/10/25			MARTES 21/10/25			MIERCOLES 22/10/25			JUEVES 23/10/25			VIERNES 24/10/25			SABADO 25/10/25		
	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A
ORUGAS TENSIONADAS Y EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X			X		
LUCES FRONTALES Y TRASERAS	X			X			X			X			X			X		
ASIENTO EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X			X		
INDICADORES	X			X			X			X			X			X		
ESCALERAS Y APOYOS SEGUROS	X			X			X			X			X			X		
ESPEJOS LATERALES	X			X			X			X			X			X		
PALANCAS Y PEDALES EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X			X		
PITO Y BATERIA	X			X			X			X			X			X		
CONTROL DE FUGAS	X			X			X			X			X			X		
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR ASEADO	X			X			X			X			X			X		
ESTADO DE LAS MANGUERAS	X			X			X			X			X			X		
ESTADO DEL BALDE	X			X			X			X			X			X		
CINTURON DE SEGURIDAD	X			X			X			X			X			X		
BOTIQUIN	X			X			X			X			X			X		
EXTINTOR	X			X			X			X			X			X		
FIRMA DIARIA OPERADOR	X			X			X			X			X			X		
FIRMA DIARIA SST	Dayana C			Dayana C			Dayana C			Dayana C			Dayana C			Dayana C		

OBSERVACIONES:

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

Agustin Ortiz

NOMBRE Y FIRMA OPERARIO

DAYANA CERVANTES

NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR SST

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ICASM2023	FORMATO DE INSPECCIÓN KIT DE DERRAMES - CONSORCIO ICASM 2023	
	CÓDIGO: SST-FT-020	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: 27/10/2025	

FECHA: 27/10/2025	ACOMPAÑAMIENTO INSPECCIÓN:
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: DAYANA CERVANTES	ALVARO DE LA HOZ
CARGO: AUXILIAR SST	CARGO: INTERVENTOR

Marque con una C (cumple), NC (no cumple) o NA (No aplica)

Item	ASPECTOS A INSPECCIONAR	CANTIDAD	C / NC /NA	OBSERVACIONES
1	Barreta Absorbentes (Rollos)	1		
2	Mascara de protección respiratoria	1		
3	Paños Absorbentes	10		
4	Cordones absorventes	3		
5	Botas con punta de acero	1		
6	Gafas de seguridad	1		
7	Pala antichispa	1		
8	Guantes de nitrilo	1		
9	Susrabcia absorvente particulado no reactivo	1		
10	Martillo antichispa	1		
11	Soga	1		
12	Cinta Señalización	1		
13	Desengrasante	1		
14	Bolsa para Residuos (rojas)	10		
15	Maletin o Contenedor (Protege los Elementos del Kit)	1		

FIRMA

Dayana C.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO
ICASM2023

ANEXO No. 11

INFORME COMPONENTE SOCIAL

Dirección: Calle 24 No 2-66 Ed. Cámara de Comercio, Santa Marta
Email: consorcioicasm@gmail.com

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG

CONTRATO DE OBRA No. LP 006 de 2023

OBJETO: "INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES".

CONTRATISTA
CONSORCIO ICASM2023
NIT. 901.782.970-2

INFORME DE SEGUIMIENTO SOCIAL

DEL 01 DE OCTUBRE HASTA EL 31 OCTUBRE DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 4
2.1 Localización general del cuerpo de agua a intervenido 5
3. IDENTIFICACIÓN DE CONTROL DE RIESGO 6
4. DIRECTORIO DE ACTORES 7
5. COMUNICACIÓN, DIVULGACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 8
5.1 Piezas de divulgación
5.2 Valla informativa del proyecto
5.3 Reuniones de participación 9
6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 18
7. INVENTARIO DE ACTAS DE VECINDAD 18
8. PQRS 19
9. CAPACIDAD DE MANO DE OBRA LOCAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 19

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo dar a conocer las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre el 01 y el 31 de octubre de 2025, en el marco del Proyecto “Intervenciones a los cuerpos de agua del Distrito de Santa Marta para el mantenimiento y preservación de sus condiciones hidráulicas y ambientales”.

En este lapso, se llevaron a cabo acciones contempladas dentro del componente social, las cuales resultan esenciales para acompañar y orientar a la comunidad frente a las intervenciones realizadas. Estas actividades buscan mitigar los impactos sociales que pudieran surgir, garantizando al mismo tiempo la integración y participación de la comunidad aledaña al área de influencia.

De esta forma, se fomenta una relación cercana entre el proyecto y la comunidad, fortaleciendo la confianza, la comunicación y la sensibilización en torno a la preservación de los cuerpos de agua y la importancia de su cuidado ambiental.

Finalmente, se presentan a continuación las actividades ejecutadas durante este período, junto con los avances obtenidos, en el marco del proceso de seguimiento y cumplimiento de los objetivos establecidos.

2. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Localización general

DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA.

El Distrito de Santa Marta está conformado por un mar territorial, un área montañosa correspondiente a la Sierra Nevada, cuerpos de agua interiores, las islas y bahías localizadas en el mar territorial y en los cuerpos de agua, el suelo consolidado constituido por una zona costera y una zona continental, el suelo no consolidado constituido por la zona de Bajamar, el subsuelo y el espacio aéreo asociado.

Santa Marta, se encuentra a orillas de la bahía del mismo nombre sobre el Mar Caribe, en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta en el departamento del Magdalena. Sus coordenadas geográficas son: 11º 14’ 50” de latitud norte y 74º 12’ 06” de latitud oeste.

El municipio se encuentra limitado por el Norte y el Oeste con el Mar Caribe, al sur con los municipios de Ciénaga y Aracataca y por el oriente los departamentos de la Guajira y Cesar.

La altura promedio de la ciudad es de 2 msnm, pero con una diferencia de altura que va, en el territorio del municipio, desde el nivel del mar hasta los 5.775 msnm en el Pico Cristóbal Colón, que es el más elevado de toda Colombia ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Ilustración 1 Localización general Santa Marta D.T.C.H.



Fuente: Adaptado de Google Maps

2.1 Localización general del cuerpo de agua a intervenido

RÍO PIEDRAS.

La cuenca del río Piedras se encuentra en el departamento del Magdalena, sobre la vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta. Sus límites geográficos están definidos de la siguiente manera: al norte, con pequeñas cuencas del Parque Tayrona, que descargan directamente al mar Caribe; al este, con la cuenca del río Mendihuaca y el mar Caribe; al sur, con las cuencas de los ríos Guachaca y Gaira; y al oeste, con la cuenca del río Manzanares.

El cauce principal corresponde al río Piedras, con una longitud aproximada de 32,81 km. Su nacimiento se localiza en la parte alta de la vertiente norte de la Cuchilla de San Lorenzo, entre el Cerro El Guaco y la Cuchilla Piedras Blancas, en un entorno montañoso con relieve de filas y vigas, a una altitud cercana a los 2.400 msnm. Desde allí, inicia encauzando las aguas de las quebradas Sirena, Alicia, Villanueva, Loma Fresca y Palacios. Tras un recorrido de unos 14 km, se conecta con la Quebrada La Lisa, y posteriormente recoge los aportes hídricos de la Quebrada Jordán, Constante, Paloquemao, Manzanares y La Cruz, hasta finalmente desembocar en el mar Caribe, en la zona costera al este de Punta Castillete, cerca de la Playa Los Naranjos, en límites con el Parque Nacional Natural Tayrona, dentro del corregimiento de Guachaca, jurisdicción del municipio de Santa Marta. Esta área forma parte de la Microcuenca Hidrográfica del Caribe de la Sierra Nevada de Santa Marta.

La cuenca se integra a la ecorregión Sierra Nevada de Santa Marta y a su Macrocuenca del Caribe; en su parte baja pertenece además a la ecorregión Sistema Costero, dos de las cinco ecorregiones definidas por la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG) para el territorio departamental. Su superficie es de aproximadamente 161,22 km², y se encuentra dentro del área municipal del Distrito de Santa Marta. En su territorio se localizan diversos asentamientos humanos, entre los que destacan: San Martín, El Recreo, San Isidro, Los Remedios, La Estrella, La Esmeralda, La Revuelta, El Trompito, Las Piedras y Los Naranjos, entre otros.

Registros fotográficos del cuerpo de agua Rio Piedras





3. IDENTIFICACIÓN DE CONTROL DE RIESGO

La identificación de los riesgos de tipo socioeconómico, cultural y ambiental asociados a las actividades de dragado constituye un paso esencial para reconocer de manera temprana los impactos que puedan generarse, ya sean positivos o negativos, y su efecto directo en las comunidades. Este ejercicio no solo facilita la anticipación de problemáticas, sino que también promueve el diálogo y la participación de la población en el proceso, fortaleciendo la confianza y la apropiación del proyecto. De esta forma, se contribuye a garantizar que las intervenciones no afecten la calidad de vida de los habitantes del área de influencia y que, por el contrario, aporten al desarrollo integral y a la sostenibilidad de la región.

RIESGO	EVENTO	NIVEL DE IMPACTO
1	Conflictos con comunidades conflictivas o que muestren desinterés por el proyecto y entidades ubicadas en el área conflictivas – No dejan realizar actividades.	Muy Alto – Negativo
2	Presencia y/o aumento de reasentamientos.	Muy Alto – Negativo
3	Atención de PQRSF por impactos generados de las actividades de dragado por parte de la comunidad y/o partes interesadas.	Muy Alto – Negativo
4	Contratación de Mano de Obra Local	Muy Alto – Positivo
5	Cambios en las rutas de tránsito de embarcaciones menores que transitan realizando su faena de pesca.	Muy Alto – Negativo
6	Afectación en caminos o vías destapadas por el paso de los equipos transportadores.	Muy Alto – Negativo
7	Ubicación y/o tránsito de equipos en áreas donde afecten cultivos.	Muy Alto – Negativo

Tabla 1. Identificación de los Impactos Sociales

4. DIRECTORIO DE ACTORES

El directorio de actores constituye una herramienta fundamental dentro del proyecto, ya que permite recopilar y organizar información clave como datos personales, contactos y ubicación de cada uno de los actores o partes interesadas. Este insumo es verificado y actualizado de manera periódica durante la ejecución del Proyecto "Intervenciones a los cuerpos de agua del Distrito de Santa Marta para el mantenimiento y preservación de sus condiciones hidráulicas y ambientales", en el marco del Contrato No. LP-006-2023, garantizando así la pertinencia y confiabilidad de la información registrada.

No	Nombre Completo	Cargo	Dependencia/Entidad	Teléfono	Correo electrónico	Dirección
1	Baudilio Valencia Roa	Presidente	Asociación de Lideres Comunales del corregimiento de Guachaca - Asocomunales	313 238 2185	mesatroncal@gmail.com	Kra 7 No. 6-59 Vereda Buriticá
2	Maribel Quintana Carpintero	Presidenta	JAC Los Naranjos	310 730 9535	maribelquintanacarpintero@gmail.com	Km 32 Cll 2 No. 5 – 88 Vereda Los Naranjos
3	Victor Pava Senia Abello Arambula	Rector Docente lider	Centro educativo distrital e intercultural Orinoco	300 515 9179	rectoría@cedorinoco.edu.co cedorinoco@gmail.com	Km 34 Frente a la Finca Recoveco Vereda Los Naranjos
4	Diego Bustamante Padilla	Coordinador Proyectos ANADARKO	Fundación ACDIVOCA LA		Dbustamante@acdivoca-la.org	Vereda Los Naranjos

5. COMUNICACIÓN, DIVULGACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

Se desarrollan actividades orientadas a fomentar una interacción continua y permanente con las comunidades del área de influencia del proyecto, actuando como un enlace directo con ellas. Estas acciones no solo buscan brindar información oportuna, sino también promover su vinculación activa en los procesos de acompañamiento y participación social. De igual manera, permiten atender y dar respuesta a las inquietudes que puedan surgir a partir de las intervenciones realizadas en el marco del presente proyecto.

5.1 Piezas de divulgación

Dentro del P.A.C se dispondrá un punto de fácil acceso y visibilidad destinado a la instalación de una cartelera informativa. En ella se divulgarán los aspectos más relevantes del proyecto, tales como avances de obra, notas de interés, mecanismos de recepción de PQRSF y cualquier otra información considerada pertinente para la comunidad. El contenido de esta cartelera deberá ser actualizado de manera semanal, garantizando así información oportuna y veraz

5.2 Valla informativa del proyecto:

Se llevará a cabo la instalación de una valla institucional con la información esencial del contrato, incluyendo: objeto y número del contrato, nombre del contratista, entidad interventora y plazo de ejecución.

Esta pieza busca asegurar la visibilidad y transparencia de las acciones adelantadas en el marco del proyecto.

5.3 Reuniones de participación:

- El día 01 de octubre, se realiza acompañamiento social a las actividades de la jornada de educación ambiental con los estudiantes del Centro Educativo Orinoco, en compañía de la profesional de la interventoría. Esta implementación se logra a través de la articulación social del proyecto, cuyo propósito es vincular a la comunidad educativa del área de influencia a jornadas de sensibilización y participación ambiental frente a acciones que promuevan la protección del recurso hídrico.




- El día 03 de octubre se articula con la presidenta de la JAC de la vereda Los Naranjos a fin de gestionar los espacios para la instalación de la valla informativa del proyecto. Asimismo, se realiza acompañamiento social a las actividades de la jornada de educación ambiental con la comunidad del sector Milagro 2, en compañía de la profesional de la interventoría. Esta implementación se logra a través de la articulación social del proyecto, cuyo propósito es vincular a la comunidad educativa del área de influencia Quebrada Bureche a jornadas de sensibilización y participación ambiental frente a acciones que promuevan la protección del recurso hídrico.






- El día 04 y 07 de octubre se retoma el levantamiento de actas de vecindad en los predios ubicados en el margen derecho del área de influencia Río Piedras, en compañía de la profesional de la interventoría.



- El día 06 de octubre se realiza acompañamiento social a las actividades de la jornada de educación ambiental con la comunidad de la vereda Los Naranjos, en compañía de la profesional de la interventoría. Esta implementación se logra a través de la articulación social del proyecto, cuyo propósito es vincular a la comunidad del área de influencia Río Piedras a jornadas de sensibilización y

participación ambiental frente a acciones que promuevan la protección del recurso hídrico





- El día 09 de octubre se realiza atención comunitaria a la petición de materiales por parte de la presidenta de la JAC Los Naranjos para el apoyo de las obras de construcción del salón comunal de esta comunidad en el marco de la ejecución del proyecto en la actual vigencia, en compañía de la profesional de la interventoría.



- El día 10 de octubre se lleva a cabo socialización del proyecto con los propietarios y/o encargados de los predios ubicados en el marguen izquierdo de Rio Piedras, en compañía de la presidenta de la JAC Los Naranjos Maribel Quintana, un representante del líder de la comunidad de Zaino y la profesional de la interventoría. Asimismo, se realiza acompañamiento social a las actividades de la jornada de educación ambiental con la comunidad del sector de Manzanares, se reporta novedad por lluvias en la zona por lo cual se procede a reprogramar la jornada, en compañía de la profesional de la interventoría. Esta implementación se logra a través de la articulación social del proyecto, cuyo propósito es vincular a la comunidad del área de influencia Río Manzanares a jornadas de sensibilización y participación ambiental frente a acciones que promuevan la protección del recurso hídrico.









- El día 14 de octubre se realiza gestión de espacios para la instalación de valla informativa del proyecto en el predio de la finca San José km 32 vereda Los Naranjos, área de influencia Río Piedras.




- El día 15 de octubre se realiza acompañamiento social a las actividades de la jornada de educación ambiental con la comunidad educativa de la I.E.D. Quinto Centenario, en compañía de la profesional de la interventoría. Esta implementación se logra a través de la articulación social del proyecto, cuyo propósito es vincular a la comunidad del área de influencia Quebrada Bureche a jornadas de sensibilización y participación ambiental frente a acciones que promuevan la protección del recurso hídrico.




- El día 16 de octubre se realiza atención comunitaria a representante de Parques Nacionales Naturales sobre avances del proyecto, en compañía del profesional ambiental de obra y la profesional ambiental de la interventoría. Asimismo, se hace acompañamiento social a las actividades de la jornada de educación ambiental con los estudiantes del Centro Educativo Orinoco, en compañía de la profesional de la interventoría.







- El día 17 de octubre se realiza atención comunitaria en obra a la presidenta de la JAC de la vereda los Naranjos, área de influencia Rio Piedras, y atención de PQRS a la presidenta de la JAC de Manzanares, área de influencia Rio Manzanares. Posteriormente, se hace acompañamiento social a las actividades de la jornada de educación ambiental con la comunidad del sector Milagro 2, en compañía de la profesional de la interventoría.








- El día 22 de octubre se lleva a cabo en las instalaciones de CORMAG la socialización del proyecto vigencia Ro Piedras a la Junta de Acción Comunal del sector Zaino. Por otro lado, se realiza atención comunitaria y convocatoria a los habitantes, en compañía de la presidenta de la JAC del sector de Manzanares, con el propósito de promover la participación y, de esta forma, continuar con las actividades de la jornada de educación ambiental en esta comunidad.




- El 23 de octubre se realiza se realiza atención comunitaria en área de influencia Rio Piedras, en compañía de la presidenta de la JAC de los Naranjos. Y acompañamiento social a las actividades de la jornada de educación ambiental con la comunidad del sector de Manzanares, en compañía de la profesional de la interventoría.





- El día 24 de octubre se realiza acompañamiento social a las actividades de la jornada de educación ambiental con la comunidad educativa de la I.E.D. Liceo del Sur sede 3 Camilo Torres en el sector San Pablo, en compañía de la profesional de la interventoría. Esta implementación se logra a través de la articulación social del proyecto, cuyo propósito es vincular a la comunidad del área de influencia Río Manzanares a jornadas de sensibilización y participación ambiental frente a acciones que promuevan la protección del recurso hídrico.





- El 28 de octubre se realiza acompañamiento social a las actividades de la jornada de educación ambiental con comunidad estudiantil del Centro Educativo Orinoco, en compañía de la profesional de la interventoría. Esta implementación se logra a través de la articulación social del proyecto, cuyo propósito es vincular a la comunidad educativa del área de influencia Río Piedras a jornadas de sensibilización y participación ambiental frente a acciones que promuevan la protección del recurso hídrico.





- El 29 de octubre se realiza acompañamiento social a las actividades de la jornada de educación ambiental con la comunidad educativa de la I.E.D. Quinto Centenario, en compañía de la profesional de la interventoría. Esta implementación se logra a través de la articulación social del proyecto, cuyo propósito es vincular a la comunidad del área de influencia Quebrada Bureche a jornadas de sensibilización y participación ambiental frente a acciones que promuevan la protección del recurso hídrico.





- El día 31 de octubre se realiza acompañamiento social a las actividades de la jornada de educación ambiental y, asimismo, se lleva a cabo la celebración del día de la niñez con las familias participantes de la comunidad del sector Milagro 2, en compañía de la profesional de la interventoría. Esta implementación se logra a través de la articulación social del proyecto, cuyo propósito es vincular a la comunidad educativa del área de influencia Quebrada Bureche a jornadas de sensibilización y participación ambiental frente a acciones que promuevan la protección del recurso hídrico.





6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Durante este periodo se elaboraron y entregaron a la interventoría los informes diarios y el cronograma de actividades, dando cumplimiento a lo establecido en el contrato. Asimismo, la profesional social de interventoría brindó acompañamiento permanente en el desarrollo de las actividades sociales realizadas.

De acuerdo con los términos de referencia, y en concordancia con el cronograma y el avance del proyecto, se contempla la entrega de informes de avance de la gestión social, así como la notificación de las novedades que se presenten en el proceso.

7. INVENTARIO DE ACTAS DE VECINDAD

ACTAS DE VECINDAD MES DE OCTUBRE

No.	PROPIETARIO/ENCARGADO	DIRECCIÓN DEL PREDIO	TIPO DE PREDIO
1	Silena Montenegro	Vereda Los Naranjos Km 32	Vivienda
2	Carlos Mejía	Casa Kunawa - Vereda Los Naranjos Km 32	Casa Finca
3	Brayan Meneses	Vereda Los Naranjos Km 32	Vivienda
4	Victor Cuervo	San Martin - Vereda Los Naranjos Km 32	Casa Finca
5	Saul Arias	No quería pero me toco - Los Naranjos Km 32	Vivienda
6			

8. PQRS

Se recepciona un PQRS a la presidenta de la Junta de Acción Comunal del sector Manzanares y del rector del Centro Educativo Orinoco de la Vereda Los Cocos. Al cierre del presente período de informe se reciben dos (2) documentos debidamente diligenciados, motivo por el cual se anexan al presente informe.

9. CAPACIDAD DE MANO DE OBRA LOCAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Para este período se tuvo en cuenta la contratación de mano de obra local calificada y no calificada que cumpla con los requisitos técnicos establecidos por el proyecto, así como los servicios locales que se requieran. A la fecha se cuenta con cinco (5) personas contratadas para los siguientes cargos:

CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL

No.	NOMBRE	CARGO	RESIDENCIA
1	LUISA FERNANDA CAMACHO ARCILA	TRABAJADOR SOCIAL	CASA 12ª – 30 PUERTO NUEVO, GUACHACA
2	NESTOR TOMAS HERRERA MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA	CALLE 1 No. 6 - 46 VEREDA LOS NARANJOS
3	JAVIER ALFONSO HERRERA MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA	VEREDA LOS NARANJOS No. 03 - 106
4	CARLOS ALBERTO DONATO BAYONA	AYUDANTE DE OBRA	TRONCAL DEL CARIBE KM 32 VEREDA LOS NARANJOS
5	YEISON JAVIER HERRERA PATERNINA	AYUDANTE DE OBRA	KM 32 VEREDA LOS NARANJOS
6			

CONSORCIO ICASM2023

FORMATO
Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencia (PQRS)

CÓDIGO: FPQRS_001
VERSIÓN: 001
FECHA: 25-06-2024

Fecha de recepción	29	10	2025
	Día	Mes	Año

No. Solicitud

Datos del solicitante			
Nombre completo:	Víctor Hugo Pava Vega		
Cedula:	85.468.735	Teléfono:	3005159179.
Dirección de correspondencia:			
Correo Electrónico:	rectoria@ceslosinoco.edu.co		

¿Desea recibir respuesta por correo electrónico o en la dirección de correspondencia?
(Marque con una X)

Dirección de correspondencia		Correo electrónico	X.

Tipo de solicitud (Marque con una X)							
Petición	X	Queja		Reclamo		Sugerencia	
Hacía quien realiza el PQRS:							

Asunto	Solicitud de arena para Construcción.

Detalle
(En el siguiente espacio realice la descripción detallada de su petición, queja, reclamo y/o sugerencia)

- 20 mts de arena. / para el relleno y Construcción de plantilla

Anexos				
¿Anexa algún soporte? (Marque con una X)	Si		No	X
Mencione el tipo de anexo o soporte:				

FIRMA
C.C. 85.468.735.

Powered by CamScanner

CONSORCIO ICASM2023

FORMATO
Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencia (PQRS)

CÓDIGO: FPQRS_001
VERSIÓN: 001
FECHA: 25-06-2024

Fecha de recepción	23	10	2.025
	Día	Mes	Año

No. Solicitud:

Datos del solicitante			
Nombre completo:	J.A.C MANZANARES (DOMINGA SAN JUAN P.		
Cedula:	36.533.634	Teléfono:	
Dirección de correspondencia:	CL 30A Nº 48-59 APTO 2		
Correo Electrónico:	GUILLERMOLOPEZ2525 @HOTMAIL.COM		
¿Desea recibir respuesta por correo electrónico o en la dirección de correspondencia? (Marque con una X)			
Dirección de correspondencia	X	Correo electrónico	X

Tipo de solicitud (Marque con una X)							
Petición	X	Queja		Reclamo		Sugerencia	
Hacía quien realiza el PQRS:	ICASM 2023						

Asunto	MATERIALES DE CONSTRUCCION – SEDE COMUNAL MANZAN
Detalle (En el siguiente espacio realice la descripción detallada de su petición, queja, reclamo y/o sugerencia)	
HEMOS REQUERIDO UNA PETICION PARA LA REPA	
RACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE COMUNAL	
SEGUN CHARLAS SOSTENIDAS CON EL GRUPO VIGIA DEL	
RIO.	
* 10 BARILLAS DE MEDIA	
2 KILO DE SALDADURA	
15 PARAGNAS. (SOPORTES PARA SOPORTAR ETERNIT	
* 5 LISTONES DE 8 CMTS X 8 CMTS DE 5 DE LARGO	
LAMINAS DE ICOPOR PARA UN PREDIO DE 11.0X7.15	
8 ROLLOS DE CINTA ASFALTICA. ARENTAL SEDE 78.66 METRO	
2 GALONES DE ALUMOL	


Anexos				
¿Anexa algún soporte? (Marque con una X)	Si	X	No	
Mencione el tipo de anexo o soporte:	COTIZACION - PLANO EDIFICACION			

FIRMA
CC 36.533.634 STA MTA

Powered by CamScanner

COTIZACIÓN IMPERMEABILIZACIÓN TECHO

- 8 Rollos de tela asfáltica

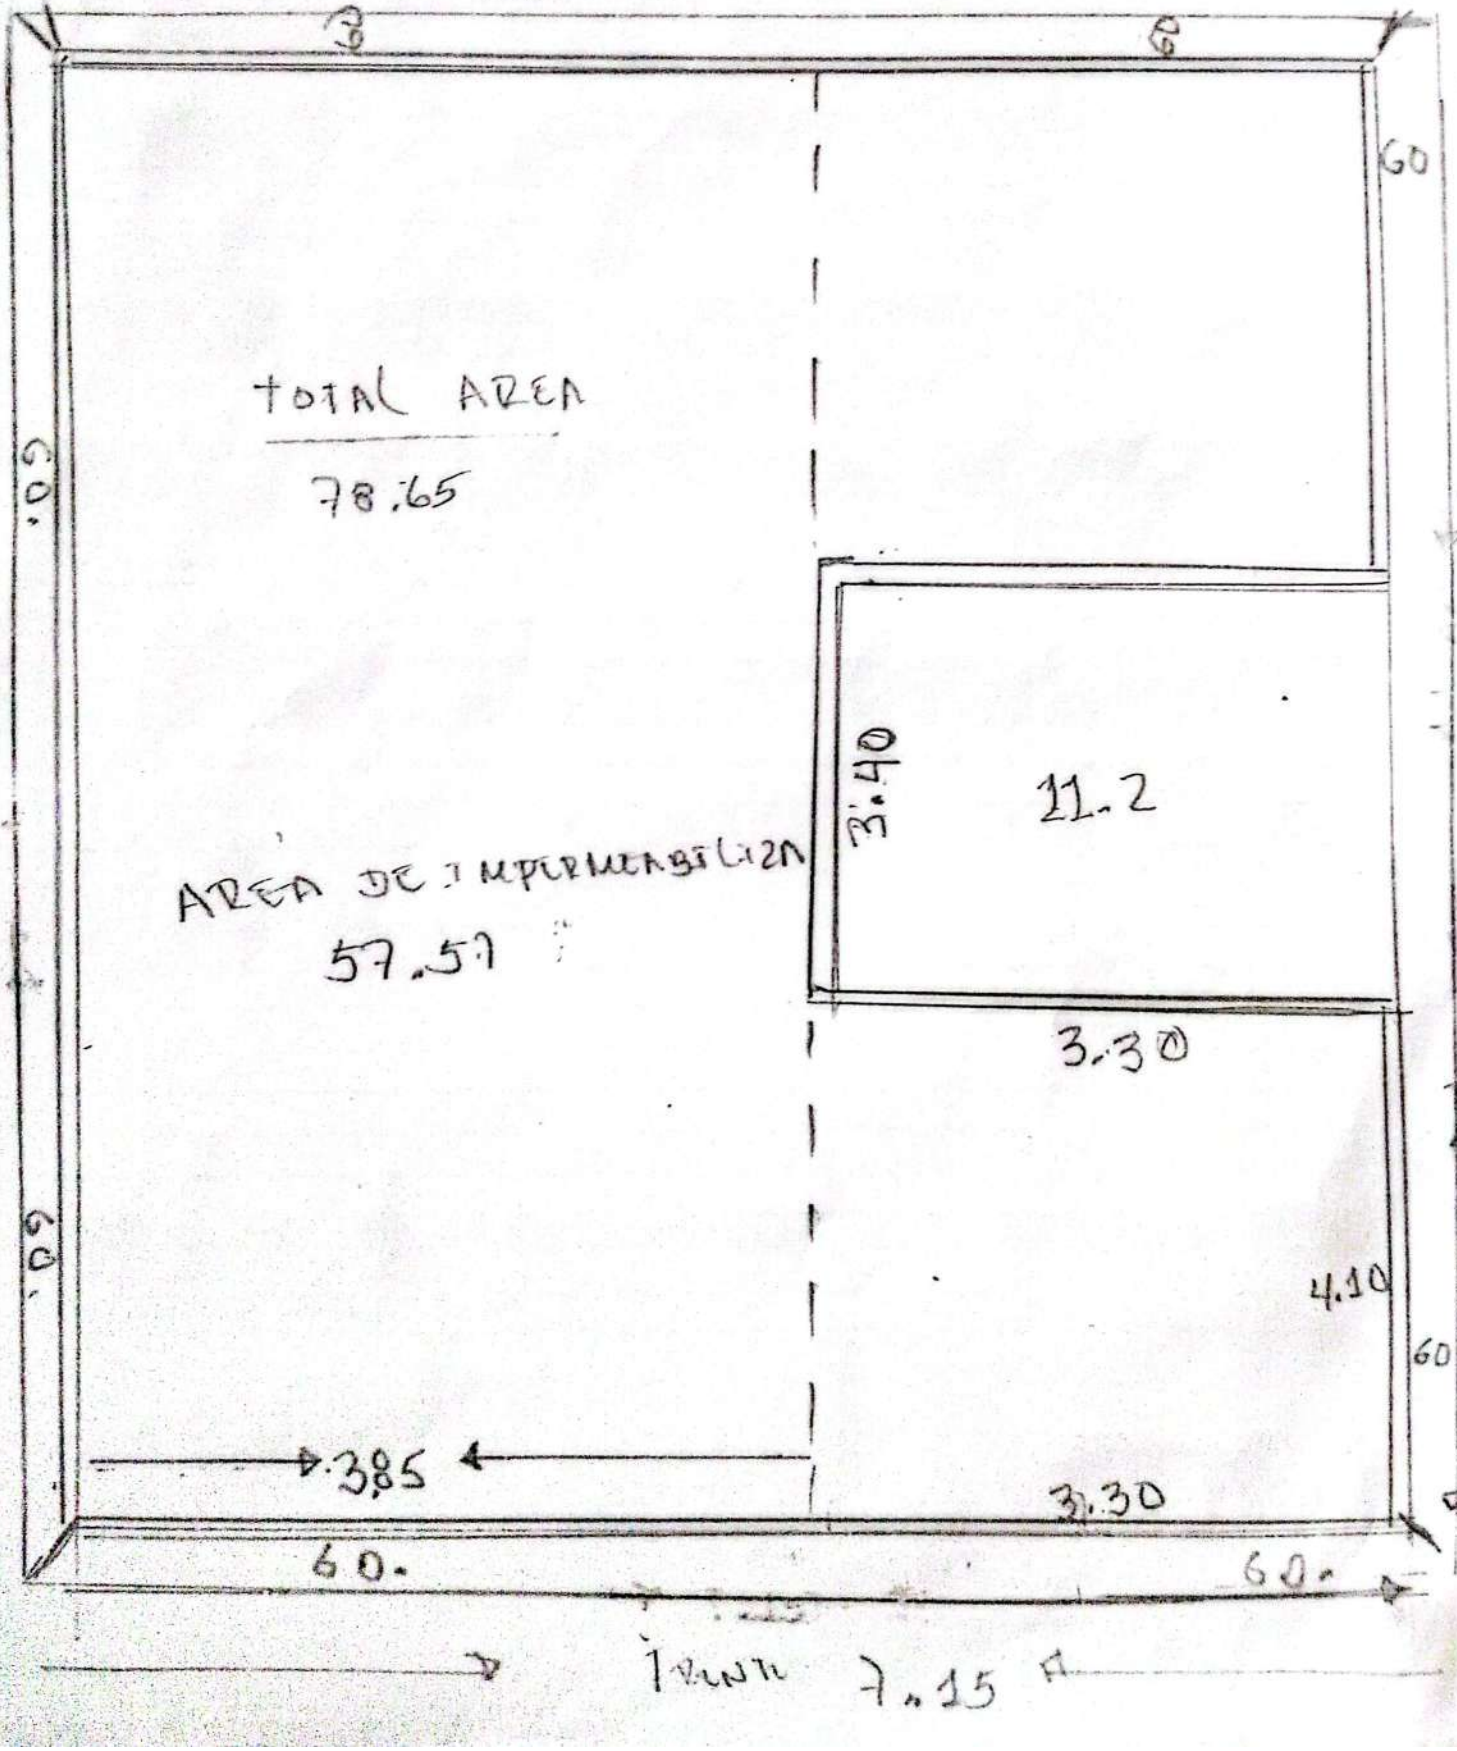

ANEXO No. 12

INFORME DE MANEJO DE FAUNA SILVETSRE

Dirección: Calle 24 No 2-66 Ed. Cámara de Comercio, Santa Marta
Email: consorcioicasm@gmail.com

INFORME DE MANEJO DE FAUNA SILVESTRE ASOCIADO A LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL CONSORCIO ICASM2023

INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES

Periodo: octubre

Vigencia 2025

RÍO PIEDRAS

Profesional responsable del componente	Biólogo, Esp. Gestión Ambiental	Firma
	Andrés Felipe Pontón Albor TP: 1083003795. Res. 3 del 03/05/2022 CPB	

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. LOCALIZACIÓN 4
3. GRUPO DE RESCATE DE FAUNA SILVESTRE 5
4. MONITOREO DE FAUNA SILVESTRE 6
4.1. Mastofauna 7
4.1.1. Resultados 9
5. RUTA METODOLÓGICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO. 12
5.1. Ahuyentamiento 12
5.2. Rescate en caliente 13
5.3. Desplazamiento y contención temporal en el Centro de Recepción Provisional 13
5.4. Valoración 13
5.5. Liberación. 13
5.7. Centro de Recepción Provisional de Fauna Silvestre 14
5.8. MATERIALES DE MANEJO DE FAUNA *in situ.* 14
6. Resultados 16
6.1. Ahuyentamiento 16
6.2. Rescate en caliente 17
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 19
8. ANEXOS 20
8.1. Historias clínicas registradas durante el periodo octubre, 2025. 20
8.2. Registro de datos biométricos tomados durante el periodo octubre, 2025. 21

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Ubicación del trazado del proyecto con relación a la ciudad de Santa Marta. Fuente: Consorcio ICASM2023, 2025. 5

Ilustración 2. Equipo fauna instalando hogar de paso para el mes de octubre en frente de obra de río Piedras. 6

Ilustración 3. Ubicación de las cámaras trampas instaladas durante el periodo octubre de la vigencia 2025. 8

Ilustración 4. Retiro de cámara trampa finalizado el periodo octubre 8

Ilustración 5. Patrón general de la actividad diaria registrada en cámaras trampa en el río Piedras durante el periodo octubre. 9

Ilustración 6. Curvas de actividad por especies encontradas en el periodo octubre en el río Piedras. 11

Ilustración 7. Registros de cámaras trampa durante el periodo octubre: De izquierda a derecha en su orden aparecen: *Mazama sanctaemarte, corzuela de Santa Marta; Cerdocyon thous, zorro perro; Hydrochoerus isthmius,* ponche; *Procyon cancrivorus,* mapache cangrejero; *Cuniculus paca,* guartinaja; *Leopardus tigrinus,* oncilla; *Leopardus pardalis, ocelote* y *Crax alberti,* paujil de pico azul. 12

Ilustración 8. Jornada de ahuyentamiento previo a la intervención de playa del río Piedras destinada para el relleno de los geocontenedores. 16

Ilustración 9. Proporción de especies ahuyentadas en un día de trabajo en el frente de obra de río Piedras. 17

Ilustración 10. Procedimiento durante el rescate en caliente de un ejemplar de babilla en el frente de obra de río Piedras. 18

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al reporte de las actividades relacionadas al periodo octubre, que va desde el día 1 al 31, del año 2025. Se relacionan las actividades de monitoreo de fauna silvestre con el fin de analizar los impactos generados, previo a las actividades de intervención. Las metodologías reportadas fueron aplicadas en área de influencia directa e indirecta del Río Piedras, cumpliendo el requisito de las actividades complementarias relacionadas al proyecto "INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES", establecidas por el protocolo de manejo de fauna de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG.

2. LOCALIZACIÓN

La cuenca del Río Piedras se localiza en el Departamento del Magdalena en la vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, en su flanco norte, entre las coordenadas 1'724.000N, 1'000.000E y 1'743.248N, 102.1374E. La cuenca limita por el norte con la cuenca de pequeños cauces del Parque Tayrona, que vierte sus aguas al mar Caribe; por el este con la cuenca del río Mendihuaca y el mar Caribe, por el sur con las cuencas de los ríos Guachaca y Gaira y por el Oeste con la cuenca del río Manzanares.

El cauce principal de la cuenca es el río Piedras que tiene una longitud aproximada de 32,81 Km, nace al norte en la parte alta de la vertiente al norte de la Cuchilla de San Lorenzo, entre el Cerro El Guaco y la Cuchilla Piedras Blancas en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, en un paisaje de montaña con un relieve de filas y vigas a una elevación aproximada de 2.400 msnm, y desemboca en el mar Caribe en la línea costera al este de Punta Castillete cerca al sitio Los Naranjos en el municipio de Santa Marta; el área hace parte de la Macrocuenca Hidrográfica del Caribe de la Sierra Nevada de Santa Marta (Tomado de documento de Fase de Aprestamiento – POMCA Río Piedras, Manzanares y otros directos al Caribe).

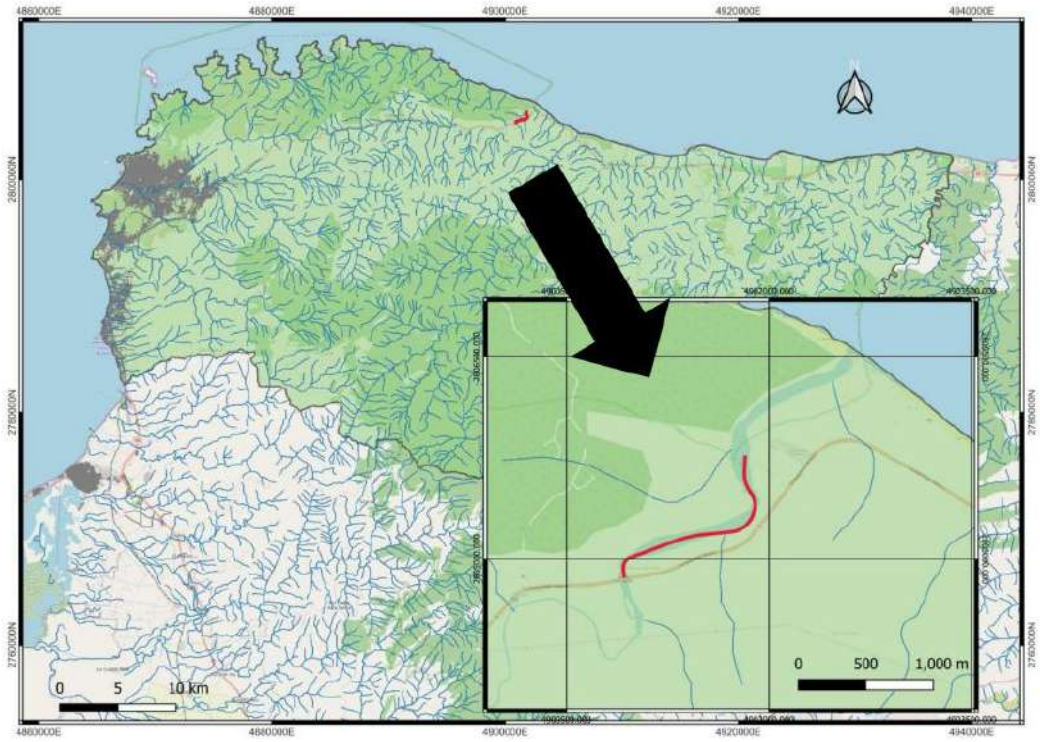


Ilustración 1. Ubicación del trazado del proyecto con relación a la ciudad de Santa Marta. Fuente: Consorcio ICASM2023, 2025.

3. GRUPO DE RESCATE DE FAUNA SILVESTRE

El grupo de rescate de fauna silvestre del proyecto estuvo conformado durante el periodo octubre por dos biólogos con experiencia en manejo de fauna silvestre, con una dedicación del 100%; un veterinario con experiencia en la atención de especies exóticas con dedicación del 100% y cuatro auxiliares de campo.



Ilustración 2. Equipo fauna instalando hogar de paso para el mes de octubre en frente de obra de río Piedras.

4. MONITOREO DE FAUNA SILVESTRE

El monitoreo de fauna silvestre previo a las actividades de remoción mecánica de sedimentos en la parte baja del río Piedras, zona de influencia directa del Parque Nacional Natural Tayrona, constituye una medida preventiva de gestión ambiental orientada a la identificación, caracterización y evaluación del componente faunístico presente en el área de intervención.

Este proceso tiene como finalidad establecer una línea base biológica actualizada que permita determinar la distribución, abundancia relativa y uso de hábitat de las especies de fauna —particularmente aves, mamíferos, reptiles y anfibios— potencialmente afectadas por las actividades operativas. A partir de esta información, se formulan acciones de manejo, rescate y reubicación, así como recomendaciones técnicas que aseguren la minimización de impactos directos e indirectos sobre la biodiversidad local.

El monitoreo, además, facilita la toma de decisiones informadas en la fase de planeación y ejecución del proyecto, garantizando la conformidad con los lineamientos establecidos por la autoridad ambiental competente y las disposiciones

de conservación derivadas del régimen especial de manejo del Parque Nacional Natural Tayrona. En este sentido, se constituye en una herramienta esencial para la gestión ambiental preventiva, asegurando la compatibilidad de las obras con la preservación de la integridad ecológica del ecosistema ribereño y su conectividad biológica regional.

Para realizar el inventario de fauna, se realizó un análisis a partir de la identidad de las especies (Riqueza) y sus abundancias (Número de individuos) con el fin de analizar diferentes índices de diversidad en el área de estudio y los grupos biológicos de interés detectados en los muestreos dentro de zonas con mayor potencial, zonas de posibles corredores o con disponibilidad de alimento asociadas al Río Piedras. De esta forma se obtuvo la información necesaria la cual representa una línea base para poder comprar posibles impactos futuros que puedan llegar a alterar las zonas monitoreadas.

4.1. Mastofauna

Para el registro de los mamíferos se realizaron observaciones directas y se llevó a cabo una búsqueda intensiva en los puntos de monitoreo. Una vez avistado un individuo, se procedió a tomar el registro fotográfico, el nombre de la especie y el método de detección empleado (directo, auditivo, huellas, heces u olfativo) (Cañon & Trujillo, 2014).

Asimismo, se instalaron 5 cámaras trampa en puntos previamente seleccionados dentro del área de estudio para registrar la presencia y los patrones de actividad de la fauna silvestre durante un periodo continuo de 30 días. Cada dispositivo se colocó a una altura óptima (30–50 cm) y con el ángulo adecuado para capturar especies terrestres de tamaño mediano a grande, orientándose hacia senderos de fauna, fuentes de agua o zonas con indicios de actividad animal.

Las cámaras se programaron para operar las 24 horas, con sensores de movimiento activados para la captura de fotografías o videos. Las observaciones fueron realizadas en la margen izquierda y derecha del río, hacia las zonas con menor asentamiento y mayor cobertura forestal que pudieran ser afectadas de forma indirecta o directa por factores como ruido, vibraciones o disminución de la calidad

del aire generados por los impactos de la obra. Esto con el fin de establecer las horas de mayor actividad de fauna presente el área y establecer rutas de manejo en caso de hallazgos ante los posibles organismos encontrados.



Ilustración 3. Ubicación de las cámaras trampas instaladas durante el periodo octubre de la vigencia 2025.



Ilustración 4. Retiro de cámara trampa finalizado el periodo octubre

4.1.1. Resultados

Se obtuvo un total de 208 registros positivos distribuidos entre las 5 locaciones trampa, bajo una intensidad de muestreo de 155 noches trampas, las cuales so obtienen de multiplicar cada cámara por día de muestreo obtenido. Las locaciones 4 y 5 mostraron una menor actividad, teniendo nulos registros de la locación 4. La cámara uno estuvo ubicada a 700 metros de la actividad generada por la obra, la cual intervino la playa del río ubicada en medio (ilustración 3) correspondiente a los geocontenedores.

Los registros obtenidos fueron depurados en Excel y analizados en Rstudio, utilizando los paquetes “lubridate” y “circular”, graficando los resultados por medio del paquete de “ggplot”. De acuerdo con ello, se obtuvo un patrón bimodal en el registro de actividad, ilustración 5, con dos picos de actividad entre las 6 y las 16 horas.


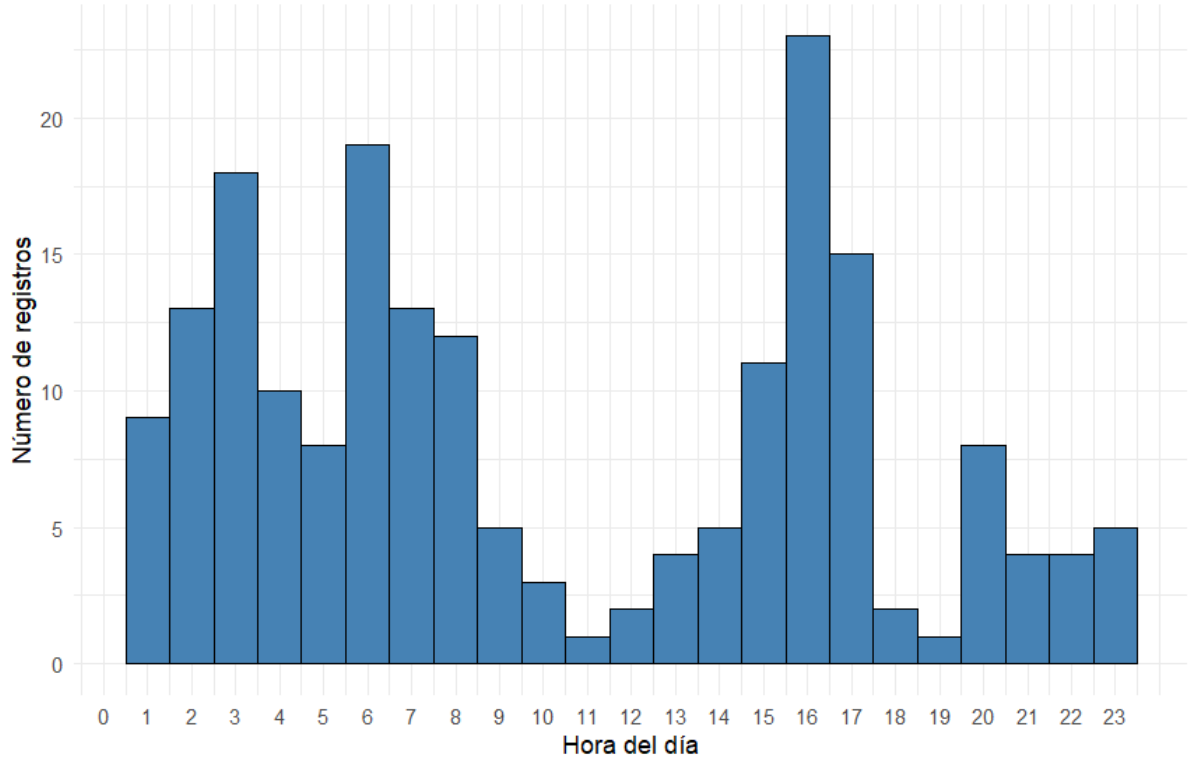


Ilustración 5. Patrón general de la actividad diaria registrada en cámaras trampa en el río Piedras durante el periodo octubre.

Al momento de detallar la actividad de movilidad por especie se obtuvo que *Dasyprocta punctata,* ñeque, presentó una mayor movilidad y es el mayor aportante de los registros obtenidos, por lo cual existe una disponibilidad de alimento para

especies mayores en esta zona, las cuales son atraídas por los recursos disponibles, como alimento o refugio proporcionado por el bosque de ribera del río Piedras en su zona de desembocadura, el cual está compuesto mayormente de manglar.

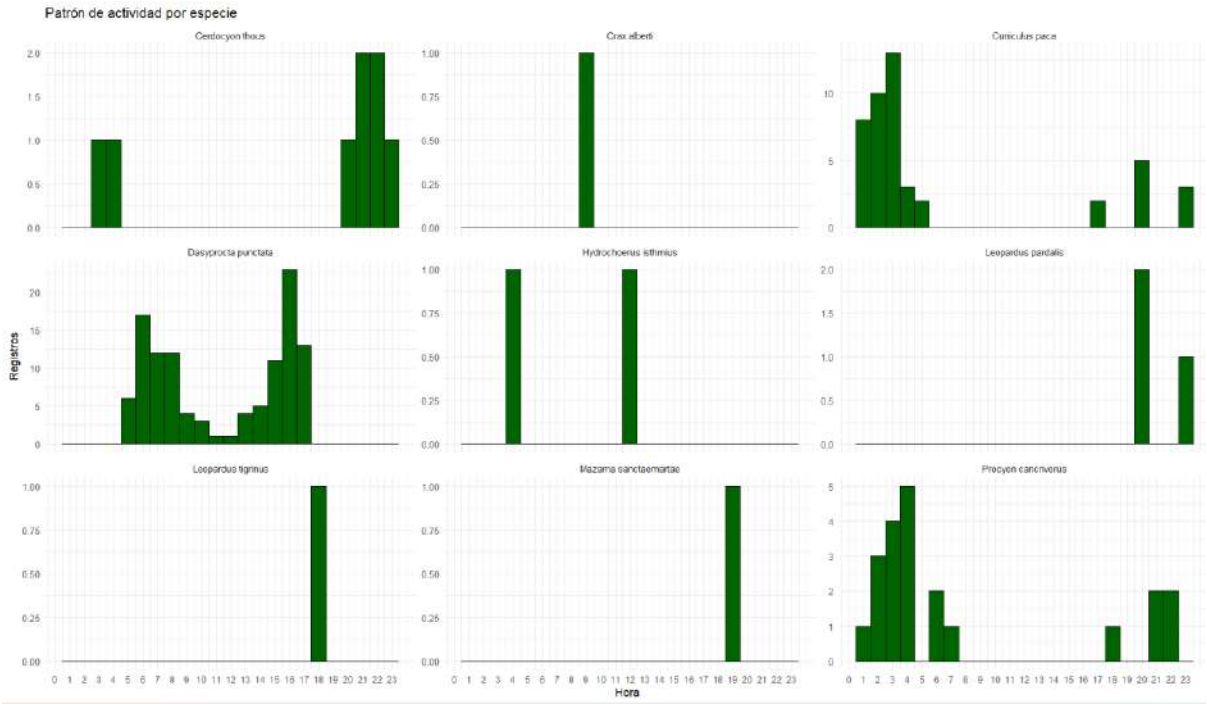

No obstante, en términos generales no se observó una alta actividad en los horarios diurnos, entre las 7 y 17 horas, las cuales son horas de actividad laboral para la obra. En este tiempo, y por su comportamiento los animales suelen estar ocultos en sus refugios para evitar la depredación de organismos mayores. Sin embargo, se debe tener en cuenta la presencia de estas especies al momento de intervenir las orillas de las formaciones arenosas, puesto que podrían verse atrapados.

Es así como se confirma la presencia en la zona de mamíferos medianos como la guartinaja, el ocelote, la oncilla, el mapache cangrejero, la corzuela de Santa Marta, el ponche el ñeque, y de aves como el paujil de pico azul, los cuales se encuentran asocian su actividad al recurso proporcionado por el río Piedras.

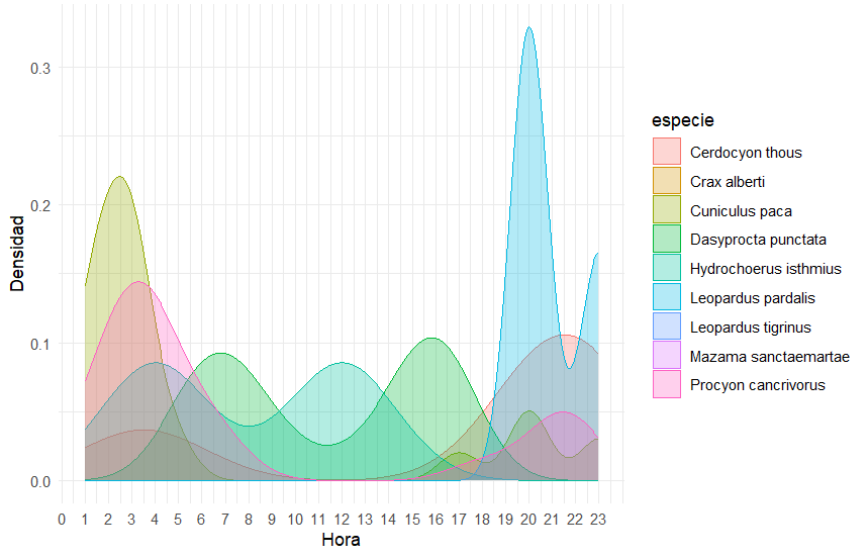


Ilustración 6. Curvas de actividad por especies encontradas en el periodo octubre en el río Piedras.





Ilustración 7. Registros de cámaras trampa durante el periodo octubre: De izquierda a derecha en su orden aparecen: *Mazama sanctaemarte, corzuela de Santa Marta; Cerdocyon thous, zorro perro; Hydrochoerus isthmius,* ponche; *Procyon cancrivorus,* mapache cangrejero; *Cuniculus paca,* guartinaja; *Leopardus tigrinus,* oncilla; *Leopardus pardalis, ocelote* y *Crax alberti,* paujil de pico azul.

5. RUTA METODOLÓGICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO.

Se siguieron los lineamientos establecidos por el Protocolo de Manejo de Fauna Silvestre propuesto por la Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG, el cual está basado en la *Resolución 2064 del 21 de octubre de 2010*, siendo adoptado por el CONSORCIO ICASM2023 según las condiciones del ecosistema a intervenir en la vigencia 2025 correspondiente a la quebrada Bureche y el río Gaira. Por tanto, se siguieron los parámetros relacionados a las actividades de ahuyentamiento, rescate en caliente, contención temporal, diligenciamiento de los formatos de datos biométricos, valoración, atención y liberación. Para este periodo se socializó y adaptó en campo dicha ruta entre el personal administrativo y operativo de la obra, estando atentos ante cualquier eventualidad.

5.1. Ahuyentamiento

Previo al inicio del traslado de la maquinaria se realizaron ahuyentamiento sonoros por medio de disturbios prolongados de 5 minutos utilizando para tal una corneta o vuvuzela de amplio alcance. En este tiempo se observa la presencia de fauna que esté dispuesta en el área del recorrido o la zona donde se ejecutará la actividad diaria, manteniendo la comunicación con el ingeniero residente de obra a cargo del frente y el maquinista.

5.2. Rescate en caliente

En caso de hallar en el sitio algún animal rezagado se procede a hacer uso de las herramientas de contención descritas en los materiales de campo de acuerdo con grupo faunístico o la estrategia de contención a implementar.

5.3. Desplazamiento y contención temporal en el Centro de Recepción Provisional

Una vez realizado el rescate, en caso de existir en el periodo descrito, el animal se resguarda en un contenedor temporal como guacal, bolsa de tela, canasta o tanque, según sea el caso.

5.4. Valoración

Una vez dispuesto en el hogar de paso o Centro de Recepción Provisional de fauna Silvestre, el biólogo inicia tomando medidas morfométricas como tamaño, peso y su condición inicial las cuales serán anotadas en la bitácora de registro otorgada por CORPAMAG. Luego de ello, el veterinario a cargo procederá a evaluar condiciones físicas como postura, condición de pelaje o plumaje, estado del pico o dentadura, respiración, visión y audición. Atención y primeros auxilios

5.5. Liberación.

Los individuos rescatados, después de ser valorados en centro de recepción provisional y que se encuentran en óptimas condiciones comportamentales y físicas son liberados en espacios con características similares al lugar donde fue hallado, manteniendo la estructura de espina de pescado en áreas relacionadas a la cuenca baja del Río Gaira o que se encuentren aprobadas por CORPAMAG.

5.6. Registro

Todas estas actividades contaron con registro fotográfico con formato de coordenadas planas, las cuales dan soporte a los registros realizados en las fichas de historia clínica y los formatos de control y seguimiento. Se elaboró una base de datos en Excel en la que se lleva registro de especies ahuyentadas, rescatadas, liberadas y muertas con el fin de evidenciar gráficamente la ejecución de todas estas actividades. Se detalló por taxonomía su clase, orden, familia, género, especie y nombre común; así como el estado de conservación, las coordenadas de hallazgo y disposición final, el tipo de actividad y las observaciones finales en caso de ameritar.

5.7. Centro de Recepción Provisional de Fauna Silvestre

El centro de Recepción Provisional se encuentra en el campamento de obra. En este punto la fauna rescatada pasa por un periodo de evaluación morfométrica y veterinaria para luego ser traslocada a un sitio seguro.

5.8. MATERIALES DE MANEJO DE FAUNA *in situ.*

Para implementar el Protocolo para Manejo de Fauna Silvestre, el proyecto ha adquirido hasta finales de octubre los siguientes materiales siguiendo las metodologías de restricción físicas establecidas para cada grupo faunístico encontradas en el río Piedras

Tabla 1. Listado de materiales disponibles durante el periodo octubre 2025.

ACTIVIDAD	INSUMO	Cantidad disponible octubre 2025
Rescate de fauna en caliente	Pértiga para el manejo de mamíferos y herpetos	1
	Pinza para el manejo de serpientes	1
	Gancho para el manejo de serpientes	1
	Guantes reforzados para manipulación de animales	2
	Nasa de captura y control para mamíferos y reptiles	1
	Caja plástica con broches alta resistencia	1
	CAJA ORG C/BIZAGRA TRANSP 54X37.4X22CM 20LT	2
	Bolsa herpetológica de tela	2
	Polaina protectora de serpiente para piernas	1
	Chaleco reflectivo en H anaranjado	2
	Polisombra	10 m
	Rollo de saco de polipropileno	10
	Guante poliester latex alta visibilidad talla L	10
	Toalla cuerpo 70x140 cm newbest 330 g verde	1
	SETX2 TOALLAS CUERPO - MANOS 400gr SATURNO GRIS	1
	FLEXOMETRO BASIC 5m STANLEY	1
	CINTA DUCTO GRIS 50 mm x 10 m EXTRA POWER TESA	1
	SOGA POLIPROPILENO NAUTICA CAL 10 mm X 10 m	1
	MP SOGA CLASICA 10MM 150M FORTE	1
	CORDEL NYLON TRENZADO ROJO 3 mm X 20 m FIXSER	3

	MP BASCULA COLGANTE USO DOMESTICO (RD-30)	1
	ALCOHOL ETILICO DESINFECTANTE LIMPIADOR 70%4000 m	1
	JUGUETE P/PERRO PELUCHE ELEFANTE PET CENTER	1
	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO 5A GEN 3.5% KLEINE1000 ml	1
	TERMOMETRO PARA SUPERFICIES INFRAROJO	1
	ATOMIZADOR PLASTICO 500ml ERGO	2
	Guacal talla M Medidas Exteriores: 67 largo x 40 alto x 40 ancho	1
	Guacal talla XL400 Medidas Exteriores: 90 largo x 67 alto x 59 ancho.	1
	Guacal talla XXL500 Medidas Exteriores: 101 largo x 75 alto x 67 ancho.	1
	DERMOSYN LOC MED X 100 M	1
	CLORHEXIN ESPRAY X 120 ML	1
	MELOXIPET 0.15% X 10 ML	
	TOALLITAS HUMEDAS FLUSHY PETS X25UND UND INSUMOS	2
	ELECTRO-ZOO C SOBRE X 19.5 GR	7
	Carpa piramidal de 3x3 lona azul rey	1
	Botiquín tipo A reglamentario	1
	Angiocat catéter intravenoso Rymco	2
	Hoja de bistury individual	25
	Jeringa desechable 10 mL	20
	Jeringa desechable 1mL – 3 mL – 5 mL	20
	Kit de sutura	1
Ahuyentamiento	Chaleco naranja reflectivo	2
	Vuvuzela de largo alcance	2
	Laser de luz verde para ahuyentamiento	1
	Linterna 5000 LM alta potencia	1
	Fumigador pulverizador manual 5 L	1
Monitoreo	Cámara trampa full-equipo	5
	Caja de seguridad para cámara trampa Bushnell	5
	Binoculares Bushnell 10x32	1
	Cámara fotográfica Nikon 950 Coolpix	1
	GPS MAP65 Garmin	1

6. Resultados

6.1. Ahuyentamiento

Para este periodo los ahuyentamientos y observaciones estuvieron concentradas en el acompañamiento de tres retroexcavadoras sobre orugas, las cuales se destinaron a la movilización del material del margen opuesto del río hasta el punto de intervención donde se construirán los geocontenedores. En este proceso, el desvío del cauce y la acumulación del material arenoso proveniente del río atrajo a especies típicas de la zona, las cuales sobrevolaban para capturar a los peces represados o canalizados por la obra. Siendo esto un atrayente para especies de aves con alimentación piscívora o oportunista.



Ilustración 8. Jornada de ahuyentamiento previo a la intervención de playa del río Piedras destinada para el relleno de los geocontenedores.

Es así como la ilustración 9 muestra la proporción de aves residentes que aprovechaban el cambio de la configuración del río para forrajear en el área. La mayor proporción observada correspondió al golero negro, seguido de la garza nívea y las piguas.

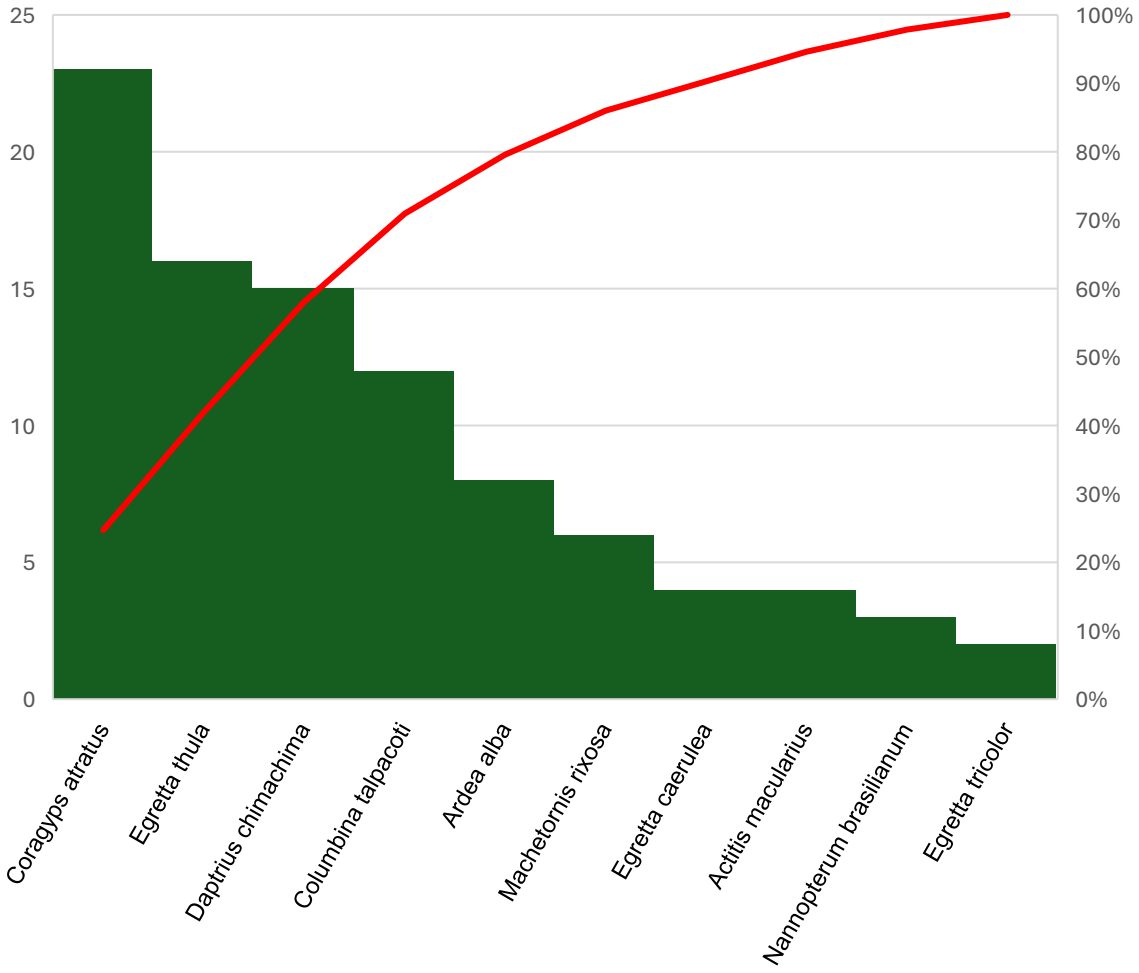


Ilustración 9. Proporción de especies ahuyentadas en un día de trabajo en el frente de obra de río Piedras.

6.2. Rescate en caliente

Para este periodo, se rescató una babilla la cual se encontraba en medio del material acopiado para los geocontenedores y una charca formada por las lluvias del día anterior la cual albergaba peces y crustáceos producto de la creciente. Una vez se recibe la alerta del maquinista el personal de fauna se desplaza hasta el punto para su extracción del sitio, tomando el mando de la obra hasta lograr el retiro del lugar utilizando la pértiga para su captura manual.

Una vez capturado, el animal es sujetado y trasladado hasta el hogar de paso para la toma de su morfometría y valoración veterinaria inicial. Como el animal no presentaba heridas ni golpes, se mantuvo durante un periodo de 30 minutos en observación hasta observar un estado de relación para proceder a liberarse. El animal fue transportado

en el guacal mediano, utilizando una toalla para cubrir sus ojos y reducir sus sentidos. Una vez obtenida la aprobación se traslada hasta aguas abajo donde es reubicada en la siguiente playa formada por el río.



Ilustración 10. Procedimiento durante el rescate en caliente de un ejemplar de babilla en el frente de obra de río Piedras.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ayerbe-Quiñones F. 2022. Guía Ilustrada de la Avifauna Colombiana. Tercera edición. Wildlife Conservation Society. Editorial Punto Aparte. Bogotá D.C.

Chaine, N. M. (2020). Rufous-tailed Jacamar (Galbula ruficauda). *Birds of the World*. https://doi.org/10.2173/BOW.RUTJAC1.01

Díaz, A., & Payán, E. (2012). Manual de fototrampeo. Manual de Fototrampeo Una Herramienta de Investigación Para La Conservación de La Biodiversidad En Colombia, 8–11. http://hdl.handle.net/20.500.11761/31415

Ley 1333 de 2009. (2009, 21 de julio). Congreso de La República de Colombia. Procedimiento sancionatorio ambiental.

Ley 1774 de 2016. (2016, 6 de enero). Congreso de La República de Colombia. Maltrato animal

Mandujano, S., & Pérez-Solano, L. A. (2019). Fototrampeo en R: organización y análisis de datos. *Volumen I. México: Instituto de Ecología AC*.

Martins M., Oliveira M E. (1999). Natura History of Snakes in Forest in the Manaus Region, Central Amazonia, Brazil.

Resolución 0126 de 2024. (2024, 6 de febrero). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Listado oficial de especies silvestres amenazadas.

Resolución 2064 de 2010. (2010, 21 de octubre). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Manejo post decomiso.

Rodríguez-Ferraro, A., & Boesman, P. F. D. (2025). Yellow Oriole (Icterus nigrogularis). *Birds of the World*. https://doi.org/10.2173/BOW.YELORI1.02

Subdirección técnica (2020) Protocolo para el manejo de fauna silvestre en el marco de los dragados hidro sedimentológicos. CORPAMAG.

8. ANEXOS

8.1. Historias clínicas registradas durante el periodo octubre, 2025.

CONSORCIO ICASM2023

HISTORIA CLÍNICA – RECEPCIÓN EN CENTRO PROVISIONAL DE FAUNA SILVESTRE

FHC.CRPFS | V2 | 08-09-2025

1. DATOS GENERALES:
- Fecha y hora de recepción: 27/oct/25
- Lugar de Hallazgo coordenadas: _____
- Frente de obra: Naranjos 1.4. Responsable: Andrés Portela

2. IDENTIFICACIÓN DEL ANIMAL

Grupo taxonómico: Ave Mamífero Reptil / Anfibio Otro

- Especie (Común y científico) Babilla Sexo: H / M Indenterm.
- Edad aproximada: Adulto / Subadulto: ____ Juvenil: ____ Neonato: ____
- Peso (gr): 2800 Longitud cm: 90

3. CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO
- Condición en que fue encontrado:

Aturdido: ____ Enredado: / Con hidrocarburo: ____ Herido: ____ Muerto: ____ Otro: ____

- Actividad de obra en curso: Acopio de material

4. EXAMEN CLÍNICO INICIAL

Parámetro	Normal	Alterado	Observaciones
Estado general	/		
Nivel de conciencia	Alerta /	Letárgico / Inconsciente	
Movilidad	Normal /	Limitada / No se mueve	
Hidratación	Normal /	Deshidratado	
Lesiones externas	No /	Sí	
Contaminantes presentes	No /	Sí	

5. CLASIFICACIÓN SEGÚN TRIAJE
- I – Liberación inmediata
- II – Atención y rehabilitación en campo
- III – Traslado a centro autorizado
- IV – Registro de mortalidad

6. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

■ Hidratación ■ Limpieza/Baño ■ Atención de heridas ■ Observación temporal ■ Otro:

7. DISPOSICIÓN FINAL DEL INDIVIDUO

■ Liberación inmediata (sitio: San Martin)
■ Rehabilitación temporal en obra (tiempo: ___ h)
■ Traslado a centro de atención de fauna (nombre: _____)
■ Registro de mortalidad – disposición con autoridad ambiental

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO


■ Sí ■ No – Código/Archivo: _____

9. FIRMAS:

Profesional responsable (Biólogo/Veterinario):

Auxiliar/Testigo:

8.2. Registro de datos biométricos tomados durante el periodo octubre, 2025.

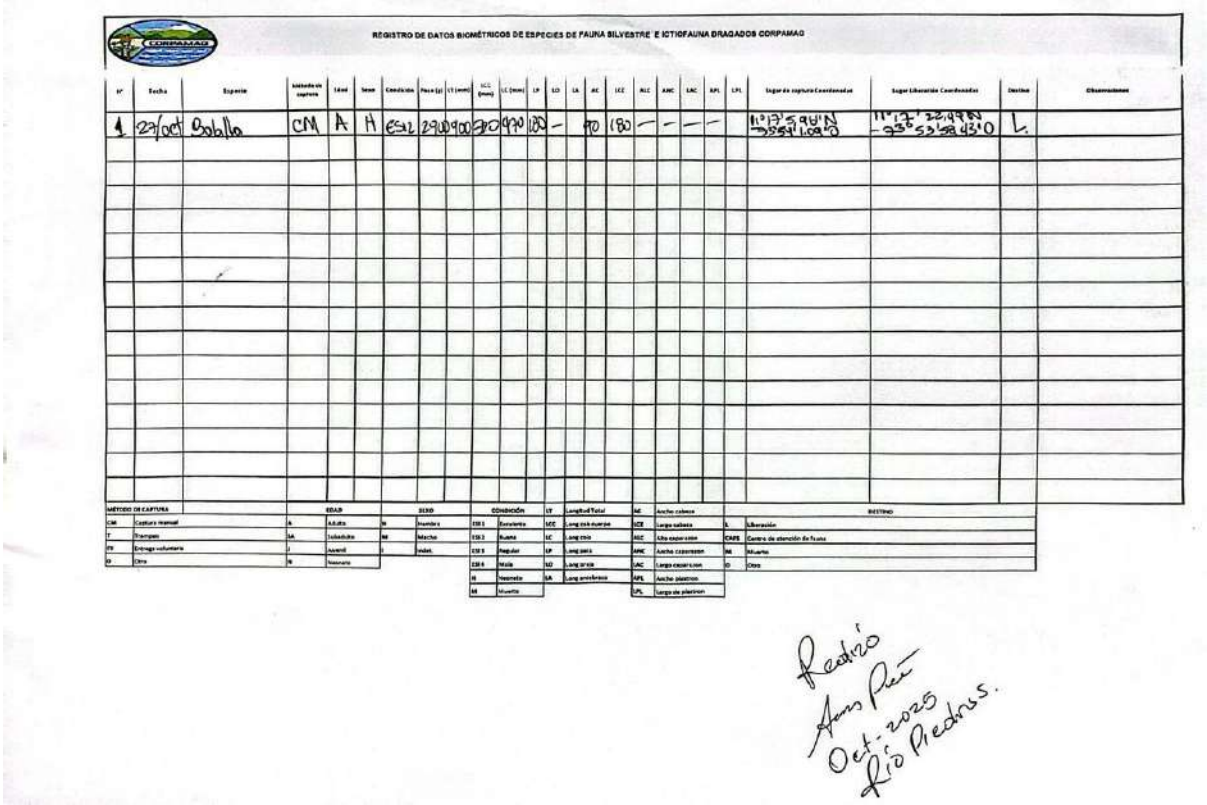

REGISTRO DE DATOS BIOMÉTRICOS DE ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE E ICTIOFAUNA DRAGADOS CORPAMAG

Nº	Fecha	Especie	Método de captura	Edad	Sexo	Condición	Peso (g)	LT (mm)	LCC (mm)	LC (mm)	LP	LO	LA	AC	LCE	ALC	ANC	LAC	APL	LPL	Lugar de captura Coordenadas	Lugar Liberación Coordenadas	Destino	Observaciones
1	27/oct	Bobito	CM	A	H	ESJ	290	900	370	490	180	–	–	90	180	–	–	–	–		11°17'59.94"N 73°54'09.09"O	11°17'33.99"N 73°53'58.45"O	L	

MÉTODO DE CAPTURA		EDAD		SEXO		CONDICIÓN		LT	Longitud Total	AC	Ancho cabeza	DESTINO	
CM	Captura manual	A	Adulto	H	Hombre	ESJ	Excelente	LCC	Long cab-cuerpo	LCE	Largo cabeza	L	Liberación
T	Trampeo	SA	Subadulto	M	Macho	BUE	Bueno	LC	Long cola	ALC	Alto caparazón	CAPE	Centro de atención de fauna
EV	Entrega voluntaria	J	Juvenil	I	Indet.	REG	Regular	LP	Long pata	ANC	Ancho caparazón	M	Muerto
O	Otro	N	Neonato			ESD	Malo	LO	Long oreja	LAC	Largo caparazón	O	Otro
						N	Neonato	LA	Long antebrazo	APL	Ancho plastron		
						M	Muerto			LPL	Largo de plastron		

Pedro Arias Pen
Oct-2025
Río Piedras.

CONSORCIO
ICASM2023

ANEXO No. 13

INFORME PIESPA

Dirección: Calle 24 No 2-66 Ed. Cámara de Comercio, Santa Marta
Email: consorcioicasm@gmail.com

RESUMEN EJECUTIVO	**EMPRESA CONTRATISTA:**
Se presenta en este documento el informe de seguimiento al Programa de Implementación de la Estrategia de Sensibilización y Participación Ambiental – PIESPA.	CONSORCIO ICASM2023
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA – CORPAMAG.
PROYECTO: Intervenciones a los cuerpos de agua del Distrito de Santa Marta para el mantenimiento y preservación de sus condiciones hidráulicas y ambientales.	**INFORME PIESPA No. 2**
Contrato de Obra No: LP 006 de 2023	**PERIODO REPORTADO:** Octubre del 2025



TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVOS.....3
2.1 OBJETIVO GENERAL 4
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4
3. ALCANCE.....5
4. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.....6
5. CONCLUSIÓN 117

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe reúne los resultados de las actividades desarrolladas durante octubre de 2025 en el marco del Plan de Implementación de la Estrategia de Sensibilización y Participación Ambiental – PIESPA, componente complementario del proyecto “Intervenciones a los cuerpos de agua del Distrito de Santa Marta para el mantenimiento y preservación de sus condiciones hidráulicas y ambientales”, liderado por la Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG.

Para el desarrollo del PIESPA fueron priorizadas seis comunidades conformadas por instituciones educativas y organizaciones comunitarias asentadas en sectores directamente relacionados con los cuerpos de agua intervenidos por CORPAMAG: río Manzanares, quebrada Bureche y río Piedras. Estas comunidades son: la Junta de Acción Comunal del barrio Manzanares, la Junta de Acción Comunal Los Naranjos, la Comunidad El Milagro II, la I.E.D. Liceo del Sur, la I.E.D. Quinto Centenario y el C.E.D.I. Orinoco Sede Los Cocos (Sede No. 2).

Durante el mes de octubre se realizaron 24 jornadas de sensibilización, distribuidas en 12 fechas, con cobertura en las seis comunidades priorizadas. Estas actividades se orientaron a la conservación y aprovechamiento responsable de los recursos hídricos y pesqueros, así como a la protección de la fauna y flora asociada a los ecosistemas acuáticos. De manera complementaria, se desarrollaron talleres sobre el manejo adecuado de residuos sólidos, que incluyeron la caracterización teórico-práctica y la transformación de material reciclable.

Asimismo, se llevaron a cabo jornadas ambientales y culturales orientadas a fortalecer la protección de las fuentes hídricas, a promover la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo. El proceso culminó con un taller pedagógico basado en las cartillas “Aprendiendo para proteger las fuentes hídricas”, que consolidó los aprendizajes y reforzó el compromiso comunitario con la educación ambiental.

El informe presenta la descripción de las jornadas realizadas, las dinámicas aplicadas, los avances logrados y el alcance obtenido durante el periodo reportado, evidenciando el cumplimiento progresivo del componente educativo y participativo del proyecto.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

- Presentar los resultados de las jornadas de sensibilización ambiental realizadas en octubre de 2025, mostrando el avance en los procesos educativos, participativos y de apropiación territorial desarrollados en las comunidades priorizadas del PIESPA.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Describir las jornadas de sensibilización desarrolladas, destacando las actividades realizadas y las temáticas ambientales trabajadas en cada una de las comunidades priorizadas.

- Identificar los avances obtenidos en educación ambiental y participación comunitaria, reconociendo los aprendizajes y el nivel de compromiso evidenciado durante el mes de octubre.

- Consolidar los registros, evidencias y soportes generados en las actividades para el cumplimiento de las metas establecidas en el PIESPA.

3. ALCANCE

La Estrategia de Sensibilización y Participación Ambiental del Río Piedras tiene como alcance implementar las estrategias y desarrollar las actividades para llevar a cabo de manera asertiva el cumplimiento del componente complementario del proyecto "INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES", que consiste en la fase de socialización y educación ambiental dirigida a las comunidades e instituciones educativas del área de intervención del proyecto.

Lo anterior, a partir de la coordinación de acciones y espacios de interacción para el fomento de la conciencia ambiental, desde la ética y la sostenibilidad en todas sus dimensiones que se empoderen en temáticas socio ambientales de importancia global, y que se conviertan en replicadores de un mensaje de conciencia y compromiso con el entorno y los recursos que la naturaleza ofrece. Es importante precisar, que estas intervenciones buscan involucrar actores claves como niños, jóvenes, líderes sociales, Juntas de Acción Comunal y miembros de la comunidad. Para el desarrollo de estas actividades se contó en el mes de octubre con la participación de seis (6) comunidades del sector, la Institución Educativa Distrital Quinto Centenario, la Institución Educativa Distrital Liceo del Sur, el Centro de Educación Distrital e Intercultural Orinoco Los Cocos (Sede No. 2), la Junta de Acción Comunal del barrio Manzanares, la Comunidad El Milagro II y La vereda Los Naranjos.

4. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

FECHA	01, 06, 17 y 23 de octubre	**HORA**	Mañana/Tarde
META	Meta No. 1: Sensibilizar en temáticas para el cuidado y protección de los cuerpos de agua y de sus ecosistemas, en las instituciones educativa, comunidad y gremios en general que se encuentren dentro del área de influencia del proyecto.		
TEMA	Actividad No. 1 Jornada de sensibilización educativa Ambiental		
OBJETIVO GENERAL	Presentar la estrategia de educación y sensibilización ambiental en el marco del desarrollo del proyectó “INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES.		
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	Socializar la estrategia de educación y sensibilización ambiental, presentando sus metas, actividades complementarias y cronograma de ejecución. Fomentar la participación y el sentido de pertenencia ambiental para el cuidado de los cuerpos de agua del distrito de Santa Marta.		
LUGAR	CEDI Orinoco Los Cocos (Sede No. 2), JAC Los Naranjos, Milagro II Y JAC Manzanares.		
PROFESIONAL RESPONSABLE	Daxy Aguas Beleño	**CARGO**	Ingeniera Ambiental
CONTRATO	Contrato de Obra Pública No. LP 006 de 2023		
PROYECTO:	“INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES”		

PARTICIPANTES

1. Centro Educativo Distrital e Intercultural Orinoco
2. Junta de Acción Comunal Los Naranjos
3. Barrio Milagro II
4. Junta de Acción Comunal Manzanares

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Objetivo de la jornada de sensibilización: Presentar la estrategia de educación y sensibilización ambiental en el marco del desarrollo del proyectó “INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES.

Para el desarrollo de la jornada se aplicó la siguiente metodología:

1. La jornada comenzó con una actividad rompe hielo denominada “Casa, inquilino y no pagó el arriendo”, diseñada para generar un ambiente participativo y motivador entre los estudiantes. La dinámica consistió en agrupar a los participantes en tríos: dos estudiantes formaban la “casa” uniendo sus manos, mientras el tercero representaba al “inquilino”. Bajo las indicaciones del gestor social, los grupos realizaron las acciones propias del juego.

2. Se presentó formalmente el equipo de trabajo, integrado por representantes del contratista y de la interventoría, en donde se dio a conocer sus roles y responsabilidades.

3. Se socializó la estrategia de educación y sensibilización ambiental, explicando de manera clara sus tres metas principales, las actividades y el cronograma de ejecución.

4. Se compartieron los contenidos que se abordarán en las diferentes jornadas y se presentaron ejemplos de las actividades complementarias que fortalecen el proceso de sensibilización, tales como:
   - Jornada de siembra.
   - Jornada de limpieza.
   - Elaboración de un mural ecológico comunitario.
   - Muestras artísticas y culturales con enfoque ambiental.

5. Finalmente, se explicó el proceso de cierre de las actividades, que incluyó la entrega de certificados de participación, la dotación de puntos ecológicos para la comunidad y la distribución de souvenirs como reconocimiento al compromiso de los asistentes.

La Jornada de sensibilización, se realizó en la I.E.D. Quinto Centenario, ubicada en Santa Marta. A continuación, se describen las poblaciones beneficiadas.

Comunidad No. 1: Río Piedras
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL E INTERCULTURAL ORINOCO, SEDE NO. 2

Dirección: Kilometro 34, Vereda Los Cocos
Jornada: Mañana
Niveles / Grados: Primaria y Secundaria
Rector: Víctor Paba
No. total de participantes: 28 participantes

La jornada se desarrolló con la participación de 28 estudiantes con edades entre 10 y 17 años, distribuidos en 9 mujeres y 19 hombres.

POBLACIÓN BENEFICIADA	
Cantidad	
Mujeres	**Hombres**
9	19
Total	28

A continuación, se detalla las características de la población antes mencionada:

De acuerdo con los beneficiarios directos, se registra grupo etario al que pertenece:	**Cantidad**	
	Mujeres	**Hombres**
Infancia (6 a 11 años)	0	3
Adolescencia (12 a 17 años)	9	16
Jóvenes (18 a 28 años)	0	0
Adultos (29 a 59 años)	0	0
Adultos mayores (mayores de 60 años)	0	0
Total	**9**	**19**

REGISTRO FOTOGRÁFICO: CEDI ORINOCO



Foto No. 001
Fecha: 01 de octubre de 2025
Actividad: Presentación de la campaña educativa ambiental a los estudiantes.
Lugar: C.E.D.I. Orinoco



Foto No. 002
Fecha: 01 de octubre de 2025
Actividad: Presentación del equipo de trabajo del PIESPA.
Lugar: C.E.D.I. Orinoco



Foto No. 003
Fecha: 01 de octubre de 2025
Actividad: Desarrollo de la actividad lúdica El Juego de las posibilidades.
Lugar: C.E.D.I. Orinoco



Foto No. 004
Fecha: 01 de octubre de 2025
Actividad: Representación lúdica de los estudiantes.
Lugar: C.E.D.I. Orinoco

Comunidad No. 2: Río Piedras
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS NARANJOS

Dirección: Kilometro 32, Vereda Los Naranjos
Lugar:
Jornada: Tarde
Presidente: Maribel Quintana
No. total de participantes: 28 participantes

La jornada se desarrolló con la participación de 18 estudiantes con edades entre 29 y 76 años, distribuidos en 8 mujeres y 10 hombres.

POBLACIÓN BENEFICIADA	
Cantidad	
Mujeres	**Hombres**
8	10
Total	18

A continuación, se detalla las características de la población antes mencionada:

De acuerdo con los beneficiarios directos, se registra grupo etario al que pertenece:	**Cantidad**	
	Mujeres	**Hombres**
Infancia (6 a 11 años)	0	0
Adolescencia (12 a 17 años)	0	0
Jóvenes (18 a 28 años)	0	0
Adultos (29 a 59 años)	5	8
Adultos mayores (mayores de 60 años)	3	2
Total	**8**	**10**

REGISTRO FOTOGRÁFICO: JAC LOS NARANJOS



Foto No. 001
Fecha: 06 de octubre de 2025
Actividad: Presentación de la campaña educativa ambiental a los asistentes.
Lugar: Hostal Hugo



Foto No. 002
Fecha: 06 de octubre de 2025
Actividad: Presentación de la campaña educativa ambiental a los asistentes.
Lugar: Hostal Hugo



Foto No. 003
Fecha: 06 de octubre de 2025
Actividad: Presentación del equipo de trabajo del PIESPA.
Lugar: Hostal Hugo



Foto No. 004
Fecha: 06 de octubre de 2025
Actividad: Socialización de la actividad de la tapatón para la recolección de tapas plásticas.
Lugar: Hostal Hugo

Comunidad No. 3: Sector Bureche
BARRIO MILAGRO II

Dirección: Calle 70 # 807- Troncal del Caribe
Lugar: Comedor comunitario
Jornada: Tarde
No. total de participantes: 20 participantes

La jornada contó con la participación de 20 participantes, con edades comprendidas entre los 24 y 70 años, distribuidos en 20 mujeres.

POBLACIÓN BENEFICIADA	
Cantidad	
Mujeres	**Hombres**
20	0
Total	20

A continuación, se detalla las características de la población antes mencionada:

De acuerdo con los beneficiarios directos, se registra grupo etario al que pertenece:	**Cantidad**	
	Mujeres	**Hombres**
Infancia (6 a 11 años)	0	0
Adolescencia (12 a 17 años)	0	0
Jóvenes (18 a 28 años)	8	0
Adultos (29 a 59 años)	10	0
Adultos mayores (mayores de 60 años)	2	0
Total	**20**	**0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO: BARRIO MILAGRO II

	
Foto No. 001 Fecha: 17 de octubre de 2025 Actividad: Presentación de la campaña educativa ambiental a los asistentes. Lugar: Comedor comunitario Milagro II	Foto No. 002 Fecha: 17 de octubre de 2025 Actividad: Presentación del equipo de trabajo del PIESPA. Lugar: Comedor comunitario Milagro II

Comunidad No. 4: Sector Manzanares
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MANZANARES

Dirección: Carrera 5 Calle 31 #4B-97
Lugar: Salón comunal
Jornada: Tarde
Presidente: Teresa Sanjuan
No. total de participantes: 16 participantes

La jornada contó con la asistencia de 16 participantes, con edades entre 20 y 68 años, distribuidos en 13 mujeres y 3 hombres.

POBLACIÓN BENEFICIADA	
Cantidad	
Mujeres	**Hombres**
13	3
Total	16

A continuación, se detalla las características de la población antes mencionada:

De acuerdo con los beneficiarios directos, se registra grupo etario al que pertenece:	**Cantidad**	
	Mujeres	**Hombres**
Infancia (6 a 11 años)	0	0
Adolescencia (12 a 17 años)	0	0
Jóvenes (18 a 28 años)	2	0
Adultos (29 a 59 años)	8	1
Adultos mayores (mayores de 60 años)	3	2
Total	**13**	**3**

REGISTRO FOTOGRÁFICO: JAC MANZANARES

	
Foto No. 001 Fecha: 23 de octubre de 2025 Actividad: Presentación de la campaña educativa ambiental a los asistentes. Lugar: Salón comunal Manzanares	Foto No. 002 Fecha: 23 de octubre de 2025 Actividad: Presentación de la campaña educativa ambiental a los asistentes. Lugar: Salón comunal Manzanares
	
Foto No. 003 Fecha: 23 de octubre de 2025 Actividad: Presentación del equipo de trabajo del PIESPA. Lugar: Salón comunal Manzanares	Foto No. 004 Fecha: 23 de octubre de 2025 Actividad: Socialización de la actividad de la tapatón para la recolección de tapas plásticas. Lugar: Salón comunal Manzanares

	
Foto No. 005 Fecha: 23 de octubre de 2025 Actividad: Desarrollo de la actividad Lugar: Salón comunal Manzanares	Foto No. 006 Fecha: 23 de octubre de 2025 Actividad: Entrega de refrigerios Lugar: Salón comunal Manzanares

ANEXOS

- Listados de Asistencia – C.E.D.I Orinoco - octubre
- Listados de Asistencia – Vereda Los Naranjos - octubre
- Listados de Asistencia – Barrio Milagro II - octubre
- Listados de Asistencia – Barrio Manzanares - octubre
- Meta 1 - Actividad No 1 - PIESPA 2025

FECHA	06 de octubre	**HORA**	Tarde
META	Meta No. 1: Sensibilizar en temáticas para el cuidado y protección de los cuerpos de agua y de sus ecosistemas, en las instituciones educativa, comunidad y gremios en general que se encuentren dentro del área de influencia del proyecto.		
TEMA	Actividad No. 2 Jornada de sensibilización para la conservación y aprovechamiento del recurso hídrico y pesquero.		
OBJETIVO GENERAL	Reconocer la importancia de la conservación y aprovechamiento del recurso hídrico y pesquero, en especial la de la fuente hídrica Río Piedras del Distrito de Santa Marta.		
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	Analizar junto con estudiantes y comunidades las principales problemáticas ambientales que afectan al recurso hídrico y pesquero, identificando su estado pasado, presente y las acciones necesarias para garantizar un futuro sostenible. Promover la adopción de prácticas responsables en el uso del agua y la protección de los ecosistemas asociados, fortaleciendo la conciencia ambiental mediante actividades pedagógicas.		
LUGAR	JAC Los Naranjos		
PROFESIONAL RESPONSABLE	Andrés Pontón Albor	**CARGO**	Biólogo
CONTRATO	Contrato de Obra Pública No. LP 006 de 2023		
PROYECTO:	“INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES”		

PARTICIPANTES

1. Junta de Acción Comunal Los Naranjos

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Objetivo de la jornada de sensibilización: Reconocer la importancia de la conservación y aprovechamiento del recurso hídrico y pesquero, en especial la de la fuente hídrica Río Piedras del Distrito de Santa Marta.

Para el desarrollo de la jornada se aplicó la siguiente metodología:

1. La jornada inició con un saludo del equipo de trabajo, seguido de la presentación a los participantes sobre quiénes somos, el motivo de nuestra presencia en el lugar y la explicación de conceptos como licitación, contratista e interventoría. Además, se indagó si reconocen la importancia de la autoridad ambiental del departamento.

2. Posteriormente, se realizó una breve charla sobre qué es el recurso hídrico y la relevancia de su calidad en las actividades cotidianas. Se planteó la pregunta: ¿cuál es el recurso hídrico más cercano a la comunidad? Para esta vigencia, los cuerpos de agua priorizados son Bureche, Manzanares y Piedras, según las comunidades asignadas durante la sensibilización.

3. Una vez identificado el recurso hídrico más cercano en la comunidad, se dividió el grupo en tres mesas de trabajo para abordar la pregunta: ¿Cuál es el estado de ese recurso hídrico en términos de pasado, presente y futuro? Cada grupo eligió un periodo y, mediante cartografía social, se discutió elementos históricos y significativos alrededor del cuerpo de agua. Luego, socializaron sus conclusiones con los demás compañeros. Para ello, se entregaron materiales como papel bond, marcadores y colores. La organización comunitaria desarrolló su actividad en torno al afluente que se mencionan a continuación:

    - La JAC Los Naranjos: trabajaron con el río Piedras, destacando su riqueza natural en el pasado, la contaminación que hoy lo afecta y las acciones necesarias para su restauración.

    Este ejercicio permitió que la comunidad no solo plasmara gráficamente sus percepciones, sino que también reflexionaran sobre los cambios ambientales ocurridos y reconocieran la necesidad de asumir compromisos colectivos para transformar la realidad de estos ecosistemas.

4. Tras un tiempo prudente, se realizó la socialización de las discusiones, resaltando factores como inundaciones, conflictos por manejo de residuos, fauna y flora presentes, uso del suelo y de la ronda hídrica a lo largo de su historia, así como la visión y compromiso para mejorar su estado actual.

5. Finalmente, se llevó a cabo una retroalimentación en la que se aclararon conceptos como ronda hídrica, zona de conservación e inundación, la importancia de la autoridad ambiental en la gestión de las rondas y del recurso hídrico dentro de su jurisdicción, y el compromiso colectivo para contribuir a su mejoramiento y a la armonía con el entorno.

La jornada de sensibilización sobre la conservación del recurso hídrico y pesquero, se realizó la vereda Los Naranjos. A continuación, se describe la población beneficiada.

Comunidad No. 1: Río Piedras
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS NARANJOS

Dirección: Kilometro 32, Vereda Los Naranjos
Lugar:
Jornada: Tarde
Presidente: Maribel Quintana
No. total de participantes: 19 participantes

La jornada se desarrolló con la participación de 19 participantes con edades entre 29 y 76 años, distribuidos en 10 mujeres y 9 hombres.

POBLACIÓN BENEFICIADA	
Cantidad	
Mujeres	**Hombres**
10	9
Total	19

A continuación, se detalla las características de la población antes mencionada:

De acuerdo con los beneficiarios directos, se registra grupo etario al que pertenece:	**Cantidad**	
	Mujeres	**Hombres**
Infancia (6 a 11 años)	0	0
Adolescencia (12 a 17 años)	0	0
Jóvenes (18 a 28 años)	0	0
Adultos (29 a 59 años)	7	7
Adultos mayores (mayores de 60 años)	3	2
Total	**10**	**9**

REGISTRO FOTOGRÁFICO: JAC LOS NARANJOS



Foto No. 001
Fecha: 06 de octubre de 2025
Actividad: Presentación de la temática sobre recurso hídrico y pesquero.
Lugar: Hostal Hugo



Foto No. 002
Fecha: 06 de octubre de 2025
Actividad: Presentación de la temática sobre recurso hídrico y pesquero.
Lugar: Hostal Hugo



Foto No. 003
Fecha: 06 de octubre de 2025
Actividad: Socialización del contenido teórico.
Lugar: Hostal Hugo



Foto No. 004
Fecha: 06 de octubre de 2025
Actividad: Socialización del contenido teórico.
Lugar: Hostal Hugo



Foto No. 005
Fecha: 06 de octubre de 2025
Actividad: Desarrollo de la cartografía social del Río Piedras - presente.
Lugar: Hostal Hugo



Foto No. 006
Fecha: 06 de octubre de 2025
Actividad: Desarrollo de la cartografía social del Río Piedras - futuro.
Lugar: Hostal Hugo



Foto No. 007
Fecha: 06 de octubre de 2025
Actividad: Desarrollo de la cartografía social del Río Piedras - pasado.
Lugar: Hostal Hugo



Foto No. 008
Fecha: 06 de octubre de 2025
Actividad: Socialización de la cartografía social del Río Piedras - pasado.
Lugar: Hostal Hugo



Foto No. 009
Fecha: 06 de octubre de 2025
Actividad: Socialización de la cartografía social del Río Piedras - futuro.
Lugar: Hostal Hugo



Foto No. 010
Fecha: 06 de octubre de 2025
Actividad: Socialización de la cartografía social del Río Piedras - presente.
Lugar: Hostal Hugo



Foto No. 011
Fecha: 06 de octubre de 2025
Actividad: Retroalimentación y compromisos.
Lugar: Hostal Hugo



Foto No. 012
Fecha: 06 de octubre de 2025
Actividad: Retroalimentación y compromisos.
Lugar: Hostal Hugo

	
Foto No. 013 Fecha: 06 de octubre de 2025 Actividad: Entrega de refrigerios a los asistentes. Lugar: Hostal Hugo	Foto No. 014 Fecha: 06 de octubre de 2025 Actividad: Entrega de refrigerios a los asistentes. Lugar: Hostal Hugo

ANEXOS

- Listados de Asistencia – Vereda Los Naranjos - octubre
- Meta 1 - Actividad No 2 - PIESPA 2025

FECHA	20 de octubre	**HORA**	Tarde
META	Meta No. 1: Sensibilizar en temáticas para el cuidado y protección de los cuerpos de agua y de sus ecosistemas, en las instituciones educativa, comunidad y gremios en general que se encuentren dentro del área de influencia del proyecto.		
TEMA	Actividad No. 3 Jornada de sensibilización para la conservación de la fauna y flora existentes en los cuerpos de agua.		
OBJETIVO GENERAL	Identificar la fauna y flora existente en la ronda hídrica del Río Piedras y el papel fundamental que cada uno cumple dentro del ecosistema.		
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	Reconocer las especies de flora y fauna presentes en la ronda hídrica del Río Piedras y demás cuerpos de agua intervenidos en la vigencia, comprendiendo sus funciones ecológicas y su aporte a los servicios ecosistémicos que benefician a la comunidad de Santa Marta. Fomentar la conciencia ambiental mediante actividades que enseñen legislación, las categorías de amenaza y las prácticas adecuadas de interacción con la vida silvestre.		
LUGAR	JAC Los Naranjos		
PROFESIONAL RESPONSABLE	Andrés Pontón Albor	**CARGO**	Biólogo
CONTRATO	Contrato de Obra Pública No. LP 006 de 2023		
PROYECTO:	“INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES”		

PARTICIPANTES

1. Junta de Acción Comunal Los Naranjos

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Objetivo de la jornada de sensibilización: Identificar la fauna y flora existente en la ronda hídrica del Río Piedras y el papel fundamental que cada uno cumple dentro del ecosistema.

Para el desarrollo de la jornada se aplicó la siguiente metodología:

1. La jornada comenzó con un saludo del equipo de trabajo a los participantes, seguido de una explicación sobre la importancia de proteger los recursos de flora y fauna durante las intervenciones de la obra. A continuación, se realizaron preguntas para conocer las experiencias de interacción entre humanos y fauna en el sector, como una dinámica para romper el hielo y escuchar las vivencias de la comunidad.

2. Posteriormente, se presentó el concepto de servicios ecosistémicos, destacando cómo la biodiversidad de bosques y ríos beneficia a la ciudad, especialmente en relación con el cuerpo de agua donde se desarrolla la actividad. Se explicó también la interacción del bosque con disturbios naturales como inundaciones, incendios y sequías, y cómo estos fenómenos se intensifican por acciones humanas, volviendo más vulnerable el ecosistema ante la extracción de capa vegetal por asentamientos.

3. Luego, se abordaron las categorías de amenaza y el papel de la autoridad ambiental en la protección de estos recursos mediante planes de manejo y medidas especiales. Se enfatizó que resulta preocupante cuando la comunidad se beneficia de especies catalogadas con algún grado de amenaza.

4. Asimismo, se resaltó la importancia de la flora y fauna a través de la legislación que las protege, y se indagó sobre las interacciones que los participantes han tenido con la vida silvestre en su zona de residencia en Santa Marta. Se mencionaron ejemplos como los beneficios de los árboles que protegen las rondas hídricas y de los animales que regulan la red trófica, haciendo especial énfasis en las posibles interacciones humano-serpiente y los procedimientos adecuados para su identificación y manejo.

5. Finalmente, la actividad concluyó con un juego denominado Bingo-fauna, en el que los participantes escucharon sonidos característicos y leyeron adivinanzas para identificar animales a partir de sus rasgos distintivos, fomentando la participación y el aprendizaje de manera lúdica.

La Jornada de sensibilización para la conservación de la fauna y flora existentes en los cuerpos de agua, se realizó en distintas comunidades e instituciones educativas de Santa Marta. A continuación, se describen la población beneficiada.

Comunidad No. 1: Río Piedras
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS NARANJOS

Dirección: Kilometro 32, Vereda Los Naranjos
Lugar:
Jornada: Tarde
Presidente: Maribel Quintana
No. total de participantes: 17 participantes

La jornada se desarrolló con la participación de 17 participantes, distribuidos en 10 mujeres y 9 hombres.

POBLACIÓN BENEFICIADA	
Cantidad	
Mujeres	**Hombres**
9	8
Total	17

REGISTRO FOTOGRÁFICO: JAC LOS NARANJOS



Foto No. 001
Fecha: 20 de octubre de 2025
Actividad: Presentación de la temática sobre fauna y flora a los participantes de la vereda Los Naranjos.
Lugar: Hostal Hugo



Foto No. 002
Fecha: 20 de octubre de 2025
Actividad: Desarrollo del contenido sobre fauna y flora.
Lugar: Hostal Hugo



Foto No. 003
Fecha: 20 de octubre de 2025
Actividad: Desarrollo del contenido sobre fauna y flora.
Lugar: Hostal Hugo



Foto No. 004
Fecha: 20 de octubre de 2025
Actividad: Desarrollo del contenido sobre fauna y flora.
Lugar: Hostal Hugo



Foto No. 005
Fecha: 20 de octubre de 2025
Actividad: Desarrollo del contenido sobre fauna y flora.
Lugar: Hostal Hugo



Foto No. 006
Fecha: 20 de octubre de 2025
Actividad: Desarrollo del contenido sobre fauna y flora.
Lugar: Hostal Hugo



Foto No. 007
Fecha: 20 de octubre de 2025
Actividad: Entrega de refrigerios a los participantes.
Lugar: Hostal Hugo



Foto No. 008
Fecha: 20 de octubre de 2025
Actividad: Entrega de refrigerios a los participantes.
Lugar: Hostal Hugo

ANEXOS

- Listados de Asistencia – vereda Los Naranjos - octubre
- Meta 1 - Actividad No 3 - PIESPA 2025

FECHA	01 y 03 de octubre	**HORA**	Mañana/Tarde
META	Meta No. 1: Sensibilizar en temáticas para el cuidado y protección de los cuerpos de agua y de sus ecosistemas, en las instituciones educativa, comunidad y gremios en general que se encuentren dentro del área de influencia del proyecto.		
TEMA	Actividad No. 4 Jornada de sensibilización para el manejo adecuado y aprovechamiento de los residuos sólidos.		
OBJETIVO GENERAL	Enseñar sobre el manejo adecuado, separación en la fuente y disposición final de residuos sólidos domiciliarios.		
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	Fortalecer el conocimiento sobre la clasificación y separación en la fuente de los residuos sólidos domiciliarios mediante actividades pedagógicas y lúdicas. Promover prácticas responsables frente al manejo y disposición final de los residuos sólidos, sensibilizando a los participantes sobre el impacto ambiental que generan en los ríos y cuerpos de agua.		
LUGAR	C.E.D.I. Orinoco y Milagro II		
PROFESIONAL RESPONSABLE	Daxy Aguas Beleño	**CARGO**	Ingeniera Ambiental
CONTRATO	Contrato de Obra Pública No. LP 006 de 2023		
PROYECTO:	“INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES”		

PARTICIPANTES

1. Centro Educativo Distrital e Intercultural Orinoco
2. Barrio Milagro II

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Objetivo de la jornada de sensibilización: Enseñar sobre el manejo adecuado, separación en la fuente y disposición final de residuos sólidos domiciliarios.

Para el desarrollo de la jornada se aplicó la siguiente metodología:

1. La actividad inició con un saludo cordial por parte del equipo del PIESPA, generando un ambiente de confianza y disposición para el aprendizaje. Se destacó la importancia de la participación de los estudiantes en las dinámicas propuestas, como parte fundamental del proceso de sensibilización ambiental.

2. Se llevó a cabo una dinámica interactiva en la que los estudiantes respondieron preguntas de opción múltiple, representadas con imágenes y con una única respuesta correcta. Cada pregunta fue acompañada de una retroalimentación detallada, explicando por qué la opción seleccionada era la adecuada y por qué las demás no correspondían.

   Las preguntas fueron adaptadas según el nivel académico de los participantes: estudiantes de grado 5° de primaria de la IED Liceo del Sur y estudiantes de grados 6° a 10° de la IED Quinto Centenario. Esta diferenciación se realizó con el fin de ajustar el nivel de complejidad y garantizar la comprensión de los contenidos.

3. Posteriormente, se abordó la temática de los residuos sólidos, explicando qué son y cómo afectan directamente a los cuerpos de agua, especialmente a los ríos que constituyen recursos hídricos característicos de estas comunidades. Se presentaron ejemplos cotidianos que ilustraron cómo los residuos llegan a los ríos y las consecuencias que generan en la salud, el ambiente y la calidad de vida.

4. La jornada concluyó con un juego de laberintos denominado “Separando para salvar el río”. Los estudiantes participaron, pasando al tablero para resolver el laberinto y demostrar de manera práctica los conocimientos adquiridos sobre la correcta disposición de los residuos. Finalmente, se entregó un refrigerio a los participantes.

La Jornada de sensibilización, se realizó en distintas instituciones educativas de Santa Marta. A continuación, se describen las poblaciones beneficiadas.

Comunidad No. 1: Río Piedras
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL E INTERCULTURAL ORINOCO, SEDE NO. 2

Dirección: Kilometro 34, Vereda Los Cocos
Jornada: Mañana
Niveles / Grados: Primaria y Secundaria
Rector: Víctor Paba
No. total de participantes: 27 estudiantes

La jornada se desarrolló con la participación de 27 estudiantes con edades entre 10 y 20 años, distribuidos en 9 mujeres y 18 hombres.

POBLACIÓN BENEFICIADA	
Cantidad	
Mujeres	**Hombres**
9	18
Total	27

A continuación, se detalla las características de la población antes mencionada:

De acuerdo con los beneficiarios directos, se registra grupo etario al que pertenece:	**Cantidad**	
	Mujeres	**Hombres**
Infancia (6 a 11 años)	0	3
Adolescencia (12 a 17 años)	8	15
Jóvenes (18 a 28 años)	1	0
Adultos (29 a 59 años)	0	0
Adultos mayores (mayores de 60 años)	0	0
Total	**9**	**18**

REGISTRO FOTOGRÁFICO: CEDI ORINOCO

	
Foto No. 001 Fecha: 01 de octubre de 2025 Actividad: Desarrollo de la actividad interactiva de preguntas sobre los residuos sólidos. Lugar: C.E.D.I. Orinoco	Foto No. 002 Fecha: 01 de octubre de 2025 Actividad: Desarrollo de la actividad interactiva de preguntas sobre los residuos sólidos. Lugar: C.E.D.I. Orinoco

fotos

	
Foto No. 003 Fecha: 01 de octubre de 2025 Actividad: Desarrollo de la actividad interactiva de preguntas sobre los residuos sólidos Lugar: C.E.D.I. Orinoco	Foto No. 004 Fecha: 01 de octubre de 2025 Actividad: Desarrollo de la actividad interactiva de pregun sobre los residuos sólidos. Lugar: C.E.D.I. Orinoco

	
Foto No. 005 Fecha: 01 de octubre de 2025 Actividad: Participación de los estudiantes en la actividad “Separando para salvar el río”. Lugar: C.E.D.I. Orinoco	Foto No. 006 Fecha: 01 de octubre de 2025 Actividad: Participación de los estudiantes en la actividad lúdica “Separando para salvar el río”. Lugar: C.E.D.I. Orinoco
	
Foto No. 007 Fecha: 01 de octubre de 2025 Actividad: Explicación de la temática sobre los residuos sólidos. Lugar: C.E.D.I. Orinoco	Foto No. 008 Fecha: 01 de octubre de 2025 Actividad: Explicación de la temática sobre los residuos sólidos. Lugar: C.E.D.I. Orinoco

Comunidad No. 2: Sector Bureche
BARRIO MILAGRO II

Dirección: Calle 70 # 807- Troncal del Caribe
Lugar: Comedor comunitario
Jornada: Tarde
No. total de participantes: 20 participantes

La jornada contó con la participación de 20 participantes, con edades comprendidas entre los 22 y 70 años, distribuidos en 19 mujeres y 1 hombre.

POBLACIÓN BENEFICIADA	
Cantidad	
Mujeres	**Hombres**
19	1
Total	20

A continuación, se detalla las características de la población antes mencionada:

De acuerdo con los beneficiarios directos, se registra grupo etario al que pertenece:	**Cantidad**	
	Mujeres	**Hombres**
Infancia (6 a 11 años)	0	0
Adolescencia (12 a 17 años)	0	0
Jóvenes (18 a 28 años)	8	0
Adultos (29 a 59 años)	10	1
Adultos mayores (mayores de 60 años)	1	0
Total	**19**	**1**

REGISTRO FOTOGRÁFICO: BARRIO MILAGRO II



Foto No. 001
Fecha: 03 de octubre de 2025
Actividad: Presentación de la jornada sobre manejo y aprovechamiento de residuos sólidos.
Lugar: Comedor comunitario Milagro II



Foto No. 002
Fecha: 03 de octubre de 2025
Actividad: Desarrollo de la actividad interactiva de preguntas sobre los residuos sólidos.
Lugar: Comedor comunitario Milagro II



Foto No. 003
Fecha: 03 de octubre de 2025
Actividad: Desarrollo de la actividad interactiva de preguntas sobre los residuos sólidos.
Lugar: Comedor comunitario Milagro II



Foto No. 004
Fecha: 03 de octubre de 2025
Actividad: Explicación de la temática sobre los residuos sólidos.
Lugar: Comedor comunitario Milagro II

	
Foto No. 005 Fecha: 03 de octubre de 2025 Actividad: Explicación de la temática sobre los residuos sólidos. Lugar: Comedor comunitario Milagro II	Foto No. 006 Fecha: 03 de octubre de 2025 Actividad: Explicación de la temática sobre los residuos sólidos. Lugar: Comedor comunitario Milagro II
	
Foto No. 007 Fecha: 03 de octubre de 2025 Actividad: Participación de los asistentes en la actividad lúdica “Separando para salvar el río”. Lugar: Comedor comunitario Milagro II	Foto No. 008 Fecha: 03 de octubre de 2025 Actividad: Entrega de refrigerios a los asistentes. Lugar: Comedor comunitario Milagro II

ANEXOS

- Listados de Asistencia – CEDI Orinoco - octubre
- Listados de Asistencia – Barrio Milagro II - octubre
- Meta 1 - Actividad No 4 - PIESPA 2025

FECHA	24, 29 y 31 de octubre	**HORA**	Mañana/Tarde
META	Meta No. 1: Sensibilizar en temáticas para el cuidado y protección de los cuerpos de agua y de sus ecosistemas, en las instituciones educativa, comunidad y gremios en general que se encuentren dentro del área de influencia del proyecto.		
TEMA	Actividad No. 5 Taller para el fortalecimiento de los temas educativos ambientales contenidos en las cartillas “Aprendiendo para proteger las fuentes Hídricas”		
OBJETIVO GENERAL	Socializar el material informativo con respecto al estado, flora y fauna del Río Piedras “Cartillas Ambientales”		
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	Promover la comprensión y apropiación de los contenidos de las Cartillas Ambientales “Aprendiendo para proteger las fuentes hídricas”, mediante actividades participativas y recreativas. Fomentar la conciencia ambiental y el compromiso comunitario en la protección de las fuentes hídricas, mediante la identificación de acciones cotidianas que contribuyan al cuidado del agua y a la preservación de los ecosistemas locales.		
LUGAR	I.E.D. Liceo del Sur Camilo Torres, I.E.D. Quinto Centenario y Milagro II.		
PROFESIONAL RESPONSABLE	Daxy Aguas Beleño	**CARGO**	Ingeniera Ambiental
CONTRATO	Contrato de Obra Pública No. LP 006 de 2023		
PROYECTO:	“INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES”		

PARTICIPANTES

1. Institución Educativa Distrital Liceo del Sur Camilo Torres
2. Institución Educativa Distrital Quinto Centenario
3. Barrio Milagro II

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Objetivo de la jornada de sensibilización: Socializar el material informativo con respecto al estado, flora y fauna del Río Piedras “Cartillas Ambientales”

Para el desarrollo de la jornada se aplicó la siguiente metodología:

1. La jornada inició con una cálida bienvenida por parte del grupo PIESPA, quienes se encargaron de recibir a los asistentes. Durante esta apertura se destacó la importancia

del encuentro, se explicó brevemente el propósito de la actividad y se motivó a los presentes a involucrarse en cada una de las dinámicas propuestas.

2. Posteriormente, se procedió a la distribución de las Cartillas Ambientales “Aprendiendo para proteger las fuentes hídricas” entre los participantes. Este material didáctico fue entregado de manera organizada, asegurando que cada asistente contara con su ejemplar. Las cartillas fueron presentadas como una herramienta pedagógica diseñada para fortalecer el conocimiento en temas ambientales, promover la conciencia y brindar información práctica sobre el cuidado y la protección de las fuentes hídricas. La entrega se realizó con una breve explicación acerca de la utilidad del material y su relevancia para la comunidad.

3. Una vez recibidas las cartillas, se otorgó un tiempo destinado a la exploración individual del contenido. Durante este momento, los asistentes pudieron revisar las secciones principales, identificar los temas tratados y familiarizarse con la estructura del material.
4. Luego, para fomentar la interacción y el aprendizaje lúdico, se llevó a cabo la dinámica recreativa denominada “tingo tingo tango”. Esta consistió en el uso de una pelota que era entregada a los participantes, quienes la circulaban entre sí mientras la persona encargada de dirigir el juego pronunciaba la palabra “tingo” de espaldas o sin mirar. Al momento de decir “tango”, se seleccionaba al participante que sostenía la pelota en ese instante. La persona elegida debía realizar la lectura de un fragmento del contenido de la cartilla ambiental, de esta manera se compartieron los conocimientos incluidos en el material.

5. Al finalizar esta actividad, se realizó una explicación más amplia sobre los temas tratados en las cartillas, destacando las acciones concretas que cada persona puede implementar en su entorno para contribuir al cuidado del agua. La jornada concluyó con la entrega de un refrigerio a los participantes.

El taller sobre los temas educativos contenidos en las cartillas ambientales se realizó en distintas comunidades e instituciones educativas de Santa Marta. A continuación, se describen las poblaciones beneficiadas.

Comunidad No. 1: Sector Manzanares

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL LICEO DEL SUR CAMILO TORRES

Dirección: Carrera 5ta Calle 34
Jornada: Mañana
Niveles / Grados: Primaria
Rector: Joaquín Linero
No. total de participantes: 22 estudiantes

La jornada se desarrolló con la participación de estudiantes del grado 3° de la sede Primaria de la IED Liceo del Sur Camilo Torres, con edades entre 8 y 11 años, distribuidos en 15 mujeres y 7 hombres.

POBLACIÓN BENEFICIADA	
Cantidad	
Mujeres	**Hombres**
15	7
Total	22

A continuación, se detalla las características de la población antes mencionada:

De acuerdo con los beneficiarios directos, se registra grupo etario al que pertenece:	**Cantidad**	
	Mujeres	**Hombres**
Infancia (6 a 11 años)	0	0
Adolescencia (12 a 17 años)	15	7
Jóvenes (18 a 28 años)	0	0
Adultos (29 a 59 años)	0	1
Adultos mayores (mayores de 60 años)	0	0
Total	**15**	**7**

REGISTRO FOTOGRÁFICO: I.E.D LICEO DEL SUR CAMILO TORRES



Foto No. 001
Fecha: 24 de octubre de 2025
Actividad: Presentación del taller sobre los temas ambientales contenidos en las cartillas.
Lugar: I.E.D. Liceo del Sur Camilo Torres



Foto No. 002
Fecha: 24 de octubre de 2025
Actividad: Presentación del taller sobre los temas ambientales contenidos en las cartillas.
Lugar: I.E.D. Liceo del Sur Camilo Torres



Foto No. 003
Fecha: 24 de octubre de 2025
Actividad: Distribución de las cartillas ambientales
Lugar: I.E.D. Liceo del Sur Camilo Torres



Foto No. 004
Fecha: 24 de octubre de 2025
Actividad: Distribución de las cartillas ambientales
Lugar: I.E.D. Liceo del Sur Camilo Torres

	
Foto No. 005 Fecha: 24 de octubre de 2025 Actividad: Exploración del contenido de las cartillas ambientales Lugar: I.E.D. Liceo del Sur Camilo Torres	Foto No. 006 Fecha: 24 de octubre de 2025 Actividad: Desarrollo de la dinámica recreativa Tingo Tingo Tango. Lugar: I.E.D. Liceo del Sur Camilo Torres
	
Foto No. 007 Fecha: 24 de octubre de 2025 Actividad: Desarrollo de la dinámica recreativa Tingo Tingo Tango. Lugar: I.E.D. Liceo del Sur Camilo Torres	Foto No. 008 Fecha: 24 de octubre de 2025 Actividad: lectura de un fragmento del contenido de la cartilla ambiental Lugar: I.E.D. Liceo del Sur Camilo Torres

	
Foto No. 009 Fecha: 24 de octubre de 2025 Actividad: Entrega de refrigerios a los asistentes. Lugar: I.E.D. Liceo del Sur Camilo Torres	Foto No. 010 Fecha: 24 de octubre de 2025 Actividad: Entrega de refrigerios a los asistentes. Lugar: I.E.D. Liceo del Sur Camilo Torres

Comunidad No. 2: Sector Bureche
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL QUINTO CENTENARIO

Dirección: Kilometro 13, Sector Bureche Vía alterna
Jornada: Mañana
Niveles / Grados: Primaria y Secundaria
Rector: Shirlen Jiménez
No. total de participantes: 25 participantes

La jornada se desarrolló con la participación de 25 estudiantes con edades entre 11 y 17 años, distribuidos en 17 mujeres y 8 hombres.

POBLACIÓN BENEFICIADA	
Cantidad	
Mujeres	**Hombres**
17	8
Total	25

A continuación, se detalla las características de la población antes mencionada:

De acuerdo con los beneficiarios directos, se registra grupo etario al que pertenece:	**Cantidad**	
	Mujeres	**Hombres**
Infancia (6 a 11 años)	2	0
Adolescencia (12 a 17 años)	15	8
Jóvenes (18 a 28 años)	0	0
Adultos (29 a 59 años)	0	0
Adultos mayores (mayores de 60 años)	0	0
Total	**17**	**8**

REGISTRO FOTOGRÁFICO: I.E.D. QUINTO CENTENARIO

	
Foto No. 001 Fecha: 29 de octubre de 2025 Actividad: Presentación del taller sobre los temas ambientales contenidos en las cartillas. Lugar: I.E.D. Quinto Centenario	Foto No. 002 Fecha: 29 de octubre de 2025 Actividad: Presentación del taller sobre los temas ambientales contenidos en las cartillas. Lugar: I.E.D. Quinto Centenario
	
Foto No. 003 Fecha: 29 de octubre de 2025 Actividad: Distribución de las cartillas ambientales Lugar: I.E.D. Quinto Centenario	Foto No. 004 Fecha: 29 de octubre de 2025 Actividad: Distribución de las cartillas ambientales Lugar: Lugar: I.E.D. Quinto Centenario

	
Foto No. 005 Fecha: 29 de octubre de 2025 Actividad: Exploración del contenido de las cartillas ambientales Lugar: I.E.D. Quinto Centenario	Foto No. 006 Fecha: 29 de octubre de 2025 Actividad: Exploración del contenido de las cartillas ambientales. Lugar: I.E.D. Quinto Centenario
	
Foto No. 007 Fecha: 29 de octubre de 2025 Actividad: Desarrollo de la dinámica recreativa Tingo Tingo Tango. Lugar: I.E.D. Quinto Centenario	Foto No. 008 Fecha: 29 de octubre de 2025 Actividad: Desarrollo de la dinámica recreativa Tingo Tingo Tango. Lugar: I.E.D. Quinto Centenario

	
Foto No. 009 Fecha: 29 de octubre de 2025 Actividad: lectura de un fragmento del contenido de la cartilla ambiental. Lugar: I.E.D. Quinto Centenario	Foto No. 010 Fecha: 29 de octubre de 2025 Actividad: lectura de un fragmento del contenido de la cartilla ambiental. Lugar: I.E.D. Quinto Centenario

	
Foto No. 011 Fecha: 29 de octubre de 2025 Actividad: Entrega de refrigerios a los estudiantes. Lugar: I.E.D. Quinto Centenario	Foto No. 012 Fecha: 29 de octubre de 2025 Actividad: Entrega de refrigerios a los estudiantes. Lugar: I.E.D. Quinto Centenario

Comunidad No. 3: Sector Bureche
BARRIO MILAGRO II

Dirección: Calle 70 # 807- Troncal del Caribe
Lugar: Comedor comunitario
Jornada: Tarde
No. total de participantes: 20 participantes

La jornada contó con la participación de 20 participantes, con edades comprendidas entre los 24 y 70 años, distribuidos en 18 mujeres y 2 hombres.

POBLACIÓN BENEFICIADA	
Cantidad	
Mujeres	**Hombres**
18	2
Total	20

A continuación, se detalla las características de la población antes mencionada:

De acuerdo con los beneficiarios directos, se registra grupo etario al que pertenece:	**Cantidad**	
	Mujeres	**Hombres**
Infancia (6 a 11 años)	0	0
Adolescencia (12 a 17 años)	0	0
Jóvenes (18 a 28 años)	8	2
Adultos (29 a 59 años)	9	0
Adultos mayores (mayores de 60 años)	1	0
Total	**18**	**2**

REGISTRO FOTOGRÁFICO: BARRIO MILAGRO II



Foto No. 001
Fecha: 31 de octubre de 2025
Actividad: Presentación del taller sobre los temas ambientales contenidos en las cartillas.
Lugar: Comedor comunitario Milagro II



Foto No. 002
Fecha: 31 de octubre de 2025
Actividad: Distribución de las cartillas ambientales.
Lugar: Comedor comunitario Milagro II



Foto No. 003
Fecha: 31 de octubre de 2025
Actividad: Exploración del contenido de las cartillas ambientales.
Lugar: Comedor comunitario Milagro II



Foto No. 004
Fecha: 31 de octubre de 2025
Actividad: Entrega de refrigerios y detalles
Lugar: Comedor comunitario Milagro II

	
Foto No. 005 Fecha: 31 de octubre de 2025 Actividad: Entrega de refrigerios y detalles en el marco del día del niño. Lugar: Comedor comunitario Milagro II	Foto No. 006 Fecha: 31 de octubre de 2025 Actividad: Entrega de refrigerios y detalles en el marco del día del niño. Lugar: Comedor comunitario Milagro II
	
Foto No. 007 Fecha: 31 de octubre de 2025 Actividad: Entrega de refrigerios y detalles en el marco del día del niño. Lugar: Comedor comunitario Milagro II	Foto No. 008 Fecha: 31 de octubre de 2025 Actividad: Entrega de refrigerios y detalles en el marco del día del niño. Lugar: Comedor comunitario Milagro II

ANEXOS

- Listados de Asistencia – I.E.D. Liceo del Sur – Octubre
- Listados de Asistencia – I.E.D. Quinto Centenario – Octubre
- Listados de Asistencia – Barrio Milagro II - octubre
- Meta 1 - Actividad No 5 - PIESPA 2025

FECHA	01 y 03 de octubre	**HORA**	Mañana/Tarde
META	Meta No. 1: Sensibilizar en temáticas para el cuidado y protección de los cuerpos de agua y de sus ecosistemas, en las instituciones educativa, comunidad y gremios en general que se encuentren dentro del área de influencia del proyecto.		
TEMA	Actividad No. 6 Jornada teórico-practico para la caracterización de los residuos sólidos.		
OBJETIVO GENERAL	Promover el manejo adecuado de los residuos sólidos a través de una jornada práctica de caracterización de residuos sólidos comunitarios.		
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	Fortalecer en los estudiantes el conocimiento sobre las 3R (reducir, reutilizar y reciclar) y el código de colores para la separación en la fuente. Fomentar la clasificación de residuos sólidos comunitarios para la protección de los recursos hídricos del distrito de Santa Marta.		
LUGAR	C.E.D.I. Orinoco y Milagro II		
PROFESIONAL RESPONSABLE	Daxy Aguas Beleño	**CARGO**	Ingeniera Ambiental
CONTRATO	Contrato de Obra Pública No. LP 006 de 2023		
PROYECTO:	“INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES”		

PARTICIPANTES

1. Centro Educativo Distrital e Intercultural Orinoco
2. Barrio Milagro II

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Objetivo de la jornada de sensibilización: Promover el manejo adecuado de los residuos sólidos a través de una jornada práctica de caracterización de residuos sólidos comunitarios.

Para el desarrollo de la jornada se aplicó la siguiente metodología:

1. La actividad inició con un saludo institucional por parte del equipo del PIESPA, quienes dieron la bienvenida a los estudiantes y explicaron los objetivos de la jornada.

2. Seguidamente, se inició la jornada teórico-práctica para la caracterización de los residuos sólidos, introduciendo el concepto de las 3R: reducir, reutilizar y reciclar. Cada principio fue definido y acompañado de ejemplos sencillos y cotidianos que facilitaron la comprensión de los estudiantes, mostrando cómo estas acciones

contribuyen a disminuir la contaminación y a generar hábitos responsables en la vida diaria.

3. Posteriormente, Se planteó la pregunta orientadora "¿Qué relación tienen las 3R con los ríos del distrito de Santa Marta?". A partir de esta reflexión, se generó un diálogo con los estudiantes para reconocer cómo la reducción, reutilización y reciclaje contribuyen a disminuir los residuos que llegan a los cuerpos de agua, protegiendo así los recursos hídricos de la comunidad.

4. Se explicó el código de colores para la separación de residuos, destacando su utilidad en la clasificación en la fuente. Para reforzar el aprendizaje, se realizó el ejercicio práctico "Aprendamos juntos a clasificar los residuos sólidos", en el que los estudiantes, organizados en grupos, clasificaron imágenes de distintos residuos en un punto ecológico pedagógico, simulando el proceso real de separación.

5. Finalmente, como cierre de la actividad, se entregó un refrigerio a los estudiantes, por su participación.

La Jornada de sensibilización, se realizó en distintas instituciones educativas de Santa Marta. A continuación, se describen las poblaciones beneficiadas.

Comunidad No. 1: Río Piedras
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL E INTERCULTURAL ORINOCO, SEDE NO. 2

Dirección: Kilometro 34, Vereda Los Cocos
Jornada: Mañana
Niveles / Grados: Primaria y Secundaria
Rector: Víctor Paba
No. total de participantes: 27 estudiantes

La jornada se desarrolló con la participación de 27 estudiantes con edades entre 10 y 20 años, distribuidos en 8 mujeres y 19 hombres.

POBLACIÓN BENEFICIADA	
Cantidad	
Mujeres	**Hombres**
8	19
Total	27

A continuación, se detalla las características de la población antes mencionada:

De acuerdo con los beneficiarios directos, se registra grupo etario al que pertenece:	**Cantidad**	
	Mujeres	**Hombres**
Infancia (6 a 11 años)	0	2
Adolescencia (12 a 17 años)	7	17
Jóvenes (18 a 28 años)	1	0
Adultos (29 a 59 años)	0	0
Adultos mayores (mayores de 60 años)	0	0
Total	**8**	**19**

REGISTRO FOTOGRÁFICO: CEDI ORINOCO



Foto No. 001
Fecha: 01 de octubre de 2025
Actividad: Explicación de los conceptos de las 3R de los residuos sólidos.
Lugar: C.E.D.I. Orinoco



Foto No. 002
Fecha: 01 de octubre de 2025
Actividad: Explicación de los conceptos de las 3R de los residuos sólidos.
Lugar: C.E.D.I. Orinoco

	
Foto No. 003 Fecha: 01 de octubre de 2025 Actividad: Explicación de los conceptos de las 3R de los residuos sólidos. Lugar: C.E.D.I. Orinoco	Foto No. 004 Fecha: 01 de octubre de 2025 Actividad: Ejercicio práctico “Aprendamos juntos a clasificar los residuos sólidos”. Lugar: C.E.D.I. Orinoco
	
Foto No. 005 Fecha: 01 de octubre de 2025 Actividad: Entrega de fichas con imágenes de residuos Solidos a los estudiantes. Lugar: C.E.D.I. Orinoco	Foto No. 006 Fecha: 01 de octubre de 2025 Actividad: Entrega de fichas con imágenes de residuos Solidos a los estudiantes. Lugar: C.E.D.I. Orinoco

	
Foto No. 007 Fecha: 01 de octubre de 2025 Actividad: Caracterización de los residuos sólidos en punto ecológico didáctico. Lugar: C.E.D.I. Orinoco	Foto No. 008 Fecha: 01 de octubre de 2025 Actividad: Caracterización de los residuos sólidos en punto ecológico didáctico. Lugar: C.E.D.I. Orinoco
	
Foto No. 009 Fecha: 01 de octubre de 2025 Actividad: Entrega de refrigerios a los estudiantes. Lugar: C.E.D.I. Orinoco	Foto No. 010 Fecha: 03 de octubre de 2025 Actividad: Entrega de refrigerios a los estudiantes. Lugar: C.E.D.I. Orinoco

Comunidad No. 2: Sector Bureche
BARRIO MILAGRO II

Dirección: Calle 70 # 807- Troncal del Caribe
Lugar: Comedor comunitario
Jornada: Tarde
No. total de participantes: 20 participantes

La jornada contó con la participación de 20 participantes, con edades comprendidas entre los 22 y 70 años, distribuidos en 19 mujeres y 1 hombre.

POBLACIÓN BENEFICIADA	
Cantidad	
Mujeres	**Hombres**
19	1
Total	20

A continuación, se detalla las características de la población antes mencionada:

De acuerdo con los beneficiarios directos, se registra grupo etario al que pertenece:	**Cantidad**	
	Mujeres	**Hombres**
Infancia (6 a 11 años)	0	0
Adolescencia (12 a 17 años)	0	0
Jóvenes (18 a 28 años)	8	0
Adultos (29 a 59 años)	10	1
Adultos mayores (mayores de 60 años)	1	0
Total	**19**	**1**

REGISTRO FOTOGRÁFICO: BARRIO MILAGRO II

	
Foto No. 001 Fecha: 03 de octubre de 2025 Actividad: Presentación de la jornada sobre caracterización de residuos sólidos. Lugar: Comedor comunitario Milagro II	Foto No. 002 Fecha: 03 de octubre de 2025 Actividad: Explicación sobre la separación en el código de colores. Lugar: Comedor comunitario Milagro II
	
Foto No. 003 Fecha: 03 de octubre de 2025 Actividad: Explicación sobre la separación en el código de colores. Lugar: Comedor comunitario Milagro II	Foto No. 004 Fecha: 03 de octubre de 2025 Actividad: Ejercicio práctico “Aprendamos juntos a clasificar los residuos sólidos”. Lugar: Comedor comunitario Milagro II

	
Foto No. 005 Fecha: 03 de octubre de 2025 Actividad: Ejercicio práctico “Aprendamos juntos a clasificar los residuos sólidos”. Lugar: Comedor comunitario Milagro II	Foto No. 006 Fecha: 03 de octubre de 2025 Actividad: Ejercicio práctico “Aprendamos juntos a clasificar los residuos sólidos”. Lugar: Comedor comunitario Milagro II
	
Foto No. 007 Fecha: 03 de octubre de 2025 Actividad: Caracterización de los residuos sólidos en punto ecológico didáctico. Lugar: Comedor comunitario Milagro II	Foto No. 008 Fecha: 03 de octubre de 2025 Actividad: Caracterización de los residuos sólidos en punto ecológico didáctico. Lugar: Comedor comunitario Milagro II

	
Foto No. 009 Fecha: 03 de octubre de 2025 Actividad: Caracterización de los residuos sólidos en punto ecológico didáctico. Lugar: Comedor comunitario Milagro II	Foto No. 010 Fecha: 03 de octubre de 2025 Actividad: Caracterización de los residuos sólidos en punto ecológico didáctico. Lugar: Comedor comunitario Milagro II
	
Foto No. 011 Fecha: 03 de octubre de 2025 Actividad: Entrega de refrigerios a los participantes. Lugar: Comedor comunitario Milagro II	Foto No. 012 Fecha: 03 de octubre de 2025 Actividad: Entrega de refrigerios a los participantes. Lugar: Comedor comunitario Milagro II

ANEXOS

- Listados de Asistencia – C.E.D.I. Orinoco - octubre
- Listados de Asistencia – Barrio Milagro II - octubre
- Meta 1 - Actividad No 6 - PIESPA 2025

FECHA	15 y 16 de octubre	**HORA**	Mañana
META	Meta No. 1: Sensibilizar en temáticas para el cuidado y protección de los cuerpos de agua y de sus ecosistemas, en las instituciones educativa, comunidad y gremios en general que se encuentren dentro del área de influencia del proyecto.		
TEMA	Actividad No. 7 Jornada de sensibilización “ambiental y cultural” para la construcción de acciones que generen grandes cambios en el cuidado y protección de los cuerpos de agua.		
OBJETIVO GENERAL	Promover acciones de educación para generar cultura ambiental en la población objetivo de la campaña, en relación con el uso adecuado del recurso hídrico.		
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	Promover el cuidado y el uso adecuado del recurso hídrico, a través de actividades lúdicas y reflexivas. Fomentar prácticas responsables y sostenibles relacionadas con el agua.		
LUGAR	I.E.D. Quinto Centenario y C.E.D.I. Orinoco.		
PROFESIONAL RESPONSABLE	Daxy Aguas Beleño	**CARGO**	Ingeniera Ambiental
CONTRATO	Contrato de Obra Pública No. LP 006 de 2023		
PROYECTO:	“INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES”		

PARTICIPANTES

1. Institución Educativa Distrital Quinto Centenario
2. Centro Educativo Distrital e Intercultural Orinoco

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Objetivo de la jornada de sensibilización: Promover acciones de educación para generar cultura ambiental en la población objetivo de la campaña, en relación con el uso adecuado del recurso hídrico.

Para el desarrollo de la jornada se aplicó la siguiente metodología:

1. En primer lugar, el grupo PIESPA inició la jornada con un saludo de apertura que permitió dar la bienvenida a los asistentes.

2. A continuación, se desarrolló la dinámica denominada Parejas del río, un juego educativo y participativo diseñado para reforzar conceptos clave sobre el cuidado del agua. Inicialmente, cada participante tomó un papel con un número secreto de un

recipiente. Una vez todos contaban con su número, buscaron su pareja con el mismo número, conformando así las binas de trabajo. Posteriormente, a cada pareja se le asignó una acción relacionada con el uso cotidiano del agua, la cual representaron mediante mímicas, mientras el resto de los asistentes adivinó la acción.

3. Seguidamente, a partir de las acciones representadas, se resaltó la importancia del agua en nuestras vidas. Se explicó la temática relacionada con los diferentes usos del recurso hídrico.

4. Posteriormente, se planteó la pregunta central de la jornada: ¿Qué pasaría si el agua desapareciera? La reflexión colectiva concluyó que la vida no existiría, pues todos los seres vivos desde los árboles más altos hasta los animales más pequeños, incluyendo a los seres humanos necesitan agua para vivir, crecer y funcionar.

5. De igual manera, se abordó el tema del ciclo del agua en Santa Marta, dónde se encuentra este recurso en la naturaleza y qué factores afectan su funcionamiento. Se enfatizó la importancia de comprender estos procesos para entender lo que está ocurriendo con los cuerpos de agua locales y cómo las actividades humanas inciden en su equilibrio.
6. Más adelante, se realizó la dinámica Detectives del agua, en la cual los participantes identificaron usos responsables y no responsables del agua en la vida cotidiana. A través de notas y ejemplos, se compartieron recomendaciones prácticas sobre cómo ahorrar agua en el hogar, la escuela y la comunidad.

7. Finalmente, se desarrolló la actividad artística Mi compromiso con el agua. En equipos, los participantes elaboraron y socializaron carteles, dibujos o poemas con mensajes de protección y cuidado del recurso hídrico. La jornada concluyó con la entrega de refrigerios.

La Jornada de sensibilización, se realizó en la I.E.D. Quinto Centenario y el C.E.D.I. Orinoco, ubicadas en Santa Marta. A continuación, se describen las poblaciones beneficiadas.

Comunidad No. 1: Sector Bureche
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL QUINTO CENTENARIO

Dirección: Kilometro 13, Sector Bureche Vía alterna
Jornada: Mañana
Niveles / Grados: Primaria y Secundaria
Rector: Shirlen Jiménez
No. total de participantes: 25 participantes

La jornada se desarrolló con la participación de 25 estudiantes con edades entre 11 y 17 años, distribuidos en 16 mujeres y 9 hombres.

POBLACIÓN BENEFICIADA	
Cantidad	
Mujeres	**Hombres**
16	9
Total	25

A continuación, se detalla las características de la población antes mencionada:

De acuerdo con los beneficiarios directos, se registra grupo etario al que pertenece:	**Cantidad**	
	Mujeres	**Hombres**
Infancia (6 a 11 años)	3	0
Adolescencia (12 a 17 años)	13	9
Jóvenes (18 a 28 años)	0	0
Adultos (29 a 59 años)	0	0
Adultos mayores (mayores de 60 años)	0	0
Total	**16**	**9**

REGISTRO FOTOGRÁFICO: I.E.D. QUINTO CENTENARIO



Foto No. 001
Fecha: 15 de octubre de 2025
Actividad: Introducción a la jornada ambiental y cultural
Lugar: I.E.D. Quinto Centenario



Foto No. 002
Fecha: 15 de octubre de 2025
Actividad: Instrucciones para la actividad lúdica.
Lugar: I.E.D. Quinto Centenario

Fotos



Foto No. 003
Fecha: 15 de octubre de 2025
Actividad: Desarrollo de la actividad lúdica “Parejas del Río”.
Lugar: I.E.D. Quinto Centenario



Foto No. 004
Fecha: 15 de octubre de 2025
Actividad: Desarrollo de la actividad lúdica “Parejas del Río”.
Lugar: I.E.D. Quinto Centenario



Foto No. 005
Fecha: 15 de octubre de 2025
Actividad: Representación de acciones cotidianas relacionadas con el agua.
Lugar: I.E.D. Quinto Centenario



Foto No. 006
Fecha: 15 de octubre de 2025
Actividad: Representación de acciones cotidianas relacionadas con el agua.
Lugar: I.E.D. Quinto Centenario



Foto No. 007
Fecha: 15 de octubre de 2025
Actividad: Socialización de la temática relacionada con los diferentes usos del recurso hídrico.
Lugar: I.E.D. Quinto Centenario



Foto No. 008
Fecha: 15 de octubre de 2025
Actividad: Socialización de la temática relacionada con los diferentes usos del recurso hídrico.
Lugar: I.E.D. Quinto Centenario

	
Foto No. 009 Fecha: 15 de octubre de 2025 Actividad: Realización de la dinámica “Detectives del agua”. Lugar: I.E.D. Quinto Centenario	Foto No. 010 Fecha: 15 de octubre de 2025 Actividad: Realización de la dinámica “Detectives del agua”. Lugar: I.E.D. Quinto Centenario
	
Foto No. 011 Fecha: 15 de octubre de 2025 Actividad: Realización de la dinámica “Detectives del agua”. Lugar: I.E.D. Quinto Centenario	Foto No. 012 Fecha: 15 de octubre de 2025 Actividad: Socialización de la dinámica “Detectives del agua”. Lugar: I.E.D. Quinto Centenario



Foto No. 013
Fecha: 15 de octubre de 2025
Actividad: Actividad artística Mi compromiso con el agua.
Lugar: I.E.D. Quinto Centenario



Foto No. 014
Fecha: 15 de octubre de 2025
Actividad: Actividad artística Mi compromiso con el agua
Lugar: I.E.D. Quinto Centenario



Foto No. 015
Fecha: 15 de octubre de 2025
Actividad: Socialización de la actividad artística
Mi compromiso con el agua.
Lugar: I.E.D. Quinto Centenario



Foto No. 016
Fecha: 15 de octubre de 2025
Actividad: Socialización de la actividad artística
Mi compromiso con el agua.
Lugar: I.E.D. Quinto Centenario

	
Foto No. 017 Fecha: 15 de octubre de 2025 Actividad: Socialización de la actividad artística Mi compromiso con el agua. Lugar: I.E.D. Quinto Centenario	Foto No. 018 Fecha: 15 de octubre de 2025 Actividad: Socialización de la actividad artística Mi compromiso con el agua. Lugar: I.E.D. Quinto Centenario
	
Foto No. 019 Fecha: 15 de octubre de 2025 Actividad: Entrega de refrigerios a los estudiantes. Lugar: I.E.D. Quinto Centenario	Foto No. 020 Fecha: 15 de octubre de 2025 Actividad: Entrega de refrigerios a los estudiantes. Lugar: I.E.D. Quinto Centenario

Comunidad No. 1: Río Piedras
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL E INTERCULTURAL ORINOCO, SEDE NO. 2

Dirección: Kilometro 34, Vereda Los Cocos
Jornada: Mañana
Niveles / Grados: Primaria y Secundaria
Rector: Víctor Paba
No. total de participantes: 22 estudiantes

La jornada se desarrolló con la participación de 22 estudiantes con edades entre 10 y 17 años, distribuidos en 10 mujeres y 12 hombres.

POBLACIÓN BENEFICIADA	
Cantidad	
Mujeres	**Hombres**
10	12
Total	22

A continuación, se detalla las características de la población antes mencionada:

De acuerdo con los beneficiarios directos, se registra grupo etario al que pertenece:	**Cantidad**	
	Mujeres	**Hombres**
Infancia (6 a 11 años)	2	1
Adolescencia (12 a 17 años)	8	11
Jóvenes (18 a 28 años)	0	0
Adultos (29 a 59 años)	0	0
Adultos mayores (mayores de 60 años)	0	0
Total	**10**	**12**

REGISTRO FOTOGRÁFICO: CEDI ORINOCO



Foto No. 001
Fecha: 16 de octubre de 2025
Actividad: Introducción a la jornada ambiental y cultural.
Lugar: C.E.D.I. Orinoco



Foto No. 002
Fecha: 16 de octubre de 2025
Actividad: Instrucciones para la actividad lúdica Parejas del Río.
Lugar: C.E.D.I. Orinoco



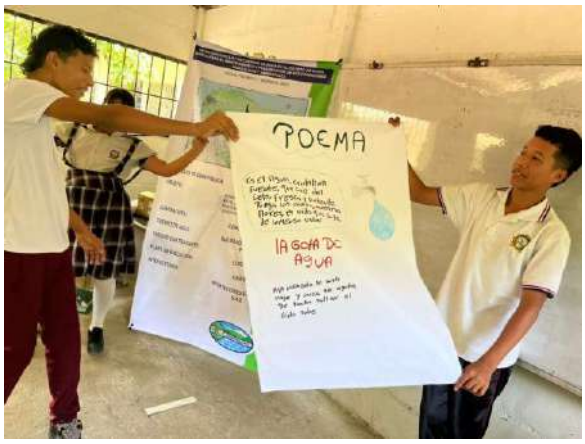
Foto No. 003
Fecha: 16 de octubre de 2025
Actividad: Representación de acciones cotidianas relacionadas con el agua.
Lugar: C.E.D.I. Orinoco



Foto No. 004
Fecha: 16 de octubre de 2025
Actividad: Representación de acciones cotidianas relacionadas con el agua.
Lugar: Lugar: C.E.D.I. Orinoco

	
Foto No. 005 Fecha: 16 de octubre de 2025 Actividad: Socialización de la temática relacionada con los diferentes usos del recurso hídrico. Lugar: C.E.D.I. Orinoco	Foto No. 006 Fecha: 16 de octubre de 2025 Actividad: Socialización de acciones para el cuidado del agua. Lugar: Lugar: C.E.D.I. Orinoco
	
Foto No. 007 Fecha: 16 de octubre de 2025 Actividad: Realización de la dinámica “Detectives del agua”. Lugar: C.E.D.I. Orinoco	Foto No. 008 Fecha: 16 de octubre de 2025 Actividad: Realización de la dinámica “Detectives del agua”. Lugar: Lugar: C.E.D.I. Orinoco

	
Foto No. 009 Fecha: 16 de octubre de 2025 Actividad: Actividad artística Mi compromiso con el agua. Lugar: C.E.D.I. Orinoco	Foto No. 010 Fecha: 16 de octubre de 2025 Actividad: Elaboración de carteles sobre la actividad “Mi compromiso con el agua”. Lugar: Lugar: C.E.D.I. Orinoco
	
Foto No. 011 Fecha: 16 de octubre de 2025 Actividad: Socialización de la actividad artística Mi compromiso con el agua. Lugar: C.E.D.I. Orinoco	Foto No. 012 Fecha: 16 de octubre de 2025 Actividad: Socialización de la actividad artística Mi compromiso con el agua. Lugar: Lugar: C.E.D.I. Orinoco

	
Foto No. 013 Fecha: 16 de octubre de 2025 Actividad: Socialización de la actividad artística Mi compromiso con el agua. Lugar: C.E.D.I. Orinoco	Foto No. 014 Fecha: 16 de octubre de 2025 Actividad: Entrega de refrigerios a los estudiantes. Lugar: Lugar: C.E.D.I. Orinoco

ANEXOS

- Listados de Asistencia – I.E.D. Quinto Centenario - octubre
- Listados de Asistencia – C.E.D.I. Orinoco - octubre
- Meta 1 - Actividad No 7 - PIESPA 2025

FECHA	15 y 16 de octubre	**HORA**	Mañana
META	Meta No. 2: Realizar jornadas de sensibilización que permitan la identificación de estrategias para la conservación de restauración ambiental de los cuerpos de agua principales en el distrito de santa marta con las instituciones educativa, comunidad y gremios en general que se encuentren dentro del área de influencia del proyecto.		
TEMA	Actividad No. 1 Jornada de sensibilización para la adaptación al cambio climático asociados a los cuerpos de agua.		
OBJETIVO GENERAL	Fortalecer los conocimientos y herramientas de las comunidades a través de actividades cotidianas que contribuyan a la disminución de los efectos adversos del cambio climático.		
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	Fortalecer la comprensión de los participantes sobre el cambio climático, sus causas y efectos, mediante exposiciones y recursos audiovisuales que faciliten el conocimiento de su impacto a nivel global y local. Promover prácticas responsables y sostenibles en la vida cotidiana que mitiguen la problemática del cambio climático alrededor de los cuerpos de agua del distrito.		
LUGAR	I.E.D. Quinto Centenario y C.E.D.I. Orinoco.		
PROFESIONAL RESPONSABLE	Daxy Aguas Beleño	**CARGO**	Ingeniera Ambiental
CONTRATO	Contrato de Obra Pública No. LP 006 de 2023		
PROYECTO:	“INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES”		

PARTICIPANTES

3. Institución Educativa Distrital Quinto Centenario
4. Centro Educativo Distrital e Intercultural Orinoco

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Objetivo de la jornada de sensibilización: Promover acciones de educación para generar cultura ambiental en la población objetivo de la campaña, en relación con el uso adecuado del recurso hídrico.

Para el desarrollo de la jornada se aplicó la siguiente metodología:

1. La jornada inició con un saludo cordial por parte del grupo encargado.

2. Seguidamente, se realizó una exposición sobre los principales conceptos relacionados con el cambio climático. Se abordaron temas como su definición, las causas principales, el efecto invernadero, los impactos globales y las alteraciones locales.

3. Para reforzar la sensibilización, se presentó un documental que ejemplificó diversos efectos negativos del cambio climático que se vienen manifestando alrededor del mundo. La proyección permitió visualizar de manera concreta las problemáticas ambientales y sociales derivadas de este fenómeno, generando un espacio de reflexión entre los asistentes.

4. Posteriormente, se desarrolló una dinámica de preguntas de selección múltiple y asociación. Los participantes identificaron y relacionaron las causas que originaron los escenarios presentados en el documental.

5. Finalmente, se entregó un refrigerio a los asistentes.

La Jornada de sensibilización, se realizó en la I.E.D. Quinto Centenario y en el C.E.D.I. Orinoco ubicadas en Santa Marta. A continuación, se describen las poblaciones beneficiadas.

Comunidad No. 1: Sector Bureche
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL QUINTO CENTENARIO

Dirección: Kilometro 13, Sector Bureche Vía alterna
Jornada: Mañana
Niveles / Grados: Primaria y Secundaria
Rector: Shirlen Jiménez
No. total de participantes: 25 participantes

La jornada se desarrolló con la participación de 25 estudiantes con edades entre 11 y 17 años, distribuidos en 16 mujeres y 9 hombres.

POBLACIÓN BENEFICIADA	
Cantidad	
Mujeres	**Hombres**
16	9
Total	25

A continuación, se detalla las características de la población antes mencionada:

De acuerdo con los beneficiarios directos, se registra grupo etario al que pertenece:	**Cantidad**	
	Mujeres	**Hombres**
Infancia (6 a 11 años)	3	0
Adolescencia (12 a 17 años)	13	9
Jóvenes (18 a 28 años)	0	0
Adultos (29 a 59 años)	0	0
Adultos mayores (mayores de 60 años)	0	0
Total	**16**	**9**

REGISTRO FOTOGRÁFICO: I.E.D. QUINTO CENTENARIO



Foto No. 001
Fecha: 15 de octubre de 2025
Actividad: Introducción a la jornada sobre cambio climático.
Lugar: I.E.D. Quinto Centenario



Foto No. 002
Fecha: 15 de octubre de 2025
Actividad: Exposición sobre los principales conceptos relacionados con el cambio climático.
Lugar: I.E.D. Quinto Centenario



Foto No. 003
Fecha: 15 de octubre de 2025
Actividad: Exposición sobre los principales conceptos relac con el cambio climático.
Lugar: I.E.D. Quinto Centenario



Foto No. 004
Fecha: 15 de octubre de 2025
Actividad: Proyección del documental sobre el cambio climático.
Lugar: I.E.D. Quinto Centenario

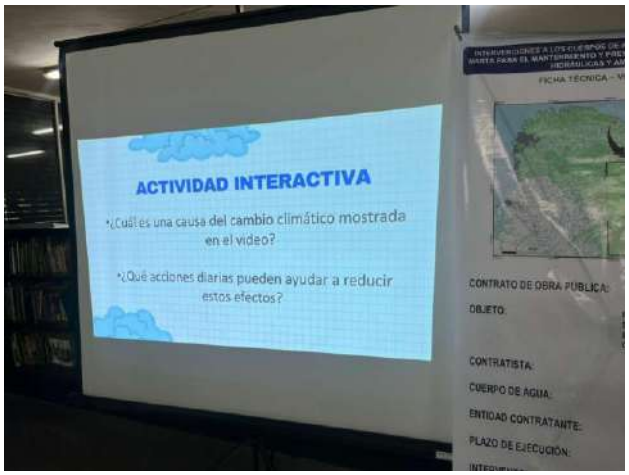


Foto No. 005
Fecha: 15 de octubre de 2025
Actividad: Desarrollo de la actividad interactiva.
Lugar: I.E.D. Quinto Centenario



Foto No. 006
Fecha: 15 de octubre de 2025
Actividad: Cuestionario sobre documental del cambio climático.
Lugar: I.E.D. Quinto Centenario

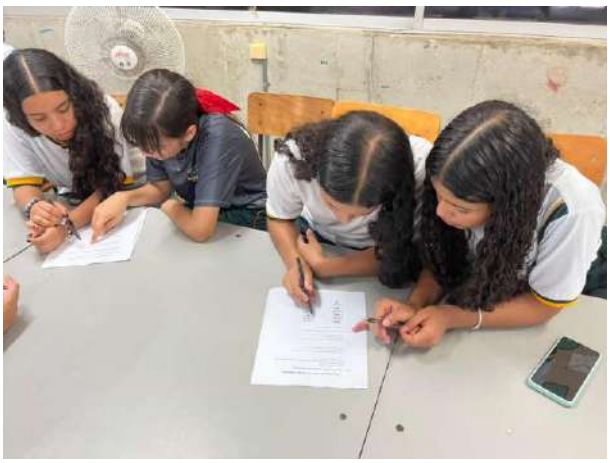


Foto No. 007
Fecha: 15 de octubre de 2025
Actividad: Cuestionario sobre documental del cambio climático.
Lugar: I.E.D. Quinto Centenario



Foto No. 008
Fecha: 15 de octubre de 2025
Actividad: Cuestionario sobre documental del cambio climático.
Lugar: I.E.D. Quinto Centenario

	
Foto No. 009 Fecha: 15 de octubre de 2025 Actividad: Entrega de refrigerios a los estudiantes. Lugar: I.E.D. Quinto Centenario	Foto No. 010 Fecha: 15 de octubre de 2025 Actividad: Entrega de refrigerios a los estudiantes. Lugar: I.E.D. Quinto Centenario

Comunidad No. 2: Río Piedras
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL E INTERCULTURAL ORINOCO, SEDE NO. 2

Dirección: Kilometro 34, Vereda Los Cocos
Jornada: Mañana
Niveles / Grados: Primaria y Secundaria
Rector: Víctor Paba
No. total de participantes: 28 estudiantes

La jornada se desarrolló con la participación de 28 estudiantes con edades entre 11 y 20 años, distribuidos en 10 mujeres y 18 hombres.

POBLACIÓN BENEFICIADA	
Cantidad	
Mujeres	**Hombres**
10	18
Total	28

A continuación, se detalla las características de la población antes mencionada:

De acuerdo con los beneficiarios directos, se registra grupo etario al que pertenece:	**Cantidad**	
	Mujeres	**Hombres**
Infancia (6 a 11 años)	0	1
Adolescencia (12 a 17 años)	10	17
Jóvenes (18 a 28 años)	0	0
Adultos (29 a 59 años)	0	0
Adultos mayores (mayores de 60 años)	0	0
Total	**10**	**18**

REGISTRO FOTOGRÁFICO: CEDI ORINOCO

	
Foto No. 001 Fecha: 16 de octubre de 2025 Actividad: Introducción a la jornada sobre cambio climático. Lugar: C.E.D.I. Orinoco	Foto No. 002 Fecha: 16 de octubre de 2025 Actividad: Exposición sobre los principales conceptos relacionados con el cambio climático. Lugar: C.E.D.I. Orinoco
	
Foto No. 003 Fecha: 16 de octubre de 2025 Actividad: Exposición sobre los principales conceptos relacionados con el cambio climático. Lugar: C.E.D.I. Orinoco	Foto No. 004 Fecha: 16 de octubre de 2025 Actividad: Proyección del documental sobre el cambio climático. Lugar: C.E.D.I. Orinoco

	
Foto No. 005 Fecha: 16 de octubre de 2025 Actividad: Proyección del documental sobre el cambio climático. Lugar: C.E.D.I. Orinoco	Foto No. 006 Fecha: 16 de octubre de 2025 Actividad: Desarrollo de la actividad interactiva. Lugar: C.E.D.I. Orinoco

	
Foto No. 007 Fecha: 16 de octubre de 2025 Actividad: Cuestionario sobre documental del cambio climático. Lugar: C.E.D.I. Orinoco	Foto No. 008 Fecha: 16 de octubre de 2025 Actividad: Cuestionario sobre documental del cambio climático. Lugar: C.E.D.I. Orinoco

	
Foto No. 009 Fecha: 16 de octubre de 2025 Actividad: Participación de los asistentes en la actividad lúdica “Separando para salvar el río”. Lugar: C.E.D.I. Orinoco	Foto No. 010 Fecha: 16 de octubre de 2025 Actividad: Entrega de refrigerios a los asistentes. Lugar: C.E.D.I. Orinoco

ANEXOS

- Listados de Asistencia – I.E.D. Quinto Centenario - octubre
- Listados de Asistencia – C.E.D.I. Orinoco - octubre
- Meta 2 - Actividad No 1 - PIESPA 2025

FECHA	24, 28, 29 y 31 de octubre	**HORA**	Mañana/Tarde
META	Meta No. 2: Realizar jornadas de sensibilización que permitan la identificación de estrategias para la conservación de restauración ambiental de los cuerpos de agua principales en el distrito de santa marta con las instituciones educativa, comunidad y gremios en general que se encuentren dentro del área de influencia del proyecto.		
TEMA	Actividad No. 2 Jornada de sensibilización para la gestión del riesgo de desastres, asociados a los cuerpos de agua.		
OBJETIVO GENERAL	Realizar actividades que permitan el análisis y reflexión colectiva en relación con la prevención y gestión del riesgo asociados a los cuerpos de agua.		
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	Describir los riesgos vinculados a los cuerpos de agua, identificando las principales amenazas, las condiciones de vulnerabilidad y los factores de riesgo que aumentan la exposición de las comunidades. Fortalecer las capacidades de prevención y gestión del riesgo de desastres, mediante aprendizajes prácticos y dinámica, como estrategia de respuesta frente a las amenazas asociadas a los cuerpos de agua.		
LUGAR	I.E.D. Liceo del Sur Camilo Torres, C.E.D.I. Orinoco, I.E.D. Quinto Centenario y Milagro II.		
PROFESIONAL RESPONSABLE	Daxy Aguas Beleño	**CARGO**	Ingeniera Ambiental
CONTRATO	Contrato de Obra Pública No. LP 006 de 2023		
PROYECTO:	“INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES”		

PARTICIPANTES

1. Institución Educativa Distrital Liceo del Sur Camilo Torres
2. Centro Educativo Distrital e Intercultural Orinoco
3. Institución Educativa Distrital Quinto Centenario
4. Barrio Milagro II

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Objetivo de la jornada de sensibilización: Realizar actividades que permitan el análisis y reflexión colectiva en relación con la prevención y gestión del riesgo asociados a los cuerpos de agua.

Para el desarrollo de la jornada se aplicó la siguiente metodología:

1. La jornada inició con una cálida bienvenida por parte del grupo encargado, quienes motivaron a los asistentes a participar activamente en las actividades programadas.
2. Seguidamente, se realizó una exposición sobre los principales conceptos relacionados con la gestión del riesgo de desastres. Se abordaron temas como la definición de amenaza, su clasificación y tipos, la vulnerabilidad con ejemplos prácticos, el concepto de riesgo y sus factores, así como el de desastre y las medidas para su gestión. Además, se explicó cómo la gestión del riesgo se vive en la cotidianidad y su relevancia para la seguridad comunitaria.

3. Posteriormente, se aplicó una prueba de vulnerabilidad familiar compuesta por siete preguntas con respuestas de tipo “sí” o “no”. Esta actividad permitió a los participantes identificar el nivel de preparación de sus hogares frente a posibles emergencias. A continuación, se socializó la importancia de contar con un plan familiar de emergencias como herramienta preventiva.

4. De igual manera, se proyectó un video educativo que explicó las acciones básicas que deben realizarse en caso de una inundación. El material audiovisual brindó pautas claras y prácticas para reducir riesgos y proteger la vida en situaciones de emergencia. También**,** se presentó información sobre las entidades responsables de atender emergencias y desastres, sus funciones y el papel que cumplen en la protección de la comunidad.

5. Más adelante, se desarrolló una dinámica participativa en la que los asistentes relacionaron conceptos clave con imágenes. Además, la jornada incluyó la actividad denominada Escala de Riesgos, un juego didáctico sobre la prevención de desastres. El recorrido en forma de escalera, acompañado de un paisaje atractivo, contenía mensajes educativos, preguntas, sorpresas y recomendaciones. A través del lanzamiento de un dado y el avance con fichas, los participantes identificaron buenas prácticas que disminuyen el impacto de los desastres y malas prácticas que aumentan la vulnerabilidad.

6. Finalmente, se entregó un refrigerio a los asistentes.

La Jornada de sensibilización, se realizó en tres las instituciones educativas y un barrio de Santa Marta. A continuación, se describen las poblaciones beneficiadas.

Comunidad No. 1: Sector Manzanares
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL LICEO DEL SUR CAMILO TORRES

Dirección: Carrera 5ta Calle 34
Jornada: Mañana
Niveles / Grados: Primaria
Rector: Joaquín Linero
No. total de participantes: 22 estudiantes

La jornada se desarrolló con la participación de estudiantes del grado 3° de la sede primaria de la IED Liceo del Sur Camilo Torres con edades entre 8 y 11 años, distribuidos en 7 mujeres y 15 hombres.

POBLACIÓN BENEFICIADA	
Cantidad	
Mujeres	**Hombres**
7	15
Total	22

A continuación, se detalla las características de la población antes mencionada:

De acuerdo con los beneficiarios directos, se registra grupo etario al que pertenece:	**Cantidad**	
	Mujeres	**Hombres**
Infancia (6 a 11 años)	7	15
Adolescencia (12 a 17 años)	0	0
Jóvenes (18 a 28 años)	0	0
Adultos (29 a 59 años)	0	1
Adultos mayores (mayores de 60 años)	0	0
Total	**7**	**15**

REGISTRO FOTOGRÁFICO: I.E.D LICEO DEL SUR CAMILO TORRES

	
Foto No. 001 Fecha: 24 de octubre de 2025 Actividad: Introducción de la jornada sobre la gestión del riesgo de desastres. Lugar: I.E.D. Liceo del Sur Camilo Torres	Foto No. 002 Fecha: 24 de octubre de 2025 Actividad: Socialización de los objetivos de la jornada. Lugar: I.E.D. Liceo del Sur Camilo Torres
	
Foto No. 003 Fecha: 24 de octubre de 2025 Actividad: Explicación de los principales conceptos de la gestión del riesgo de desastres. Lugar: I.E.D. Liceo del Sur Camilo Torres	Foto No. 004 Fecha: 24 de octubre de 2025 Actividad: Explicación de los principales conceptos de la gestión del riesgo de desastres. Lugar: I.E.D. Liceo del Sur Camilo Torres

	
Foto No. 005 Fecha: 24 de octubre de 2025 Actividad: Actividad sobre relación de conceptos con imágenes. Lugar: I.E.D. Liceo del Sur Camilo Torres	Foto No. 006 Fecha: 24 de octubre de 2025 Actividad: Actividad sobre relación de conceptos con imágenes. Lugar: I.E.D. Liceo del Sur Camilo Torres
	
Foto No. 007 Fecha: 24 de octubre de 2025 Actividad: Desarrollo de la actividad denominada Escala de Riesgos. Lugar: I.E.D. Liceo del Sur Camilo Torres	Foto No. 008 Fecha: 24 de octubre de 2025 Actividad: Desarrollo de la actividad denominada Escala de Riesgos. Lugar: I.E.D. Liceo del Sur Camilo Torres

	
Foto No. 009 Fecha: 24 de octubre de 2025 Actividad: Desarrollo de la actividad denominada Escala de Riesgos. Lugar: I.E.D. Liceo del Sur Camilo Torres	Foto No. 010 Fecha: 24 de octubre de 2025 Actividad: Desarrollo de la actividad denominada Escala de Riesgos. Lugar: I.E.D. Liceo del Sur Camilo Torres

	
Foto No. 011 Fecha: 24 de octubre de 2025 Actividad: Desarrollo de la actividad denominada Escala de Riesgos. Lugar: I.E.D. Liceo del Sur Camilo Torres	Foto No. 012 Fecha: 24 de octubre de 2025 Actividad: Desarrollo de la actividad denominada Escala de Riesgos. Lugar: I.E.D. Liceo del Sur Camilo Torres

Comunidad No. 2: Río Piedras
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL E INTERCULTURAL ORINOCO, SEDE NO. 2

Dirección: Kilometro 34, Vereda Los Cocos
Jornada: Mañana
Niveles / Grados: Primaria y Secundaria
Rector: Víctor Paba
No. Total de participantes: 30 estudiantes

La jornada se desarrolló con la participación de 30 estudiantes con edades entre 10 y 17 años, distribuidos en 10 mujeres y 20 hombres.

POBLACIÓN BENEFICIADA	
Cantidad	
Mujeres	**Hombres**
10	20
Total	30

A continuación, se detalla las características de la población antes mencionada:

De acuerdo con los beneficiarios directos, se registra grupo etario al que pertenece:	**Cantidad**	
	Mujeres	**Hombres**
Infancia (6 a 11 años)	2	2
Adolescencia (12 a 17 años)	8	18
Jóvenes (18 a 28 años)	0	0
Adultos (29 a 59 años)	0	0
Adultos mayores (mayores de 60 años)	0	0
Total	**10**	**20**

REGISTRO FOTOGRÁFICO: CEDI ORINOCO



Foto No. 001
Fecha: 28 de octubre de 2025
Actividad: Socialización de los objetivos de la jornada.
Lugar: C.E.D.I. Orinoco



Foto No. 002
Fecha: 28 de octubre de 2025
Actividad: Explicación de los principales conceptos de gestión del riesgo de desastres.
Lugar: C.E.D.I. Orinoco



Foto No. 003
Fecha: 28 de octubre de 2025
Actividad: Explicación de los principales conceptos de la gestión del riesgo de desastres.
Lugar: C.E.D.I. Orinoco



Foto No. 004
Fecha: 28 de octubre de 2025
Actividad: Explicación de los principales conceptos de la gestión del riesgo de desastres.
Lugar: C.E.D.I. Orinoco

	
Foto No. 005 Fecha: 28 de octubre de 2025 Actividad: Actividad sobre relación de conceptos con imágenes. Lugar: C.E.D.I. Orinoco	Foto No. 006 Fecha: 28 de octubre de 2025 Actividad: Actividad sobre relación de conceptos con imágenes. Lugar: C.E.D.I. Orinoco
	
Foto No. 007 Fecha: 28 de octubre de 2025 Actividad: Desarrollo de la actividad denominada Escala de Riesgos. Lugar: C.E.D.I. Orinoco	Foto No. 008 Fecha: 28 de octubre de 2025 Actividad: Desarrollo de la actividad denominada Escala de Riesgos. Lugar: C.E.D.I. Orinoco

	
Foto No. 009 Fecha: 28 de octubre de 2025 Actividad: Desarrollo de la actividad denominada Escala de Riesgos. Lugar: C.E.D.I. Orinoco	Foto No. 010 Fecha: 28 de octubre de 2025 Actividad: Desarrollo de la actividad denominada Escala de Riesgos. Lugar: C.E.D.I. Orinoco
	
Foto No. 011 Fecha: 28 de octubre de 2025 Actividad: Entrega de refrigerios a los estudiantes. Lugar: C.E.D.I. Orinoco	Foto No. 012 Fecha: 28 de octubre de 2025 Actividad: Entrega de refrigerios a los estudiantes. Lugar: C.E.D.I. Orinoco

Comunidad No. 3: Sector Manzanares
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL QUINTO CENTENARIO

Dirección: Kilometro 13, Sector Bureche Vía alterna
Jornada: Mañana
Niveles / Grados: Primaria y Secundaria
Rector: Shirlen Jiménez
No. total de participantes: 25 participantes

La jornada se desarrolló con la participación de 25 estudiantes con edades entre 11 y 17 años, distribuidos en 17 mujeres y 8 hombres.

POBLACIÓN BENEFICIADA	
Cantidad	
Mujeres	**Hombres**
17	8
Total	25

A continuación, se detalla las características de la población antes mencionada:

De acuerdo con los beneficiarios directos, se registra grupo etario al que pertenece:	**Cantidad**	
	Mujeres	**Hombres**
Infancia (6 a 11 años)	2	0
Adolescencia (12 a 17 años)	15	8
Jóvenes (18 a 28 años)	0	0
Adultos (29 a 59 años)	0	0
Adultos mayores (mayores de 60 años)	0	0
Total	**17**	**8**

REGISTRO FOTOGRÁFICO: I.E.D. QUINTO CENTENARIO



Foto No. 001
Fecha: 29 de octubre de 2025
Actividad: Introducción de la jornada sobre la gestión del riesgo de desastres.
Lugar: I.E.D. Quinto Centenario



Foto No. 002
Fecha: 29 de octubre de 2025
Actividad: Explicación de los principales conceptos de la gestión del riesgo de desastres.
Lugar: I.E.D. Quinto Centenario



Foto No. 003
Fecha: 29 de octubre de 2025
Actividad: Explicación de las entidades de gestión del riesgo de desastres.
Lugar: I.E.D. Quinto Centenario



Foto No. 004
Fecha: 29 de octubre de 2025
Actividad: Actividad sobre relación de conceptos con imágenes.
Lugar: I.E.D. Quinto Centenario



Foto No. 005
Fecha: 29 de octubre de 2025
Actividad: Desarrollo de la actividad denominada Escala de Riesgos.
Lugar: I.E.D. Quinto Centenario



Foto No. 006
Fecha: 29 de octubre de 2025
Actividad: Desarrollo de la actividad denominada Escala de Riesgos.
Lugar: I.E.D. Quinto Centenario



Foto No. 007
Fecha: 29 de octubre de 2025
Actividad: Desarrollo de la actividad denominada Escala de Riesgos.
Lugar: I.E.D. Quinto Centenario



Foto No. 008
Fecha: 29 de octubre de 2025
Actividad: Desarrollo de la actividad denominada Escala de Riesgos.
Lugar: I.E.D. Quinto Centenario

	
Foto No. 009 Fecha: 29 de octubre de 2025 Actividad: Desarrollo de la actividad denominada Escala de Riesgos. Lugar: I.E.D. Quinto Centenario	Foto No. 010 Fecha: 29 de octubre de 2025 Actividad: Desarrollo de la actividad denominada Escala de Riesgos. Lugar: I.E.D. Quinto Centenario
	
Foto No. 011 Fecha: 29 de octubre de 2025 Actividad: Entrega de refrigerios a los estudiantes. Lugar: I.E.D. Quinto Centenario	Foto No. 012 Fecha: 29 de octubre de 2025 Actividad: Entrega de refrigerios a los estudiantes. Lugar: I.E.D. Quinto Centenario

Comunidad No. 4: Sector Bureche
BARRIO MILAGRO II

Dirección: Calle 70 # 807- Troncal del Caribe
Lugar: Comedor comunitario
Jornada: Tarde
No. total de participantes: 21 participantes

La jornada contó con la participación de 21 participantes, con edades comprendidas entre los 25 y 72 años, distribuidos en 19 mujeres y 2 hombre.

POBLACIÓN BENEFICIADA	
Cantidad	
Mujeres	**Hombres**
19	2
Total	21

A continuación, se detalla las características de la población antes mencionada:

De acuerdo con los beneficiarios directos, se registra grupo etario al que pertenece:	**Cantidad**	
	Mujeres	**Hombres**
Infancia (6 a 11 años)	0	0
Adolescencia (12 a 17 años)	0	0
Jóvenes (18 a 28 años)	7	0
Adultos (29 a 59 años)	11	2
Adultos mayores (mayores de 60 años)	1	0
Total	**19**	**2**

REGISTRO FOTOGRÁFICO: BARRIO MILAGRO II



Foto No. 001
Fecha: 31 de octubre de 2025
Actividad: Socialización de los objetivos de la jornada.
Lugar: Comedor comunitario Milagro II



Foto No. 002
Fecha: 31 de octubre de 2025
Actividad: Explicación de los principales conceptos de gestión del riesgo de desastres.
Lugar: Comedor comunitario Milagro II



Foto No. 003
Fecha: 31 de octubre de 2025
Actividad: Explicación de los principales conceptos de la gestión del riesgo de desastres.
Lugar: Comedor comunitario Milagro II



Foto No. 004
Fecha: 31 de octubre de 2025
Actividad: Explicación de las entidades de gestión del riesgo de desastres.
Lugar: Comedor comunitario Milagro II



Foto No. 005
Fecha: 31 de octubre de 2025
Actividad: Actividad sobre relación de conceptos con imágenes.
Lugar: Comedor comunitario Milagro II



Foto No. 006
Fecha: 31 de octubre de 2025
Actividad: Desarrollo de la actividad denominada Escala de Riesgos.
Lugar: Comedor comunitario Milagro II



Foto No. 007
Fecha: 31 de octubre de 2025
Actividad: Desarrollo de la actividad denominada Escala de Riesgos.
Lugar: Comedor comunitario Milagro II



Foto No. 008
Fecha: 31 de octubre de 2025
Actividad: Desarrollo de la actividad denominada Escala de Riesgos.
Lugar: Comedor comunitario Milagro II

	
Foto No. 009 Fecha: 31 de octubre de 2025 Actividad: Desarrollo de la actividad denominada Escala de Riesgos. Lugar: Comedor comunitario Milagro II	Foto No. 010 Fecha: 31 de octubre de 2025 Actividad: Desarrollo de la actividad denominada Escala de Riesgos. Lugar: Comedor comunitario Milagro II

ANEXOS

- Listados de Asistencia – I.E.D. Liceo del Sur - octubre
- Listados de Asistencia – C.E.D.I. Orinoco – octubre
- Listados de Asistencia – I.E.D. Quinto Centenario - octubre
- Listados de Asistencia – Barrio Milagro II - octubre
- Meta 2 - Actividad No 2 - PIESPA 2025

FECHA	15, 16 y 17 de octubre	**HORA**	Mañana/Tarde
META	Meta No. 3: Realizar campaña educativo ambiental, enfocadas en el cuidado y protección de los cuerpos de agua y el uso racional de los recursos naturales, de los cuerpos de agua principales en el distrito de Santa Marta.		
TEMA	Actividad No. 5. Acompañamiento-Actividades de Cierre de campaña educativa ambiental, a través de la transformación del material reciclable.		
OBJETIVO GENERAL	Realizar una jornada de muestras de grupos artesanos locales que trabajen en la elaboración y fabricación de materiales reciclables.		
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	Visibilizar el trabajo de los artesanos locales que emplean materiales reciclables en sus procesos de creación, mostrando la diversidad de productos elaborados y su aporte a la sostenibilidad ambiental y al desarrollo comunitario. Involucrar a los participantes en prácticas de transformación de residuos plásticos, mediante ejercicios guiados que fortalezcan la conciencia ambiental y promuevan la adopción de hábitos responsables frente al manejo de materiales reciclables.		
LUGAR	I.E.D. Quinto Centenario, C.E.D.I. Orinoco y Milagro II.		
PROFESIONAL RESPONSABLE	Daxy Aguas Beleño	**CARGO**	Ingeniera Ambiental
CONTRATO	Contrato de Obra Pública No. LP 006 de 2023		
PROYECTO:	“INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES”		

PARTICIPANTES

1. Institución Educativa Distrital Quinto Centenario
2. Centro Educativo Distrital e Intercultural Orinoco
3. Barrio Milagro II

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Objetivo de la jornada de sensibilización: Realizar una jornada de muestras de grupos artesanos locales que trabajen en la elaboración y fabricación de materiales reciclables.

Para el desarrollo de la jornada se aplicó la siguiente metodología:

1. La jornada inició con una bienvenida por parte del grupo encargado, quienes resaltaron el propósito del encuentro y presentaron la temática central orientada a la promoción de prácticas sostenibles mediante el uso de materiales reciclables.

2. A continuación, se realizó la presentación del artesano y emprendedor Robinson Jaraba, quien compartió su experiencia en la elaboración de productos a partir de tapas plásticas y destacó la importancia de la innovación en el aprovechamiento de residuos.

3. Seguidamente, se expusieron las muestras de los trabajos realizados por parte del artesano, entre los que se incluyeron materas cuadradas, redondas y tipo china, juegos de sillas y mesas, estructuras turísticas, puntos ecológicos, casilleros, letreros y otros elementos elaborados con material reciclado.

4. Posteriormente, el artesano ofreció una breve charla en la que explicó el proceso de recolección, selección y transformación de los materiales, resaltando la importancia de la conciencia ambiental y el emprendimiento sostenible.

5. Como parte práctica, se llevó a cabo un ejercicio de transformación del material reciclable, en el cual los participantes conformaron de tres a cuatros equipos para elaborar portaobjetos con tapas plásticas. El artesano explicó el paso a paso y acompañó a los grupos durante todo el proceso, garantizando un aprendizaje participativo y dinámico.

6. Finalmente, se realizó la donación de los productos elaborados a la comunidad, como muestra de compromiso social y ambiental. La jornada concluyó con la entrega de refrigerios a los asistentes

La Jornada de cierre de campaña a través de la transformación del material reciclable, se realizó en instituciones educativas y comunidades ubicadas en Santa Marta. A continuación, se describen las poblaciones beneficiadas.

Comunidad No. 1: Sector Manzanares
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL QUINTO CENTENARIO

Dirección: Kilometro 13, Sector Bureche Vía alterna
Jornada: Mañana
Niveles / Grados: Primaria y Secundaria
Rector: Shirlen Jiménez
No. total de participantes: 25 participantes

La jornada se desarrolló con la participación de 25 estudiantes con edades entre 11 y 17 años, distribuidos en 16 mujeres y 9 hombres.

POBLACIÓN BENEFICIADA	
Cantidad	
Mujeres	**Hombres**
16	9
Total	25

A continuación, se detalla las características de la población antes mencionada:

De acuerdo con los beneficiarios directos, se registra grupo etario al que pertenece:	**Cantidad**	
	Mujeres	**Hombres**
Infancia (6 a 11 años)	3	0
Adolescencia (12 a 17 años)	13	9
Jóvenes (18 a 28 años)	0	0
Adultos (29 a 59 años)	0	0
Adultos mayores (mayores de 60 años)	0	0
Total	**16**	**9**

REGISTRO FOTOGRÁFICO: I.E.D. QUINTO CENTENARIO



Foto No. 001
Fecha: 15 de octubre de 2025
Actividad: Presentación del artesano y emprendedor Robinson Jaraba.
Lugar: I.E.D. Quinto Centenario



Foto No. 002
Fecha: 15 de octubre de 2025
Actividad: Presentación del artesano y emprendedor Robinson Jaraba
Lugar: I.E.D. Quinto Centenario



Foto No. 003
Fecha: 15 de octubre de 2025
Actividad: Exposición de muestras y trabajos realizados en material reciclable por el artesano.
Lugar: I.E.D. Quinto Centenario



Foto No. 004
Fecha: 15 de octubre de 2025
Actividad: Exposición de muestras y trabajos realizados en material reciclable por el artesano.
Lugar: I.E.D. Quinto Centenario



Foto No. 005
Fecha: 15 de octubre de 2025
Actividad: Exploración y explicación del proceso de elaboración de las artesanías ecológicas.
Lugar: I.E.D. Quinto Centenario



Foto No. 006
Fecha: 15 de octubre de 2025
Actividad: Exploración y explicación del proceso de elaboración de las artesanías ecológicas.
Lugar: I.E.D. Quinto Centenario



Foto No. 007
Fecha: 15 de octubre de 2025
Actividad: Entrega de matera hecha en material Reciclable a la institución.
Lugar: I.E.D. Quinto Centenario



Foto No. 008
Fecha: 15 de octubre de 2025
Actividad: Entrega de matera hecha en material Reciclable a la institución.
Lugar: I.E.D. Quinto Centenario

	
Foto No. 009 Fecha: 15 de octubre de 2025 Actividad: Entrega de refrigerios a los estudiantes. Lugar: I.E.D. Quinto Centenario	Foto No. 010 Fecha: 15 de octubre de 2025 Actividad: Entrega de refrigerios a los estudiantes. Lugar: I.E.D. Quinto Centenario

Comunidad No. 2: Río Piedras
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL E INTERCULTURAL ORINOCO, SEDE NO. 2

Dirección: Kilometro 34, Vereda Los Cocos
Jornada: Mañana
Niveles / Grados: Primaria y Secundaria
Rector: Víctor Paba
No. total de participantes: 28 estudiantes

La jornada se desarrolló con la participación de 28 estudiantes con edades entre 11 y 20 años, distribuidos en 11 mujeres y 17 hombres.

POBLACIÓN BENEFICIADA	
Cantidad	
Mujeres	**Hombres**
11	17
Total	28

A continuación, se detalla las características de la población antes mencionada:

De acuerdo con los beneficiarios directos, se registra grupo etario al que pertenece:	**Cantidad**	
	Mujeres	**Hombres**
Infancia (6 a 11 años)	0	1
Adolescencia (12 a 17 años)	11	16
Jóvenes (18 a 28 años)	0	0
Adultos (29 a 59 años)	0	0
Adultos mayores (mayores de 60 años)	0	0
Total	**10**	**17**

REGISTRO FOTOGRÁFICO: CEDI ORINOCO



Foto No. 001
Fecha: 16 de octubre de 2025
Actividad: Exposición de muestras y trabajos realizados en material reciclable por el artesano.
Lugar: C.E.D.I. Orinoco



Foto No. 002
Fecha: 16 de octubre de 2025
Actividad: Exposición de muestras y trabajos realizados.
en material reciclable por el artesano.
Lugar: C.E.D.I. Orinoco



Foto No. 003
Fecha: 16 de octubre de 2025
Actividad: explicación del proceso de elaboración de las artesanías ecológicas.
Lugar: C.E.D.I. Orinoco



Foto No. 004
Fecha: 16 de octubre de 2025
Actividad: explicación del proceso de elaboración de las artesanías ecológicas.
Lugar: C.E.D.I. Orinoco



Foto No. 005
Fecha: 16 de octubre de 2025
Actividad: Exploración de las muestras o artesanías ecológicas.
Lugar: C.E.D.I. Orinoco



Foto No. 006
Fecha: 16 de octubre de 2025
Actividad: Entrega de matera hecha en material Reciclable a la institución.
Lugar: C.E.D.I. Orinoco

	
Foto No. 007 Fecha: 16 de octubre de 2025 Actividad: Entrega de refrigerios a los estudiantes. Lugar: C.E.D.I. Orinoco	Foto No. 008 Fecha: 16 de octubre de 2025 Actividad: Entrega de refrigerios a los estudiantes. Lugar: C.E.D.I. Orinoco

Comunidad No. 3: Sector Bureche
BARRIO MILAGRO II

Dirección: Calle 70 # 807- Troncal del Caribe
Lugar: Comedor comunitario
Jornada: Tarde
No. total de participantes: 20 participantes

La jornada contó con la participación de 20 participantes, con edades comprendidas entre los 24 y 70 años, distribuidos en 20 mujeres.

POBLACIÓN BENEFICIADA	
Cantidad	
Mujeres	**Hombres**
20	0
Total	20

A continuación, se detalla las características de la población antes mencionada:

De acuerdo con los beneficiarios directos, se	**Cantidad**	
	Mujeres	**Hombres**

registra grupo etario al que pertenece:		
Infancia (6 a 11 años)	0	0
Adolescencia (12 a 17 años)	0	0
Jóvenes (18 a 28 años)	10	0
Adultos (29 a 59 años)	8	0
Adultos mayores (mayores de 60 años)	2	0
Total	**20**	**0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO: BARRIO MILAGRO II



Foto No. 001
Fecha: 17 de octubre de 2025
Actividad: Presentación del artesano y emprendedor Robinson Jaraba.
Lugar: Comedor comunitario Milagro II



Foto No. 002
Fecha: 17 de octubre de 2025
Actividad: Presentación del artesano y emprendedor Robinson Jaraba.
Lugar: Comedor comunitario Milagro II



Foto No. 003
Fecha: 17 de octubre de 2025
Actividad: Exposición de muestras y trabajos realizados por el artesano.
Lugar: Comedor comunitario Milagro II



Foto No. 004
Fecha: 17 de octubre de 2025
Actividad: Ejercicio de transformación del material reciclable.
Lugar: Comedor comunitario Milagro II



Foto No. 005
Fecha: 17 de octubre de 2025
Actividad: Ejercicio de transformación del material reciclable.
Lugar: Comedor comunitario Milagro II



Foto No. 006
Fecha: 17 de octubre de 2025
Actividad: Ejercicio de transformación del material reciclable.
Lugar: Comedor comunitario Milagro II

	
Foto No. 007 Fecha: 17 de octubre de 2025 Actividad: Ejercicio de transformación del material reciclable. Lugar: Comedor comunitario Milagro II	Foto No. 008 Fecha: 17 de octubre de 2025 Actividad: Ejercicio de transformación del material reciclable. Lugar: Comedor comunitario Milagro II
	
Foto No. 009 Fecha: 17 de octubre de 2025 Actividad: Ejercicio de transformación del material reciclable. Lugar: Comedor comunitario Milagro II	Foto No. 010 Fecha: 17 de octubre de 2025 Actividad: Ejercicio de transformación del material reciclable. Lugar: Comedor comunitario Milagro II

	
Foto No. 011 Fecha: 17 de octubre de 2025 Actividad: Ejercicio de transformación del material reciclable. Lugar: Comedor comunitario Milagro II	Foto No. 012 Fecha: 17 de octubre de 2025 Actividad: Ejercicio de transformación del material reciclable. Lugar: Comedor comunitario Milagro II

ANEXOS

- Listados de Asistencia – I.E.D. Quinto Centenario - octubre
- Listados de Asistencia – C.E.D.I. Orinoco – octubre
- Listados de Asistencia – Barrio Milagro II - octubre
- Meta 3 - Actividad No 5 - PIESPA 2025

5. CONCLUSIÓN

Las jornadas de sensibilización desarrolladas en octubre de 2025 en el marco del PIESPA consolidaron avances en la construcción de una cultura ambiental y en la apropiación social del territorio por parte de las comunidades priorizadas. La articulación con instituciones educativas y organizaciones comunitarias permitió fortalecer capacidades en la conservación y uso responsable de los recursos hídricos y pesqueros, la protección de la biodiversidad asociada a los ecosistemas acuáticos y el manejo integral de residuos sólidos mediante procesos de caracterización y reciclaje.

De manera complementaria, las jornadas ambientales y culturales promovieron la protección de las fuentes hídricas, la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo, integrando enfoques pedagógicos que reforzaron el compromiso comunitario con la sostenibilidad. El cierre del proceso, a través del taller basado en las cartillas “Aprendiendo para proteger las fuentes hídricas”, consolidó los aprendizajes y aseguró la continuidad de prácticas responsables orientadas al bienestar ambiental y social del territorio.

Fecha de elaboración: Octubre, 2025.	
Elaboró	**Revisó**
	
Daxy Nizayen Aguas Beleño Ing. Ambiental y Sanitaria T.P. No. 021024-0605777 ATL	

CONSORCIO
ICASM2023

ANEXO No. 14

ACTA DE OBRA No.16

ENTIDAD EJECUTORA: CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA " CORPAMAG"

ACTA DE OBRA No. 16

CONTRATO No:	**LP 006 DE 2023**	PERIODO:	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	VIGENCIA	2025
	"INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 330.530.495.016,00	VALOR DE LA VIGENCIA:	$ 11.186.206.374,00
OBJETO:	**PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES**	VALOR CONTRATO ACTUALIZADO:	$ 330.530.495.016,00	VALOR DEL ACTA:	$ 554.009.871,00
	HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES"	PLAZO INICIAL	Ciento cuarenta y siete (147) meses	VALOR ACUMULADO:	$ 2.899.465.240,00
CONTRATISTA:	**CONSORCIO ICASM2023**	PLAZO ACTUALIZADO:	Ciento cuarenta y siete (147) meses	VALOR DE SALDO:	$ 8.286.741.134,00
CONTRATO DE INT.No:	**CM 007 DE 2023**	FECHA DE INICIACIÓN:	19 DE MARZO DE 2024	FECHA DE INICIACIÓN:	20 DE MARZO DE 2025
INTERVENTOR:	**Interventores e Ingenieria S.A.S**	FECHA DE VENCIMENTO:	19 DE JUNIO DE 2036	FECHA DE FINALIZACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
VIGENCIA:	**2025**	PORCENTAJE EJECUTADO TOTAL:	0,17%	PORCENTAJE EJECUTADO:	4,95%
		PORCENTAJE ACUMULADO TOTAL:	3,56%	PORCENTAJE ACUMULADO:	25,92%

AÑO 2025							PRESENTE ACTA		ACUMULADO		SALDO	
ITEM	**ESP.**	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
I. PRELIMINARES						**$ 31.513.384,00**		**$ 7.878.346,00**		**$ 19.695.865,00**		**$ 11.817.519,00**
1.1	P - 1.1	Movilización y Desmovilización de Equipos	und	8,0	$ 3.939.173,00	$ 31.513.384,00	2,00	$ 7.878.346,00	5,0	$ 19.695.865,00	3,0	$ 11.817.519,00
II. MANTENIMIENTO HIDRAULICO						**$ 7.480.285.719,18**		**$ 351.770.772,80**		**$ 2.005.046.473,28**		**$ 5.475.239.245,90**
2.1	P - 2.1	Remoción Mecanica de Sedimentos Mediante el Uso de Excavadora sobre Orugas. Incluye: Seguimiento y Control Topografico	m3	92.648,54	$ 16.507,00	$ 1.529.349.449,78	21.310,40	$ 351.770.772,80	32.597,31	$ 538.083.812,68	60.051,23	$ 991.265.637,10
2.3	P - 2.3	Cargue, Retiro y Disposicion Final de Material proveniente de la remoción y Excavaciones. Incluye: Disposicion en Escombrera Certificada	m3	92.648,54	$ 42.500,00	$ 3.937.562.950,00	0,00	$ 0,00	11.286,91	$ 479.693.675,00	81.361,63	$ 3.457.869.275,00
2.4	P - 2.4	Limpieza Manual de vegetación	mes	12,0	$ 49.385.635,00	$ 592.627.620,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 98.771.270,00	10,00	$ 493.856.350,00
2.5	P - 2.5	Muro en Geocontenedores ensamblado con tensores internos en geotextil. Incluye: Relleno con Material Proveniente de la Excavación, Formaletería y Costuras.	m3	6.000,0	$ 160.377,00	$ 962.262.000,00	0,00	$ 0,00	4.154,25	$ 666.246.152,25	1.845,75	$ 296.015.847,75
2.6	P - 2.6	Manto Antisocavación ensamblado en geotextil. Incluye: Inyección de Arena proveniente de la excavación en Lastre Inferior	m2	2.250,0	$ 33.138,00	$ 74.560.500,00	0,00	$ 0,00	1.112,00	$ 36.849.456,00	1.138,00	$ 37.711.044,00
2.7	P - 2.7	Manto para el Control de Erosión permanente, Tipo TRM 50	m2	7.031,30	$ 45.978,00	$ 323.285.111,40	0,00	$ 0,00	3.390,58	$ 155.891.857,35	3.640,73	$ 167.393.254,05
2.8	P - 2.8	Geotextil Tejido de Poliéster	m2	5.156,30	$ 11.760,00	$ 60.638.088,00	0,00	$ 0,00	2.509,38	$ 29.510.250,00	2.646,93	$ 31.127.838,00
					TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 7.511.799.103,18**		**$ 359.649.118,80**		**$ 2.024.742.338,28**		**$ 5.487.056.764,90**
					Administración (23%)	$ 1.727.713.794,00		$ 82.719.297,00		$ 465.690.738,00		$ 1.262.023.056,00
					Imprevistos (2%)	$ 150.235.982,00		$ 7.192.982,00		$ 40.494.847,00		$ 109.741.135,00
					Utilidad (5%)	$ 375.589.955,00		$ 17.982.456,00		$ 101.237.117,00		$ 274.352.838,00
					IVA (19%) sobre la Utilidad	$ 71.362.091,00		$ 3.416.667,00		$ 19.235.052,00		$ 52.127.039,00
					TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**$ 2.324.901.822,00**		**$ 111.311.402,00**		**$ 626.657.754,00**		**$ 1.698.244.068,00**
					VALOR TOTAL DE LA OBRA CIVIL	**$ 9.836.700.925,18**		**$ 470.960.520,80**		**$ 2.651.400.092,28**		**$ 7.185.300.832,90**
III. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS						**$ 1.134.038.192,00**		**$ 69.789.369,53**		**$ 208.458.107,67**		**$ 925.580.084,33**
3.1	P - 3.1	Rescate de Fauna Acuatica y Terrestre	und	1,0	$ 237.598.855,00	$ 237.598.855,00	0,16	$ 38.015.816,80	0,68	$ 161.567.221,40	0,32	$ 76.031.633,60
3.2	P - 3.3	Implementacion de Estrategia de Sensibilización y Participación Ambiental Dirigido a la Comunidad en la Zona de Influencia del Proyecto	und	8,0	$ 37.443.694,00	$ 299.549.552,00	0,85	$ 31.773.552,73	1,25	$ 46.890.886,27	6,75	$ 252.658.665,73
3.3	P - 3.4	Diseño de sistema de alerta temprana Río Gaira.	und	1,0	$ 225.174.735,00	$ 225.174.735,00	0,0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 225.174.735,00
3.4.1	P - 3.4	Implementación del sistema de alerta temprana Río Guachaca.	und	1,0	$ 371.715.050,00	$ 371.715.050,00	0,0	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 371.715.050,00
					IVA. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA	**$ 215.467.256,48**		**$ 13.259.980,21**		**$ 39.607.040,46**		**$ 175.860.216,02**
					VALOR TOTAL OBRA AÑO 2025	**$ 11.186.206.374,00**		**$ 554.009.871,00**		**$ 2.899.465.240,00**		**$ 8.286.741.134,00**

VALOR PRESENTE ACTA : QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta en las que ella intervinieron a los 31 días del mes de octubre de 2025.

DIXON ENRIQUE VALVERDE MARTÍNEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ICASM2023

FRANCISCO ALFONSO FERNÁNDEZ SALTAREN
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORES E INGENIERIA SAS
