
ANEXO TÉCNICO – SOPORTE DE PRÓRROGA CONTRACTUAL

El presente anexo técnico forma parte integral de la solicitud de prórroga del Contrato No. 033-2025, cuyo objeto es el suministro e instalación de transformador tipo seco para el Palacio de Justicia de Sincelejo. Se incluye cronograma actualizado, identificación de ruta crítica y análisis de riesgos técnicos.

1. Cronograma de Ejecución (Diagrama de Gantt)

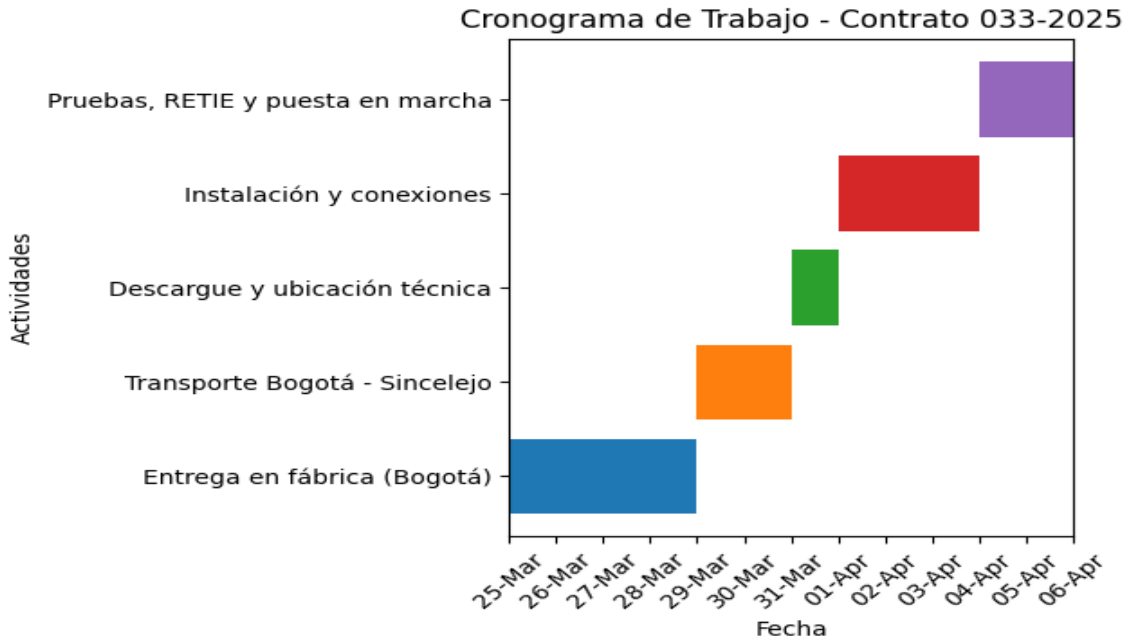

2. Ruta Crítica Identificada

Actividad	Impacto en plazo
Entrega del transformador	Inicio de actividades dependientes
Transporte especializado	Retraso afecta instalación
Instalación y conexiones	Condiciona pruebas técnicas
Pruebas y puesta en marcha	Actividad final determinante

3. Análisis de Riesgos Técnicos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Medida de Mitigación

Demora adicional en importación	Media	Alto	Seguimiento permanente al proveedor
Retraso en transporte terrestre	Baja	Media	Coordinación logística anticipada
Fallas en pruebas eléctricas	Baja	Alto	Verificación técnica previa en fábrica
Condiciones climáticas adversas	Baja	Media	Plan de contingencia operativa
