CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SUPERCEMENTO SAS

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No 67 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURÍA AUXILIAR DE USAQUÉN – BOGOTÁ

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

ÍTEM N° 5769 **UNIDAD** UN

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS SOBRE MUROS INTERIORES, CON VINILO IGUAL O SIMILAR A VINILTEX TIPO 1

CONTRATISTA

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALISON MOLINA

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN		ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
REGISTRADURIA AUXILIAR DE USAQUEN					
OFICINA DE REGISTRADOR		4,05	3,94		15,96
OFICINA DE REGISTRADOR		-0,49	0,69		-0,33
PATIO MURO SUR		3,02	7,40		22,35
PATIO MURO SUR	FILOS COLUMNA	0,09	4,22		0,38
PATIO MURO SUR	FILOS VIGA	0,30	7,40		2,22
PATIO MURO OCCIDENTAL		3,02	5,70		17,21
PATIO MURO NORTE		2,57	7,85		20,17
PATIO MURO NORTE	FILOS INGRESO	0,25	7,30		1,83
PATIO MURO NORTE	AREA INGRESO	-2,30	2,70		-6,21
PATIO MURO NORTE	AREA VENTANA	-2,00	1,50		-3,00
PATIO MURO ORIENTAL		3,02	5,70		17,21
PATIO MURO ORIENTAL	AREA VENTANA	-1,00	1,18		-1,18
PATIO MURO ORIENTAL	AREA VENTANA	-1,00	1,18		-1,18
PATIO MURO ORIENTAL	AREA ESTRACTOR	-0,18	0,18		-0,03
PATIO MURO ORIENTAL	AREA FILOS VENTANAS Y ESTRACTOR	0,10	9,44		0,94
PATIO MURO ORIENTAL	FILOS COLUMNA	1,90	0,36		0,68
PATIO MURO ORIENTAL	FILOS PUERTAVENTANA	0,26	4,01		1,04
NUEVO RACK	MURO NORTE	2,38	2,05		4,88
NUEVO RACK	AREA VENTANA	-0,45	0,48		-0,22
NUEVO RACK	FILOS VENTANA	0,10	1,86		0,19
NUEVO RACK	MURO ORIENTAL	2,38	1,14		2,71
NUEVO RACK	MURO SUR	2,38	1,97		4,69
NUEVO RACK	MURO OCCIDENTE	0,35	1,04		0,36
NUEVO RACK	FILOS INGRESO	0,22	1,04		0,23
NUEVO RACK	TECHO	1,14	1,89		2,15
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**103,07**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					
TOTAL POR EJECUTAR					

PLANO / ESQUEMA

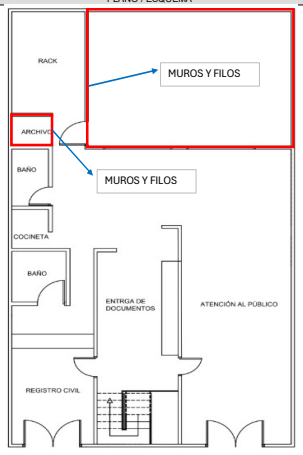

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) HARRY PIRE

Residente de Obra

(Firma)

(Nombre)

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) LUIS CARLOS VELOSA

Director de Proyectos

(Firma)

(Nombre) ALISON MOLINA

SUPERVISORA CONTRATO

Original : Supervisor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.
