CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SUPERCEMENTO SAS

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

SUPERCEMENTO

CONTRATO No 67 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURÍA AUXILIAR DE USAQUÉN – BOGOTÁ

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

ÍTEM N° 5769 **UNIDAD** M2

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS SOBRE MUROS INTERIORES, CON VINILO IGUAL O SIMILAR A VINILTEX TIPO 1


CONTRATISTA SUPERCEMENTO SAS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALISON MOLINA
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN		ANCHO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
REGISTRADURIA AUXILIAR DE USAQUEN					
BAÑO DEBAJO DE ESCALERAS	MURO ORIENTAL	1,1	2,13	1,00	2,34
BAÑO DEBAJO DE ESCALERAS	MURO SUR	1,76	1,97	1,00	3,47
BAÑO DEBAJO DE ESCALERAS	AREA VENTANA	0,87	1,97	1,00	1,71
BAÑO DEBAJO DE ESCALERAS	AREA VENTANA	-0,24	0,95	1,00	-0,23
BAÑO DEBAJO DE ESCALERAS	AREA VENTANA	0,48	0,12	1,00	0,06
BAÑO DEBAJO DE ESCALERAS	AREA VENTANA	1,9	0,12	2,00	0,23
BAÑO DEBAJO DE ESCALERAS	MURO NORTE	0,8	2,13	1,00	1,70
BAÑO DEBAJO DE ESCALERAS	MURO OCCIDENTAL	0,9	2,13	1,00	1,92
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**11,20**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					
TOTAL POR EJECUTAR					

PLANO / ESQUEMA

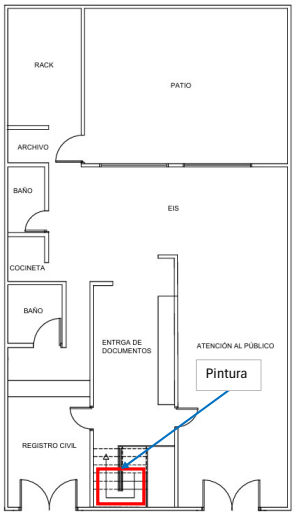

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) HARRY PIRE
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre)

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) LUIS CARLOS VELOSA
Director de Proyectos

(Firma)

(Nombre) ALISON MOLINA
SUPERVISORA CONTRATO

Original : Supervisor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.
