CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SUPERCEMENTO SAS

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No 67 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURÍA AUXILIAR DE USAQUÉN – BOGOTÁ

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

ÍTEM N° 5972 **UNIDAD** M3

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI

CONTRATISTA

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALISON MOLINA

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	ALTO	ANCHO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
REGISTRADURIA AUXILIAR DE USAQUEN					
PATIO VIGA INFERIOR	0,35	0,25	5,7	1	0,50
PATIO VIGA SUPERIOR	0,20	0,20	5,70	1	0,23
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**0,73**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					
TOTAL POR EJECUTAR					

PLANO / ESQUEMA

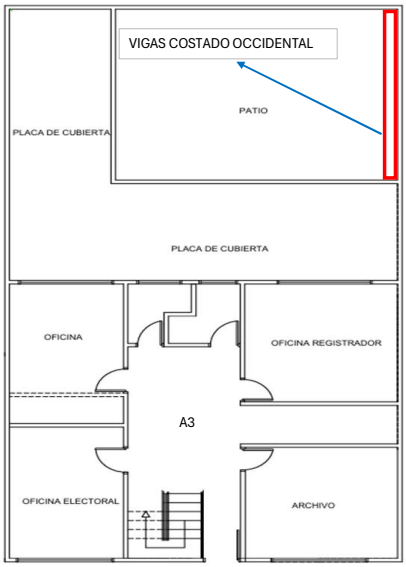

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) HARRY PIRE

Residente de Obra

(Firma)

(Nombre)

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) LUIS CARLOS VELOSA

Director de Proyectos

(Firma)

(Nombre) ALISON MOLINA

SUPERVISORA CONTRATO

Original : Supervisor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.
