ACTA DE REUNION
SOCIALIZACION DE ETAPAS DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MEN/FPD

Acta No.	002
Fecha:	17 de mayo de 2025
Lugar:	Institución Etnoeducativa Rural Valle De Parashi
Proyecto:	Construcción de espacios educativos de acuerdo con los diseños aprobados en Valle De Parashi, La Guajira.
Tema:	Reunión de socialización de etapas del proyecto de infraestructura MEN/FPD

PARTICIPANTES: VENTITRES (23) PERSONAS

Salvador Velásquez Iguarán (Líder y representante de la Autoridad Valle de Parashi)	Rubén Darío Santisteban Bayona (Arquitecto Residente de Obra Contratista FPD)
Luz Stella Pérez (Directora de la Institución Etnoeducativa Rural Valle de Parashi)	

DESARROLLO DE LA REUNION

El día 17 de mayo de 2025, se lleva a cabo la reunión de socialización en etapa de cimentación ciclópea y fundición de zapatas y pedestales en hormigón armado, previa a la cimentación de concreto reforzado del proyecto de infraestructura en el marco del Convenio MEN-FPD, en las instalaciones de la Institución Etnoeducativa Rural Valle De Parashi, con el fin de informar a la autoridad y Líder del lugar, sobre esta medida de nivelación para los pisos de cada ambiente educativo del proyecto de construcción.


En la reunión, el arquitecto Rubén Darío Santisteban Bayona, argumenta por qué se hizo necesario construir una cimentación ciclópea para que la superficie acabada de pisos no presente inundaciones en sus límites occidentales y por la pendiente tendida del terreno natural hacia el oriente se hace necesario rellenar y compactar antes la fundición de las futuras losas de contrapiso.

Se explicó en terreno el cambio de dirección del Módulo de Comedor – Cocina, dada la inclinación natural del terreno, rescatando que sólo se dejó un escalón entre Cocina y Comedor separando los dos ambientes en la puerta de acceso y el mismo cambio de nivel en el andén, se solucionará por medio de una rampa. Se resalta que la decisión de replantear el Comedor – Cocina siguiendo las diagonales de la implantación de las Aulas, además de requerir menos relleno compactado, respeta la existencia de un cardón que lleva décadas en el lugar y contrastará con el volumen de la construcción de este Módulo y al mismo tiempo funciona con la dirección de los vientos predominantes generando corredores de ventilación natural entre los Módulos, respetando la bioclimática solucionada por el diseño original.


De los pozos tipo aljibe se socializa que el segundo pozo hacia el jawei seco al sur oriente de la Institución el día de ayer al final de la jornada se había excavado a una profundidad de 2,60m y todavía no se ha encontrado agua y se resuelve la inquietud de hacer obra civil, una vez se encuentre el afluente de agua y el primer pozo alineado al oriente del módulo de Cocina – Comedor con una profundidad de 6,80m hasta donde se encontró piedra grande, la Autoridad y la Líder del lugar manifiestan que hablarán con personal de la comunidad que hace un proceso de quema en estos casos, para continuar con la excavación en busca de agua y que también existe la opción de cavar frente al portón de acceso a las enramadas donde

se reciben clases al centro oriente de la Institución donde anteriormente existía un pozo que fue tapado para disponer del acceso mientras se entrega la obra ejecutada.

EVIDENCIAS Y/O ANEXOS

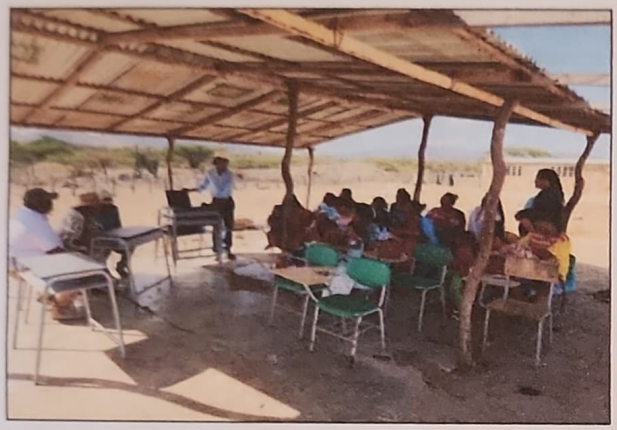



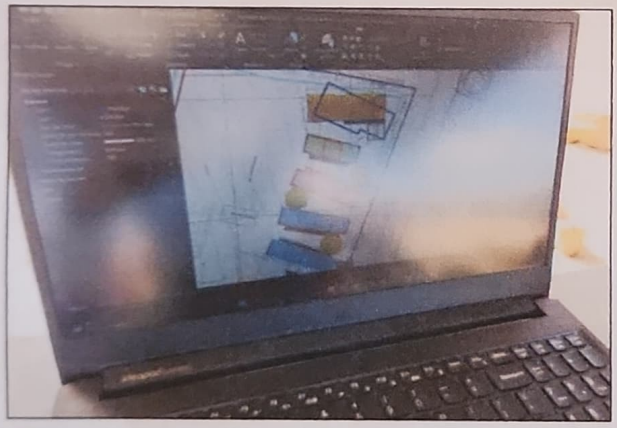







FOTOGRAFÍAS DE OBRA EN LA FECHA DE LA REUNIÓN

CONCLUSIONES

- El proyecto de infraestructura se ejecuta con éxito y se lleva a cabo conforme al cronograma presentado, resaltando la fuente de empleo con el 100% de la vinculación de personal local en la mano de obra.

- Se aclaró y se explicó técnicamente la ejecución de la obra hasta la fecha y la calidad de los materiales y sus usos, generando confianza en los lideres de la comunidad.

FIRMAS PARTICIPANTES

Nombre	Salvador Velásquez Iguarán	
En representación de	Líder y Representante de la Autoridad de la Comunidad de Valle De Parashi	
Correo electrónico	salvadoriguaran@gmail.com	
Teléfono	3135257174	
Nombre	Luz Stella Pérez	
En representación de	Directora Institución Etno Educativa Rural Valle De Parashi	
Correo electrónico	luzestelaperez74@gmail.com	
Teléfono	3106853564	
Nombre	Rubén Darío Santisteban Bayona	
En representación de	Arquitecto Residente de la Obra	
Correo electrónico	rubendariosb@gmail.com	
Teléfono	3158021256	

ACTA DE REUNION

SOCIALIZACION DE ETAPAS DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MEN/FPD

Acta No.	003
Fecha:	17 de junio de 2025
Lugar:	Institución Etnoeducativa Rural Valle De Parashi
Proyecto:	Construcción de espacios educativos de acuerdo con los diseños aprobados en Valle De Parashi, La Guajira.
Tema:	Reunión de socialización de etapas del proyecto de infraestructura MEN/FPD

PARTICIPANTES: CATORCE (14) PERSONAS

Salvador Velásquez Iguarán (Líder y representante de la Autoridad Valle de Parashi)	Rubén Darío Santisteban Bayona (Arquitecto Residente de Obra Contratista FPD)
Luz Stella Pérez (Directora de la Institución Etnoeducativa Rural Valle de Parashi)	

DESARROLLO DE LA REUNION


El día 17 de junio de 2025, se lleva a cabo la reunión de socialización en etapa de cimentación en concreto reforzado del proyecto de infraestructura, previo a la fundición de losas de contrapiso en el marco del Convenio MEN-FPD, en las instalaciones de la Institución Etnoeducativa Rural Valle De Parashi, con el fin de informar a la autoridad y Líder del lugar, sobre las medidas previstas para fundir las losas de piso de cada ambiente educativo del proyecto de construcción.

El arquitecto Rubén Darío Santisteban Bayona, expone que a pesar de haber dificultades con la entrega de materiales hasta la zona por parte del proveedor de la madera, se ha solucionado la fundición del concreto ciclópeo con formaletería metálica de la empresa y que en esta semana se comenzarán a fundir las losas de contrapiso por etapas, fundiendo primero el piso de las Aulas del primer Módulo de 4 Aulas, durante 2 días, dejando un acabado esmaltado como está establecido contractualmente y se hace necesario que se ejecute en dos días, por la necesidad de dejar de una vez las dilataciones en la placa y en un tercer día la etapa final de fundición que sería en un concreto con textura para hacerlo antideslizante.

A la pregunta de los asistentes sobre porque no se hacían primero los muros, se les explicó que el proceso constructivo del proyecto, se están dejando los aceros para arranques de muros en los puntos cruciales de los bloques que funcionarán como columnetas y dovelas y para el resto de aceros verticales se usarán anclajes que cumplen estructuralmente una vez fundamos las losas de piso, que no pegamos primero la mampostería, porque el bloque que utilizaremos va a la vista y los pisos hay que nivelarlos y en el caso de andenes se construyen con una pendiente hacia afuera y a raíz de esos niveles se debe pegar la mampostería para nivelarla desde la primera hilada y de esa manera, el nivel del piso, no queda arriba de la primera hilada de bloques, también se explica que una vez compactado los Módulos, se instala la tubería eléctrica para la energización de tomacorrientes e iluminación de las Aulas. También se aclara, que la estructura del proyecto no queda a la vista, sino embebida entre los bloques que se refuerzan con acero y concreto.

Se expone que en esta etapa de la obra sólo falta fundir la cimentación del Módulo de Comedor – Cocina y se continúa en relleno y compactación de los Módulos de Aulas para la posterior fundición de las losas de piso sobre las que se levantará la mampostería de bloque a la vista.


EVIDENCIAS Y/O ANEXOS

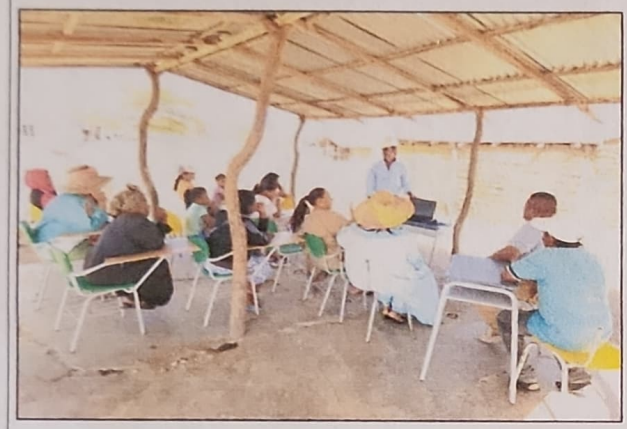








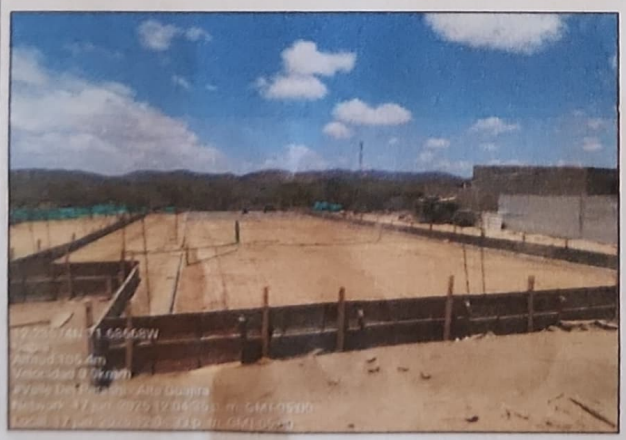

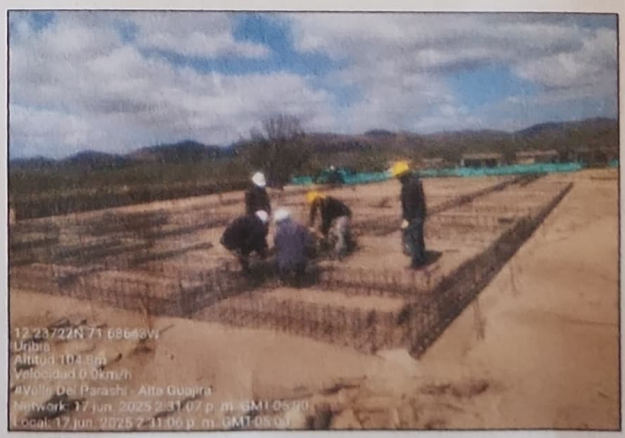



FOTOGRAFÍAS DE OBRA EN LA FECHA DE LA REUNIÓN

CONCLUSIONES

- El proyecto de infraestructura se ejecuta con éxito y se lleva a cabo conforme al cronograma presentado, resaltando la fuente de empleo con el 100% de la vinculación de personal local en la mano de obra.

- Se aclaró y se explicó técnicamente la ejecución de la obra hasta la fecha y la calidad de los materiales y sus usos, resaltando que, a pesar de las dificultades con la logística de provisión de materiales para la obra, la Autoridad y Líder junto con el personal local que labora en la obra, han cooperado para que la ejecución del proyecto continúe con buen ritmo y no retrasarnos en el cronograma de entrega.

FIRMAS PARTICIPANTES

Nombre	Salvador Velásquez Iguarán	
En representación de	Líder y Representante de la Autoridad de la Comunidad de Valle De Parashi	
Correo electrónico	salvadoriguaran@gmail.com	
Teléfono	3135257174	
Nombre	Luz Stella Pérez	
En representación de	Directora Institución Etno Educativa Rural Valle De Parashi	
Correo electrónico	luzestelaperez74@gmail.com	
Teléfono	3106853564	
Nombre	Rubén Darío Santisteban Bayona	
En representación de	Arquitecto Residente de la Obra	
Correo electrónico	rubendariosb@gmail.com	
Teléfono	3158021256	
