GOBERNACION
DE CASANARE
NIT.892099216-6

INFORME VISITA
FO-IF-07
2014-01-02
V. 02

CODIGO	
FECHA	AGOSTO 24 DE 2020
DESTINATARIO	OSCAR EDUARDO GARCIA, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTO DE CASANARE
PROFESIONAL	WALTER CUBIDES ALFONSO
ASUNTO	INFORME DE VISITA TECNICA PARA EVALUAR EL ESTADO DE LA ESTRUCTURA DE LA VIA SECUNDARIA PAVIMENTADA Y DETERMINAR LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA ADQUIRIR MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE PARA EL MANTENIMIENTO MEDIANTE EL RE PARCHEO EN LOS PUNTOS CRITICOS DEL TRAMO DE LA VIA YOPAL – ALGARROBO VIA A OROCUE DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO	YOPAL

ACTA DE VISITA	**SI**		**NO X**	
FECHA DE VISITA	AGOSTO 22 DEL 2020			

1. ESTADO ACTUAL

SE REALIZA RECORRIDO DE LA VÍA SECUNDARIA PAVIMENTADA QUE CONDUCE DE YOPAL AL MUNICIPIO DE OROCUE, PARA LOCALIZAR LOS PUNTOS EN LOS CUALES LA CARPETA ASFALTICA PRESENTA MAYOR DETERIORO Y EL ESTADO GENERAL DE LA VÍA.


A CONTINUACIÓN, SE PRESENTA UNA RELACIÓN DE LOS PUNTOS EN LOS CUALES SE EVIDENCIA MAYOR AFECTACIÓN Y DONDE ES PRIORIDAD REALIZAR ACTIVIDADES DE REPARCHEO, SE DEBE TENER EN CUENTA QUE LA CANTIDAD Y MEDIDA DE LO HUECOS IDENTIFICADOS EN LA PRESENTE VISITA PUEDE AUMENTAR DEBIDO AL TRAFICO CONTINUO EN LA VÍA.

2. ACTIVIDADES REQUERIDAS

AREAS A INTERVENIR CON REPARCHEO Y/O BACHEO VIA SECUNDARIA PAVIMENTADA				
TRAMO YOPAL - ALGARROBO				
INVENTARIO DE HUECOS PARA PARCHEO CON MDC-2				
Punto	**Abscisa**	**Largo (M)**	**Ancho (M)**	**Cantidad huecos**
0	K0+000 salida de Yopal(Fin de la doble Calzada)			
1	K3+800	0,70	0,70	2
2	K4+600	4,00	5,50	1
2	K5+200	1,00	1,00	2

3	K6+900	6,00	2,00	1
4	K7+200	0,40	0,30	2
5	K7+300	1,00	1,00	2
6	K8+100	1,00	0,80	1
7	K8+900	1	1,00	1
8	K9+600	1,00	0,80	1
9	K10+460	0,50	0,50	3
10	K11+380	1,50	1,00	1
11	K21+500	2,00	1,00	2
12	K12+550	1,50	1,00	1
13	K17+720	1,50	1,00	3
14	K18+615	2,00	1,00	1
15	K20+650	1,00	1,00	3
16	K25+990	4,00	1,50	1
TOTAL				**28**


3. UBICACIÓN

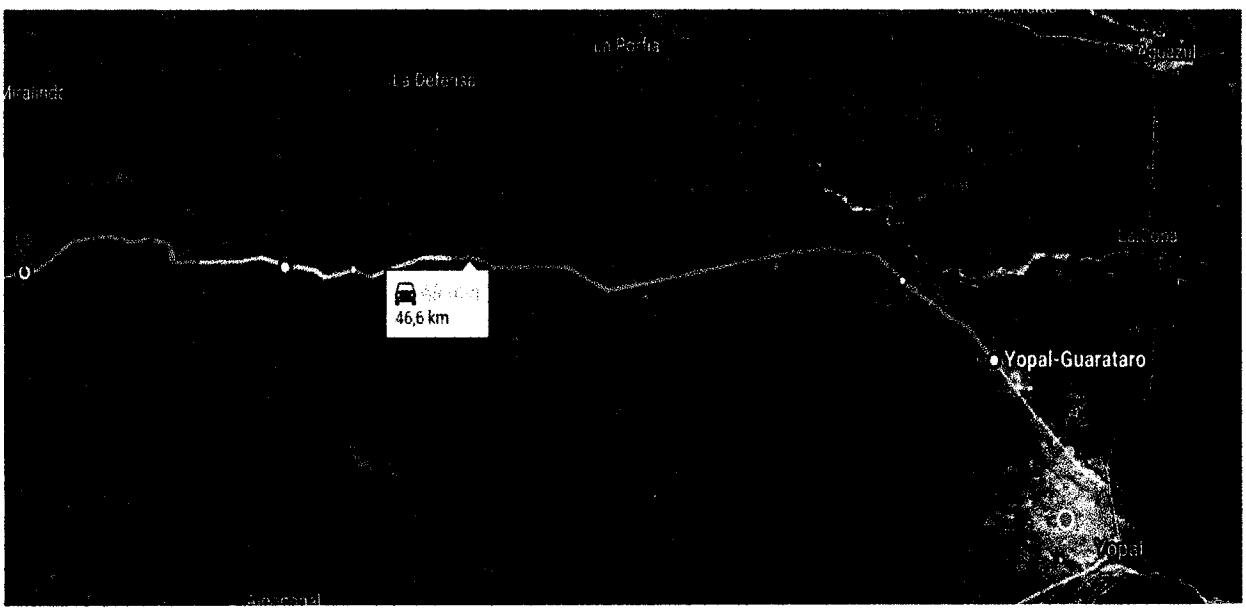

6. SOLICITUD DE LA COMUNIDAD

- LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE HATOCOROZAL ENVIO SOLICITUD A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE CASANARE DIRIGIDA AL ING OSCAR EDUARDO GARCIA COMO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA CON EL OBJETO DE REALIZAR LA INTERVENCION DE LA VIA PAVIMENTADA MEDIANTE EL TAPADO DE HUECOS DE LA CARPETA ASFALTICA CON MDC-2 EN UN TRAMO APROXIMADO DE 60 KM PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA PROFERIDA POR EL JUZGADO PRIMERO DE YOPAL EL DIA 24 DE FEBRERO 2015 POR LA ACCION POPULAR 0217 DE 2013 EN CONTRA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y OTROS.

7. ANEXO FOTOGRAFICO









NOMBRE Y FIRMA
DEL PROFESIONAL

WALTER CUBIDES ALFONSO
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nro. 1175 DEL 2020
