FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL.

N° Contrato y Fecha	PJ-027-2026 del 23 de enero del 2026
Nombre del Contratista	SOLUCIONES DINAMICAS SANTA MARTA S.A.S
N° de identificación	900.807.318 - 6
Objeto del Contrato	PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA RED DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) DE LAS UNIDADES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (UPSS) Y LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND.
Valor total del Contrato	$ 87.600.000
Valor Facturas	$ 28.930.690
N° Pago / N° de informe:	2/8
N° CDP	228 del 19 de enero del 2026.
N° CRP	826 del 22 de enero del 2026.
Plazo del Contrato	ocho (8) meses
Fecha de Inicio	23 de enero del 2026.
Nombre y cargo del supervisor del contrato	Adriana Ariza Monsalve – Profesional Universitario

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

N° de modificación	N/A
Tipo de modificación (adición – prórroga)	N/A
Valor adicionado	N/A
CDP de la adición	N/A
CRP de la adición	N/A
Tiempo prorrogado	NA

POLIZA (SI APLICA)

N° de póliza	46-44-101014308
Nombre de la aseguradora	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
Fecha de la póliza	**23 DE ENERO DE 2026.**
Acto Administrativo de Aprobación	**015 DEL 23 DE ENERO DE 2026.**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES

ITEM	**ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO** (*Deben ser coherentes con las actividades específicas del objeto del contrato*)
1.	*Se realiza mantenimiento preventivo CCTV en el Centro de Salud La Paz.*
2.	*Se realiza mantenimiento preventivo CCTV en el Centro de Salud IPC la candelaria.*
3.	*Se realiza mantenimiento preventivo CCTV en Puesto de Salud Pando.*
4.	*Se realiza mantenimiento preventivo CCTV en Puesto de Salud Manzanares.*
5.	*Se realiza mantenimiento preventivo CCTV en Puesto de Salud Juan XXIII.*

Vigilado Supersalud

6.	*Se realiza mantenimiento preventivo CCTV en Puesto de Salud Obrero.*
7.	*Se realiza mantenimiento preventivo CCTV en la Sede administrativa.*
8.	*Se realiza mantenimiento preventivo CCTV en Centro de salud Bastidas.*

INFORMACION APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	
No DE PLANILLA	**9499422448**


INFORMACION DEL CONTRATISTA

1. Que, a la fecha, he cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato.
2. Que autorizo los impuestos a que estoy obligado a pagar, por ocasión al señalado contrato, sean descontados por la ESE
3. Que lo correspondiente a pago por Seguridad Social, está debidamente pagado por el valor que exige la Ley, pago del cual anexo copia simple.

Esta certificación se firma el mes de febrero del Año 2026 en Santa Marta DTCH.

ANEXOS
(Por cada actividad ejecutada se debe anexar una evidencia)

Anexo 01	*Acta de mantenimiento preventivo CCTV en Centro de Salud La Paz.*
Anexo 02	*Acta de mantenimiento preventivo CCTV en Centro de Salud IPC la candelaria.*
Anexo 03	*Acta de mantenimiento preventivo CCTV en Puesto de Salud Pando.*
Anexo 04	*Acta de mantenimiento preventivo CCTV en Puesto de Salud Manzanares.*
Anexo 05	*Acta de mantenimiento preventivo CCTV en Puesto de Salud Juan XXIII.*
Anexo 06	*Acta de mantenimiento preventivo CCTV en Puesto de Salud Obrero.*
Anexo 07	*Acta de mantenimiento preventivo CCTV en la Sede Administrativa.*
Anexo 08	*Acta de mantenimiento preventivo CCTV en Centro de salud Bastidas.*
Anexo 09	*Entrada de Almacen No 645193.*
Anexo 10	*Entrada de Almacen No 645192.*
Anexo 11	*Entrada de Almacen No 645182.*
Anexo 12	*Captura de Pantalla Registro Activos Fijos*

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	ADRIANA GISSELLE ARIZA MONSALVE PROFESIONAL UNIVERSITARIO
FIRMA DEL SUPERVISOR	
NOMBRE CONTRATISTA	SOLUCIONES DINAMICAS SANTA MARTA S.A.S
N°. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	900.807.318 - 6
FIRMA CONTRATISTA	

Vigilado Supersalud

SOLDICAS SAS

NIT: 900.807.318 – 6.

SOPORTE TECNICO SOLDICAS S.A.S

INFORMACION DEL SERVICIO CONTRATO N°PJ-PS-027-2026.

CLIENTE: E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND – SANTA MARTA – COLOMBIA.	**REPORTE N°:**018
DEPENDENCIA: CENTRO DE SALUD LA PAZ.	**FECHA DE REPORTE:** 20/02/2026.
NOMBRE USUARIO: MARIA JOSE BERTEL.	**FECHA DE SOLUCION:** 20/02/2026.
OFICINA: ENFERMERIA.	**TIPO DE CONEXIÓN:** LAN.
HORA INICIAL: 08:15 A.M **HORA FINAL:** 05:20 P.M	**DIRECCION IP:** DHCP

INOFORMACION DEL GRABADOR.

GRABADOR.	REFERENCIA	SERIAL	MARCA	CAPACI DISCO	CANALES	P. INVENTARIO
XVR	DH-XVR1B16-1	BG0A938PAJ5C761	DAHUA	1TB	16	**7592**

INFORMACION CAMARAS

DISTRIBUCION INSTALACION Y UBICACIÓN CAMARAS CENTRO DE SALUD LA PAZ.

ITEM.	DESCRIPCION.	SERIAL.	MODELO.	RESOLUCION.	UBICACIÓN	P. INVENTARIO
1	CAMARA TIPO DOMO ANALO	AF09126PDDF31D0	DH-HAC-T1A51N-U-A	5MPX	CON MED URG	5732
2	CAMARA TIPO DOMO ANALO	AF0F304PDD1F184	DH-HAC-T1A51N-U-A	5MPX	FACTURACION CON EXTERNA	5717
3	CAMARA TIPO DOMO ANALO	AF09126PDD59576	DH-HAC-T1A51N-U-A	5MPX	PASILLO PATIO URG	5718
4	CAMARA TIPO DOMO ANALO	AF0F304PDDEA9E6	DH-HAC-T1A51N-U-A	5MPX	SALA ESPERA CONSULTA EXT	6694
5	CAMARA TIPO DOMO ANALO	AF09126PDD99C5A	DH-HAC-T1A51N-U-A	5MPX	ESTACION ENFERMERIA URG	5733
6	CAMARA TIPO DOMO ANALO	AF0F304PDD98D72	DH-HAC-T1A51N-U-A	5MPX	ENTRADA URG	5720
7	CAMARA TIPO DOMO ANALO	AF09126PDDC39E4	DH-HAC-T1A51N-U-A	5MPX	VACUNACION.	5719
8	CAMARA TIPO DOMO ANALO	AF095FBPBVCB37C	DH-HAC-T1A51N-U-A	5MPX	PATIO	6707
9	CAMARA TIPO BALA.	BH091DDPDD096D3	DH-IPC-HDW1439T1-A-IL	5MPX	EXTERIOR LADO IZQUIERDO	7078
10	CAMARA TIPO DOMO	BF06DFBPDD30ACB	DH-HAC- T1A51N-U-A	5MPX	ENTRADA PORTON.	7076
11	CAMARA TIPO BALA ANALO	BH10048PDD5D7AB	DH-IPC-HDW1439T1-A-IL	5MPX	ENTRADA URGENCIA	7080
12	CAMARA TIPO BALA ANALO	BH10048PDD23EF5	DH-IPC-HDW1439T1-A-IL	5MPX	EXTERIOR LADO DERECHO	7079
13	CAMARA TIPO DOMO	BF02580PDD0B0D8	DH-HAC-T1A51N-U-A	5MPX	ESTACION ENFERMERIA URG	7077
14	DISPONIBLES	DISPONIBLES	DISPONIBLES	DISPONIBL	DISPONIBLES	DISPONIBLES
15	DISPONIBLES	DISPONIBLES	DISPONIBLES	DISPONIBL	DISPONIBLES	DISPONIBLES
16	CAMARA TIPO DOMO IP	AJ00044PAGC5E5B	DH-IPC-HDW1439T1-A-IL	4MPX	CENTRO CABLEADO	7003

17	CAMARA TIPO DOMO IP	AJ08F6BPAG00320	DH-IPC-HDW1439T1-A-IL	4MPX	FARMACIA	**7001**

TIPO DE FUENTE.	TIPO DE CABLE.	TIPO DE V BALUN	TIPO DE CONEXIÓN.	EN LINEA.
12V 5 AMP	UTP	ACTIVO	ETHERNET.	SI
USUARIO.	**PASSWORD.**	**PATRON.**	**AUDIO.**	**DIAMETRO.**
XXXXXX	XXXXXXX	XXXX	SI	2.8

INFORMACION DEL SERVICIO.

Se realiza visita técnica atendiendo el primer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de video vigilancia instalada en el **CENTRO DE SALUD LA PAZ**, perteneciente a la **E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND**, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

ACTIVIDADES REALIZADAS.

Se realiza limpieza total del gabinete y del cableado en general, del mismo modo limpieza de los lentes de las cámaras instalada en esta unidad, alineación de vistas y cambios de video balun y fuentes de energía donde fue necesario.

Se realiza la instalación de 5 nuevas cámaras en puntos estratégicos donde no existían en la parte externa de esta unidad de servicio.

MATERIAL Y REPUESTOS UTILIZADOS.

Se utilizaron 3 cámaras tipo bala que fueron instaladas en la parte exterior.
2 cámaras tipo domo que fue utilizada una a la salida del garaje y otra en la estación de enfermería urgencia.
3 fuentes de poder 12V 5amp.
280 metros de cable utp categoría No6.
5 parejas de video balun.

OBSERVACIONES.

Se realiza cambio del xvr grabador de 8 canales a uno de 16 canales.
Se requiere la instalación de tres nuevas cámaras que se ubicarían en la parte alta de las escaleras que enfoque quien sube y baje, otra en la salida del ascensor primer piso enfocando la sala de espera de laboratorio y otra en la entrada de sala de partos exterior.

Sin perjuicio de que se haya afectado completamente las labores con el mantenimiento, se ha verificado y comprobado que los equipos objeto de mantenimiento quedan funcionando correctamente: Sí (X) No ( ) todo lo anterior Amparados en el contrato de prestación de servicios **No PJ-PS-027-2026.**


ADALBERTO CASTRO DONADO.
COORDINADOR OPERATIVO

María José Bertel.
QUIEN ATIENDE LA VISITA.

REGISTRO FOTOGRAFICO.





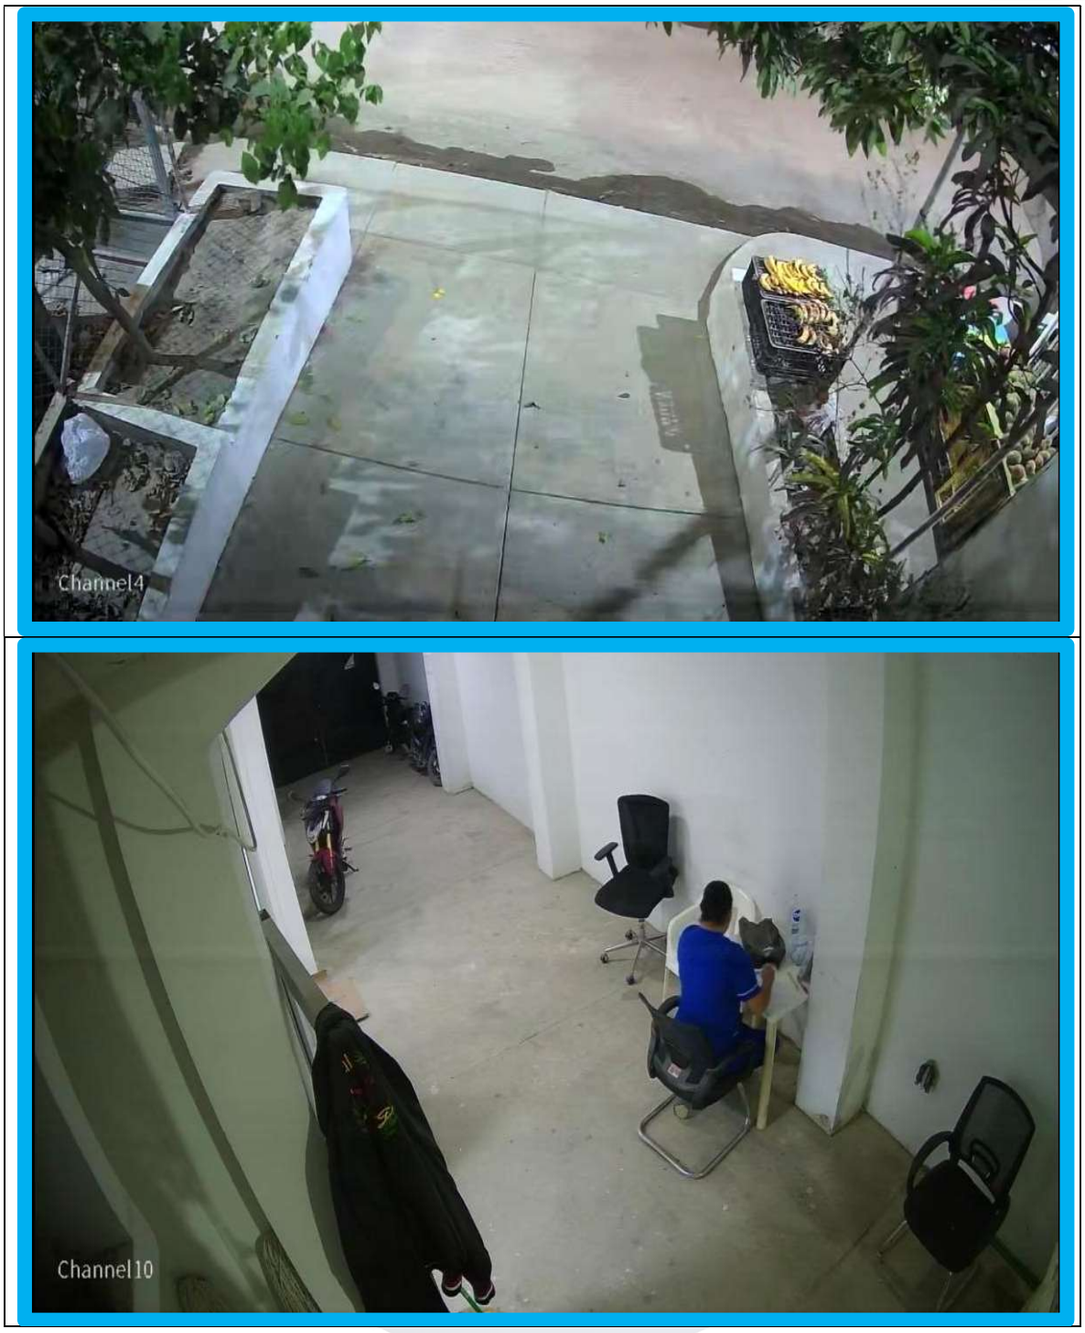

Dirección: Calle 29B No 1C – 42. Tel: (605)4311902 Móvil: 3105930743 – 3007025400.
WhatsApp:3185969650 – 3245335278.
Web: www.soldicassas.com Email: contacto@soldicassas.com Santa Marta – Colombia.

SOLDICAS SAS

NIT: 900.807.318 – 6.

SOPORTE TECNICO SOLDICAS S.A.S

INFORMACION DEL SERVICIO CONTRATO N°PJ-027-2026.

CLIENTE: E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND – SANTA MARTA – COLOMBIA.	**REPORTE N°:** 001
DEPENDENCIA: C.S I.P.C LA CANDELARIA.	**FECHA DE REPORTE:** 19/02/2026.
NOMBRE USUARIO: SLENDY PAZ– ENFERMERA JEFE.	**FECHA DE SOLUCION:** 19/02/2026.
OFICINA: SISTEMAS	**TIPO DE CONEXIÓN:** LAN.
HORA INICIAL: 09:00 P.M **HORA FINAL:** 02:10 P.M	**DIRECCION IP:** DHCP

INOFORMACION DEL GRABADOR.

GRABADOR.	REFERENCIA	SERIAL	MARCA	CAPACI DISCO	CANALES	P. INVENTARIO
XVR	DH-XVR1A08	6K05311PAZ081AC	DAHUA	1TB	8	NO TIENE

INFORMACION CAMARAS

CAMARAS.	SERIAL.	P. INVENTARIO.	REFERENCIA.	MARCA.	UBICACION
DOMO	C00473396	NO TIENE	THC-120-P	HILOOK.	ESTAR ENF URG.
DOMO	6L01AA2PAR113AC	NO TIENE	DH-HAC-T1A21N	DAHUA.	SALIDA PATIO
DOMO	C00473426	NO TIENE	THC-120-P	HILOOK.	SALA ESPERA URG.
BALA	135721394	NO TIENE	DS-2CE-16COT-VFIR3F	HIKVISION.	ENTRADA CONSULTA
BALA	109939214	NO TIENE	DS-2CE-16COT-VFIR3F	HIKVISION.	PLANTA
BALA	136721391	NO TIENE	DS-2CE-16COT-VFIR3F	HIKVISION.	PATIO

TIPO DE FUENTE.	TIPO DE CABLE.	TIPO DE V BALUN	TIPO DE CONEXIÓN.	EN LINEA.
12V 1 AMP	UTP	ACTIVO	ETHERNET.	SI
8	CAT6	SI	SI	X
USUARIO.	**PASSWORD.**	**PATRON.**	**AUDIO.**	
XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	NO	

INFORMACION DEL SERVICIO.

Se realiza visita técnica atendiendo el primer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de redes de video vigilancia instalada en el **CENTRO DE SALUD IPC LA CANDELARIA**, perteneciente a la **E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND**, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

ACTIVIDADES REALIZADAS.

Se realiza limpieza total del gabinete y del cableado en general, del mismo modo limpieza de los lentes de las cámaras, alineación de vistas y cambios de video balun y fuentes de energía donde fue necesario.

MATERIAL Y REPUESTOS UTILIZADOS.

Ninguno en esta ocasión.

OBSERVACIONES.

Se mantiene la observación estas cámaras ya requieren ser cambiadas teniendo en cuenta que no cumplen con el protocolo que esta implementado la entidad.

ADALBERTO CASTRO DONADO.

COORDINADOR OPERATIVO.

Slendy Paz

USUARIO QUE ATIENDE LA VISITA.

Dirección: Calle 29B No 1C – 42. Tel: (605)4311902 Móvil: 3105930743 – 3007025400.
WhatsApp:3185969650 – 3245335278.
Web: www.soldicassas.com Email: contacto@soldicassas.com Santa Marta – Colombia.


CAM 1
CAM 2
CAM 3
CAM 4
CAM 5
CAM 6
CAM 7
CAM 8

SOPORTE TECNICO SOLDICAS S.A.S

INFORMACION DEL SERVICIO CONTRATO N°PJ-027-2026.

CLIENTE: E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND – SANTA MARTA – COLOMBIA.	**REPORTE N°:**
DEPENDENCIA: PUESTO DE SALUD PANDO.	**FECHA DE REPORTE:** 19/02/2026.
NOMBRE USUARIO: AMIRA GARCIA CUETO.	**FECHA DE SOLUCION:** 19/02/2026.
OFICINA: SISTEMAS	**TIPO DE CONEXIÓN:** LAN.
HORA INICIAL: 10:00 A.M **HORA FINAL:** 11:10 P.M	**DIRECCION IP:** DHCP

INOFORMACION DEL GRABADOR.

GRABADOR.	REFERENCIA	SERIAL	MARCA	CAPACI DISCO	CANALES	P. INVENTARIO
XVR	DH-XVR1B04HS-I	AC0C4B2PAZ109F6	DAHUA	1TB	4	6400

INFORMACION CAMARAS

CAMARAS.	SERIAL.	P. INVENTARIO.	REFERENCIA.	MARCA.	UBICACIÓN
DOMO	AF09126PDD93413	6420	DH-HAC-T1A51N-U-A	DAHUA	SALA DE ESPERA.
DOMO	AF09126PDD8837E	6421	DH-HAC-T1A51N-U-A	DAHUA	VACUNACION.

TIPO DE FUENTE.	TIPO DE CABLE.	TIPO DE V BALUN	TIPO DE CONEXIÓN.	EN LINEA.
12V 1 AMP	UTP	ACTIVO	ETHERNET.	SI
8	CAT6	SI	SI	X
USUARIO.	**PASSWORD.**	**PATRON.**	**AUDIO.**	
XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	NO	

INFORMACION DEL SERVICIO.

Se realiza visita técnica atendiendo el primer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de redes de video vigilancia instalada en el **PUESTO DE SALUD PANDO**, perteneciente a la **E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND**, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

ACTIVIDADES REALIZADAS.

Se realiza limpieza total del gabinete y del cableado en general, del mismo modo limpieza de los lentes de las dos cámaras instalada en esta unidad, alineación de vistas y cambios de video balun y fuentes de energía donde fue necesario.

MATERIAL Y REPUESTOS UTILIZADOS.

Dos parejas de video balun y una fuente de 12v 5amp.

OBSERVACIONES.

Se requiere la instalación de dos nuevas cámaras en la parte exterior de esta unidad.


ADALBERTO CASTRO DONADO.

COORDINADOR OPERATIVO.

Amira Garcia cueto

USUARIO QUE ATIENDE LA VISITA.

REGISTRO FOTOGRAFICO.

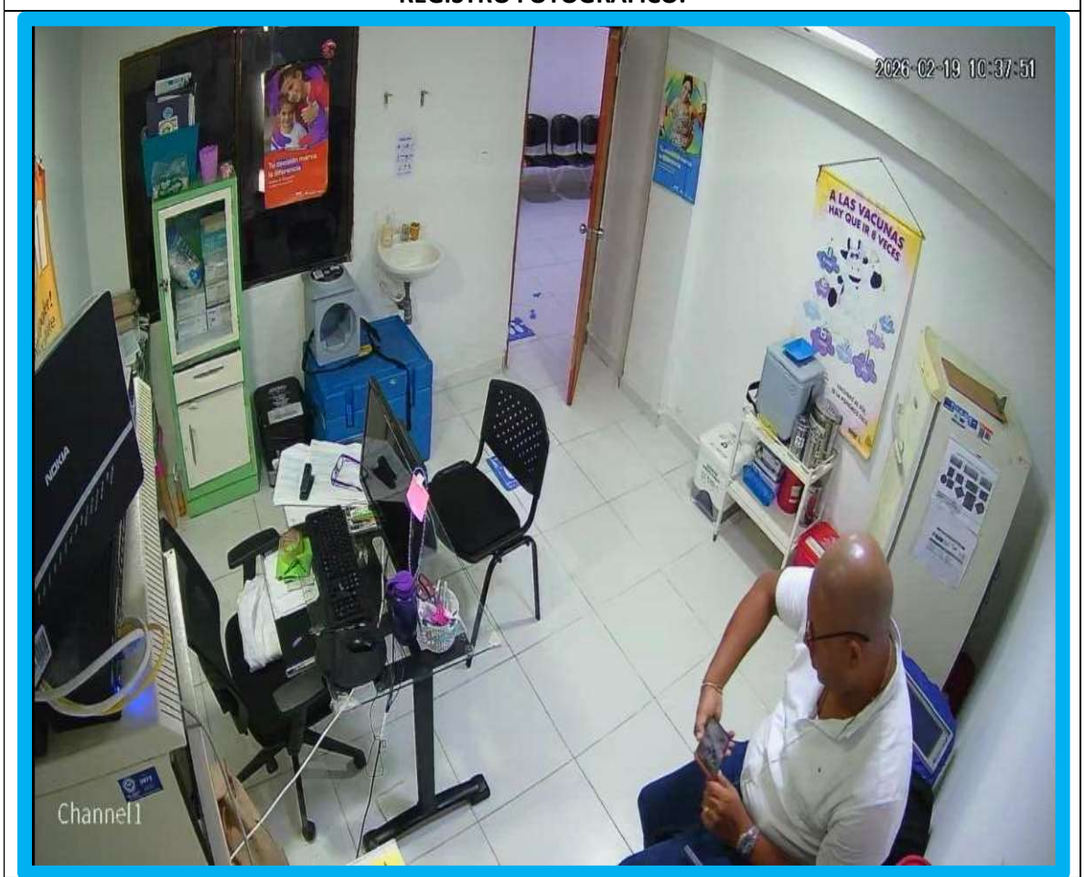



SOLDICAS SAS
NIT: 900.807.318 – 6.

SOPORTE TECNICO SOLDICAS S.A.S

INFORMACION DEL SERVICIO CONTRATO N°PJ-PS-030-2026.

CLIENTE: E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND – SANTA MARTA – COLOMBIA.	**REPORTE N°:** 004
DEPENDENCIA: P.S MANZANARES.	**FECHA DE REPORTE:** 20/02/2026.
NOMBRE USUARIO: JULIA ROMERO.	**FECHA DE SOLUCION:** 20/02/2026.
OFICINA: ENFERMERIA.	**TIPO DE CONEXIÓN:** LAN.
HORA INICIAL: 09:18 A.M **HORA FINAL:** 09:50 P.M	**DIRECCION IP:** DHCP

INOFORMACION DEL GRABADOR.

GRABADOR.	REFERENCIA	SERIAL	MARCA	CAPACI DISCO	CANALES	P. INVENTARIO
XVR	DH-XVR1B04HS-I	AD0C054PAZ22736	DAHUA	1TB	4	6390

INFORMACION CAMARAS

CAMARAS.	SERIAL.	P. INVENTARIO.	REFERENCIA.	MARCA.	UBICACION
DOMO	AF09126PDD89E46	6424	DH-HAC-T1A51N-U-A	DAHUA	SALA DE ESPERA.
DOMO	AF09126PDD62DD2	6425	DH-HAC-T1A51N-U-A	DAHUA	VACUNACION.

TIPO DE FUENTE.	TIPO DE CABLE.	TIPO DE V BALUN	TIPO DE CONEXIÓN.	EN LINEA.
12V 5 AMP	UTP	ACTIVO	ETHERNET.	SI
USUARIO.	**PASSWORD.**	**PATRON.**	**AUDIO.**	**DIAMETRO.**
XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX	SI	2.8

INFORMACION DEL SERVICIO.

Se realiza visita técnica atendiendo el primer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de redes de video vigilancia instalada en el **PUESTO DE SALUD MANZANARES**, perteneciente a la **E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND**, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

ACTIVIDADES REALIZADAS.

Se realiza limpieza total del gabinete y del cableado en general, del mismo modo limpieza de los lentes de las dos cámaras instalada en esta unidad, alineación de vistas y cambios de video balun y fuentes de energía donde fue necesario.

MATERIAL Y REPUESTOS UTILIZADOS.

Dos parejas de video balun y una fuente de 12v 5amp.

OBSERVACIONES.

Se requiere la instalación de tres nuevas cámaras en la parte exterior de esta unidad.


Sin perjuicio de que se haya afectado completamente las labores con el mantenimiento, se ha verificado y comprobado que los equipos objeto de mantenimiento quedan funcionando correctamente: Sí (X) No ( ) todo lo anterior Amparados en el contrato de prestación de servicios No PJ-PS-030-2026.


ADALBERTO CASTRO DONADO.
COORDINADOR OPERATIVO.


Julia Edet Romero Jimenez


QUIEN ATIENDE LA VISITA.

REGISTRO FOTOGRAFICO.

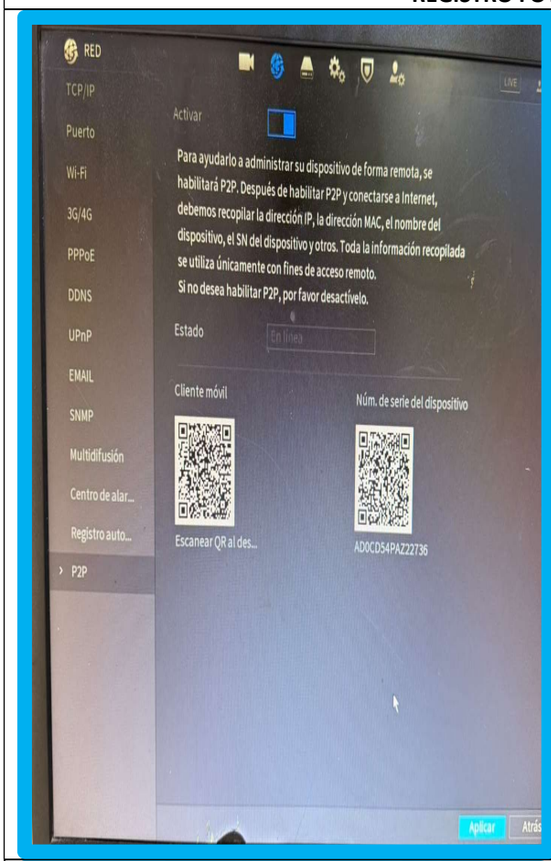

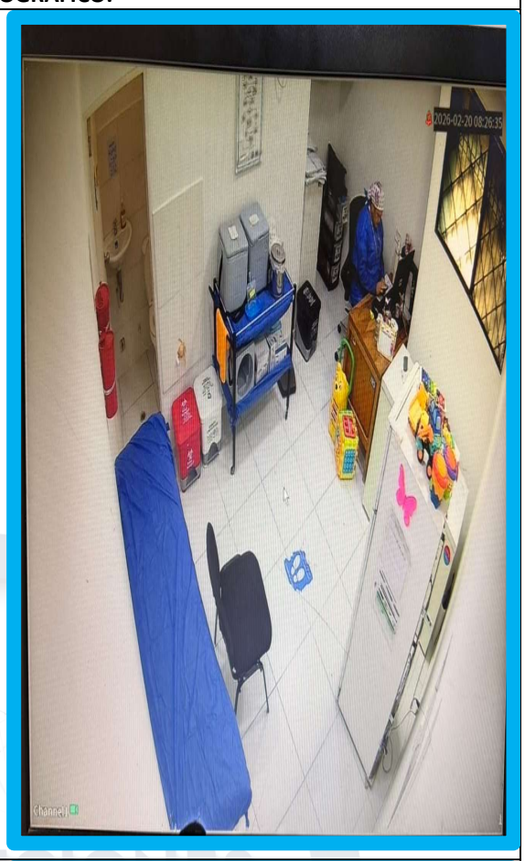

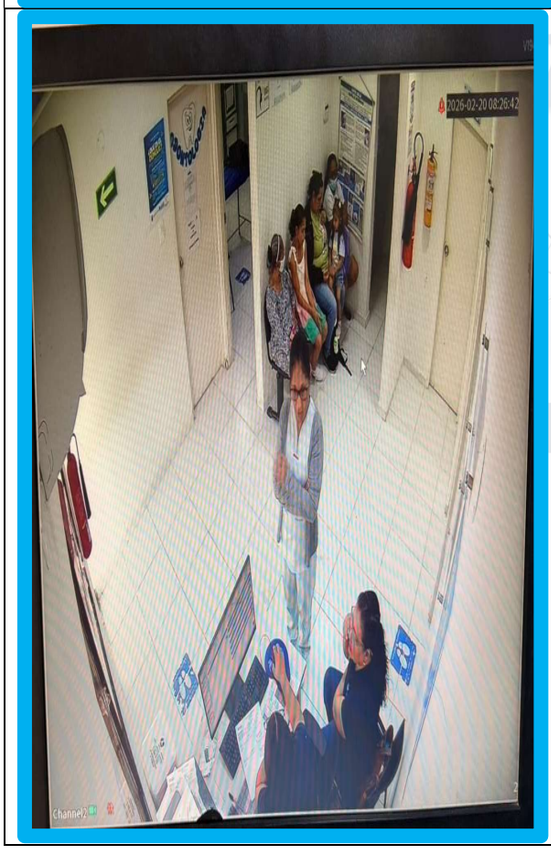

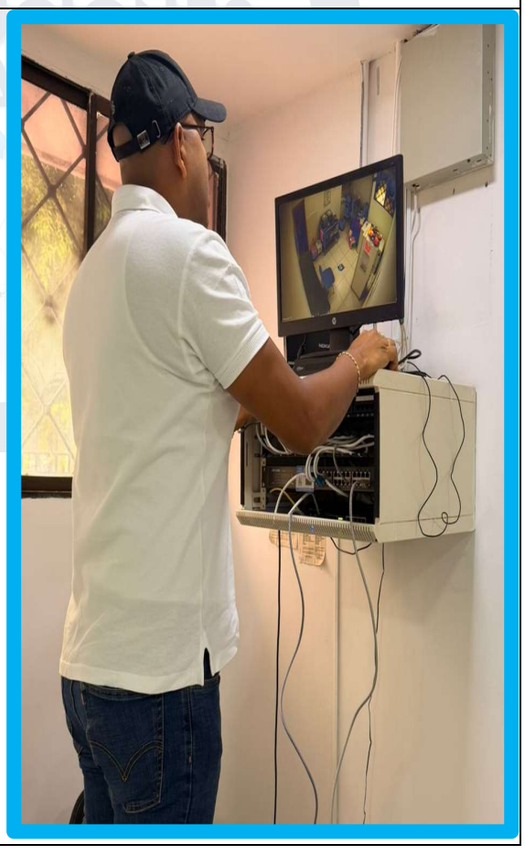

SOLDICAS SAS

NIT: 900.807.318 – 6.

SOPORTE TECNICO SOLDICAS S.A.S

INFORMACION DEL SERVICIO CONTRATO N°PJ-PS-027-2025.

CLIENTE: E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND – SANTA MARTA – COLOMBIA.	**REPORTE N°:** 0022.
DEPENDENCIA: P.S OBRERO.	**FECHA DE REPORTE:** 21/02/2026.
NOMBRE USUARIO: ENILSA PEÑA – ENFERMERA	**FECHA DE SOLUCION:** 21/02/2026.
OFICINA: SISTEMAS	**TIPO DE CONEXIÓN:** LAN.
HORA INICIAL: 08:15 A.M **HORA FINAL:** 10:30 A.M	**DIRECCION IP:** DHCP

INOFORMACION DEL GRABADOR.

GRABADOR.	REFERENCIA	SERIAL	MARCA	CAPACI DISCO	CANALES	P. INVENTARIO
XVR	DH-XVR1B08H-I	AC0B26BPAZB632A	DAHUA	2TB	8	NO TIENE

INFORMACION CAMARAS

CAMARAS.	SERIAL.	P. INVENTARIO.	REFERENCIA.	MARCA.	UBICACION
DOMO	No tiene	No tiene	No tiene	Dahua	Sala de espera.
DOMO	No tiene	No tiene	No tiene	Dahua	Pasillo consultorios.
DOMO	No tiene	No tiene	No tiene	Dahua	Entrada pricipal.
DOMO	No tiene	No tiene	No tiene	Dahua	Exterior izquierdo.
BALA	No tiene	No tiene	No tiene	Dahua	Exterior derecho.

TIPO DE FUENTE.	TIPO DE CABLE.	TIPO DE V BALUN	TIPO DE CONEXIÓN.	EN LINEA.
12V 5 AMP	UTP	ACTIVO	ETHERNET.	SI
USUARIO.	**PASSWORD.**	**PATRON.**	**AUDIO.**	**DIAMETRO.**
XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXX	no	2.8

INFORMACION DEL SERVICIO.

Se realiza visita técnica atendiendo el primer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de redes de video vigilancia instalada en el **PUESTO DE SALUD OBRERO**, perteneciente a la **E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND**, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

ACTIVIDADES REALIZADAS.

Se realiza limpieza total del gabinete y del cableado en general, del mismo modo limpieza de los lentes de las dos cámaras instalada en esta unidad, alineación de vistas y cambios de video balun y fuentes de energía donde fue necesario.

MATERIAL Y REPUESTOS UTILIZADOS.

Cambio de video balun.

OBSERVACIONES.

Se realiza retiro de monitor serial:AF007B6PGJ00160.

Sin perjuicio de que se haya afectado completamente las labores con el mantenimiento, se ha verificado y comprobado que los equipos objeto de mantenimiento quedan funcionando correctamente: Sí (X) No ( ) todo lo anterior Amparados en el contrato de prestación de servicios No PJ-PS-027-2026.

ADALBERTO CASTRO DONADO.
COORDINADOR OPERATIVO.

QUIEN ATIENDE LA VISITA.

SOLDICAS SAS

NIT: 900.807.318 – 6.







Dirección: Calle 29B No 1C – 42. Tel: (605)4311902 Móvil: 3007025400.

WhatsApp:3185969650

Web: www.soldicassas.com Email: contacto@soldicassas.com

Santa Marta – Colombia.

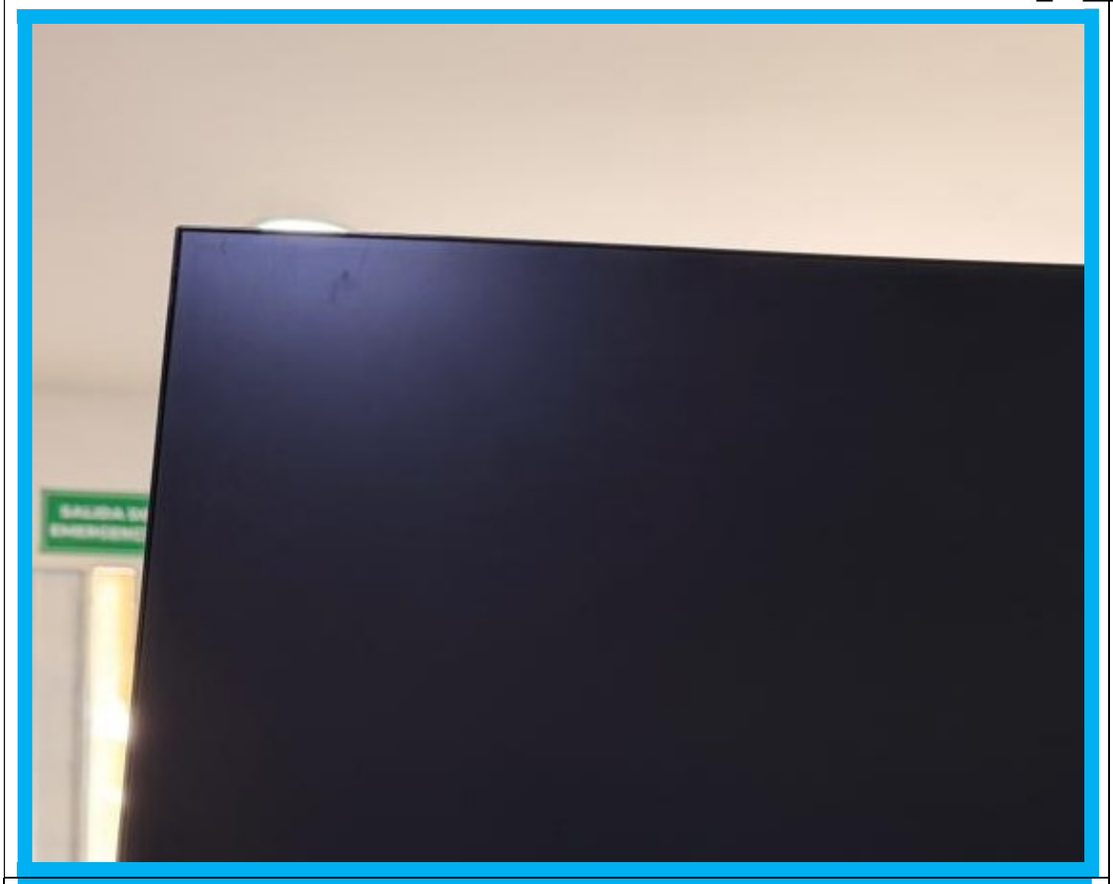

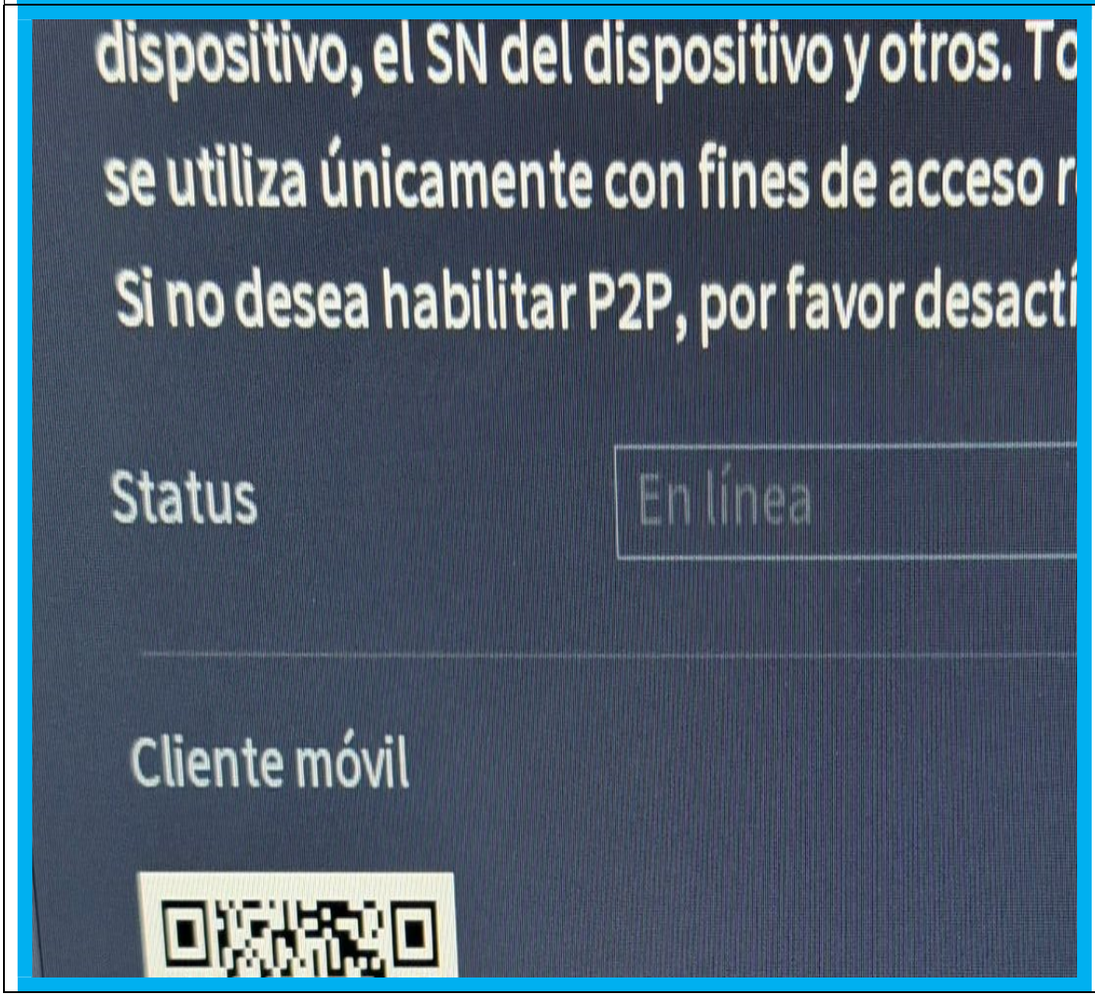
dispositivo, el SN del dispositivo y otros. To
se utiliza únicamente con fines de acceso r
Si no desea habilitar P2P, por favor desacti
Status
En línea
Cliente móvil

SOLDICAS SAS
NIT: 900.807.318 – 6.

SOPORTE TECNICO SOLDICAS S.A.S

INFORMACION DEL SERVICIO CONTRATO N°PJ-PS-027-2026.

CLIENTE: E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND – SANTA MARTA – COLOMBIA.	**REPORTE N°:** 013
DEPENDENCIA: P.S JUAN XXIII.	**FECHA DE REPORTE:** 20/02/2026.
NOMBRE USUARIO: GLEINIS BENAVIDES.	**FECHA DE SOLUCION:** 20/02/2026.
OFICINA: SISTEMAS	**TIPO DE CONEXIÓN:** LAN.
HORA INICIAL: 09:15 A.M **HORA FINAL:** 11:40 A.M	**DIRECCION IP:** DHCP

INOFORMACION DEL GRABADOR.

GRABADOR.	REFERENCIA	SERIAL	MARCA	CAPACI DISCO	CANALES	P. INVENTARIO
XVR	DH-XVR1B04HS-I	AD0CD54PAZ01BFB	DAHUA	1TB	4	NO TIENE

INFORMACION CAMARAS

CAMARAS.	SERIAL.	P. INVENTARIO.	REFERENCIA.	MARCA.	UBICACION
DOMO	AF09126PDDB9FB1	NO TIENE	DH-HAC-T1A51N-U-A	DAHUA	SALA DE ESPERA.
DOMO	AF09126PDD0316A	NO TIENE	DH-HAC-T1A51N-U-A	DAHUA	VACUNACION.

TIPO DE FUENTE.	TIPO DE CABLE.	TIPO DE V BALUN	TIPO DE CONEXIÓN.	EN LINEA.
12V 5 AMP	UTP	ACTIVO	ETHERNET.	SI
USUARIO.	**PASSWORD.**	**PATRON.**	**AUDIO.**	**DIAMETRO.**
XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXX	SI	2.8

INFORMACION DEL SERVICIO.

Se realiza visita técnica atendiendo el primer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de redes de video vigilancia instalada en el **PUESTO DE SALUD JUAN XXIII**, perteneciente a la **E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND**, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

ACTIVIDADES REALIZADAS.

Se realiza limpieza total del gabinete y del cableado en general, del mismo modo limpieza de los lentes de las dos cámaras instalada en esta unidad, alineación de vistas y cambios de video balun y fuentes de energía donde fue necesario.

MATERIAL Y REPUESTOS UTILIZADOS.

Cambio de dos parejas de video balun, y una fuente de energía.

OBSERVACIONES.

Se mantiene la necesidad de realizar la instalación de dos cámaras adicionales en la puerta principal ya que esta unidad cuenta con esos puntos ciegos, del mismo modo fue instalado un aire acondicionado que ocupa la visión de la cámara de que esta instalada en la sala de espera es necesario reubicar.

Sin perjuicio de que se haya afectado completamente las labores con el mantenimiento, se ha verificado y comprobado que los equipos objeto de mantenimiento quedan funcionando correctamente: Sí (X) No ( ) todo lo anterior Amparados en el contrato de prestación de servicios No PJ-PS-027-2026.

ADALBERTO CASTRO DONADO.
COORDINADOR OPERATIVO.


QUIEN ATIENDE LA VISITA:


SOLDICAS SAS

NIT: 900.807.318 – 6.

IMAGEN FOTOGRAFICA.



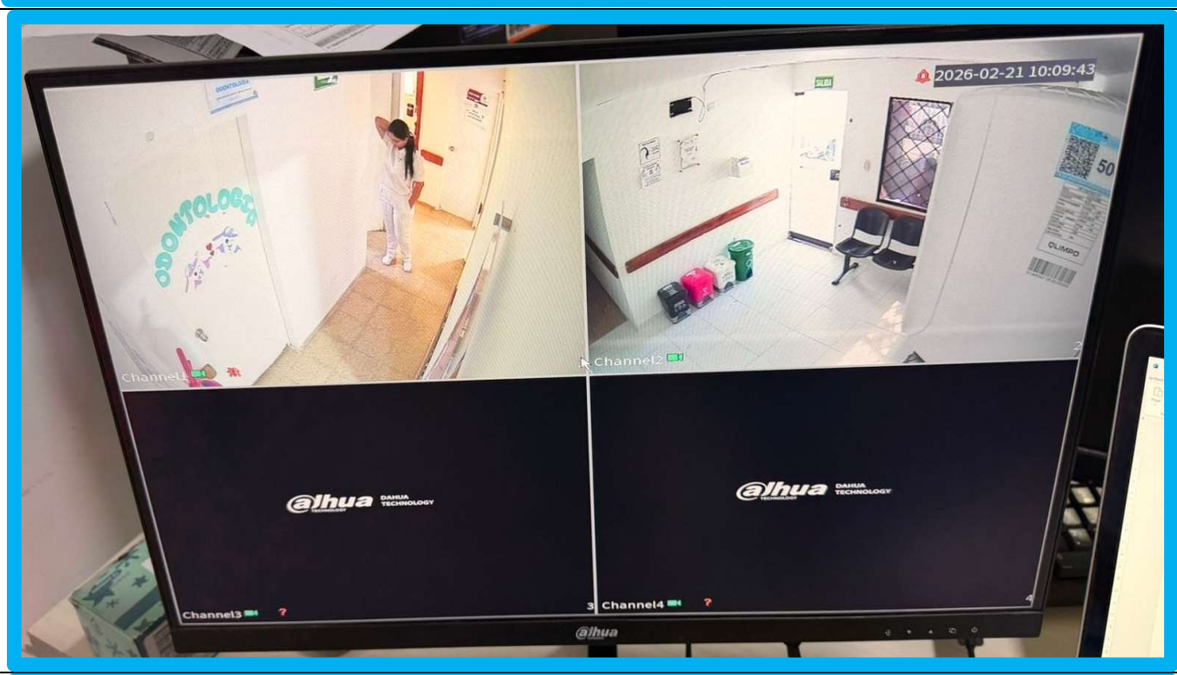

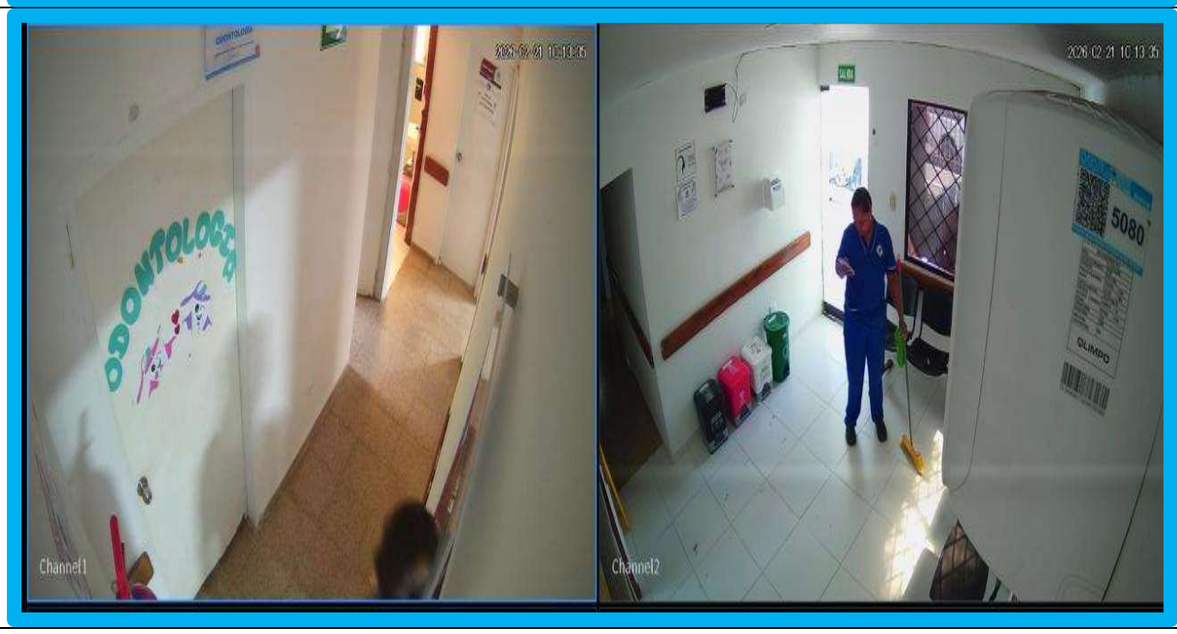

Dirección: Calle 29B No 1C – 42. Tel: (605)4311902 Móvil: 3105930743 – 3007025400.

WhatsApp:3185969650 – 3245335278.

Web: www.soldicassas.com Email: contacto@soldicassas.com Santa Marta – Colombia.

SOLDICAS SAS
NIT: 900.807.318 – 6.

SOPORTE TECNICO SOLDICAS S.A.S

INFORMACION DEL SERVICIO CONTRATO N°PJ-PS-027-2026.

CLIENTE: E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND – SANTA MARTA – COLOMBIA.	**REPORTE N°:**025
DEPENDENCIA: SEDE ADMINISTRATIVA.	**FECHA DE REPORTE:** 21/02/2026.
NOMBRE USUARIO: ADRIANA ARIZA MONSALVE.	**FECHA DE SOLUCION:** 21/02/2026.
OFICINA: SISTEMAS	**TIPO DE CONEXIÓN:** LAN.
HORA INICIAL: 10:00 A.M **HORA FINAL:** 04:50 P.M	**DIRECCION IP:** DHCP

INOFORMACION DEL GRABADOR.

GRABADOR.	REFERENCIA	SERIAL	MARCA	CAPACI DISCO	CANALES	P. INVENTARIO
XVR	DH-XVR1B16-I/T	BG02D4EPAJ8F02C	DAHUA	1TB	16	7583

INFORMACION CAMARAS

CAMARAS.	SERIAL.	P. INVENTARIO.	REFERENCIA.	MARCA.	UBICACION
BALA	AD025ACPBVC6F68	6459	DH-HAC-B1A21N	DAHUA	SALIDA PATIO
BALA	AD09306PDDE485D	6460	DH-HAC-B1A21N	DAHUA	PARQUEADERO
BALA	NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	DAHUA	PATIO
BALA	NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	DAHUA	PARQUEADERO
DOMO	NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	DAHUA	PASILLO
DOMO	NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	DAHUA	ENTRADA
DOMO	AF084BEPDD83730	7150	DH-HAC-T1A21N-U	DAHUA	ENTRADA PRINCIPA
DOMO	BJ0FAAFPDD0E1A9	7181	DH-HAC-T1A21N-U	DAHUA	ENTRADA GERENCIA.

TIPO DE FUENTE.	TIPO DE CABLE.	TIPO DE V BALUN	TIPO DE CONEXIÓN.	EN LINEA.
12V 5 AMP	UTP	ACTIVO	ETHERNET.	SI
X	X	X	X	
USUARIO.	**PASSWORD.**	**PATRON.**	**AUDIO.**	**DIAMETRO.**
XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXX	SI	2.8

INFORMACION DEL SERVICIO.

Se realiza visita técnica atendiendo el primer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de redes de video vigilancia instalada en la **SEDE ADMINISTRATIVA**, perteneciente a la **E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND**, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

ACTIVIDADES REALIZADAS.

Se realiza limpieza total del gabinete y del cableado en general, del mismo modo limpieza de los lentes de las cámaras instalada en esta unidad, alineación de vistas y cambios de video balun y fuentes de energía donde fue necesario, instalación de una nueva cámara con vista a las entradas de gerencia, subgerencia, jurídica y sistemas.

MATERIAL Y REPUESTOS UTILIZADOS.

Video balun, cámara de seguridad tipo domo, fuente de energía, cambio de xvr de 8 canales a uno de 16 canales.
XVR 8 CH CAMBIADO SERIAL: **AK06F61PAZ2DC2F**
XVR 16 CH INSTALADOSERIAL: **BG02D4EPAJ8F02C**

OBSERVACIONES.


Quedan 6 canales disponibles para posibles solicitudes.

Sin perjuicio de que se haya afectado completamente las labores con el mantenimiento, se ha verificado y comprobado que los equipos objeto de mantenimiento quedan funcionando correctamente: Sí (X) No ( ) todo lo anterior Amparados en el contrato de prestación de servicios No PJ-PS-027-2026.

ADALBERTO CASTRO DONADO.
COORDINADOR OPERATIVO.

QUIEN ATIENDE LA VISITA:

IMAGEN FOTOGRAFICA.

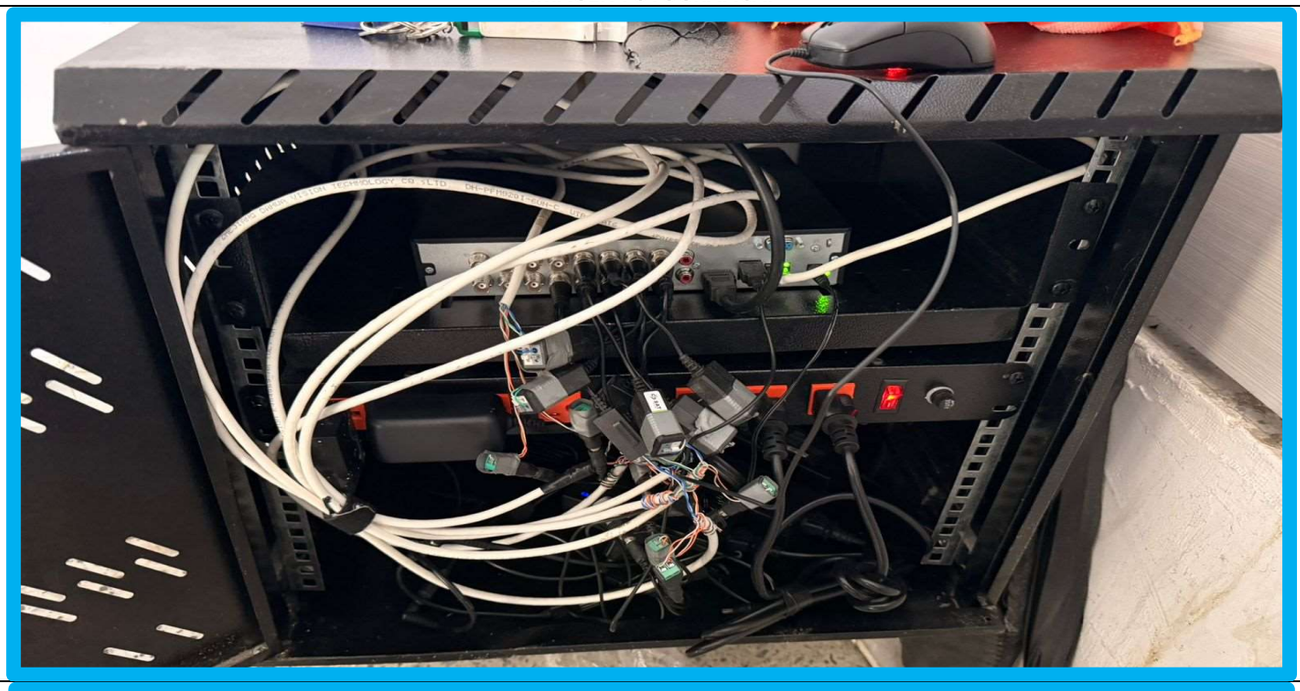





SOLDICAS SAS

NIT: 900.807.318 – 6.

SOPORTE TECNICO SOLDICAS S.A.S

INFORMACION DEL SERVICIO CONTRATO N°PJ-027-2026.

CLIENTE: E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND – SANTA MARTA – COLOMBIA.	**REPORTE N°:** 001
DEPENDENCIA: CENTRO DE SALUD BASTIDAS.	**FECHA DE REPORTE:** 22/02/2026.
NOMBRE USUARIO: DELMIRA PAOLA GUTIERREZ	**FECHA DE SOLUCION:** 22/02/2026.
OFICINA: SISTEMAS	**TIPO DE CONEXIÓN:** LAN.
HORA INICIAL: 07:00 A.M **HORA FINAL:** 03:10 P.M	**DIRECCION IP:** DHCP

INOFORMACION DEL GRABADOR.

GRABADOR.	REFERENCIA	SERIAL	MARCA	CAPACI DISCO	CANALES	P. INVENTARIO
XVR	DH-XVR5116HS-I3	AL068BAPAJ3D309	DAHUA	10TB	16	6603
XVR	DH-XVR5116HS-I3	AL068BAPAJF4E64	DAHUA	10TB	16	6602

INFORMACION CAMARAS

CAMARAS.	SERIAL.	INVENTARIO	MODELO.	MARCA.	UBICACION.
DOMO	AF09126PDDF655D	6484	DH-HAC-T1A51N-U-A	DAHUA.	DOCENCIA SERVICIO.
DOMO	AF09126PDD4A495	6479	DH-HAC-T1A51N-U-A	DAHUA.	ENTRA SALA PARTO
DOMO	AF09126PDDA3CC4	6480	DH-HAC-T1A51N-U-A	DAHUA.	VACUNACION.
DOMO	AF09126PDD30381	AUSENTE	DH-HAC-T1A51N-U-A	DAHUA.	ENTRADA INT CONSU
DOMO	AF09126PDDF0A8E	6485	DH-HAC-T1A51N-U-A	DAHUA.	CENTRAL ELECTRICA
DOMO	AF09126PDDF4652	6475	DH-HAC-T1A51N-U-A	DAHUA.	ENTRADA URG INTER
DOMO	AF09126PDD8A2BC	6481	DH-HAC-T1A51N-U-A	DAHUA.	SALA ESPERA CONS
DOMO	AF09126PDD81268	6477	DH-HAC-T1A51N-U-A	DAHUA.	PASILLO CONSU URG
DOMO	AF09126PDD9753D	6483	DH-HAC-T1A51N-U-A	DAHUA.	SALA ESPERA URG
DOMO	AF09126PDD9875A	6478	DH-HAC-T1A51N-U-A	DAHUA.	PASILLO CONSULTA
DOMO	AF09126PDDFC218	6487	DH-HAC-T1A51N-U-A	DAHUA.	LABORATORIO
DOMO	AF09126PDD2BE0D	6462	DH-HAC-T1A51N-U-A	DAHUA.	FARMACIA.
DOMO	AF09126PDD3ECEC	6474	DH-HAC-T1A51N-U-A	DAHUA.	ENTRADA ODONTOL
DOMO	AF09126PDD3213D	6471	DH-HAC-T1A51N-U-A	DAHUA.	PASILLO OBSERVAC
DOMO IP	AJ00044PAG4698B	6491	DH-IPC-HDW1439T1-A-IL	DAHUA.	FACTURACION CONS
DOMO IP	AJ00044PAG68883	AUSENTE	DH-IPC-HDW1439T1-A-IL	DAHUA.	CENTRO DE CABLEA
DOMO IP	AH06782PAGAAF6A	6489	DH-IPC-HDW1439T1-A-IL	DAHUA.	FACTURACION URG
DOMO IP	AH06782PAGE17C6	6488	DH-IPC-HDW1439T1-A-IL	DAHUA.	ESTACION ENF URG
BALA.	AF095FBPBV65A70	6467	DH-HAC-B1A51N-U-A	DAHUA.	ENTRADA URG
BALA.	AE0E3F1PDDA0573	6470	DH-HAC-B1A51N-U-A	DAHUA.	SALA ESPERA PATIO
BALA.	AG0C041PDD3660C	6468	DH-HAC-B1A51N-U-A	DAHUA.	SALA ESPERA PATIO
BALA.	AF095FBPBVA3219	6472	DH-HAC-B1A51N-U-A	DAHUA.	SALA ESPERA PATIO
BALA.	AE0E3F1PDD869C3	6469	DH-HAC-B1A51N-U-A	DAHUA.	ENTRADA CONSULTA
BALA.	AE0E3F1PDDEDEC4	6461	DH-HAC-B1A51N-U-A	DAHUA.	PASILLO MORGUE 2.
BALA.	AG0C041PDD710C5	6457	DH-HAC-B1A51N-U-A	DAHUA.	EXTERIOR CAI 1
BALA.	AE0E3F1PDDCB66E	6465	DH-HAC-B1A51N-U-A	DAHUA.	ENTRADA URG1
BALA.	AE0E3F1PDD055B9	6466	DH-HAC-B1A51N-U-A	DAHUA.	ENTRADA CONSULTA
BALA.	AG00135PBVE8966	6473	DH-HAC-B1A51N-U-A	DAHUA.	PASILLO MORGUE 1.
BALA.	AG00135PBVAD8F4	6456	DH-HAC-B1A51N-U-A	DAHUA.	PATIO
BALA.	AG00135PBV0EA30	6454	DH-HAC-B1A51N-U-A	DAHUA.	ENTRADA LABORATO
BALA.	AG00135PBVF2758	6455	DH-HAC-B1A51N-U-A	DAHUA.	EXTERIOR CONSULT
BALA.	AG0C041PDD1A34B	6453	DH-HAC-B1A51N-U-A	DAHUA.	EXTERIOR CAI 2
SWITCH DAHUA POE	AM09678PAJADA4A	6601	DH-PFS3010-8ET-96	DAHUA.	CENTRO DE CABLEADO

TIPO DE FUENTE.	TIPO DE CABLE.	TIPO DE V BALUN	TIPO DE CONEXIÓN.	EN LINEA.
12V 1 AMP	UTP	ACTIVO	ETHERNET.	SI
8	CAT6	SI	SI	X
USUARIO.	**PASSWORD.**	**PATRON.**	**AUDIO.**	
XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	NO	

INFORMACION DEL SERVICIO.

Se realiza visita técnica atendiendo el primer cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de redes de video vigilancia instalada en el **CENTRO DE SALUD BASTIDAS**, perteneciente a la **E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND**, entregado por el área de sistemas y comunicaciones.

ACTIVIDADES REALIZADAS.
Se realiza limpieza total del gabinete y del cableado en general, del mismo modo limpieza de los lentes de las cámaras, alineación de vistas y cambios de video balun y fuentes de energía donde fue necesario.
MATERIAL Y REPUESTOS UTILIZADOS.
4 Fuentes de 12v 5 amp, 1 multitoma para rack de 8 salidas, 6 patch cord. 14 video balun.
OBSERVACIONES.
Se mantiene la observación estas cámaras ya requieren ser cambiadas teniendo en cuenta que no cumplen con el protocolo que esta implementado la entidad.


ADALBERTO CASTRO DONADO.

COORDINADOR OPERATIVO.

USUARIO QUE ATIENDE LA VISITA.

REGISTRO FOTOGRAFICO.



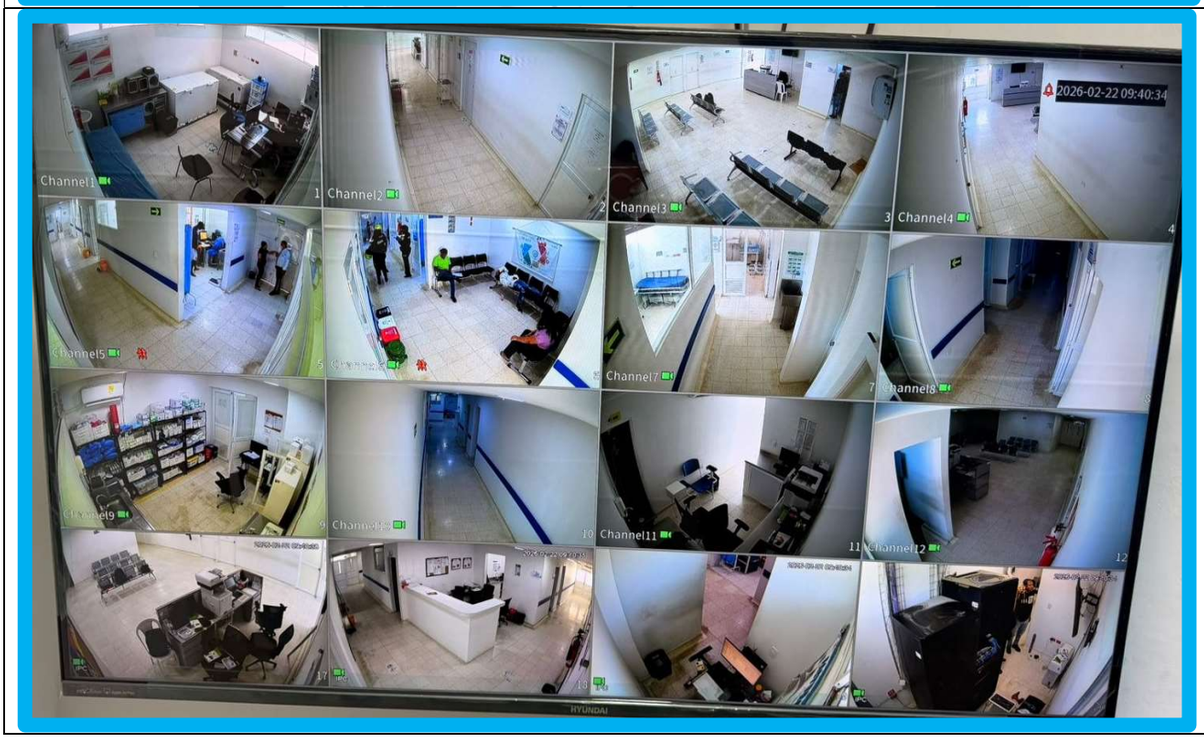







Dirección: Calle 29B No 1C – 42. Tel: (605)4311902 Móvil: 3105930743 – 3007025400.
WhatsApp:3185969650 – 3245335278.
Web: www.soldicassas.com Email: contacto@soldicassas.com Santa Marta – Colombia.

REPORTE DE MOVIMIENTO

ALEJANDRO PROSPERO REVEREND E.S.E.

AV DEL LIBERTADOR 25 67

3173633600

Tipo Movimiento: Entrada por compras (Entrada) **No.** 645193 **Consec Ref.** 11049

Fecha: 23/02/2026 **Tipo Documento:** ENTRADA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Bodega Origen: MATERIAL Y SUMINISTROS **Bodega Destino:** MATERIAL Y SUMINISTROS **Usuario:** ASUAREZ

Entregado a paciente: **Contrato:**

Orden De Compra: 0

Observaciones

FACTURA.FE318

CODIGO	PRODUCTO	LOTE	CANT.	VLR. UNITARIO.	IVA	SUB TOTAL
MYS714	SPLITTER PULPO 1X4 ELECTRICO PARA SISTEMA CCTV	*	10 Unid.	15.422,40	0	154.224,00
MYS713	FUENTE 12V 5A SAT	*	12 Unid.	78.540,00	0	942.480,00
MYS132	CABLE UTP CAT6A	*	305 Unid.	4.688,60	0	1.430.023,00
MYS723	VIDEO BALUN PASIVO	*	30 Unid.	20.111,00	0	603.330,00
MYS722	DISCO DURO 1 TB PURPURA	*	1 Unid.	537.880,00	0	537.880,00
MYS77	DISCO DURO 2TB	*	2 Unid.	860.489,00	0	1.720.978,00
MYS712	MULTITOMA RACK X8 RETIE	*	2 Unid.	211.820,00	0	423.640,00
MYS1366	TORNILLO TIPO CANASTILLA	*	10 Unid.	1.023,40	0	10.234,00
MYS341	SWITCH 5POR LS1005G GIGABIT TP	*	1 Unid.	199.920,00	0	199.920,00
MYS966	METRO CABLE UTP CAT6A SIN BLINDAR	*	30 Unid.	12.852,00	0	385.560,00
MYS927	CAJA HERMETICAS 10X10 PLASTICA	*	30 Unid.	18.278,40	0	548.352,00

TOTAL 6.956.621,00

Mansilla Peralta M.

FUNCIONARIO QUE RECIBE

Scanned with CamScanner

REPORTE DE MOVIMIENTO

ALEJANDRO PROSPERO REVEREND E.S.E.

AV DEL LIBERTADOR 25 67

3173633600

Tipo Movimiento: Entrada por compras (Entrada) **No.** 645192 **Consec Ref.** 11048

Fecha: 23/02/2026 **Tipo Documento:** ENTRADA DE ACTIVOS DE CONTROL

Bodega Origen: ACTIVOS ADMINISTRATIVOS **Bodega Destino:** ACTIVOS ADMINISTRATIVOS **Usuario:** ASUAREZ

Entregado a paciente: **Contrato:**

Orden De Compra: 0

Observaciones

FACTURA.FE318

CODIGO	PRODUCTO	LOTE	CANT.	VLR. UNITARIO.	IVA	SUB TOTAL
MYS234	CAMARA DOMO PLAST DAHUA 5MPX COOPER •		19 Unid.	248.472,00	0	4.720.968,00
ACT65	CAMARA BALA PLAST DAHUA 5M AUDIO IR20 COOP •		7 Unid.	257.040,00	0	1.799.280,00

TOTAL 6.520.248,00

FUNCIONARIO QUE RECIBE

Scanned with CamScanner

REPORTE DE MOVIMIENTO

ALEJANDRO PROSPERO REVEREND E.S.E.

AV DEL LIBERTADOR 25 67

3173633600

Tipo Movimiento: Entrada por compras (Entrada) **No.** 645182 **Consec Ref.** 11047

Fecha: 23/02/2026 **Tipo Documento:** ENTRADA DE ACTIVOS FIJOS

Bodega Origen: BODEGA DE ACTIVOS FIJOS **Bodega Destino:** BODEGA DE ACTIVOS FIJOS **Usuario:** ASUAREZ

Entregado a paciente: **Contrato:**

Orden De Compra: 0

Observaciones

FACTURA.FE318

CODIGO	PRODUCTO	LOTE	CANT.	VLR. UNITARIO.	IVA	SUB TOTAL
ACT206	XVR DAHUA 16CH+16IP 8M H265	•	2 Unid.	2.942.275,00	0	5.884.550,00
ACT78	XVR DAHUA 8CH+4IP 4MLITE H265+	•	2 Unid.	1.809.635,38	0	3.619.270,76

TOTAL 9.503.820,76

FUNCIONARIO QUE RECIBE

Scanned with CamScanner

(9) WhatsApp | Contabilidad eMedico

contabilidad.emedico.co/ListadoActivosFijos

Listados de activos fijos

Activos depreciables (tangibles) | Activos amortizables (intangibles)

Numero activo	Descripción	Ubicación	F. Ult. Depreciación	Valor del activo	Saldo	Estado
7625	XVR DAHUA 8CH+4MLITE H266	99 - SEDE ADM	2026-02-23	$1,809,635.38	$1,809,635.38	Activo
7624	XVR DAHUA 8CH+4MLITE H265	99 - SEDE ADM	2026-02-23	$1,809,635.38	$1,809,635.38	Activo
7592	XVR DAHUA 16CH+16IP 8M H265+1 BAHIA DE HDD	99 - SEDE ADM	2026-02-23	$2,942,275.00	$2,942,275.00	Activo
7626	XVR DAHUA 16CH+16IP 8M H265+1 BAHIA DE HDD	99 - SEDE ADM	2026-02-23	$2,942,275.00	$2,942,275.00	Activo
7691	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	99 - SEDE ADM	2026-02-19	$13,085,006.76	$13,085,006.76	Activo
