CORMAGDALENA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA
MANUAL DE INTERVENTORÍA

PROGRAMA DE INVERSIONES VIGENCIA 2025 (REPROGRAMACIÓN A PARTIR DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2025)

CÓDIGO	CINT-FR-009
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

SUBDIRECCIÓN U OFICINA EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DESARROLLO SOSTENIBLE Y NAVEGACIÓN | **ACTA No.** 24 | **VALOR BÁSICO ACTA** $ 4.689.477.887,00 | **PERIODO MES** 24 | **FECHA ELABORACIÓN** 9/01/2026

CONTRATO Nº 0-458-2023

OBJETO: MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO HIDRÁULICO Y MECÁNICO EN EL RIO MAGDALENA EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y BARRANQUILLA (ATLÁNTICO), 2023-2026


CONTRATISTA: CONSORCIO PANMAR - VÍAS 2023 | **LOCALIZACIÓ:** BARRANCABERMEJA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 0-458-2023 | **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

SUPERVISOR: MARÍA PAULA GUERRERO CHALELA - CORMAGDALENA

PLAZO INICIAL	30 MESES	**PLAZO ACUMULADO**	24 MESES
FECHA DE INICIO	5/01/2024	**PLAZO FINAL**	30 MESES
FECHA DE REINICIACIÓN		**FECHA DE VENCIMIENTO**	4/07/2026
VALOR INICIAL (incluido Iva)	$ 105.709.429.426,00	**VALOR ADICIÓN No. 3**	$ 3.570.573.331,00
VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 105.709.429.426,00	**VALOR TOTAL EN ADICIONES**	$ 14.516.485.814,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (1)	VALOR ORIGINAL V. ACTUALIZADO MILES DE PESOS (2)	% SOBRE VALOR CONTRATO (3)	% EJECUTADO SOBRE VALOR G.P.P (4)	% EJECUTADO SOBRE VALOR CONTRATO (5)	1 MES 13 01/01/2025 - 31/01/2025	2 MES 14 01/02/2025 - 29/02/2025	3 MES 15 01/03/2025 - 31/03/2025	4 MES 16 01/04/2025 - 30/04/2025	5 MES 17 01/05/2025 - 31/05/2025	6 MES 18 01/06/2025 - 30/06/2025	7 MES 19 01/07/2025 - 31/07/2025	8 MES 20 01/08/2025 - 31/08/2025	9 MES 21 01/09/2025 - 30/09/2025	10 MES 22 01/10/2025 - 31/10/2025	11 MES 23 01/11/2025 - 30/11/2025	12 MES 24 01/12/2025 - 31/12/2025
ITEM 1. DRAGADO HIDRÁULICO CON DRAGA PARTICULAR DE CORTE Y SUCCIÓN, INCLUYE: REMOLCADOR FLUVIAL, BOTE PARA MANOBRAS, ADAPTADO CON PUNTALES, EXCAVADORA PARA MANOBRAS DE DRAGADO, LANCHA DE TRANSPORTE DE TRIPULACIÓN, TUBERÍA DE FEAD CON SU EQUIPO DE TERMOFUSIÓN, EQUIPOS DE BATIMETRÍA CON SU RESPECTIVA LANCHA, MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE LAS DRAGAS Y SUS EQUIPOS DE APOYO Y DEMÁS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	40,789,700	77.73%	97.84%	76.05%	$ 2,264,503	$ 3,292,423	$ 3,323,209	$ 2,103,730	$ 2,173,854	$ 2,206,351	$ 3,234,271	$ 3,454,144	$ 3,196,591	$ 2,615,724	$ 3,671,513	$ 7,072,593
					5.55%	8.07%	8.15%	5.16%	5.33%	5.41%	7.93%	8.47%	7.84%	6.41%	9.00%	17.34%
					$ 3,811,394	$ 1,981,252	$ 2,044,569	$ 1,561,835	$ 1,717,259	$ 4,054,640	$ 4,285,691	$ 5,946,571	$ 3,986,824	$ 2,905,390	$ 3,612,750	$ 4,000,268
					9.34%	4.86%	5.01%	3.83%	4.21%	9.94%	10.51%	14.58%	9.77%	7.12%	8.86%	9.81%
ITEM 2. REMOCIÓN MECÁNICA, INCLUYE : EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ORUGAS CON BALDE, REMOLCADOR FLUVIAL, BOTE PARA MANOBRA ADAPTADO CON PUNTALES Y PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS EN UN SOLO TURNO	8,466,711	16.13%	81.53%	13.15%	$ 678,491	$ 511,844	$ 553,506	$ 535,651	$ 553,506	$ 624,926	$ 839,186	$ 788,192	$ 762,767	$ 788,192	$ 572,075	$ 750,054
					8.01%	6.05%	6.54%	6.33%	6.54%	7.38%	9.91%	9.31%	9.01%	9.31%	6.76%	8.86%
					$ 1,047,495	$ 660,636	$ 493,989	$ 452,327	$ 660,636	$ 470,182	$ 714,201	$ 1,024,235	$ 553,006	$ 171,661.52	$ 247,899	$ 406,809
					12.37%	7.80%	5.83%	5.34%	7.80%	5.55%	8.44%	12.10%	6.53%	2.03%	2.93%	4.80%
ITEM 3. EQUIPO DE APOYO PARA LA DRAGA DE CORMAGDALENA 1, INCLUYE: REMOLCADOR FLUVIAL, BOTE PARA MANOBRAS, EXCAVADORA PARA MANIOBRA DE DRAGADO Y PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS EN DOBLE TURNO	873,342	1.66%	100.00%	1.66%	$ 0	$ 160,001	$ 206,669	$ 200,002	$ 206,669	$ 100,001	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
					0.00%	18.32%	23.66%	22.90%	23.66%	11.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
					$ 0	$ 0	$ 100,001	$ 200,002	$ 206,669	$ 186,668	$ 180,002	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
					0.00%	0.00%	11.45%	22.90%	23.66%	21.37%	20.61%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ITEM 4. REPARACIONES, MANTENIMIENTOS Y/O SUMINISTROS DE Y PARA LAS DRAGAS PROPIEDAD DE CORMAGDALENA (INCLUYE EQUIPOS AUXILIARES) NO MODIFICABLE	681,584	1.30%	105.39%	1.37%	$ 138,742	$ 138,742	$ 69,371	$ 69,371	$ 69,371	$ 69,371	$ 138,742	$ 70,682	$ 66,158	$ 0	$ 0	$ 0
					20.36%	20.36%	10.18%	10.18%	10.18%	10.18%	20.36%	10.37%	9.71%	0.00%	0.00%	0.00%
					$ 0	$ 235,780	$ 48,325	$ 70,122	$ 105,268	$ 53,617	$ 31,633	$ 0	$ 13,062	$ 60,152	$ 26,236	$ 74,139
					0.00%	34.59%	7.09%	10.29%	15.44%	7.87%	4.64%	0.00%	1.92%	8.83%	3.85%	10.88%
ITEM 5. ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PAGA	322,028	0.61%	100.08%	0.61%	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 257,982
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	80.11%
					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64,047	$ 0	$ 106,321	$ 0	$ 135,881	$ 0	$ 16,027
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19.89%	0.00%	33.02%	0.00%	42.20%	0.00%	4.98%
ITEM 6. PROGRAMA SOCIAL CON COMUNIDADES USUARIAS DEL RÍO NO MODIFICABLE	302,953	0.58%	54.32%	0.31%	$ 0	$ 0	$ 75,738	$ 0	$ 0	$ 75,738	$ 0	$ 0	$ 0	$ 151,476	$ 75,738	$ 75,738
					0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	25.00%	25.00%
					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90,016	$ 74,560	$ 0	$ 0
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	29.71%	24.61%	0.00%	0.00%
ITEM 7. EQUIPO DE APOYO PARA LA DRAGA CARMEN RITA, INCLUYE CONJUNTO DE DRAGADO: EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON BALDE PARA DRAGADO, REMOLCADOR FLUVIAL, BOTE PARA MANIOBRA ADAPTADO CON PUNTALES Y PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS	1,039,652	1.98%	98.10%	1.94%									$ 158,423	$ 306,945	$ 297,043	$ 277,240
													15.24%	29.52%	28.57%	26.67%
													$ 188,127	$ 306,945	$ 297,043	$ 227,733
													18.10%	29.52%	28.57%	21.90%
VALOR BÁSICO TOTAL (NO INCLUYE IVA)	**52,475,969**	**100%**		**95.11%**												

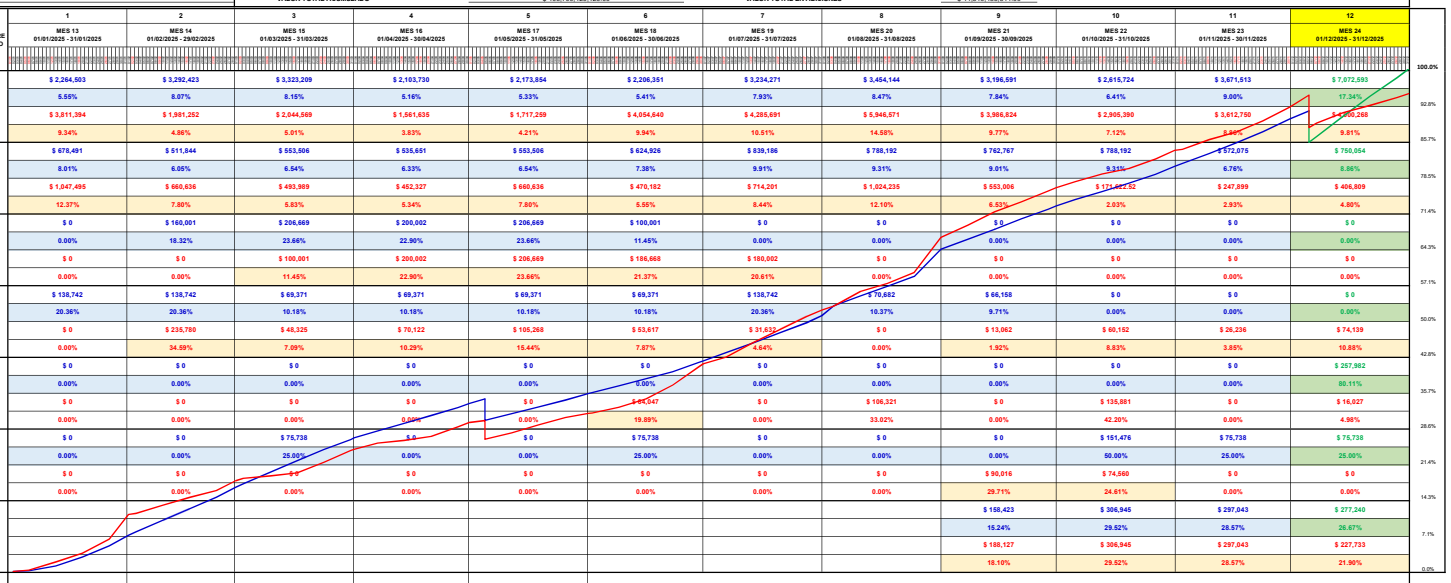

	INVERSIÓN MENSUAL BÁSICA	MILES DE PESOS	%	%	5.87%	9.26%	7.82%	5.48%	8.06%	5.12%	6.54%	4.36%	5.72%	5.13%	5.88%	9.20%	8.03%	9.93%	8.22%	13.49%	7.97%	9.21%	7.36%	6.96%	8.80%	7.97%	16.67%	9.00%
CONVENCIONES			REPROGRAMADO	EJECUTADA	3.081.736	4.858.889	4.103.011	2.877.667	4.229.493	2.690.894	2.908.754	2.284.086	3.003.400	2.689.832	3.075.387	4.820.155	4.212.200	5.211.527	4.313.018	7.077.128	4.183.939	4.831.006	3.862.338	3.654.560	4.616.989	4.183.929	8.433.668	4.724.976
PROGRAMADO																												
REPROGRAMADO	INVERSIÓN ACUMULADA BÁSICA	MILES DE PESOS	%	%	5.87%	9.26%	13.69%	14.74%	21.75%	19.86%	27.39%	24.22%	33.02%	29.34%	38.88%	38.54%	46.91%	48.46%	59.80%	61.96%	67.77%	71.17%	75.13%	78.13%	83.93%	86.11%	100.00%	95.11%
EJECUTADO			REPROGRAMADO	EJECUTADA	3.081.736	4.858.889	7.184.747	7.736.557	11.413.240	10.429.441	14.321.994	12.707.526	17.325.394	15.397.359	20.401.781	20.226.513	24.613.981	25.438.040	31.379.716	32.515.168	35.563.655	37.346.204	39.425.992	41.000.754	44.042.361	45.184.683	52.475.969	49.909.659

(1) Deben anotarse los códigos de los ítems agrupados.

(2) Valor original y actualizado de las G.P.P. Vigentes (Ver Instructivo).

(3) Porcentaje de cada G.P.P. tomando como 100 % el valor total del contrato principal.

(4) Porcentaje ejecutado acumulado de cada G.P.P. tomando como 100 % el valor vigente de cada G.P.P.

(5) Porcentaje ejecutado acumulado de cada G.P.P. tomando como 100 % el valor total del contrato original.

Firma:
Nombre: **CARLOS ALFONSO GUERRERO ACOSTA**
Representante Legal Contratista

Firma:
Nombre: **LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO**
Director de Interventoría
