| | | Sistema de Gestión de Calidad | |
|---|---|---|---|
| eLATIN | **ACTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO**<br>**CONTRATO No. 3984-2025** | **FORMATO N°:** | FT-MET-001 |
| | | **Fecha:** | Febrero 01/2020 |
| | | **Versión:** | 3 |

| **ACTA N°** | **MP 269** | **EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:** | **RONDA N° 2 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SISTEMA TELEFONÍA** |
|---|---|---|---|

**FECHA DE INICIO** **27 / 11 / 25**

## NOVEDADES PRELIMINARES

Al momento de realizar inspección del sistema de telefonía, no presenta novedad

## ACTIVIDAD REALIZADA

Durante la ejecución del mantenimiento preventivo al sistema de telefonía, se realizaron las siguientes actividades técnicas:


- Limpieza interna y externa de los equipos de telefonía y módulos asociados, utilizando aire a presión y paños antiestáticos para la remoción de polvo y partículas.
- Verificación del estado físico y mecánico de los puertos, conectores RJ45 y paneles de parcheo, asegurando su correcta fijación y conexión.
- Comprobación de continuidad y polaridad en los pares telefónicos, garantizando una adecuada transmisión de señal.

Revisión del sistema de alimentación eléctrica y correcta conexión a la red de respaldo (UPS).

| **GEOLOCALIZACIÓN:** | **latitud:** 4.8060598 - **longitud:** -75.7180876 - **altitud:** 1374 **m** |
|---|---|

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



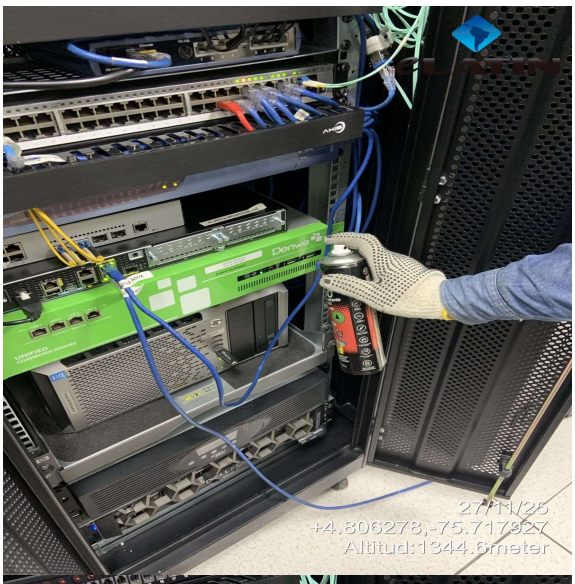







eLATIN
27/11/2025
4.8060501 -75.7180873
Altitud:1374.0msnm


eLATIN
27/11/2025
4.8060542 -75.7180795
Altitud:1373.6msnm


eLATIN
27/11/2025
4.8060604 -75.718076
Altitud:1372.4msnm


eLATIN
27/11/2025
4.8060582 -75.718081
Altitud:1373.6msnm

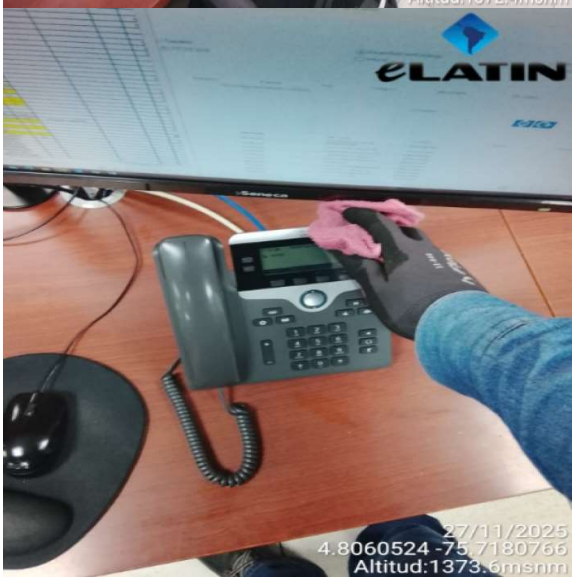
eLATIN
27/11/2025
4.8060524 -75.7180766
Altitud:1373.6msnm


eLATIN
MWY 563
27/11/2025
4.8060473 -75.7180778
Altitud:1373.6msnm













| OBSERVACIONES | | |
|---|---|---|
| Luego de la ejecución del mantenimiento preventivo, el equipo queda operativo y dentro de los parámetros normales de funcionamiento | | |
| **FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS** | | FIRMA |
| **Nombre**<br>**C.C**<br>**Cargo**<br>**Teléfono** | José Sebastián Mayoral<br>1.120.217.147<br>Ingeniero de Soporte<br>3127095797 | Sebastián Mayoral |
| **FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | FIRMA |
| **Nombre**<br>**C.C**<br>**Cargo**<br>**Teléfono** | Sebastián Madrid<br>9.861.041<br>Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana<br>3117076440 | |
