eLATIN	ACTA DE AFECTACIÓN DE BOLSA CONTRATO No. 3984-2025	Sistema de Gestión de Calidad	
		FORMATO N°:	FT-MET-001
		Fecha:	Febrero 01/2020
		Versión:	3

ACTA N°	AB 139	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	PUNTO DE CÁMARA P28 IGLESIA DORADO - CÁMARA DOMO PTZ

FECHA DE INICIO **03 / 12 / 25**

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

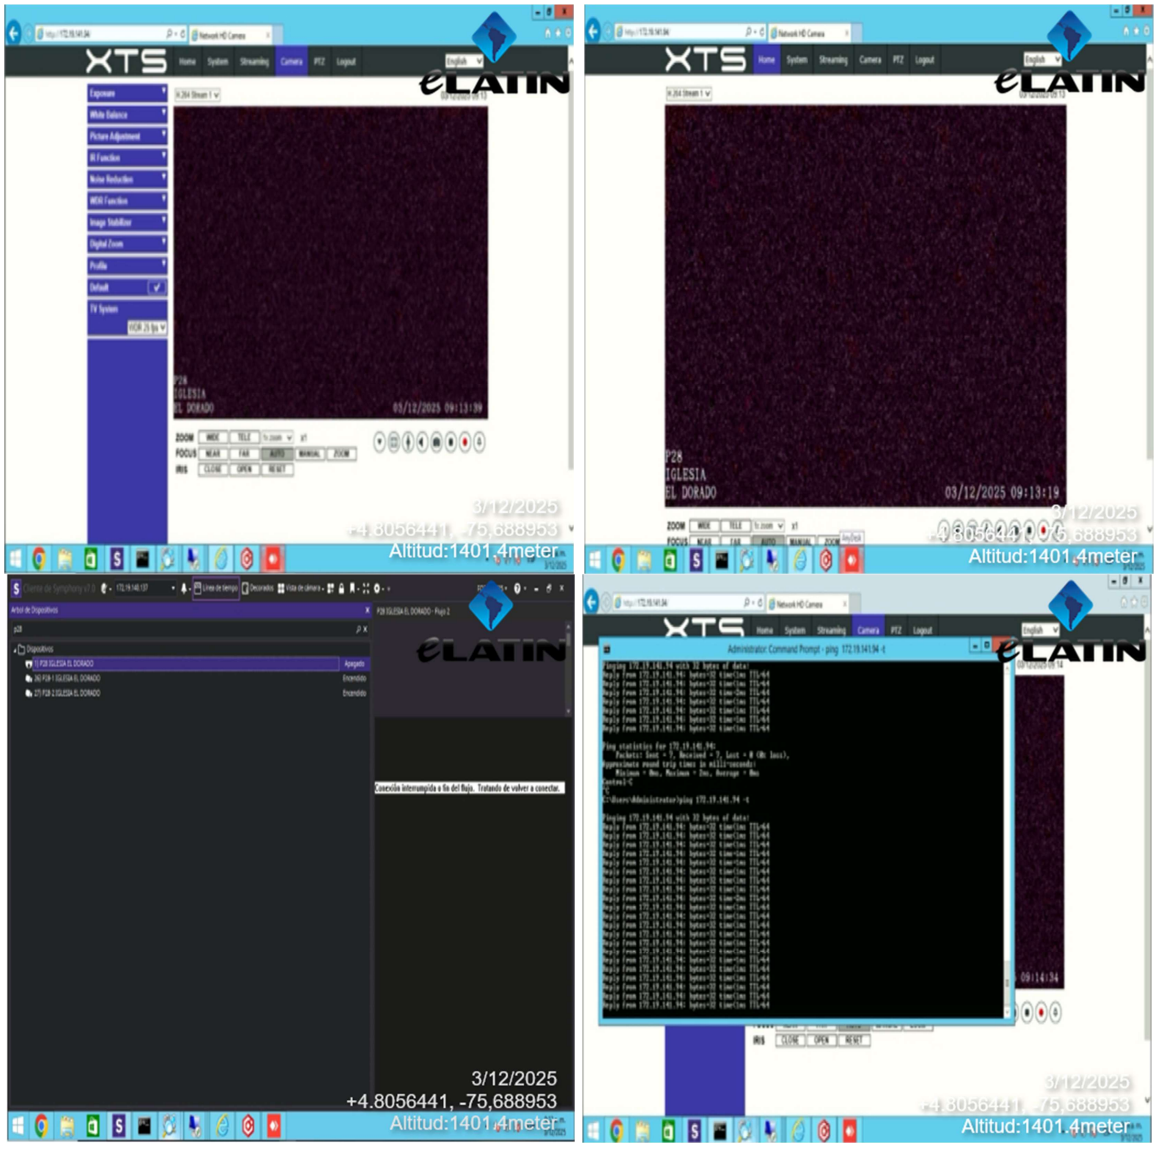
Durante la inspección del punto de cámara P28 Iglesia Dorado que la cámara tipo PTZ se encuentra energizada y con respuesta a nivel de red mediante protocolo (Ping) hacia su dirección IP. Sin embargo, no genera imagen de video, mostrando únicamente una pantalla negra con interferencia. Se ejecutó procedimiento de reinicio controlado del punto de cámara, sin que se lograra la recuperación de la funcionalidad. La condición detectada compromete la disponibilidad del dispositivo en el sistema de videovigilancia, impidiendo la captura y transmisión de evidencia visual, lo que genera un punto ciego en la cobertura de seguridad del área.

La cámara PTZ fue trasladada al banco de pruebas de las instalaciones de ELATIN, donde se verificó el estado físico y funcional del equipo para la ejecución de las respectivas pruebas operativas. Durante dichas pruebas se evidenció que, aunque el equipo presenta conectividad a nivel de red, persiste la falla al generar señal de video negra con interferencia. Con base en el diagnóstico, se recomienda el reemplazo del dispositivo PTZ, marca XTS, modelo SDH20XDN2MP-WPE y serial: SD17200689 con el propósito de restablecer la continuidad operacional del sistema, garantizar la integración con el centro de control y asegurar la trazabilidad visual ante eventualidades o incidentes.

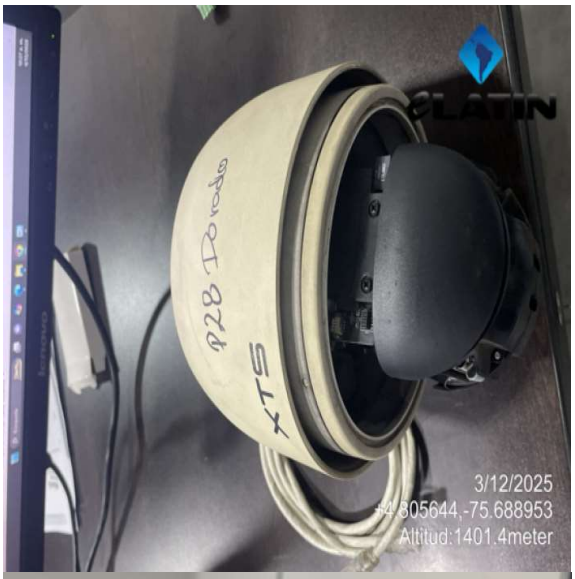
A solicitud de la supervisión, se realiza la instalación de una nueva cámara PTZ, procedimiento que queda consignado en el acta de mantenimiento correctivo MC 109 donde se documenta la evidencia técnica de la intervención realizada.

GEOLOCALIZACIÓN:	**latitud:** 4.8056441051575 - **longitud:** -75.688953016959 - **altitud:** 1401 **m**

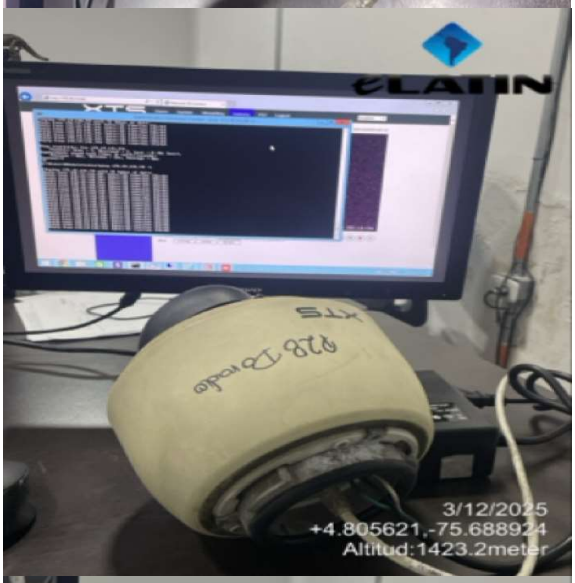
REGISTRO FOTOGRÁFICO

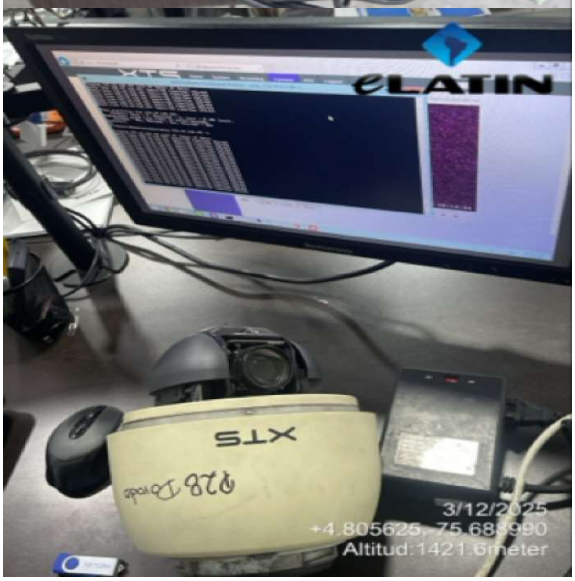


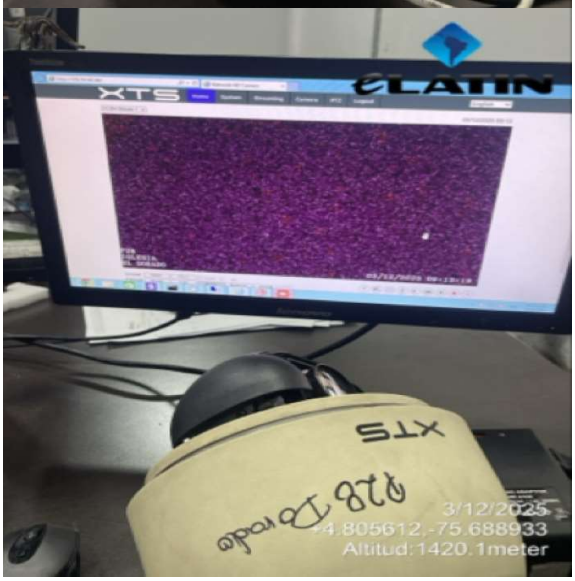

eLATIN
Model : SDH2DXDN2MP-WPF
P/N : 9C82F2Z2XT00
Network, 20X DN, True WDR
EIS, Sunshield, Vandal Proof Cover
AC24V & POE + 60W
MAC: A81B188A4373
SD17200689
MADE IN TAIWAN
3/12/2025
+4.805644,-75.688953
Altitud:1401.4meter

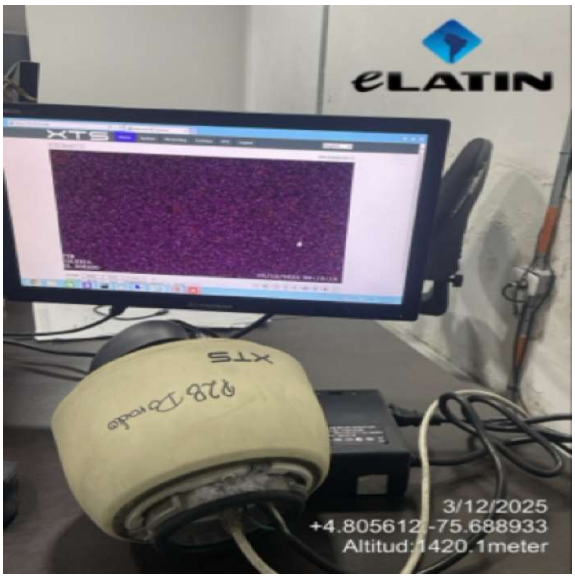

eLATIN
XTS
928 Dorado
3/12/2025
+4.805644,-75.688953
Altitud:1401.4meter


eLATIN
XTS
928 Dorado
3/12/2025
+4.805644,-75.688953
Altitud:1401.4meter


eLATIN
XTS
928 Dorado
3/12/2025
+4.805621,-75.688924
Altitud:1423.2meter


eLATIN
XTS
928 Dorado
3/12/2025
+4.805625,-75.688990
Altitud:1421.6meter


eLATIN
XTS
928 Dorado
3/12/2025
+4.805612,-75.688933
Altitud:1420.1meter





REPUESTO SOLICITADO		
Se solicita a la supervisión autorizar la afectación de bolsa de repuestos de los siguientes elementos: **1-** Sección CÁMARAS **- Ítem:** Cámara Domo PTZ Nueva, Cantidad: una (1) unidad. Costo unitario $ 7.776.000 **2-** Sección CÁMARAS **- Ítem:** Fuente de Poder VDC, para cámara videovigilancia, Cantidad: una (1) unidad. Costo unitario $108.000		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre	José Sebastián Mayoral	Sebastián Mayoral
C.C	1.120.217.147	
Cargo	Ingeniero de Soporte	
Teléfono	3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre	Sebastián Madrid	
C.C	9.861.041	
Cargo	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Teléfono	3117076440	
