

	CONTRATANTE	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO			
	CONTRATISTA	GRUPO INVERSIONES SAN JOSE SAS			
	INTERVENTORIA	ARQ. JUAN ESTEBAN PATIÑO VANEGAS			
	CODIGO:	VERSIÓN No. 01	FECHA:	Hoja: 01 de 40	

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO N°:	CO-001-2025	**OBJETO:**	REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN LOCATIVA DE INMUEBLE PROVISIONAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA				
ARQ RESPONSABLE:				**CORTE Nº:**	1	**FECHA :**	15/01/2026
ITEM Nº:	3,1	**DESCRIPCION ITEM**	DEMOLICIÓN MECÁNICA y/o MANUAL DE ESTRUCTURAS incluye cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado, y en cualquier clase de estructura.Retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.			**UND:**	m^3

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

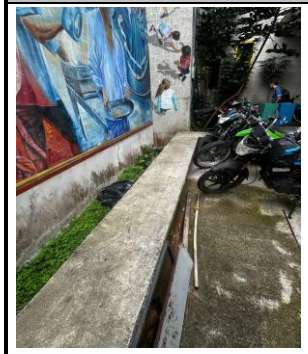

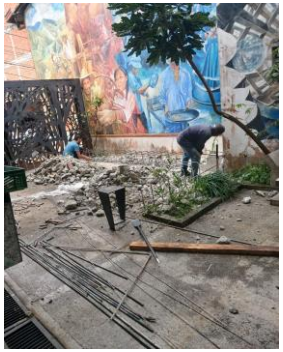



LOCALIZACION	DIMENSIONES			Cantidad	MEDIDA TOTAL
	Longitud	Ancho	Alto		
Demolición banca concreto zona parqueadero	9,6		0,55	1,0	5,3
Demolicion banca concreto debajo escalas	4,47		0,45	1,0	2,0
Demolición muro para apertura puerta urgencias	2,1		0,90	1,0	1,9
TOTAL ACTA N°1					**9,15**


CONTRATISTA		INTERVENTORIA		SUPERVISOR	
ELABORO		Vo.Bo.		Vo.Bo.	
NOMBRE	PEDRO DANIEL PINEDA RAMOS	NOMBRE	JUAN ESTEBAN PATIÑO VANEGAS	NOMBRE	MARIA TERESA TAMAYO OSPINA

SAN JOSÉ GRUPO DE INVERSIONES	CONTRATANTE: ESE HOSPITAL SAN ANTONIO				HSA Hospital San Antonio Buriticá
	CONTRATISTA: GRUPO INVERSIONES SAN JOSE SAS				
	INTERVENTORIA: ARQ. JUAN ESTEBAN PATIÑO VANEGAS				
	CODIGO:		VERSIÓN No. 01	FECHA:	Hoja: 01 de 40

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO N°:	CO-001-2025	**OBJETO:**	REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN LOCATIVA DE INMUEBLE PROVISIONAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA				
ARQ RESPONSABLE:				**CORTE Nº:**	1	**FECHA :**	15/01/2026
ITEM Nº:	4,1	**DESCRIPCION ITEM**	Construcción de losa de contrapiso en concreto de 28MPa. e=0.10m. Incluye malla D106, vidrado, encofrada todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. El entresuelo y el acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.			**UND:**	m²

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA


LOCALIZACION	DIMENSIONES			Cantidad	MEDIDA TOTAL
	Longitud	Ancho	Alto		
Losa zona parqueadero ambulancia				1,0	8,5
TOTAL ACTA N°5					**8,50**


CONTRATISTA		INTERVENTORIA		SUPERVISOR	
ELABORO		Vo.Bo.		Vo.Bo.	
NOMBRE	PEDRO DANIEL PINEDA RAMOS	NOMBRE	JUAN ESTEBAN PATIÑO VANEGAS	NOMBRE	MARIA TERESA TAMAYO OSPINA


	CONTRATANTE	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO			
	CONTRATISTA	GRUPO INVERSIONES SAN JOSE SAS			
	INTERVENTORIA	ARQ. JUAN ESTEBAN PATIÑO VANEGAS			
	CODIGO:	VERSIÓN No. 01	FECHA:	Hoja: 01 de 40	

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO N°:	CO-001-2025	**OBJETO:**	REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN LOCATIVA DE INMUEBLE PROVISIONAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA				
ARQ RESPONSABLE:				**CORTE Nº:**	1	**FECHA :**	15/01/2026
ITEM Nº:	5,1	**DESCRIPCION ITEM**	Suministro, transporte e instalación de estuco plastico sobre muros. Incluye ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.			**UND:**	m²

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA






LOCALIZACION	DIMENSIONES			Cantidad	MEDIDA TOTAL
	Longitud	Ancho	Alto		
Sótano N -3,7	7,2		3,00	2,0	43,4
Piso 1 N 0,0	7,1		3,00	2,0	42,6
Piso 2 N +3,60	6,5		3,00	2,000	39,0
			TOTAL ACTA N°5		**125,00**

CONTRATISTA		INTERVENTORIA		SUPERVISOR	
ELABORO		Vo.Bo.		Vo.Bo.	
NOMBRE	PEDRO DANIEL PINEDA RAMOS	NOMBRE	JUAN ESTEBAN PATIÑO VANEGAS	NOMBRE	MARIA TERESA TAMAYO OSPINA

SAN JOSÉ GRUPO DE INVERSIONES	CONTRATANTE: ESE HOSPITAL SAN ANTONIO				HSA Hospital San Antonio Buriticá
	CONTRATISTA: GRUPO INVERSIONES SAN JOSE SAS				
	INTERVENTORIA: ARQ. JUAN ESTEBAN PATIÑO VANEGAS				
	CODIGO:		VERSIÓN No. 01	FECHA:	Hoja: 01 de 40

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO N°:	CO-001-2025	**OBJETO:**	REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN LOCATIVA DE INMUEBLE PROVISIONAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA				
ARQ RESPONSABLE:				**CORTE Nº:**	1	**FECHA :**	15/01/2026
ITEM Nº:	5,2	**DESCRIPCION ITEM**	Suministro, transporte e instalación de pintura alta asepsia acril uretano sobre muros estucados y/o revocados a tres manos hasta obtener la superficie homogénea y todos los elementos necesarios para su acabado final			**UND:**	m²

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA






LOCALIZACION	DIMENSIONES			Cantidad	MEDIDA TOTAL
	Longitud	Ancho	Alto		
Observación	3,50	3,00		4,0	42,00
Consultorio de urgencias	1,12	3,00		1,0	3,36
Reanimación	3,10	3,00		1,0	9,30
Procedimiento menores	3,10	3,00		1,0	9,30
Consultorios	3,00	3,00		1,0	9,00
Farmacia	5,10	3,00		1,0	15,30
SIAU	2,91	3,00		1,0	8,74
TOTAL ACTA N°5					**97,00**



CONTRATISTA		INTERVENTORIA		SUPERVISOR	
ELABORO		Vo.Bo.		Vo.Bo.	
NOMBRE	PEDRO DANIEL PINEDA RAMOS	NOMBRE	JUAN ESTEBAN PATIÑO VANEGAS	NOMBRE	MARIA TERESA TAMAYO OSPINA

SAN JOSÉ GRUPO DE INVERSIONES	CONTRATANTE: ESE HOSPITAL SAN ANTONIO				HSA Hospital San Antonio Buriticá
	CONTRATISTA: GRUPO INVERSIONES SAN JOSE SAS				
	INTERVENTORIA: ARQ. JUAN ESTEBAN PATIÑO VANEGAS				
	CODIGO:		VERSIÓN No. 01	FECHA:	Hoja: 01 de 40


MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO N°:	CO-001-2025	**OBJETO:**	REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN LOCATIVA DE INMUEBLE PROVISIONAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA				
ARQ RESPONSABLE:				**CORTE Nº:**	1	**FECHA :**	15/01/2026
ITEM Nº:	6,1	**DESCRIPCION ITEM**	Suministro, transporte e instalación de muro en drywall. Incluye, placa yeso 1/2", masillado, pintura de alta asepsia acril uretano, perfilería de aluminio para soporte, chazos, cintas, ángulos, cortes y todo los demás elementos necesario para su correcta instalación y funcionamiento.			**UND:**	m²

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA






LOCALIZACION	DIMENSIONES			Cantidad	MEDIDA TOTAL
	Longitud	Ancho	Alto		
Procedimientos	4,2		2,83	3,0	35,7
Farmacia	5,23		2,83	1,0	14,8
Consultorios	4,2		2,83	4,0	47,5
TOTAL ACTA N°5					**98,00**

CONTRATISTA		INTERVENTORIA		SUPERVISOR	
ELABORO		Vo.Bo.		Vo.Bo.	
NOMBRE	PEDRO DANIEL PINEDA RAMOS	NOMBRE	JUAN ESTEBAN PATIÑO VANEGAS	NOMBRE	MARIA TERESA TAMAYO OSPINA

	CONTRATANTE	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO			
	CONTRATISTA	GRUPO INVERSIONES SAN JOSE SAS			
	INTERVENTORIA	ARQ. JUAN ESTEBAN PATIÑO VANEGAS			
	CODIGO:	VERSIÓN No. 01	FECHA:	Hoja: 01 de 40	

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO N°:	CO-001-2025	**OBJETO:**	REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN LOCATIVA DE INMUEBLE PROVISIONAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA				
ARQ RESPONSABLE:				**CORTE Nº:**	1	**FECHA :**	15/01/2026
ITEM Nº:	7,2,1	**DESCRIPCION ITEM**	Suministro, transporte e instalación de tuberia PVC-S 4", incluye accesorios de conexión, instalación y funcionamiento.			**UND:**	m

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES			Cantidad	MEDIDA TOTAL
	Longitud	Ancho	Alto		
Conexión provisionales PVC-S 4"	1,0		1,00	1,0	1,0
TOTAL ACTA N°5					**1,00**

CONTRATISTA		INTERVENTORIA		SUPERVISOR	
ELABORO		Vo.Bo.		Vo.Bo.	
NOMBRE	PEDRO DANIEL PINEDA RAMOS	NOMBRE	JUAN ESTEBAN PATIÑO VANEGAS	NOMBRE	MARIA TERESA TAMAYO OSPINA


	CONTRATANTE	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO			
	CONTRATISTA	GRUPO INVERSIONES SAN JOSE SAS			
	INTERVENTORIA	ARQ. JUAN ESTEBAN PATIÑO VANEGAS			
	CODIGO:	VERSIÓN No. 01	FECHA:	Hoja: 01 de 40	

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO N°:	CO-001-2025	**OBJETO:**	REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN LOCATIVA DE INMUEBLE PROVISIONAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA				
ARQ RESPONSABLE:				**CORTE Nº:**	1	**FECHA :**	15/01/2026
ITEM Nº:	7,2,2	**DESCRIPCION ITEM**	Suministro, transporte e instalación de tuberia PVC-S 2", incluye accesorios de conexión, instalación y funcionamiento.			**UND:**	m

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA







LOCALIZACION	DIMENSIONES			Cantidad	MEDIDA TOTAL
	Longitud	Ancho	Alto		
Conexión provisionales PVC-S 2"	43,0			43,0	43,0
Sótano N-3,7					
Piso 1 N-0,0					
Piso 2 N+3,70					
TOTAL ACTA N°5					**43,00**

CONTRATISTA		INTERVENTORIA		SUPERVISOR	
ELABORO		Vo.Bo.		Vo.Bo.	
NOMBRE	PEDRO DANIEL PINEDA RAMOS	NOMBRE	JUAN ESTEBAN PATIÑO VANEGAS	NOMBRE	MARIA TERESA TAMAYO OSPINA

	CONTRATANTE	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO			
	CONTRATISTA	GRUPO INVERSIONES SAN JOSE SAS			
	INTERVENTORIA	ARQ. JUAN ESTEBAN PATIÑO VANEGAS			
	CODIGO:	VERSIÓN No. 01	FECHA:	Hoja: 01 de 40	

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO N°:	CO-001-2025	**OBJETO:**	REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN LOCATIVA DE INMUEBLE PROVISIONAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA				
ARQ RESPONSABLE:				**CORTE Nº:**	1	**FECHA :**	15/01/2026
ITEM Nº:	7,2,3	**DESCRIPCION ITEM**	Suministro, transporte e instalación de salida de sanitaria de PVC-S 2", incluye accesorios de conexión, instalación y funcionamiento.			**UND:**	und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA






LOCALIZACION	DIMENSIONES			Cantidad	MEDIDA TOTAL
	Longitud	Ancho	Alto		
Conexión provisionales PVC-S 2"	4,0			4,0	4,0
Sótano N-3,7					
Piso 1 N-0,0					
Piso 2 N+3,70					
TOTAL ACTA N°5					**4,00**

CONTRATISTA		INTERVENTORIA		SUPERVISOR	
ELABORO		Vo.Bo.		Vo.Bo.	
NOMBRE	PEDRO DANIEL PINEDA RAMOS	NOMBRE	JUAN ESTEBAN PATIÑO VANEGAS	NOMBRE	MARIA TERESA TAMAYO OSPINA

	CONTRATANTE	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO			
	CONTRATISTA	GRUPO INVERSIONES SAN JOSE SAS			
	INTERVENTORIA	ARQ. JUAN ESTEBAN PATIÑO VANEGAS			
	CODIGO:	VERSIÓN No. 01	FECHA:	Hoja: 01 de 40	

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO N°:	CO-001-2025	**OBJETO:**	REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN LOCATIVA DE INMUEBLE PROVISIONAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA				
ARQ RESPONSABLE:				**CORTE Nº:**	1	**FECHA :**	15/01/2026
ITEM Nº:	7,3,1	**DESCRIPCION ITEM**	Suministro, transporte e instalación de ducha provisional, incluye griferia y conexión, abasto y todos los elementos necesario para su correcto funcionamiento	**UND:**	und		

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION	DIMENSIONES			Cantidad	MEDIDA TOTAL
	Longitud	Ancho	Alto		
Conexión de baño provisional				4,0	4,0
Sótano N-3,7					
Piso 1 N-0,0					
TOTAL ACTA N°5					**4,00**

CONTRATISTA		INTERVENTORIA		SUPERVISOR	
ELABORO		Vo.Bo.		Vo.Bo.	
NOMBRE	PEDRO DANIEL PINEDA RAMOS	NOMBRE	JUAN ESTEBAN PATIÑO VANEGAS	NOMBRE	MARIA TERESA TAMAYO OSPINA

	CONTRATANTE	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO			
	CONTRATISTA	GRUPO INVERSIONES SAN JOSE SAS			
	INTERVENTORIA	ARQ. JUAN ESTEBAN PATIÑO VANEGAS			
	CODIGO:	VERSIÓN No. 01	FECHA:	Hoja: 01 de 40	

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO N°:	CO-001-2025	**OBJETO:**	REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN LOCATIVA DE INMUEBLE PROVISIONAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA				
ARQ RESPONSABLE:				**CORTE Nº:**	1	**FECHA :**	15/01/2026
ITEM Nº:	7,3,2	**DESCRIPCION ITEM**	Suministro, transporte e instalación de lavamanos Acuacer de colgar blanco, incluye griferia, abasto metálico, sifón y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.			**UND:**	und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA







LOCALIZACION	DIMENSIONES			Cantidad	MEDIDA TOTAL
	Longitud	Ancho	Alto		
Sótano N-3,7				1,0	1,0
Piso 1 N-0,0				1,0	1,0
Piso 2 N+3,70				1,0	1,0
TOTAL ACTA N°5					**3,00**

CONTRATISTA		INTERVENTORIA		SUPERVISOR	
ELABORO		Vo.Bo.		Vo.Bo.	
NOMBRE	PEDRO DANIEL PINEDA RAMOS	NOMBRE	JUAN ESTEBAN PATIÑO VANEGAS	NOMBRE	MARIA TERESA TAMAYO OSPINA

	CONTRATANTE	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO			
	CONTRATISTA	GRUPO INVERSIONES SAN JOSE SAS			
	INTERVENTORIA	ARQ. JUAN ESTEBAN PATIÑO VANEGAS			
	CODIGO:	VERSIÓN No. 01	FECHA:	Hoja: 01 de 40	

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO N°:	CO-001-2025	**OBJETO:**	REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN LOCATIVA DE INMUEBLE PROVISIONAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA				
ARQ RESPONSABLE:				**CORTE Nº:**	1	**FECHA :**	15/01/2026
ITEM Nº:	9,1,1	**DESCRIPCION ITEM**	Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo de iluminación (5601-2W Decora Leviton), incluye tuberia, cable 12 AWG-CU-THHN/THWN-90ºC, accesorios de fijación para su correcta instalación y funcionamiento			**UND:**	und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION	DIMENSIONES			Cantidad	MEDIDA TOTAL
	Longitud	Ancho	Alto		
Iluminación provisional					
Sótano N-3,7				3,0	3,0
Piso 1 N-0,0				3,0	3,0
Piso 2 N+3,70				3,0	3,0
TOTAL ACTA N°5					**9,00**

CONTRATISTA		INTERVENTORIA		SUPERVISOR	
ELABORO		Vo.Bo.		Vo.Bo.	
NOMBRE	PEDRO DANIEL PINEDA RAMOS	NOMBRE	JUAN ESTEBAN PATIÑO VANEGAS	NOMBRE	MARIA TERESA TAMAYO OSPINA

	CONTRATANTE	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO			
	CONTRATISTA	GRUPO INVERSIONES SAN JOSE SAS			
	INTERVENTORIA	ARQ. JUAN ESTEBAN PATIÑO VANEGAS			
	CODIGO:	VERSIÓN No. 01	FECHA:	Hoja: 01 de 40	

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO N°:	CO-001-2025	**OBJETO:**	REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN LOCATIVA DE INMUEBLE PROVISIONAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA				
ARQ RESPONSABLE:				**CORTE Nº:**	1	**FECHA :**	15/01/2026
ITEM Nº:	9,1,2	**DESCRIPCION ITEM**	Suministro, transporte e instalación de salida para luminaria LED en muro o techo, incluye tuberia empotrada, cable 12 AWG-CU-THHN/THWN-90ºC, encintada y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento	**UND:**	und		

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION	DIMENSIONES			Cantidad	MEDIDA TOTAL
	Longitud	Ancho	Alto		
Iluminación provisional					
Sótano N-3,7				3,0	3,0
Piso 1 N-0,0				3,0	3,0
Piso 2 N+3,70				3,0	3,0
TOTAL ACTA N°5					**9,00**

CONTRATISTA		INTERVENTORIA		SUPERVISOR	
ELABORO		Vo.Bo.		Vo.Bo.	
NOMBRE	PEDRO DANIEL PINEDA RAMOS	NOMBRE	JUAN ESTEBAN PATIÑO VANEGAS	NOMBRE	MARIA TERESA TAMAYO OSPINA

	CONTRATANTE	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO			
	CONTRATISTA	GRUPO INVERSIONES SAN JOSE SAS			
	INTERVENTORIA	ARQ. JUAN ESTEBAN PATIÑO VANEGAS			
	CODIGO:	VERSIÓN No. 01	FECHA:	Hoja: 01 de 40	

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO N°:	CO-001-2025	**OBJETO:**	REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN LOCATIVA DE INMUEBLE PROVISIONAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA				
ARQ RESPONSABLE:				**CORTE Nº:**	1	**FECHA :**	15/01/2026
ITEM Nº:	9,2,1	**DESCRIPCION ITEM**	Suministro, transporte e instalación de acometida trifásica en cables 1No.12+1No.12+1No.12 AWG-75ºC, incluye conectrores, encintada y demás accesorios de fijación para su correcta instalación y funcionamiento		**UND:**	m	

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION	DIMENSIONES			Cantidad	MEDIDA TOTAL
	Longitud	Ancho	Alto		
Losa zona parqueadero ambulancia	9,6		0,60	1,0	5,7
				1,0	
TOTAL ACTA N°5					**5,73**



CONTRATISTA		INTERVENTORIA		SUPERVISOR	
ELABORO		Vo.Bo.		Vo.Bo.	
NOMBRE	PEDRO DANIEL PINEDA RAMOS	NOMBRE	JUAN ESTEBAN PATIÑO VANEGAS	NOMBRE	MARIA TERESA TAMAYO OSPINA


	CONTRATANTE	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO			
	CONTRATISTA	GRUPO INVERSIONES SAN JOSE SAS			
	INTERVENTORIA	ARQ. JUAN ESTEBAN PATIÑO VANEGAS			
	CODIGO:	VERSIÓN No. 01	FECHA:	Hoja: 01 de 40	

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO N°:	CO-001-2025	**OBJETO:**	REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN LOCATIVA DE INMUEBLE PROVISIONAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA				
ARQ RESPONSABLE:				**CORTE Nº:**	1	**FECHA :**	15/01/2026
ITEM Nº:	9,3,1	**DESCRIPCION ITEM**	Suministro, transporte e instalación de tuberia EMT 3/4", incluye accesorios de conecciones y demás todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento			**UND:**	m

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES			Cantidad	MEDIDA TOTAL
	Longitud	Ancho	Alto		
Acometida para redes provisionales	128,1			1,0	128,1
TOTAL ACTA N°5					**128,10**

CONTRATISTA		INTERVENTORIA		SUPERVISOR	
ELABORO		Vo.Bo.		Vo.Bo.	
NOMBRE	PEDRO DANIEL PINEDA RAMOS	NOMBRE	JUAN ESTEBAN PATIÑO VANEGAS	NOMBRE	MARIA TERESA TAMAYO OSPINA


SAN JOSÉ GRUPO DE INVERSIONES	CONTRATANTE: ESE HOSPITAL SAN ANTONIO CONTRATISTA: GRUPO INVERSIONES SAN JOSE SAS INTERVENTORIA: ARQ. JUAN ESTEBAN PATIÑO VANEGAS				HSA Hospital San Antonio Buriticá
CODIGO:		VERSIÓN No. 01	FECHA:	Hoja: 01 de 40	

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO N°:	CO-001-2025	**OBJETO:**	REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN LOCATIVA DE INMUEBLE PROVISIONAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA				
ARQ RESPONSABLE:				**CORTE Nº:**	1	**FECHA :**	15/01/2026
ITEM Nº:	12,1	**DESCRIPCION ITEM**	Suministro, transporte e instalación de mesón en acero inoxidable mueble, incluye salpicadero, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.			**UND:**	m²

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



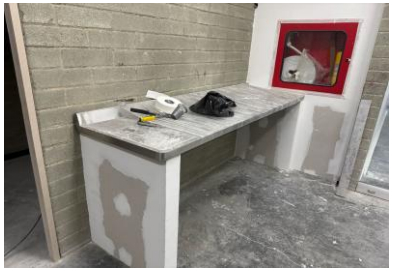



LOCALIZACION	DIMENSIONES			Cantidad	MEDIDA TOTAL
	Longitud	Ancho	Alto		
Sótano N-3,7					
Mesón en acero inoxidable	1,8	0,40		4,0	2,88
Piso 1 N-0,0					
Mesón en acero inoxidable	1,8	0,40		4,0	2,88
Piso 2 N+3,70					
Mesón en acero inoxidable	1,8	0,40		3,000	2,16
TOTAL ACTA N°5					**7,92**

CONTRATISTA		INTERVENTORIA		SUPERVISOR	
ELABORO		Vo.Bo.		Vo.Bo.	
NOMBRE	PEDRO DANIEL PINEDA RAMOS	NOMBRE	JUAN ESTEBAN PATIÑO VANEGAS	NOMBRE	MARIA TERESA TAMAYO OSPINA
