	MEMORIA GRÁFICA DE OBRA	CODIGO: GI-F022 VERSION: 01 FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-1	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA: ACTA No.:	28/10/2025 FINAL

CAPITULO:	PRELIMINARES	ITEM No.:	1.50001	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3500PSI PARA PLACA DE CONTRAPISO e=0.10	UNIDAD:	M2











NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

**** SE REALIZA UN AJUSTE EN EL ACTA No. 5, DEBIDO A UN ERROR DE DIGITACIÓN SE INVIRTIO EL 3,81 POR 3,18 DEJANDO UN MENOR VALOR A COBRAR.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
No Mat. 25202-105910

1505

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO:	GI-F022
VERSION:	01
FECHA:	MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	PISOS BASES Y ACABADOS	ITEM No.:	1.50007	DESCRIPCION DEL ITEM:	DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

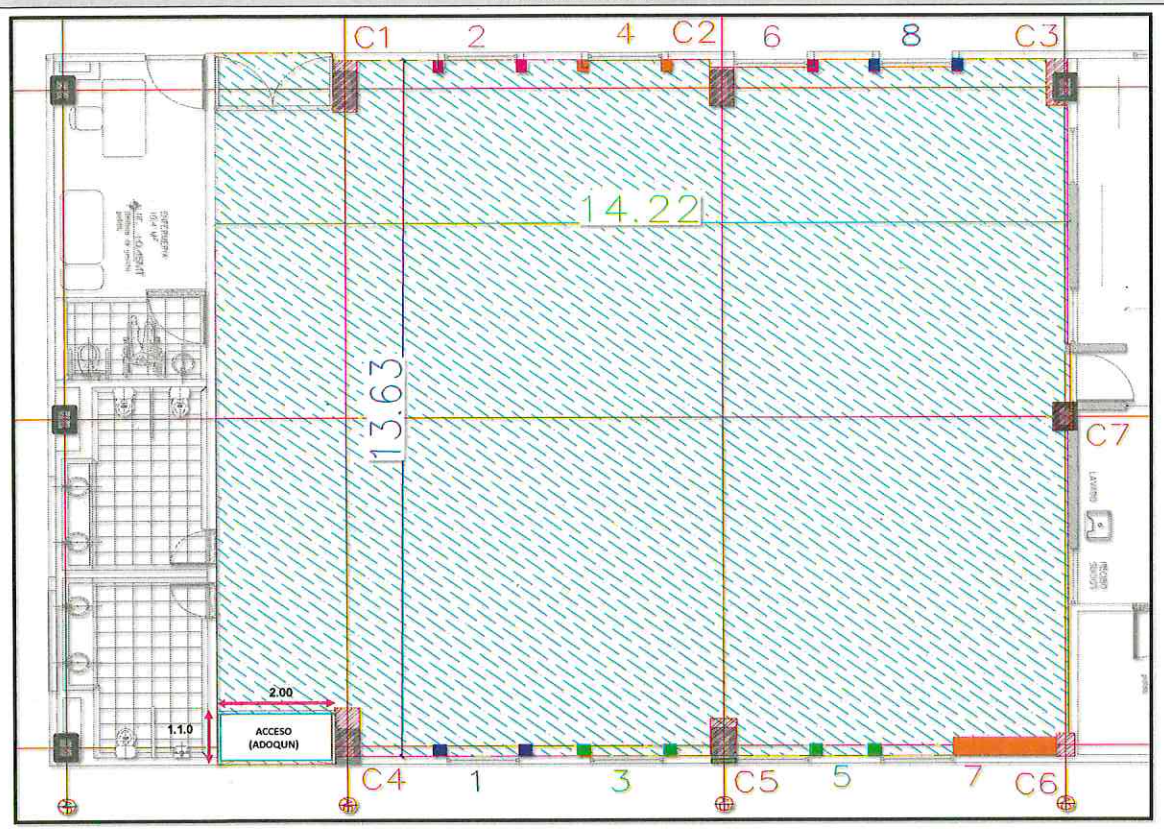


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
BLOQUE A					-
COMEDOR					
COMEDOR	14.22	13.63		1.00	193.82
ACCESO (ADOQUIN)	1.10	2.00		-1.00	-2.20
COLUMNA C1	0.50	1.01		-1.00	(0.51)
COLUMNA C2	0.63	1.02		-1.00	(0.64)
COLUMNA C3	0.50	1.00		-1.00	(0.50)
COLUMNA C4	0.50	1.01		-1.00	(0.51)
COLUMNA C5	0.63	0.63		-1.00	(0.40)
COLUMNA C6	0.22	0.20		-1.00	(0.04)
COLUMNA C7	0.21	0.45		-1.00	(0.09)
MURO 1	0.12	0.12		-2.00	(0.03)
MURO 2	0.12	0.12		-2.00	(0.03)
MURO 3	0.12	0.12		-2.00	(0.03)
MURO 4	0.12	0.12		-2.00	(0.03)
MURO 5	0.12	0.12		-2.00	(0.03)
MURO 6	0.12	0.12		-1.00	(0.01)
MURO 7	0.25	1.41		-1.00	(0.35)
MURO 8	0.12	0.12		-2.00	(0.03)
					-
					-
					-

	MEMORIA GRÁFICA DE OBRA	CODIGO: GI-F022 VERSION: 01 FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-1	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA: ACTA No.:	28/10/2025 FINAL
CAPITULO:	PISOS BASES Y ACABADOS	ITEM No.:	1.50007	DESCRIPCION DEL ITEM:	DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5	UNIDAD:	M2

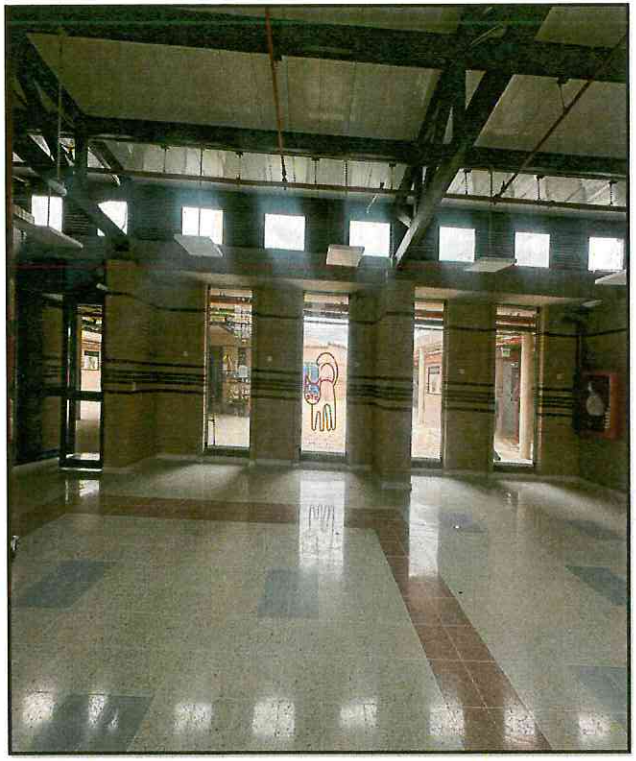





NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

**** SE REALIZA UN AJUSTE EN EL ACTA No. 5, DEBIDO A UN ERROR DE DIGITACIÓN SE INVIRTIO EL 3,81 POR 3,18 DEJANDO UN MENOR VALOR A COBRAR.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
No Mat. 25202-105910

1905

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO:	GI-F022
VERSION:	01
FECHA:	MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	ITEM No.:	1.60003	DESCRIPCION DEL ITEM:	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

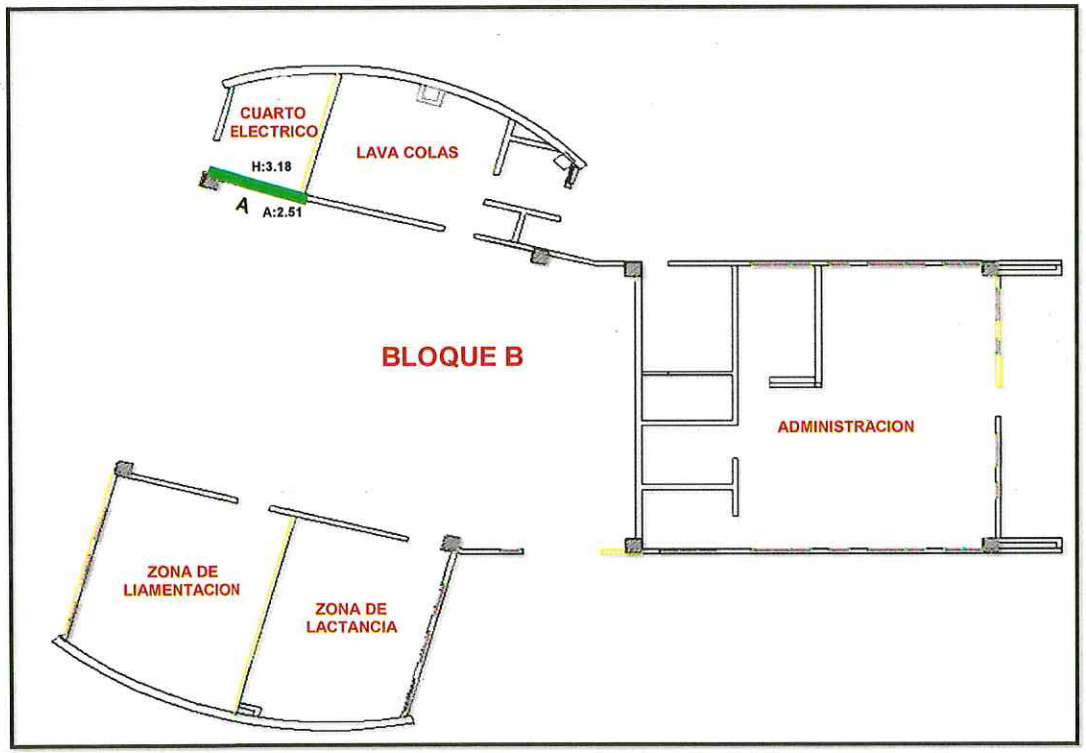

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
BLOQUE B					-
CUARTO ELECTRICO (RACK)					
MURO A		3.18	2.51	1.00	7.98

SUBTOTAL	7.98
VIENE	
TOTAL	7.98

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
No Mat.25202-088508


MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
No Mat. 25202-105910

	MEMORIA GRÁFICA DE OBRA	CODIGO: GI-F022 VERSION: 01 FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-1	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	PRELIMINARES	ITEM No.:	1.60003	DESCRIPCION DEL ITEM:	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	UNIDAD:	M2

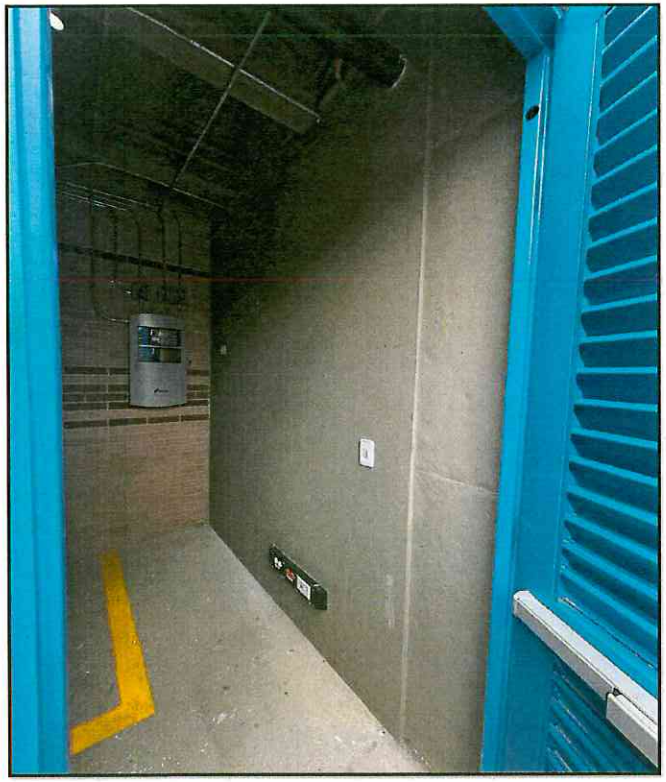



NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

**** SE REALIZA UN AJUSTE EN EL ACTA No. 5, DEBIDO A UN ERROR DE DIGITACIÓN SE INVIRTIO EL 3,81 POR 3,18 DEJANDO UN MENOR VALOR A COBRAR.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
No Mat. 25202-105910

5063

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	ITEM No.:	1.60006	DESCRIPCION DEL ITEM:	LAVADA DE FACHADA	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

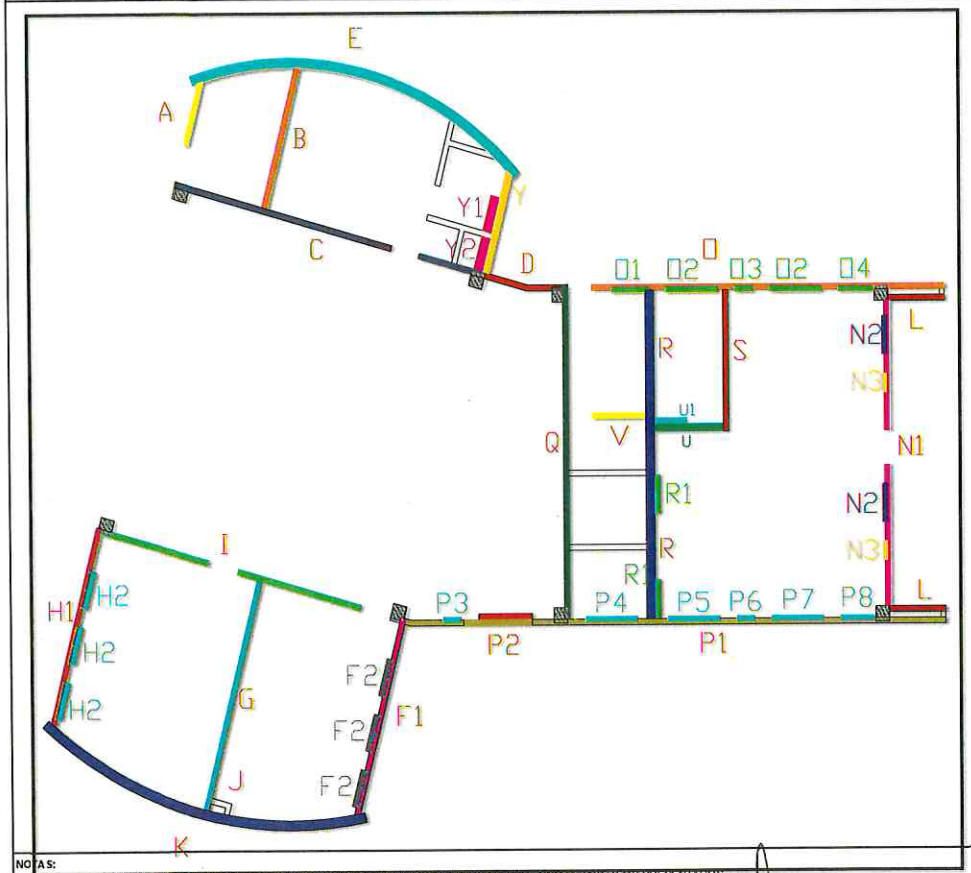

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
BLOQUE B						-
MUROS EN MAMPOSTERIA						-
MURO A		2.76		3.69	2.00	20.37
PUERTA A		1.00		2.45	-2.00	-4.90
MURO B		4.02		3.21	2.00	25.81
MURO C		8.50		2.92	1.00	24.82
PUERTA C		1.01		2.46	-1.00	-2.48
MURO E CURVO		9.16		3.72	1.00	34.08
MURO D		1.97		3.35	2.00	13.20
MURO D1 ANTEPECHO SUPERIOR		1.97		1.70	2.00	6.70
MURO F		5.07		2.95	2.00	29.91
VENTANAS F2		1.02		1.29	-6.00	-7.89
MURO F1		0.71		0.62	1.00	0.44
MURO G		6.36		3.24	2.00	41.21
MURO H		5.18		3.45	2.00	35.74
VENTANAS H2		1.02		1.29	-6.00	-7.89
MURO I		8.48		2.92	2.00	49.52
PUERTAS I		1.01		2.46	-4.00	-9.94
MURO K CURVO		9.16		3.72	2.00	68.15
MURO L		1.50		2.92	2.00	8.76
MURO N		6.89		2.93	2.00	40.38
PUERTA N1		1.02		2.46	-2.00	-5.02
VENTANAS N 2		1.02		1.29	-4.00	-5.26
VENTANAS N 3		0.50		1.29	-4.00	-2.58
MURO O		11.30		3.35	2.00	75.71
PUERTA O		1.01		2.43	-2.00	-4.91
VENTANA O 1		0.76		1.29	-2.00	-1.96
VENTANA O 2		1.52		1.29	-4.00	-7.84
VENTANA O 3		0.51		1.29	-2.00	-1.32
VENTANA O 4		1.01		1.29	-2.00	-2.61
MURO P1		15.70		2.93	2.00	92.00
PUERTA P 2		2.03		2.48	-2.00	-10.07
VENTANA P 3		0.51		1.29	-2.00	-1.32
VENTANA P 4		1.52		0.32	-2.00	-0.97
VENTANA P 5		1.52		1.29	-2.00	-3.92
VENTANA P 6		0.51		1.29	-2.00	-1.32
VENTANA P 7		1.51		1.29	-2.00	-3.90
VENTANA P 8		1.01		1.29	-2.00	-2.61
MURO Q		7.99		2.95	1.00	23.57
MURO R		8.67		3.54	2.00	61.38
PUERTA R1		1.01		2.45	-4.00	-9.90
MURO S		3.59		3.54	2.00	25.42
MURO U		1.91		3.54	2.00	13.52
PUERTA U1		0.77		2.54	2.00	3.91
MURO V		2.64		3.00	1.00	7.92
PUERTA V		1.01		2.43	-1.00	-2.45
MURO Y		3.29		3.45	1.00	11.35
PUERTA Y1		0.90		2.45	-1.00	-2.21
PUERTA Y2		0.86		2.45	-1.00	-2.11
				SUBTOTAL		608.49
				VIENE		
				TOTAL		608.49

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASKID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
No Mat. 25202-105910

1004

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	ITEM No.:	1.60006	DESCRIPCION DEL ITEM:	LAVADA DE FACHADA	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

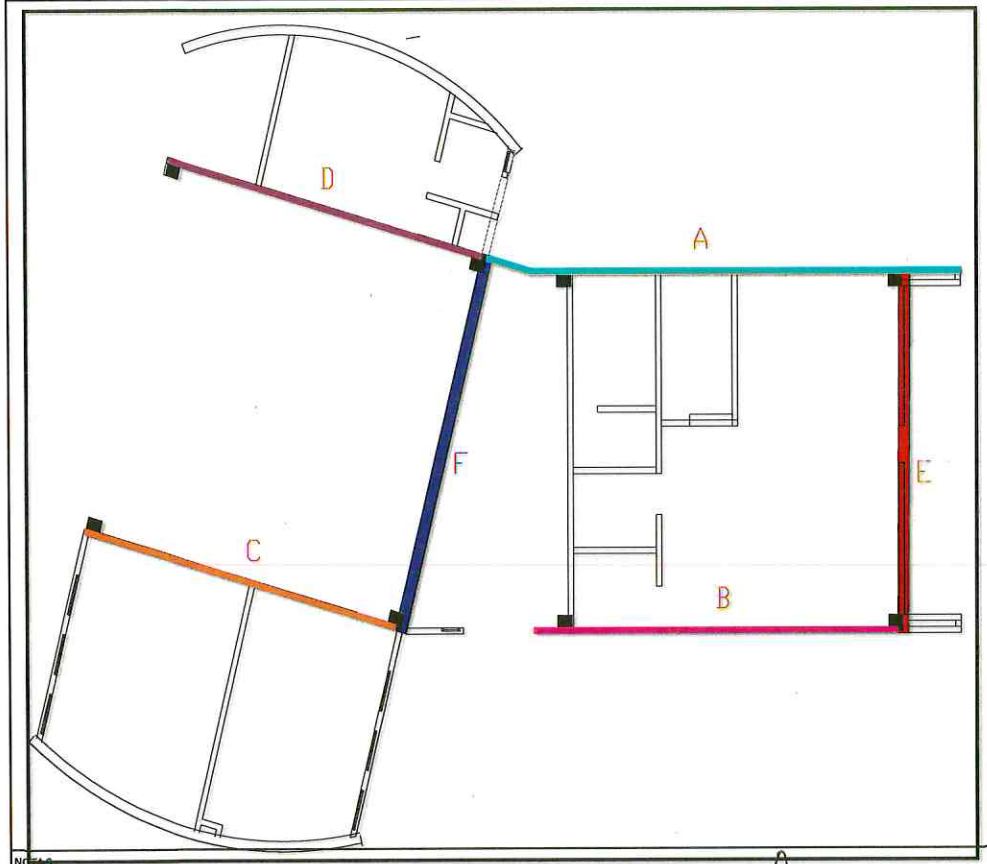

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
BLOQUE B					-
MUROS EN MAMPOSTERIA					-
MURO A	13.27		1.02	2.00	27.07
MURO B	10.10		1.02	2.00	20.60
MURO C	9.16		1.02	2.00	18.69
MURO D	9.16		1.02	2.00	18.69
MURO E	8.69		1.02	2.00	17.73
MURO F	9.37		1.02	2.00	19.11
					-
					-
					-


	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO: GI-F022
		VERSION: 01
		FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	ITEM No.:	1.60006	DESCRIPCION DEL ITEM:	LAVADA DE FACHADA	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

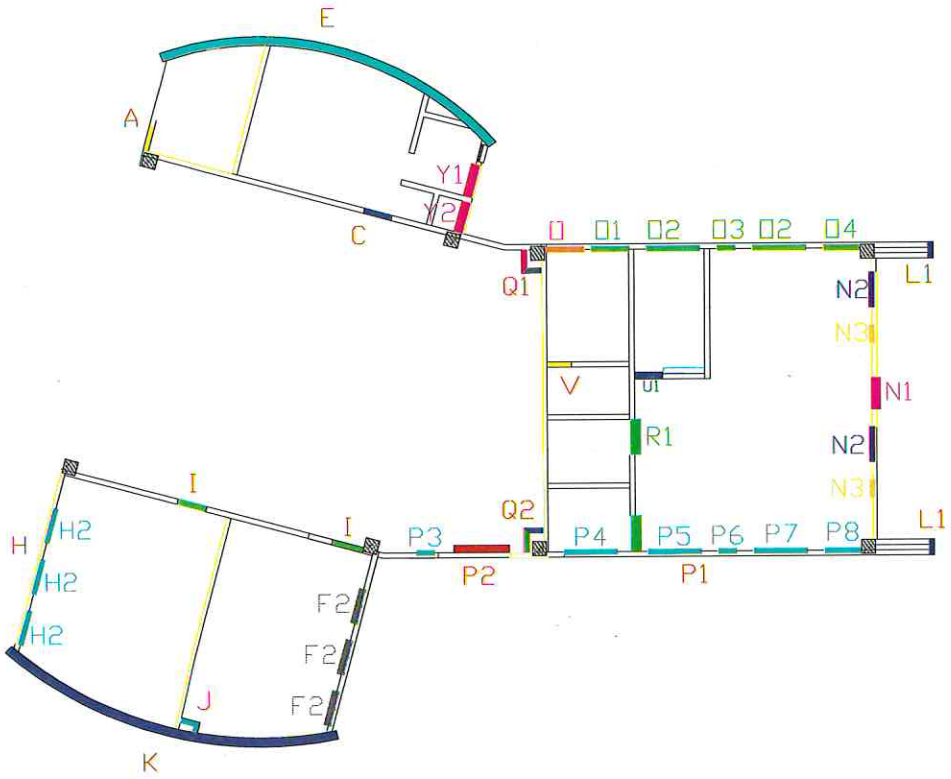

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			CANT	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO		
BLOQUE B						-
MUROS EN MAMPOSTERIA						-
MARCO PUERTA DINTEL A		1.00		0.12	1.00	0.12
MERCO PERTA LATERALES A		2.45		0.12	2.00	0.59
MARCO PUERTA DINTEL C		1.01		0.12	1.00	0.12
MARCO PUERTA LATERALES C		2.46		0.12	2.00	0.59
MURO E HILADA CHOCOLATE		10.21		0.36	1.00	3.68
VENTANAS HORIZONTAL F2		1.02		0.12	6.00	0.73
VENTANAS VERTICAL F2		1.29		0.12	6.00	0.93
VENTANAS HORIZONTAL H2		1.02		0.12	6.00	0.73
VENTANAS VERTICAL H2		1.29		0.12	6.00	0.93
PUERTAS DINTEL I		1.01		0.12	2.00	0.24
PUERTAS LATERALES I		2.46		0.12	4.00	1.18
MURO J LINEALES DUCTO		0.50		3.24	2.00	3.24
MURO K HILADA CHOCOLATE		10.72		0.36	1.00	3.86
MURO L1		0.50		2.92	2.00	2.92
PUERTA DINTEL N1		1.02		0.12	1.00	0.12
PUERTA LATERALES N1		2.46		0.12	2.00	0.59
VENTANAS HORIZONTAL N 2		1.02		0.12	2.00	0.24
VENTANAS VERTICAL N 2		1.29		0.12	2.00	0.31
VENTANAS HORIZONTAL N 3		0.50		0.12	2.00	0.12
VENTANAS VERTICAL N 3		1.29		0.12	2.00	0.31
PUERTA DINTEL O		1.01		0.12	1.00	0.12
PUERTA LATERALES O		2.43		0.12	2.00	0.58
VENTANA HORIZONTAL O 1		0.76		0.12	2.00	0.18
VENTANA VERTICAL O 1		1.29		0.12	2.00	0.31
VENTANA HORIZONTAL O 2		1.52		0.12	4.00	0.73
VENTANA VERTICAL O 2		1.29		0.12	4.00	0.62
VENTANA VERTICAL O 3		1.29		0.12	2.00	0.31
VENTANA HORIZONTAL O 3		0.51		0.12	1.00	0.06
VENTANA VERTICAL O 4		1.29		0.12	2.00	0.31
VENTANA HORIZONTAL O 4		1.01		0.12	1.00	0.12
PUERTA DINTEL P 2		2.03		0.12	1.00	0.24
PUERTA LATERALES P 2		2.48		0.12	2.00	0.60
VENTANA HORIZONTAL P 3		0.51		0.12	2.00	0.12
VENTANA VERTICAL P 3		1.29		0.12	2.00	0.31
VENTANA HORIZONTAL P 4		1.52		0.12	2.00	0.36
VENTANA VERTICAL P 4		0.32		0.12	2.00	0.08
VENTANA HORIZONTAL P 5		1.52		0.12	2.00	0.36
VENTANA VERTICAL P 5		1.29		0.12	2.00	0.31
VENTANA HORIZONTAL P 6		0.51		0.12	2.00	0.12
VENTANA VERTICAL P 6		1.29		0.12	2.00	0.31
VENTANA P 7		1.51		0.12	2.00	0.36
VENTANA P 7		1.29		0.12	2.00	0.31
VENTANA P 8		1.01		0.12	2.00	0.24
VENTANA P 8		1.29		0.12	2.00	0.31
MUROS Q1		0.50		2.95	2.00	2.95
MUROS Q2		0.50		2.95	2.00	2.95

5066

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO: GI-F022 VERSION: 01 FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA: ACTA No.:	28/10/2025 FINAL

CAPITULO:	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	ITEM No.:	1.60006	DESCRIPCION DEL ITEM:	LAVADA DE FACHADA					UNIDAD:		M2
					PUERTA DINTEL R1		1.01			0.12	2.00	0.24
					PUERTA LATERALES R1		2.45			0.12	4.00	1.18
					PUERTA DINTEL U1		0.77			0.12	1.00	0.09
					PUERTA LATERALES U1		2.54			0.12	2.00	0.61
					PUERTA DINTEL V		1.01			0.12	1.00	0.12
					PUERTA LATERAL V		2.43			0.12	2.00	0.58
					PUERTA DINTEL Y1		0.90			0.12	1.00	0.11
					PUERTA DINTEL Y1		2.45			0.12	2.00	0.59
					PUERTA DINTE Y2		0.86			0.12	1.00	0.10
					PUERTALATERAL Y2		2.45			0.12	2.00	0.59
											SUBTOTAL	39.03
											VIENE	730.38
											TOTAL	769.41

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
No Mat. 25202-105910

5063

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	ITEM No.:	1.60006	DESCRIPCION DEL ITEM:	LAVADA DE FACHADA	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

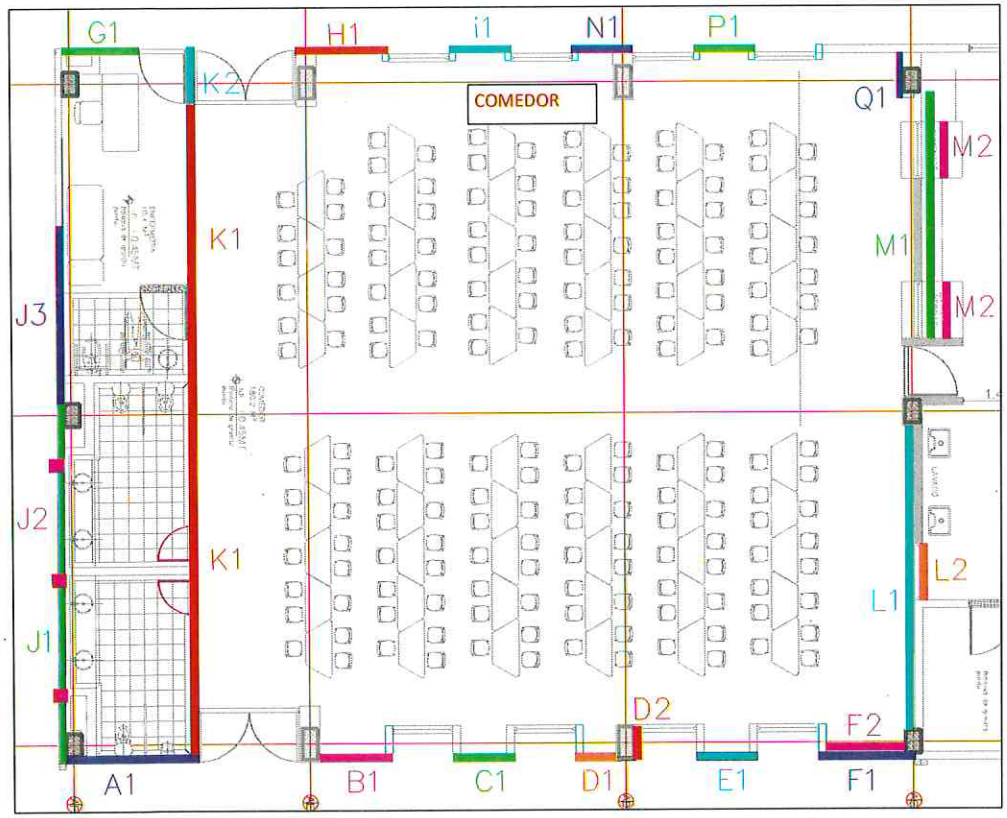

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
BLOQUE A PISO 1					-
SALON COMEDOR M2					
MURO A1	2.55		5.92	1.00	15.10
MURO B1	1.75		5.92	2.00	20.72
MURO C1	1.26		5.92	2.00	14.92
MURO D1	0.81		5.92	2.00	9.59
MURO D2	0.76		5.92	1.00	4.50
MURO E1	1.26		5.92	2.00	14.92
MURO F1	1.64		5.92	1.00	9.71
MURO F2	1.40		2.94	1.00	4.12
MURO G1	1.51		2.94	1.00	4.44
MURO H1	1.74		2.94	2.00	10.23
MURO I1	1.25		2.94	2.00	7.35
MURO J1	6.77		3.36	1.00	22.75
MURO J2	0.12		2.90	6.00	2.09
MURO J3	3.85		3.36	1.00	12.94
MURO K1	13.10		3.83	1.00	50.17
MURO K2	0.94		2.95	1.00	2.77
PUERTAS	1.00		2.83	-2.00	(5.66)
MURO L1	5.95		2.94	1.00	17.49
VENTANA L2	1.16		1.43	-1.00	(1.66)
					-
MURO M1	5.00		2.94	1.00	14.70
VENTANAS M2	1.43		1.15	-2.00	(3.29)
MURO N1	1.25		2.94	2.00	7.35
MURO P1	1.25		2.94	2.00	7.35
MURO Q1	1.02		3.19	1.00	3.25
					-
					-
					-

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	ITEM No.:	1.60006	DESCRIPCION DEL ITEM:	LAVADA DE FACHADA	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

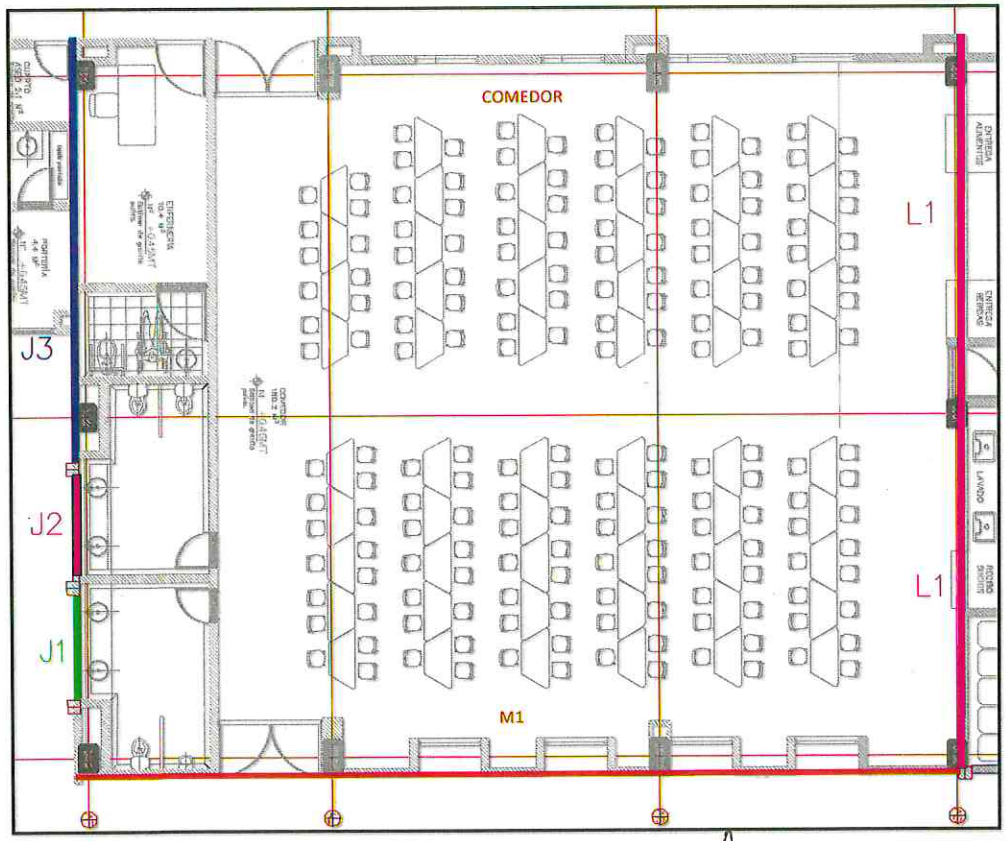

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
BLOQUE A PISO 2					-
COMEDOR					
MUROS M2					
MURO J 1	1.92		2.31	2.00	8.87
MURO J 2	1.92		2.05	2.00	7.85
MURO J 3	7.43		1.40	2.00	20.80
MURO L 1	13.32		1.77	2.00	47.15
HILADA CHOCOLATE M1	16.75		0.48	1.00	8.04
					-
					-
					-

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO:	GI-F022
VERSION:	01
FECHA:	MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	ITEM No.:	1.60006	DESCRIPCION DEL ITEM:	LAVADA DE FACHADA	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

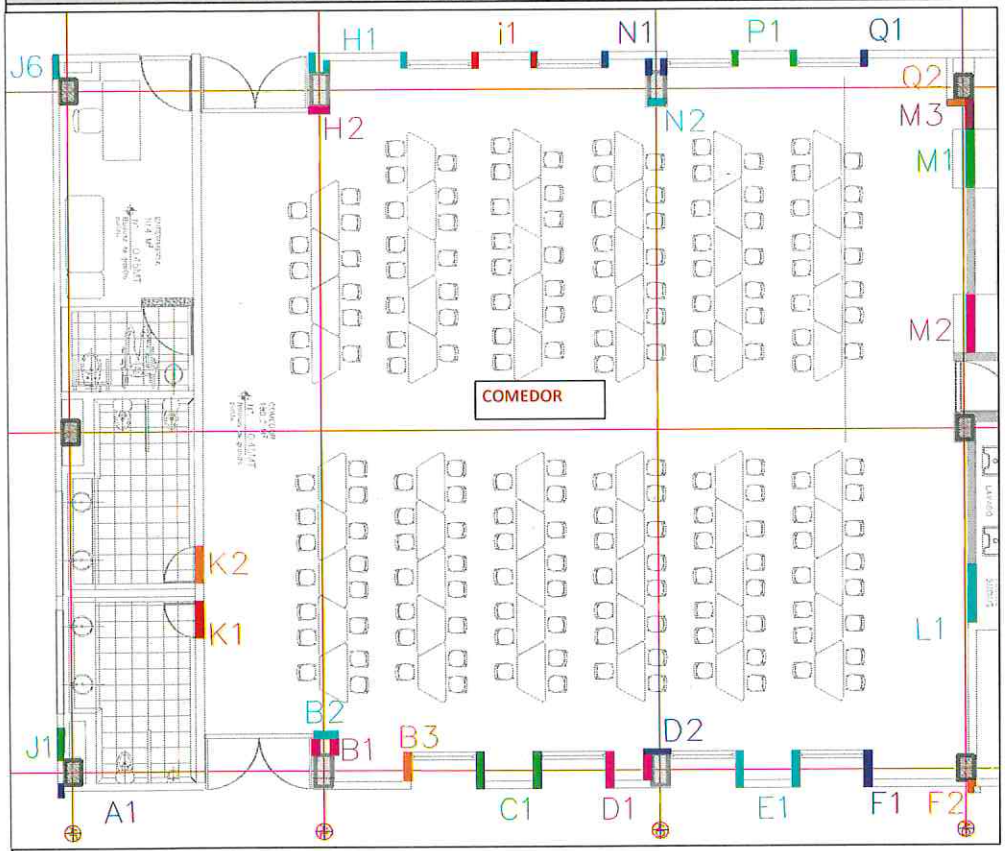

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
BLOQUE A					-
PISO 1 ml					-
MURO A 1 MARCO COCOA	0.48		6.07	1.00	2.91
MURO B 1	0.45		5.22	2.00	4.70
MURO B 2	0.50		4.39	1.00	2.20
MURO B 3	0.48		6.07	1.00	2.91
MURO C 1	0.48		6.07	2.00	5.83
MURO D 1	0.88		6.07	3.00	16.02
MURO D 2	0.63		4.99	1.00	3.14
MURO E 1	0.48		6.07	2.00	5.83
MURO F 1	0.48		5.71	1.00	2.74
MURO F 2 MARCO COCOA	0.48		5.71	1.00	2.74
MURO H 1	0.48		2.81	3.00	4.05
MURO H 2	0.50		2.81	1.00	1.41
MURO I 1	0.48		2.81	2.00	2.70
MURO J 1	0.50		2.83	1.00	1.42
MURO J 6	0.55		2.83	1.00	1.56
MURO K 1 DINTELES PUERTA	1.02		0.12	1.00	0.12
MURO K 1 LATERALES PUERTA	0.12		2.83	2.00	0.68
MURO K 2 DINTELES PUERTA	1.02		0.12	1.00	0.12
MURO K2 LATERALES PUERTA	0.12		2.83	2.00	0.68
MURO L 1 HORIZONTAL VENTANA	1.16		0.12	2.00	0.28
MURO L 1 VERTICAL VENTANA	1.43		0.12	2.00	0.34
MURO M 1 VERTICAL VENTANA	1.16		0.12	2.00	0.28
MURO M 1 HORIZONTAL VENTANA	1.43		0.12	2.00	0.34
MURO M 2 HORIZONTAL VENTANA	1.16		0.12	2.00	0.28
MURO M 2 VERTICAL VENTANA	1.43		0.12	2.00	0.34
MURO M 3 LATERAL VENTANA	0.50		2.10	1.00	1.05
MURO N 1	0.48		2.81	3.00	4.05
MURO N 2	0.50		2.81	1.00	1.41
MURO P 1	0.48		2.81	2.00	2.70
MURO Q 1	0.48		2.81	1.00	1.35
MURO Q 2	0.50		2.81	1.00	1.41
					-
					-
					-

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	ITEM No.:	1.60006	DESCRIPCION DEL ITEM:	LAVADA DE FACHADA	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

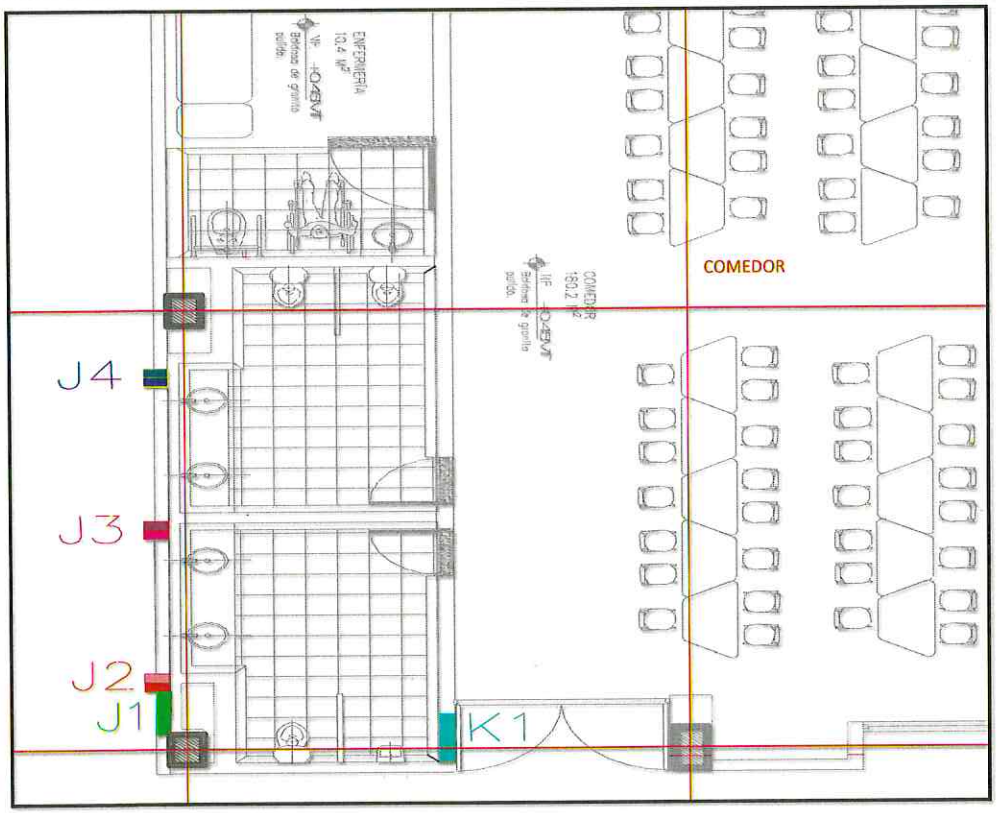

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
BLOQUE A					-
PISO 1 ml					-
MURO J 1	0.80		2.28	2.00	3.65
MURO J 2	0.24		2.34	2.00	1.12
MURO J 3	0.24		2.08	2.00	1.00
MURO J 4	0.24		1.80	2.00	0.86
MURO K 1	0.50		2.33	1.00	1.17
					-
					-
					-

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	ITEM No.:	1.60006	DESCRIPCION DEL ITEM:	LAVADA DE FACHADA	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

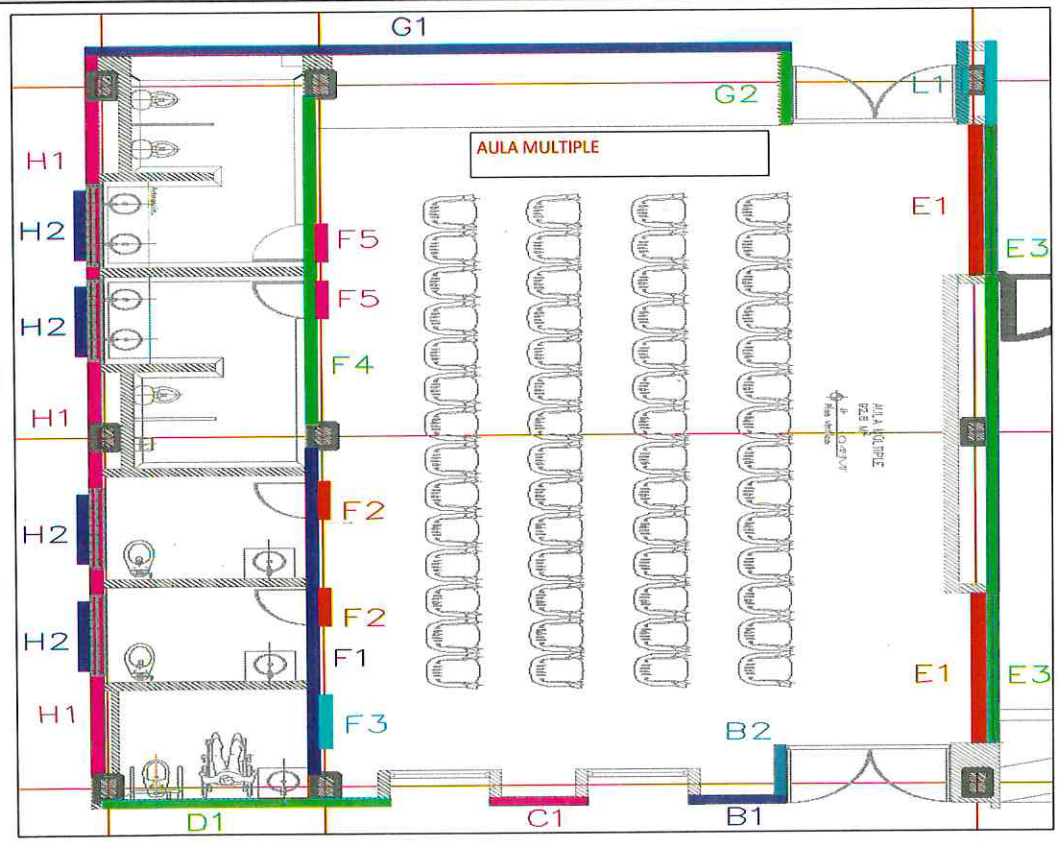

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
BLOQUE A						-
AUDITORIO						-
MURO B1		0.88		5.83	2.00	10.26
MURO B2		1.14		3.60	2.00	8.21
MURO C1		1.26		5.83	2.00	14.69
MURO D1		3.69		5.85	1.00	21.59
VENTANAS E1		2.76		2.40	-4.00	(26.50)
MURO E3		13.63		3.35	2.00	91.32
MURO F1		5.93		2.93	1.00	17.37
PUERTA F2		0.77		2.79	-2.00	(4.30)
PUERTA F3		1.01		2.79	-1.00	(2.82)
MURO F4		5.88		2.93	1.00	17.23
PUERTA F5		0.78		2.78	-2.00	(4.34)
MURO G1		8.49		2.94	2.00	49.92
MURO G2		1.14		2.95	2.00	6.73
MURO H1		14.00		3.35	1.00	46.90
VENTANAS H2		1.40		0.30	-4.00	(1.68)
MURO L1		1.14		2.95	2.00	6.73
						-
						-
						-

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	ITEM No.:	1.60006	DESCRIPCION DEL ITEM:	LAVADA DE FACHADA	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

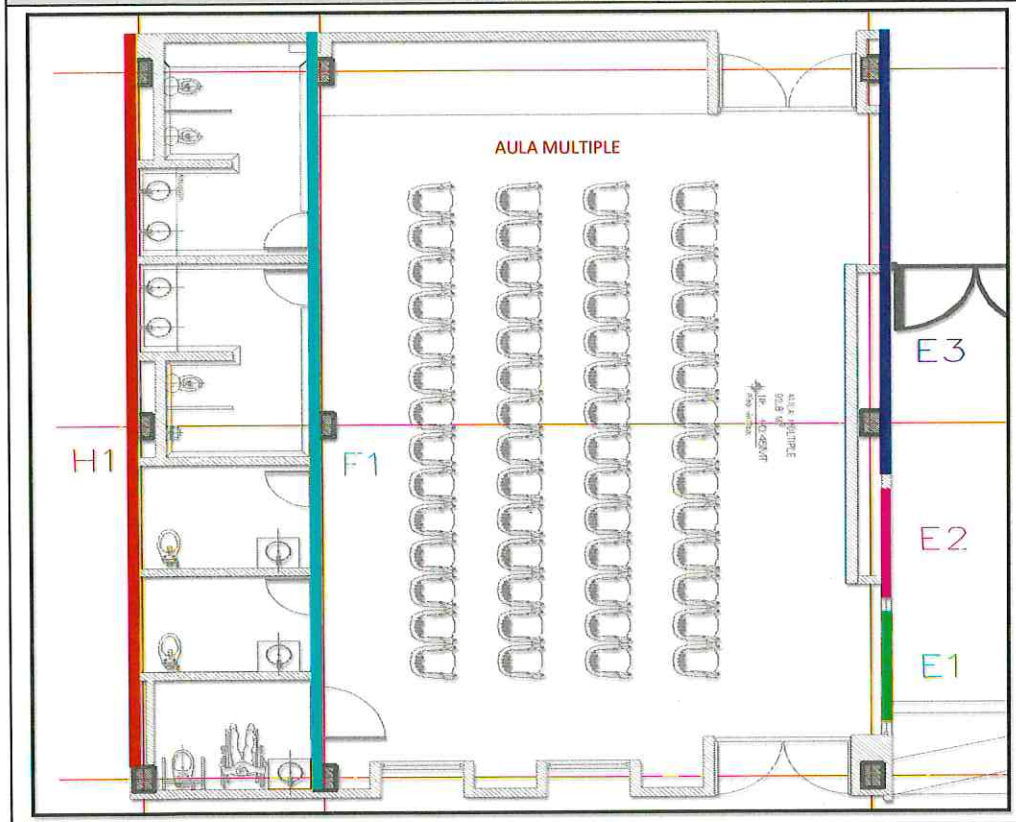

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
BLOQUE A					-
AUDITORIO 2					-
MURO E 1	1.93		2.30	2.00	8.88
MURO E 2	1.93		2.00	2.00	7.72
MURO E 3	7.36		1.38	2.00	20.31
MURO F 1	12.54		2.15	1.00	26.96
MURO H 1	14.00		1.78	1.00	24.92
					-
					-
					-

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO:	GI-F022
VERSION:	01
FECHA:	MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	ITEM No.:	1.60006	DESCRIPCION DEL ITEM:	LAVADA DE FACHADA	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

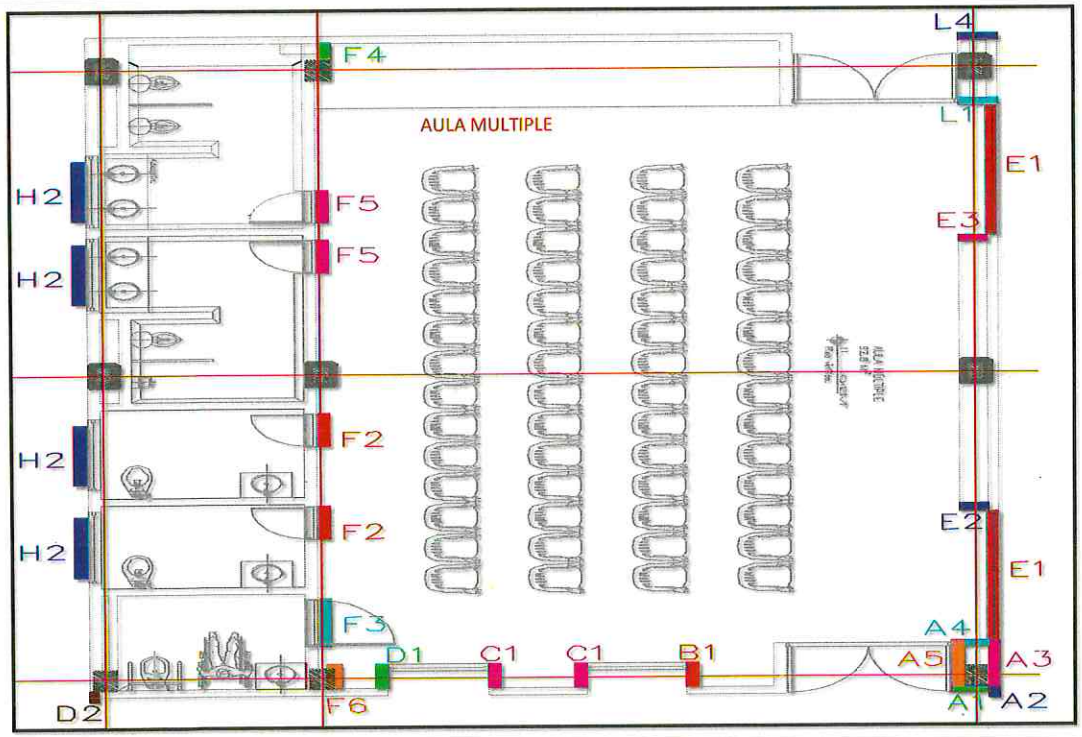

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
BLOQUE A AUDITORIO					-
MURO **A 1**	0.40		5.83	1.00	2.33
MURO **A 2** MARCO COCOA	0.48		5.95	1.00	2.86
MURO **A 3**	0.85		5.83	1.00	4.96
MURO **A 4**	0.50		5.50	1.00	2.75
MURO **A 5**	0.85		5.83	1.00	4.96
MURO **B1**	0.48		5.83	1.00	2.80
MURO **C1**	0.48		5.83	2.00	5.60
MURO **D 1**	0.48		5.83	1.00	2.80
MURO **D 2** MARCO COCOA	0.48		5.95	1.00	2.86
VENTANA HORIZONTAL **E 1**	2.76		0.12	4.00	1.32
VENTANA VERTICAL **E 1**	2.40		0.12	4.00	1.15
MURO **E 2**	0.50		5.13	1.00	2.57
MURO **E 3**	0.50		4.35	1.00	2.18
PUERTA DINTEL **F 2**	0.77		0.12	2.00	0.18
PUERTA LATERAL **F 2**	2.79		0.12	4.00	1.34
PUERTA DINTEL **F 3**	1.01		0.12	1.00	0.12
PUERTA LATERAL **F 3**	2.79		0.12	2.00	0.67
MURO COLUMNA **F 4**	0.84		2.94	1.00	2.47
PUERTA DINTEL **F 5**	0.78		0.12	1.00	0.09
PUERTA LATERAL **F 5**	2.78		0.12	1.00	0.33
MURO COLUMNA **F 6**	0.62		2.95	1.00	1.83
VENTANA HORIZONTAL **H 2**	1.40		0.12	8.00	1.34
VENTANA VERTICAL **H 2**	0.30		0.12	8.00	0.29
MURO L 1	0.50		3.97	1.00	1.99
MURO L 4	0.50		2.95	1.00	1.48
					-
					-
					-

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO:	GI-F022
VERSION:	01
FECHA:	MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	ITEM No.:	1.60006	DESCRIPCION DEL ITEM:	LAVADA DE FACHADA	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

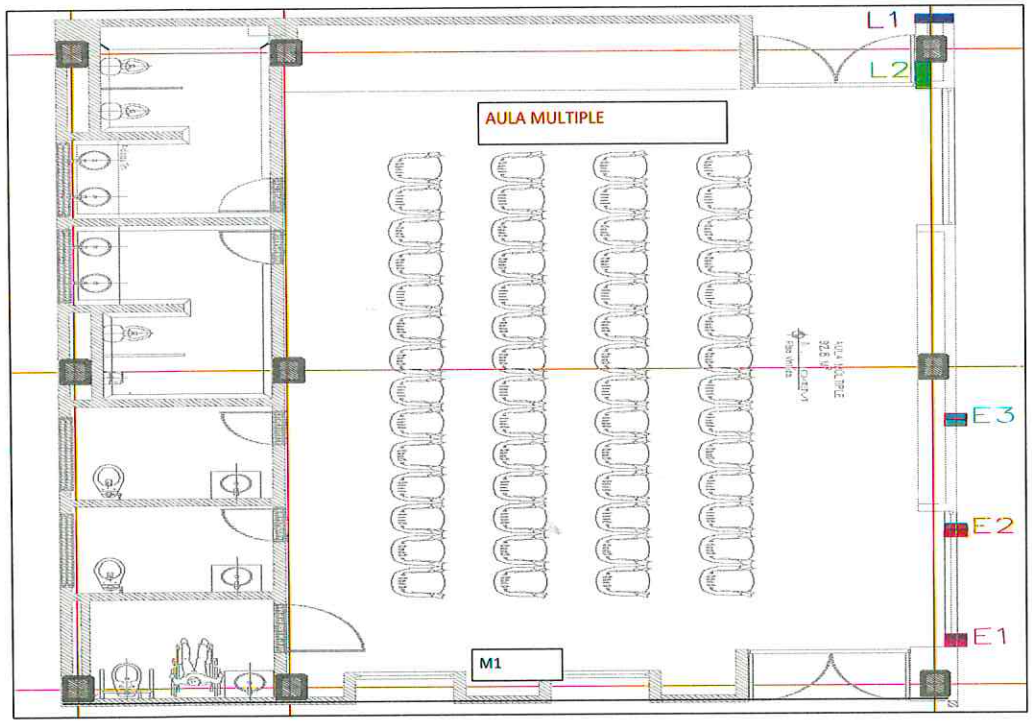

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
BLOQUE A AUDITORIO					-
MUROS PISO 2					-
MOÑO E 1	0.24		2.34	2.00	1.12
MOÑO E 2	0.24		2.08	2.00	1.00
MOÑO E 3	0.24		1.67	2.00	0.80
DUCTO COLUMNA L 1	0.50		0.50	1.00	0.25
DUCTO COLUMNA L 2	0.65		1.05	1.00	0.68
HILADA CHOCOLATE M 1	10.87		0.48	1.00	5.22
					-
					-
					-

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO:	GI-F022
VERSION:	01
FECHA:	MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	ITEM No.:	1.60006	DESCRIPCION DEL ITEM:	LAVADA DE FACHADA	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

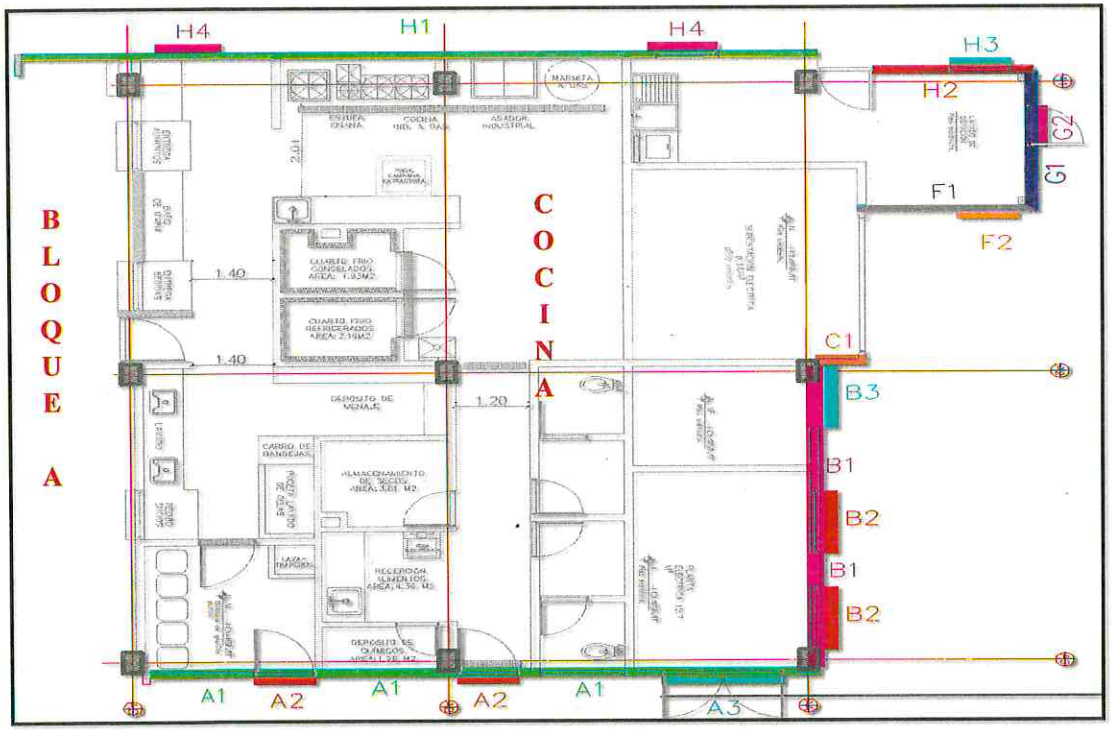

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			CANT	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO		
BLOQUE A FACHADA COCINA						-
MUROS PISO 1						-
MURO A1		10.89		3.43	1.00	37.35
HILADA CHOCOLATE A1		10.89		0.24	1.00	2.61
PUERTA A2		1.00		2.79	-2.00	(5.58)
PUERTA A3		2.16		2.79	-1.00	(6.03)
MURO B1		6.68		3.54	1.00	23.65
HILADA CHOCOLATE B1		6.68		0.24	1.00	1.60
VENTANA B2		1.40		0.51	-2.00	(1.43)
PUERTA B3		1.03		2.80	-1.00	(2.88)
MURO C1		1.10		2.92	1.00	3.21
MURO F1		3.42		3.42	1.00	11.70
HILADA CHOCOLATE F1		2.45		0.48	1.00	1.18
VENTANA F2		1.40		0.51	-1.00	(0.71)
MURO G1		3.34		3.40	1.00	11.36
HILADA CHOCOLATE G1		3.58		0.48	1.00	1.72
PUERTA G2		1.08		2.79	-1.00	(3.01)
MURO H1		13.40		2.92	1.00	39.13
MURO H2		2.75		3.42	1.00	9.41
HILADA CHOCOLATE H2		2.75		0.48	1.00	1.32
VENTANA H3		1.40		0.51	-1.00	(0.71)
VENTANA H4		1.40		0.51	-2.00	(1.43)
						-
						-
						-

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	ITEM No.:	1.60006	DESCRIPCION DEL ITEM:	LAVADA DE FACHADA	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

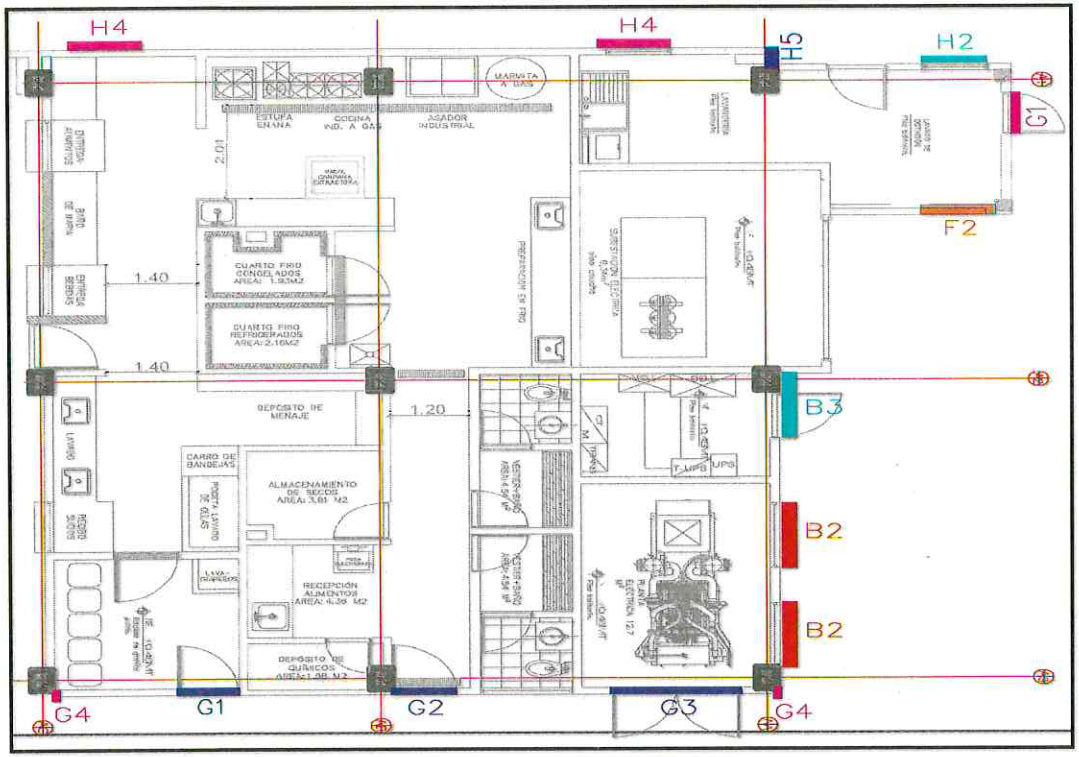

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
BLOQUE A FACHADA COCINA					-
MUROS PISO 1					-
PUERTA DINTEL A2	1.00		0.12	1.00	0.12
PUERTA LATERALES A2	2.79		0.12	1.00	0.33
PUERTA DINTEL A3	2.16		0.12	1.00	0.26
PUERTA LATERALES A3	2.79		0.12	1.00	0.33
HILADA CHOCOLATE A4	0.24		3.52	2.00	1.69
VENTANA FILO HORIZONTAL B2	1.40		0.12	4.00	0.67
VENTANA FILO VERTICAL B2	0.51		0.12	4.00	0.24
PUERTA DINTEL B3	1.03		0.12	1.00	0.12
PUERTA LATERALES B3	2.80		0.12	2.00	0.67
VENTANA FILO HORIZONTAL F2	1.40		0.12	2.00	0.34
VENTANA FILO VERTICAL F2	0.51		0.12	2.00	0.12
PUERTA DINTEL G1	1.08		0.12	1.00	0.13
PUERTA LATERALES G1	2.79		0.12	2.00	0.67
VENTANA FILO HORIZONTAL H2	1.40		0.12	2.00	0.34
VENTANA FILO VERTICAL H2	0.51		0.12	2.00	0.12
VENTANA FILO HORIZONTAL H4	1.40		0.12	4.00	0.67
VENTANA FILO VERTICAL H4	0.51		0.12	4.00	0.24
					-
					-
					-

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	ITEM No.:	1,60006	DESCRIPCION DEL ITEM:	LAVADA DE FACHADA	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

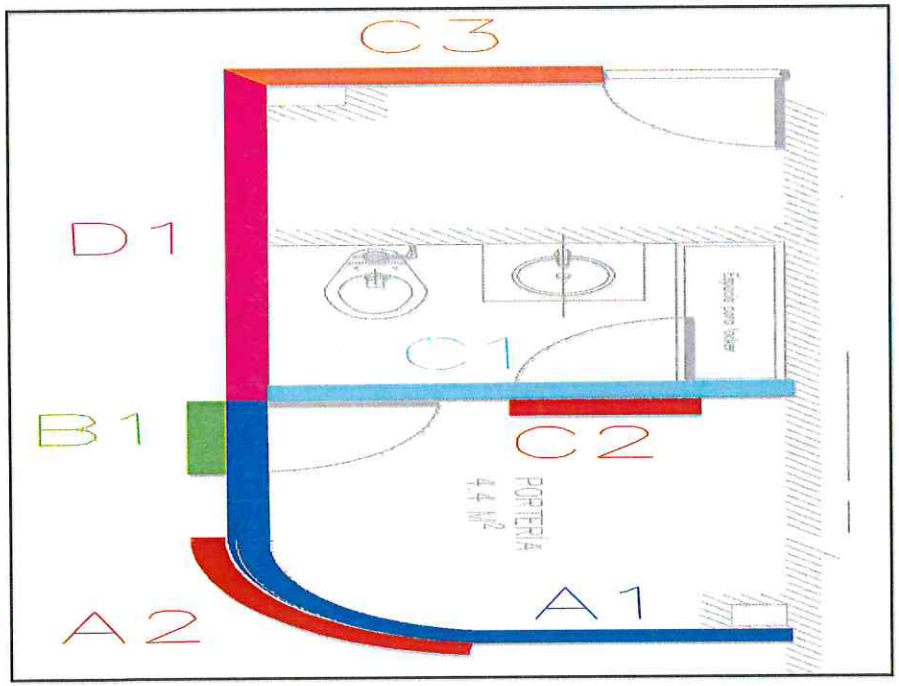

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
BLOQUE A FACHADA VIGILANCIA					-
MUROS PISO 1					-
MURO A1	5,25		2,95	2,00	30,98
VENTANA A2	3,02		1,33	-2,00	(8,03)
PUERTA B1	0,77		2,44	-2,00	(3,76)
MURO C1	2,15		2,94	1,00	6,32
PUERTA C2	0,77		2,44	-1,00	(1,88)
MURO C3	1,40		2,93	1,00	4,10
MURO D1	3,26		2,95	1,00	9,62
HILADA CHOCOLATE D1	7,75		0,48	1,00	3,72
					-
					-
					-

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO: GI-F022 | VERSION: 01 | FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	ITEM No.:	1.60006	DESCRIPCION DEL ITEM:	LAVADA DE FACHADA	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

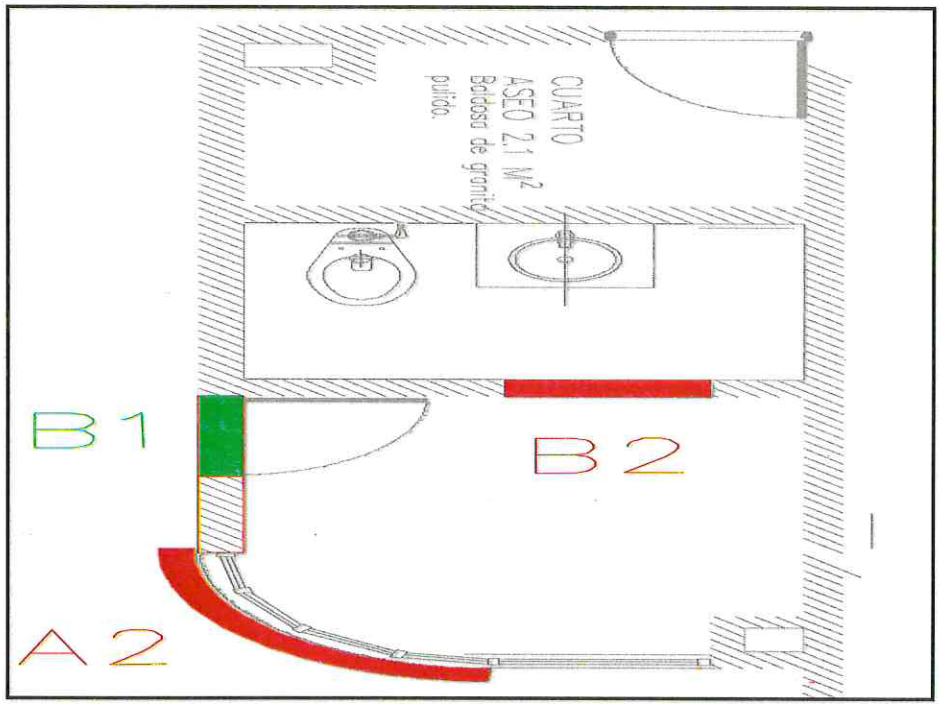

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
BLOQUE A FACHADA VIGILANCIA					-
MUROS PISO 1					-
VENTANA FILO VERTICAL A2	3.02		0.12	2.00	0.72
VENTANA FILO HORIZONTAL A2	1.33		0.12	2.00	0.32
PUERTA DINTEL B1	0.77		0.12	1.00	0.09
PUERTA LATERALES B1	2.44		0.12	2.00	0.59
PUERTA DINTEL B2	0.77		0.12	1.00	0.09
PUERTA LATERALES B2	2.44		0.12	2.00	0.59

SUBTOTAL	2.40
VIENE	1,762.39
TOTAL	1,764.79

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
No Mat. 25202-105910

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO GI-F022 | VERSION: 01 | FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	ITEM No.:	1.60008	DESCRIPCION DEL ITEM:	LAVADA DE FACHADA	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

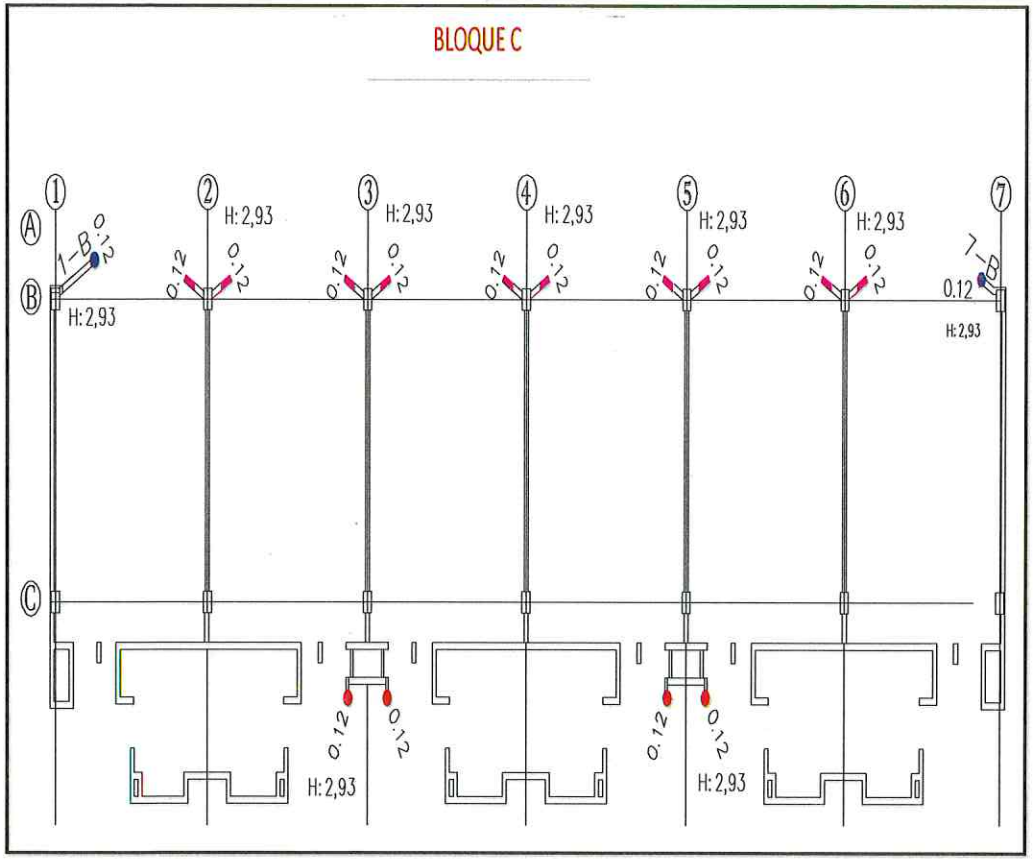

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	
BLOQUE C SALONES CUBIERTA					-
FILO INFERIOR CULATA EJE 1	0.12		2.93	1.00	0.35
					-
FILO INFERIOR CULATA EJE 7	0.12		2.93	1.00	0.35
					-
Muros EJE 3 Y 5 C					-
FILO DUCTOS EJE C -EJE 3 C	0.12		2.93	2.00	0.70
FILO DUCTOS EJE C -EJE 5 C	0.12		2.93	2.00	0.70
BLOQUE C SALONES MUROS PUERTAS					-
FILO EJE 2B SUPERIOR	0.120		2.93	1.00	0.35
FILO EJE 2B SUPERIOR	0.120		2.93	1.00	0.35
FILO EJE 3B SUPERIOR	0.120		2.93	1.00	0.35
FILO EJE 3B SUPERIOR	0.120		2.93	1.00	0.35
FILO EJE 4B SUPERIOR	0.120		2.93	1.00	0.35
FILO EJE 4B SUPERIOR	0.120		2.93	1.00	0.35
FILO EJE 5B SUPERIOR	0.120		2.93	1.00	0.35
FILO EJE 5B SUPERIOR	0.120		2.93	1.00	0.35
FILO EJE 6B SUPERIOR	0.120		2.93	1.00	0.35
FILO EJE 6B SUPERIOR	0.120		2.93	1.00	0.35

SUBTOTAL	5.60
IVENE	1,764.79
TOTAL	1,770.39

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE KRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
No Mat. 25202-105910

5080


	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO: GI-F022
		VERSION: 01
		FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	ITEM No.:	1.60006	DESCRIPCION DEL ITEM:	LAVADA DE FACHADA	UNIDAD:	M2

BLOQUE C

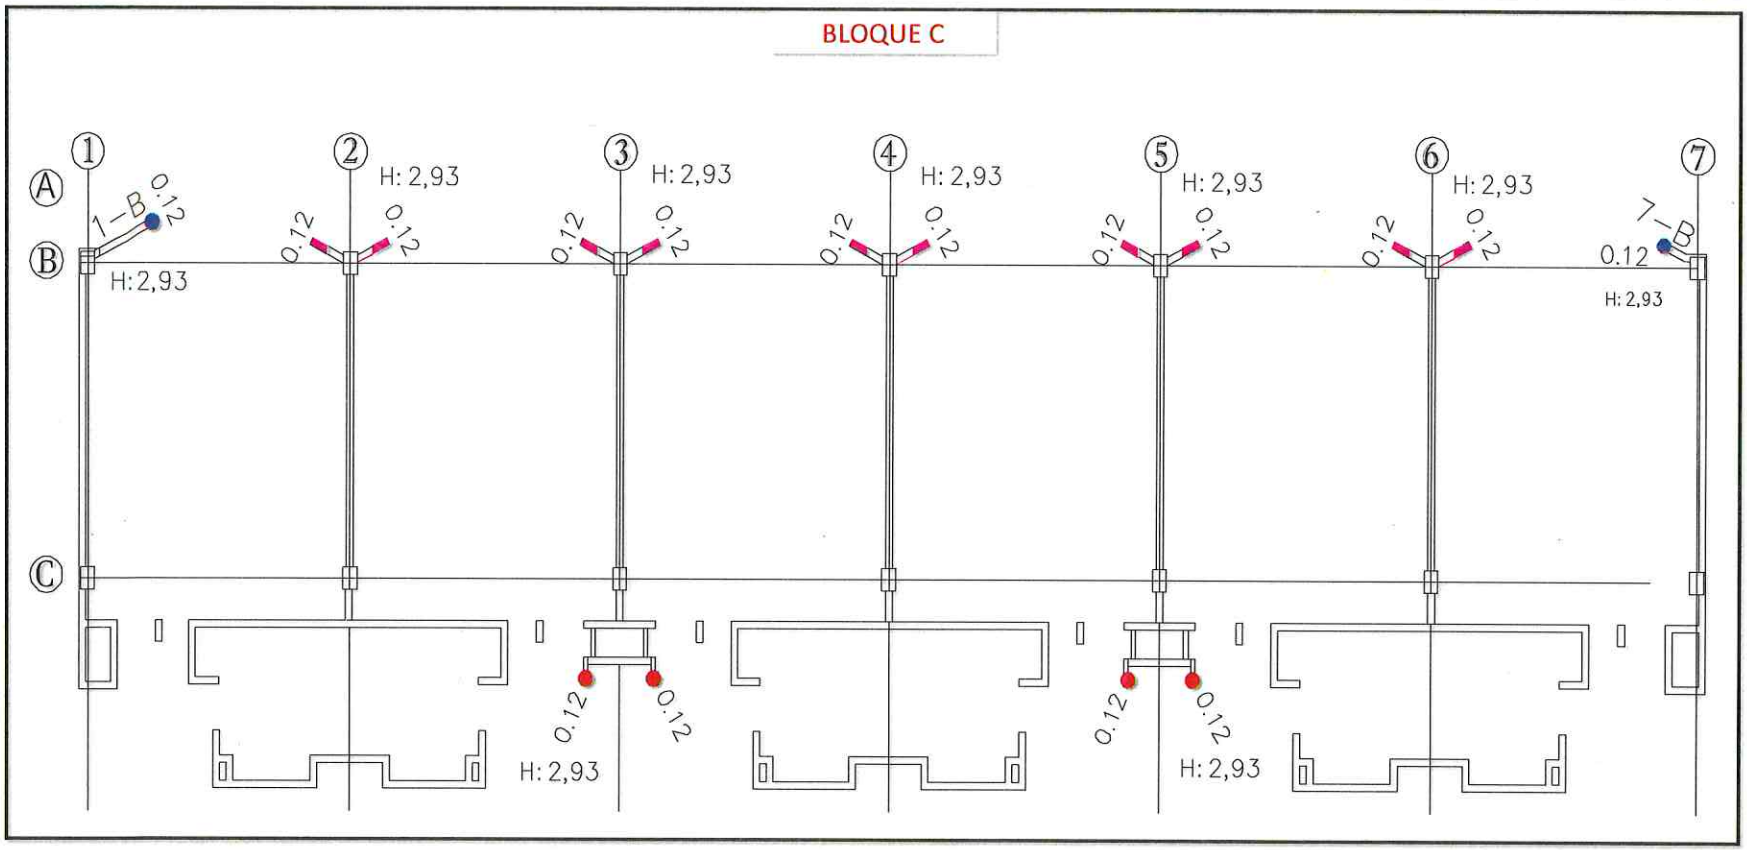

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON OBILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat.25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
No Mat. 25202-105910

1805

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.076-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	ITEM No.:	1.60006	DESCRIPCION DEL ITEM:	LAVADA DE FACHADA	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

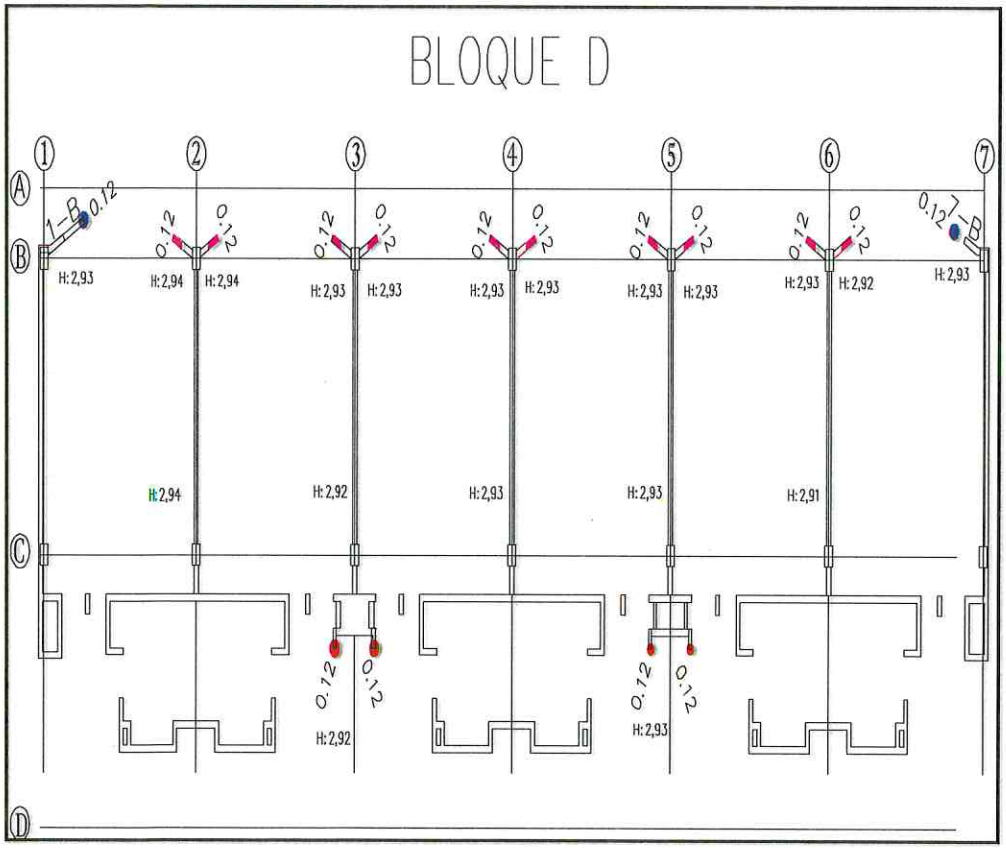

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	
BLOQUE D SALONES					-
FILO INFERIOR CULATA EJE 1	0.12		2.93	1.00	0.35
					-
FILO INFERIOR CULATA EJE 7	0.12		2.93	1.00	0.35
					-
MUROS ELECTRICOS EJE 3 Y 5 C					-
FILO DUCTOS EJE C -EJE 3 C	0.12		2.92	2.00	0.70
FILO DUCTOS EJE C -EJE 5 C	0.12		2.93	2.00	0.70
					-
BLOQUE D SALONES MUROS PUERTAS					-
FILO EJE 2B SUPERIOR	0.12		2.94	1.00	0.35
FILO EJE 2B SUPERIOR	0.12		2.94	1.00	0.35
FILO EJE 3B SUPERIOR	0.12		2.93	1.00	0.35
FILO EJE 3B SUPERIOR	0.12		2.93	1.00	0.35
FILO EJE 4B SUPERIOR	0.12		2.93	1.00	0.35
FILO EJE 4B SUPERIOR	0.12		2.93	1.00	0.35
FILO EJE 5B SUPERIOR	0.12		2.93	1.00	0.35
FILO EJE 5B SUPERIOR	0.12		2.93	1.00	0.35
FILO EJE 6B SUPERIOR	0.12		2.93	1.00	0.35
FILO EJE 6B SUPERIOR	0.12		2.92	1.00	0.35
					-
				SUBTOTAL	5.60
				VIENE	1,770.39
				TOTAL	1,775.99

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO,EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088803

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
No Mat.25202-105910


5082

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO: GI-F022
		VERSION: 01
		FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	ITEM No.:	1.60006	DESCRIPCION DEL ITEM:	LAVADA DE FACHADA	UNIDAD:	M2

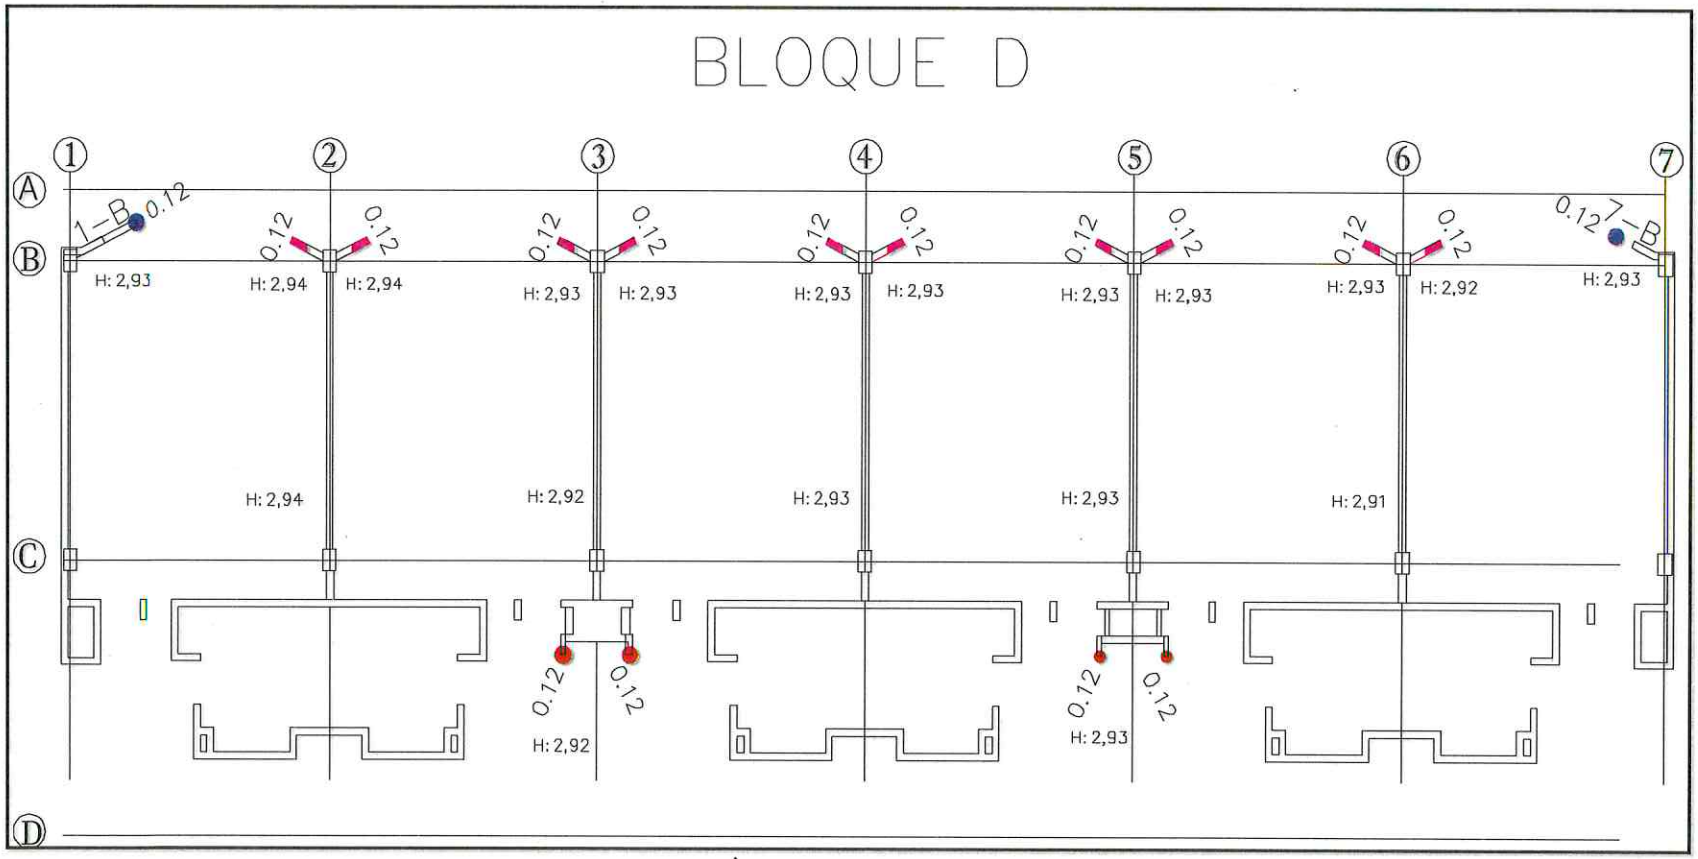

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TABTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
No Mat. 25202-105910

5083

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO: GI-F022 | VERSION: 01 | FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	ITEM No.:	1.60006	DESCRIPCION DEL ITEM:	LAVADA DE FACHADA	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

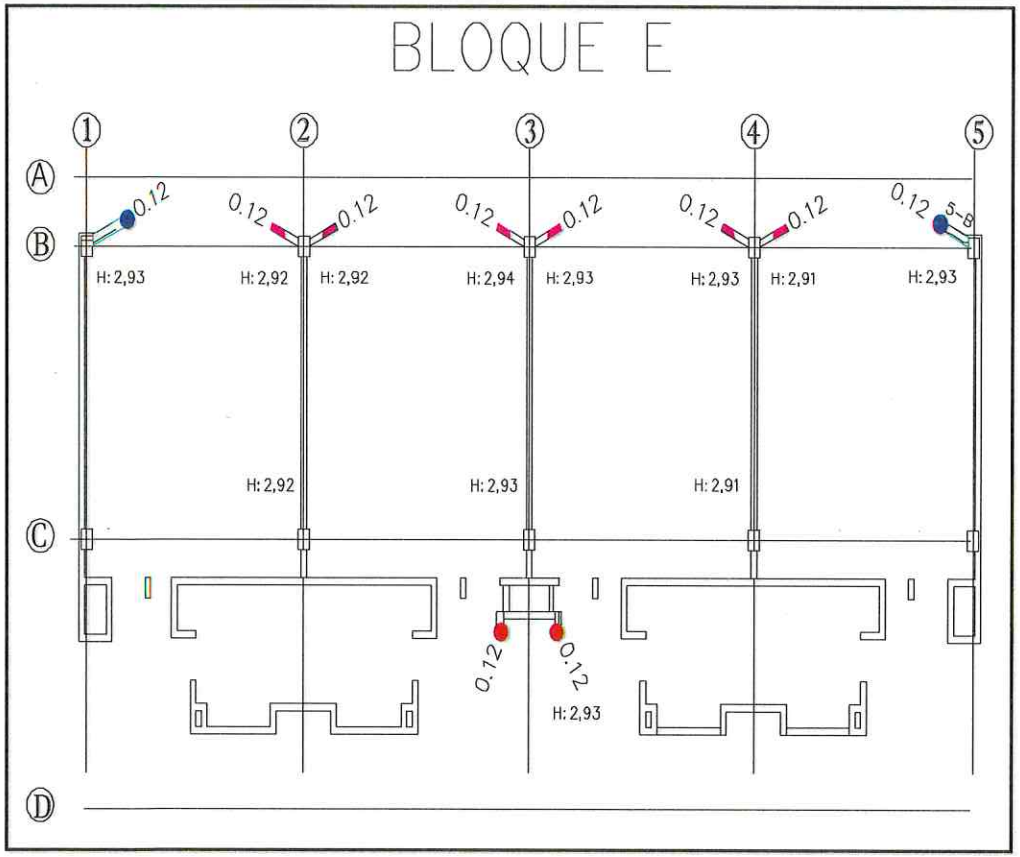

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
BLOQUE E SALONES					-
FILO INFERIOR CULATA EJE 1	0.12		2.93	1.00	0.35
FILO INFERIOR CULATA EJE 7	0.12		2.93	1.00	0.35
					-
MUROS ELECTRICOS EJE 3C					-
FILO DUCTOS EJE C -EJE 3 C	0.12		2.93	2.00	0.70
					-
BLOQUE E SALONES MUROS PUERTAS					-
FILO EJE 2B SUPERIOR	0.12		2.92	1.00	0.35
FILO EJE 2B SUPERIOR	0.12		2.92	1.00	0.35
FILO EJE 3B SUPERIOR	0.12		2.94	1.00	0.35
FILO EJE 3B SUPERIOR	0.12		2.93	1.00	0.35
FILO EJE 4B SUPERIOR	0.12		2.93	1.00	0.35
FILO EJE 4B SUPERIOR	0.12		2.91	1.00	0.35

SUBTOTAL	3.50
VIENE	1,775.99
TOTAL	1,779.49

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
No Mat. 25202-105910


1809

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO: GI-F022
		VERSION: 01
		FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	ITEM No.:	1.60006	DESCRIPCION DEL ITEM:	LAVADA DE FACHADA	UNIDAD:	M2

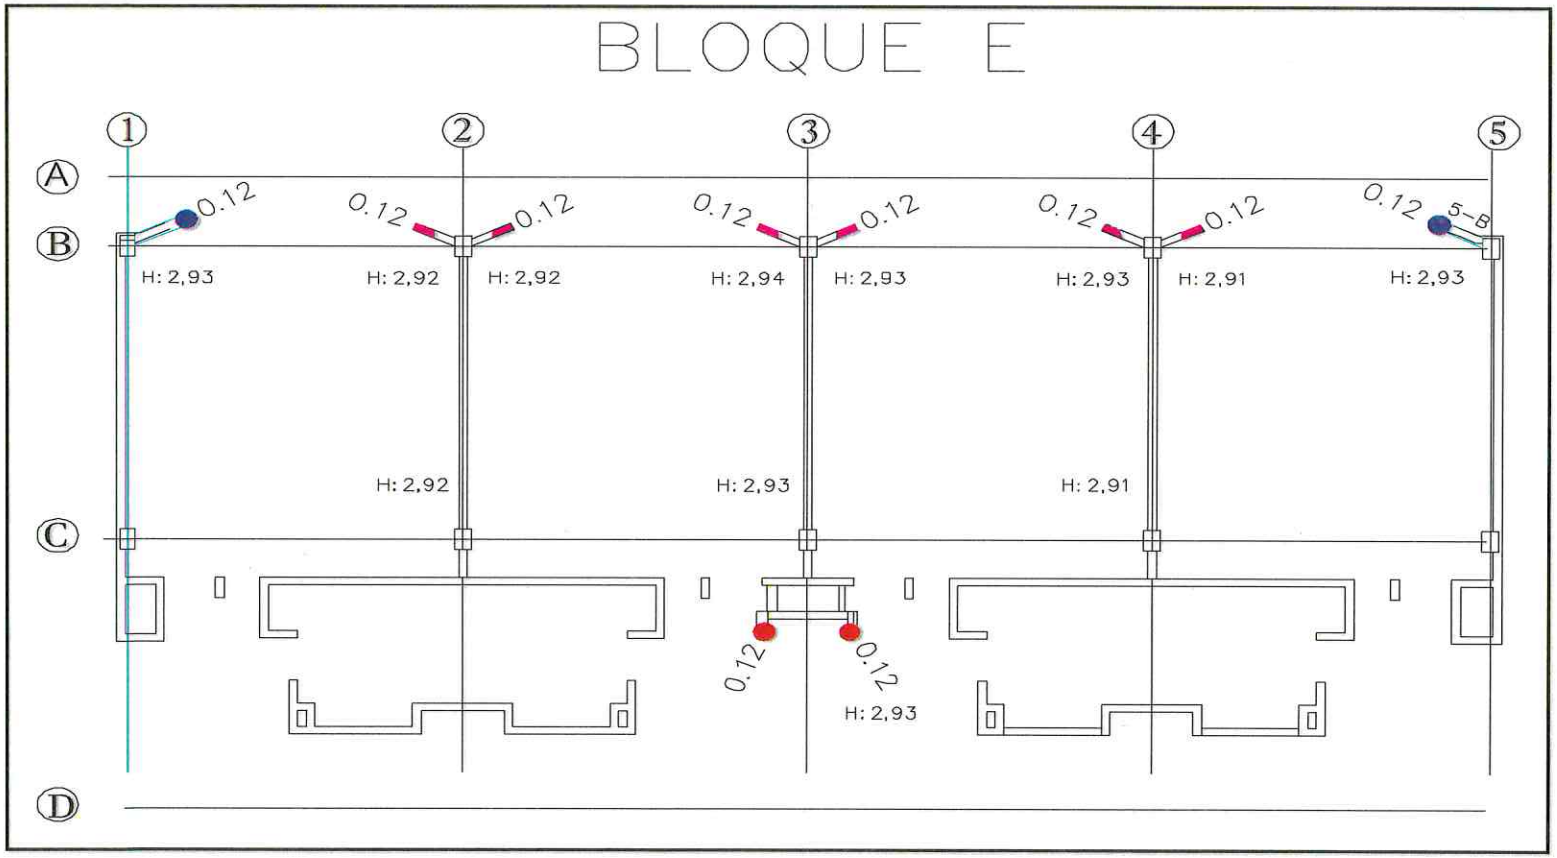

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID PARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
No Mat. 25202-105910

5985

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO: GI-F022 | VERSION: 01 | FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	ITEM No.:	1.60006	DESCRIPCION DEL ITEM:	LAVADA DE FACHADA	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

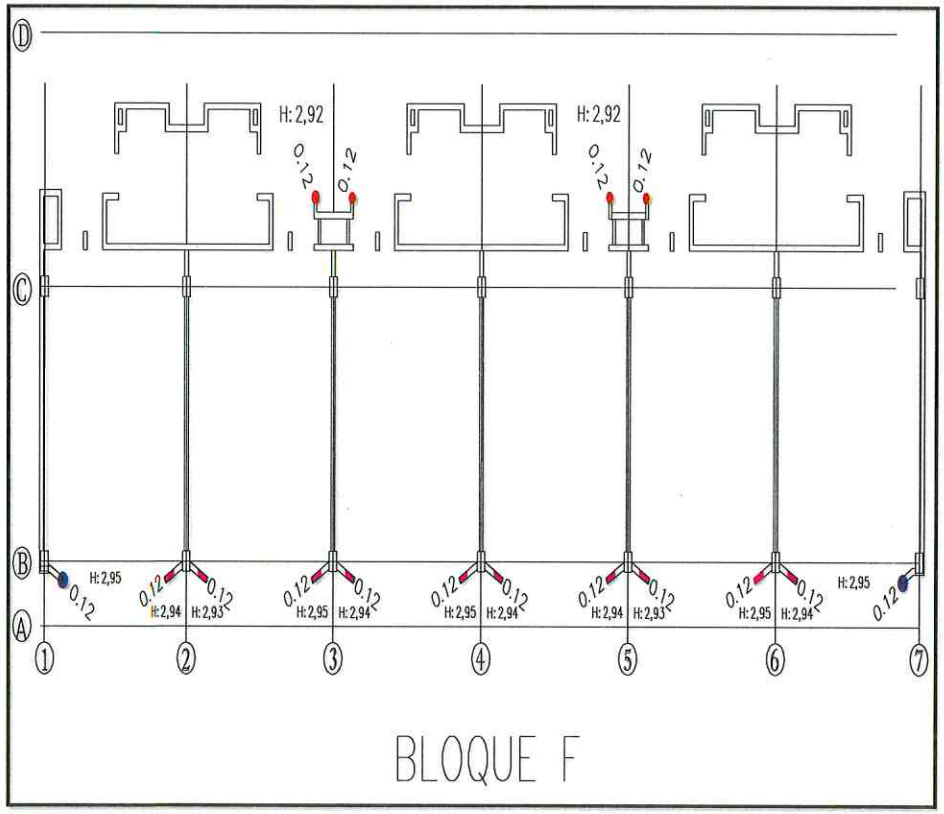

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	
BLOQUE F SALONES					-
FILO INFERIOR CULATA EJE 1	0.12		2.95	1.00	0.35
FILO INFERIOR CULATA EJE 7	0.12		2.95	1.00	0.35
					-
MUROS ELECTRICOS EJE 3 Y 5 C					-
FILO DUCTOS EJE C -EJE 3 C	0.12		2.92	2.00	0.70
FILO DUCTOS EJE C -EJE 5 C	0.12		2.92	2.00	0.70
					-
BLOQUE F SALONES MUROS PUERTAS					-
FILO EJE 2B SUPERIOR	0.12		2.94	1.00	0.35
FILO EJE 2B SUPERIOR	0.12		2.93	1.00	0.35
FILO EJE 3B SUPERIOR	0.12		2.95	1.00	0.35
FILO EJE 3B SUPERIOR	0.12		2.94	1.00	0.35
FILO EJE 4B SUPERIOR	0.12		2.95	1.00	0.35
FILO EJE 4B SUPERIOR	0.12		2.94	1.00	0.35
FILO EJE 5B SUPERIOR	0.12		2.94	1.00	0.35
FILO EJE 5B SUPERIOR	0.12		2.93	1.00	0.35
FILO EJE 6B SUPERIOR	0.12		2.95	1.00	0.35
FILO EJE 6B SUPERIOR	0.12		2.94	1.00	0.35
					-
					-
SUBTOTAL					5.60
VIENE					1,779.49
TOTAL					1,785.09

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
No Mat. 25202-105910


5086

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO: GI-F022
		VERSION: 01
		FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	ITEM No.:	1.60006	DESCRIPCION DEL ITEM:	LAVADA DE FACHADA	UNIDAD:	M2

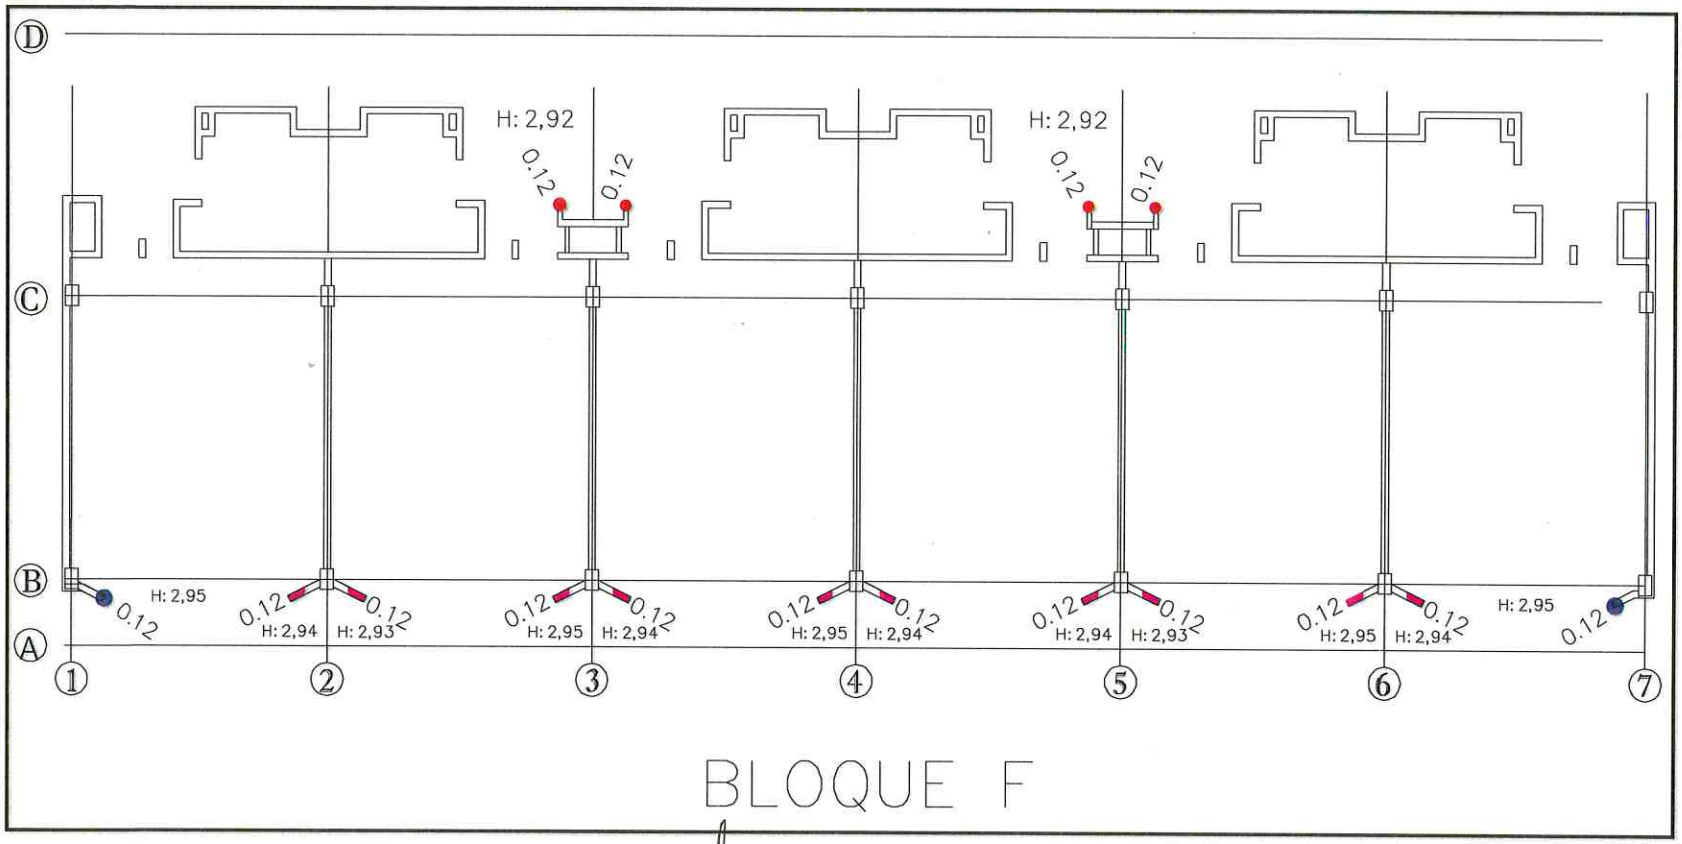

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
No Mat. 25202-105910

5087

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	ITEM No.:	1.60006	DESCRIPCION DEL ITEM:	LAVADA DE FACHADA	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

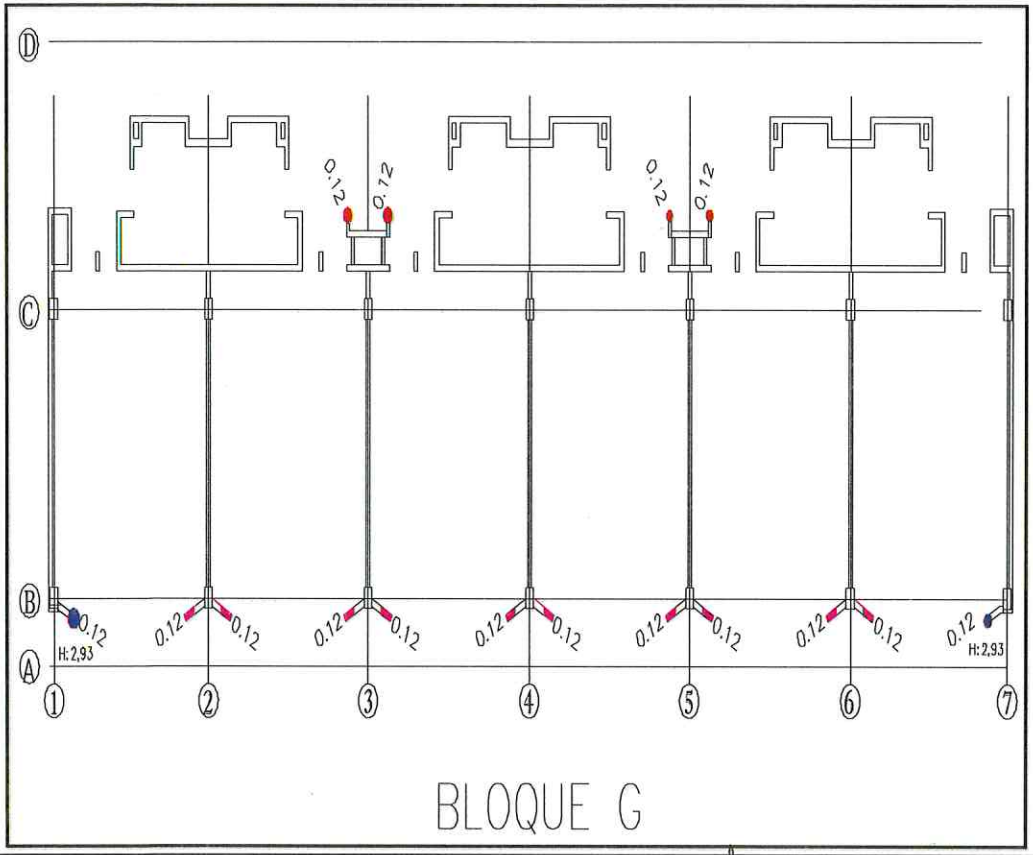

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	
BLOQUE G SALONES					-
FILO INFERIOR CULATA EJE 1	0.12		2.93	1.00	0.35
FILO INFERIOR CULATA EJE 7	0.12		2.93	1.00	0.35
					-
MUROS ELECTRICOS EJE 3 Y 5 C					-
FILO DUCTOS EJE C -EJE 3 C	0.12		2.95	2.00	0.71
FILO DUCTOS EJE C -EJE 5 C	0.12		2.94	2.00	0.71
BLOQUE G SALONES MUROS PUERTAS					-
FILO EJE 2B SUPERIOR	0.12		2.95	1.00	0.35
FILO EJE 2B SUPERIOR	0.12		2.94	1.00	0.35
FILO EJE 3B SUPERIOR	0.12		2.94	1.00	0.35
FILO EJE 3B SUPERIOR	0.12		2.96	1.00	0.36
FILO EJE 4B SUPERIOR	0.12		2.93	1.00	0.35
FILO EJE 4B SUPERIOR	0.12		2.95	1.00	0.35
FILO EJE 5B SUPERIOR	0.12		2.93	1.00	0.35
FILO EJE 5B SUPERIOR	0.12		2.94	1.00	0.35
FILO EJE 6B SUPERIOR	0.12		2.94	1.00	0.35
FILO EJE 6B SUPERIOR	0.12		2.93	1.00	0.35
					-
					-

SUBTOTAL	5.63
IVA 19	1,785.09
TOTAL	1,790.72

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
No Mat. 25202-105910


582

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO: GI-F022 VERSION: 01 FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	ITEM No.:	1.60006	DESCRIPCION DEL ITEM:	LAVADA DE FACHADA	UNIDAD:	M2

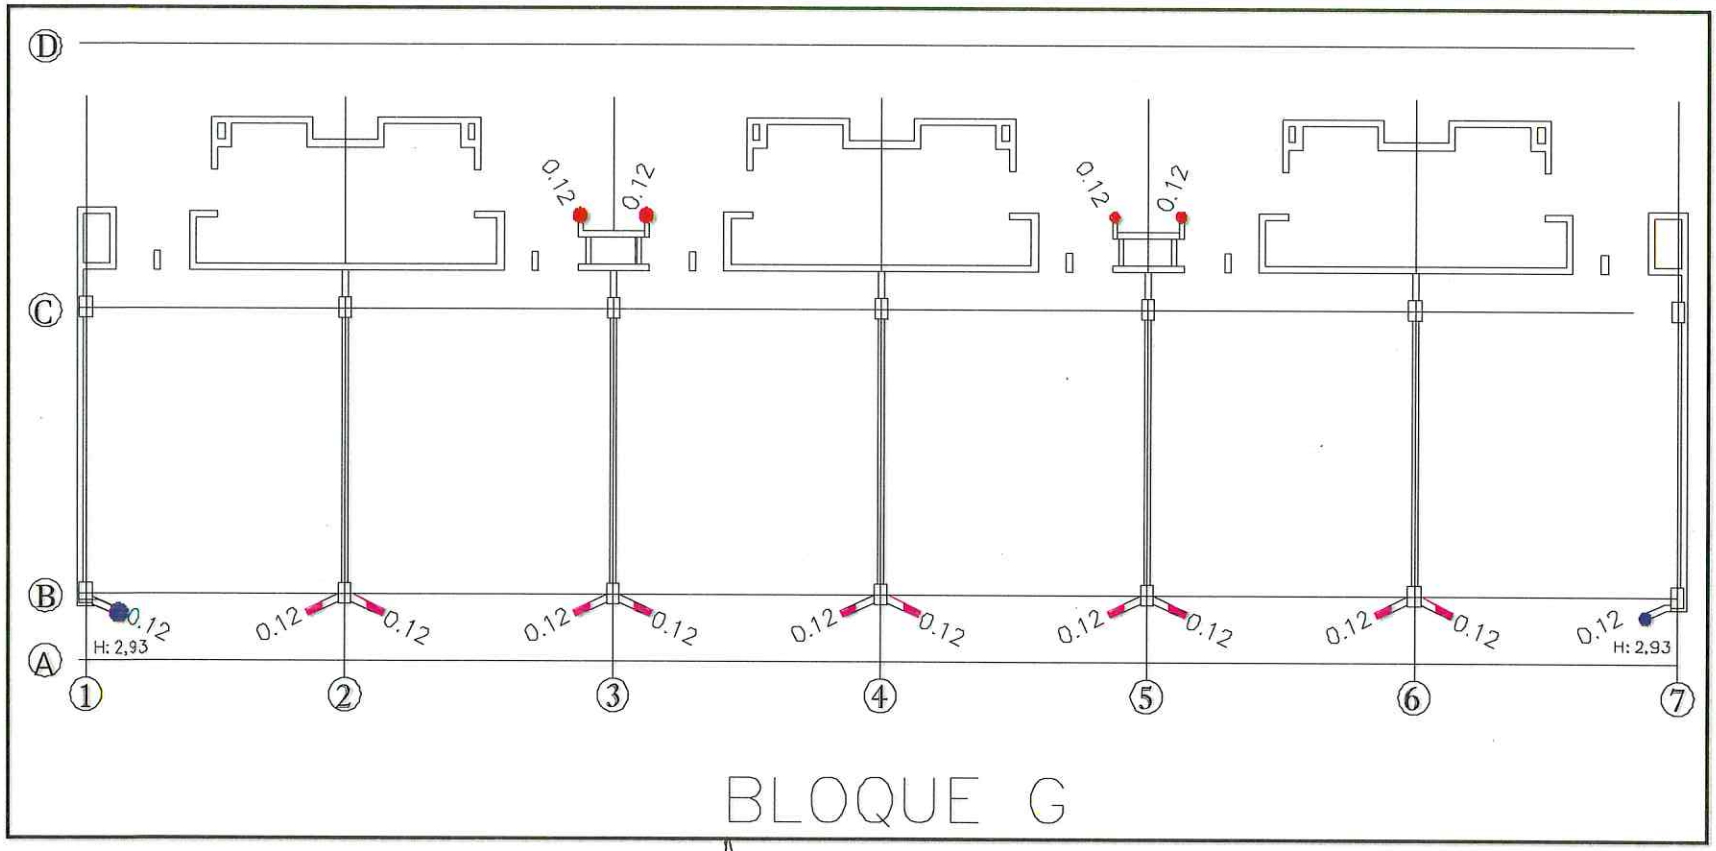

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILO BOHORQUEZ LESMES REPRESENTANTE LEGAL - OBRA CONSORCIO BS INGENIERIA No Mat.25202-088503	NATALIE TRISTANCHO CLEVES REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA CONSORCIO STARK No Mat. 25202-225673	FABIAN BOHORQUEZ LESMES DIRECTOR DE OBRA No Mat.25202-088508	MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES DIRECTOR DE INTERVENTORIA No Mat. 25202-105910

1805

MEMORIA GRÁFICA DE OBRA


CODIGO: GI-F023
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023


CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	ITEM No.:	1.60006	DESCRIPCION DEL ITEM:	LAVADA DE FACHADA	UNIDAD:	M2





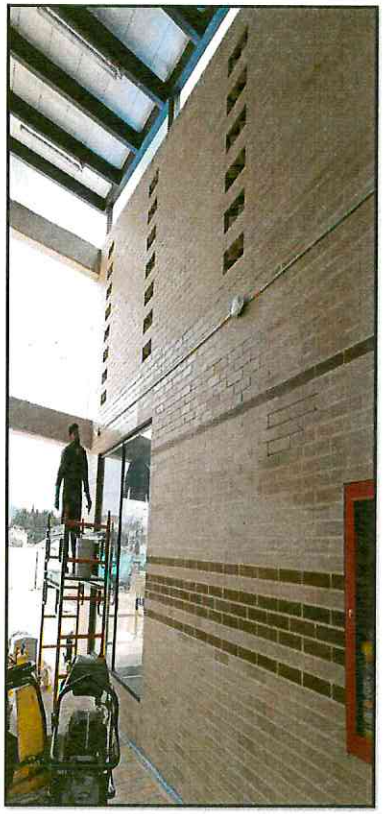

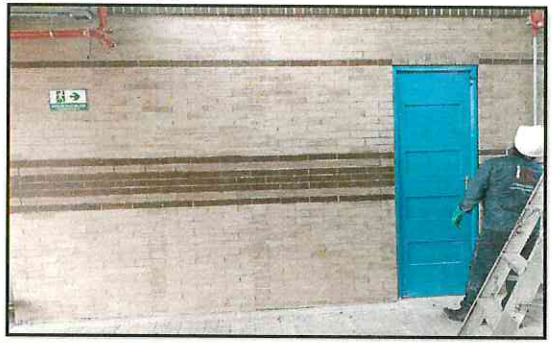



JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
No Mat. 25202-105910

NOTAS:
* EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

	MEMORIA GRÁFICA DE OBRA	CODIGO: GI-F023 VERSION: 01 FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	ITEM No.:	1.60006	DESCRIPCION DEL ITEM:	LAVADA DE FACHADA	UNIDAD:	M2







JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
No Mat. 25202-105910

NOTAS:
* EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

5091

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO: GI-F022 | VERSION: 01 | FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	ITEM No.:	1.60007	DESCRIPCION DEL ITEM:	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

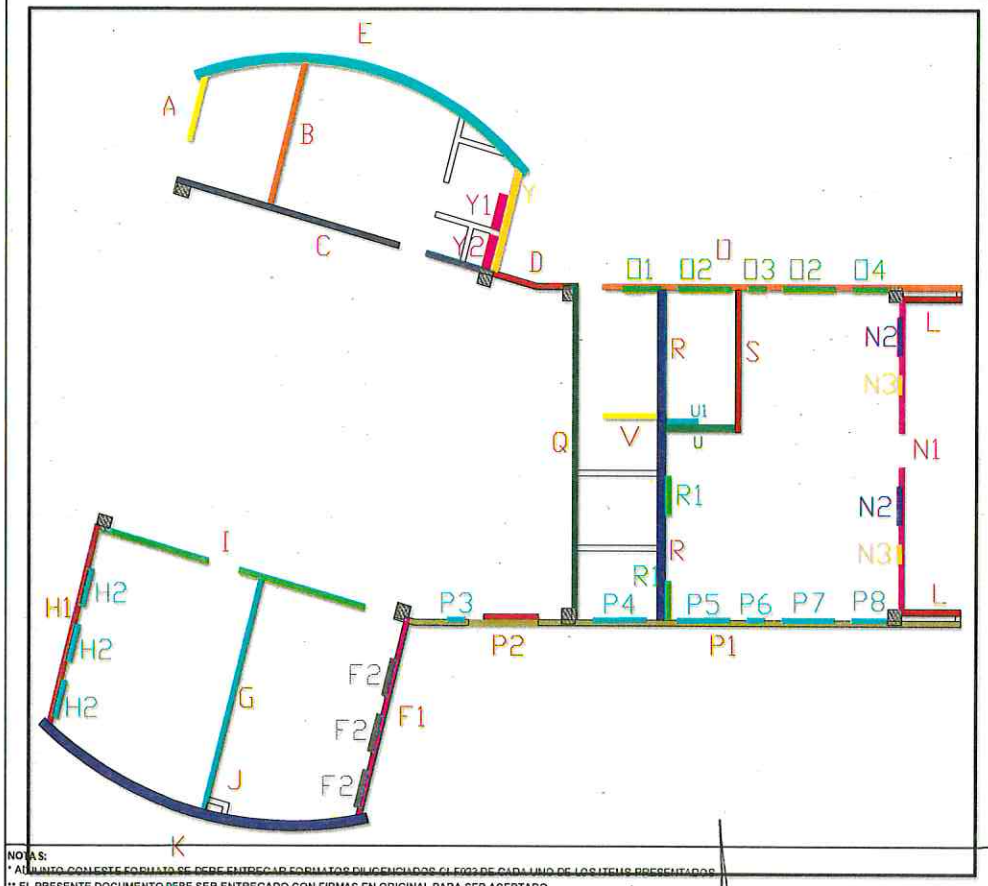

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
BLOQUE B					
MUROS EN MAMPOSTERIA					-
MURO A	2.76		3.69	2.00	20.37
PUERTA A	1.00		2.45	-2.00	-4.90
MURO B	4.02		3.21	2.00	25.81
MURO C	8.50		2.92	1.00	24.82
PUERTA C	1.01		2.46	-1.00	-2.48
MURO E CURVO	9.16		3.72	1.00	34.08
MURO D	1.97		3.35	2.00	13.20
MURO D1 ANTEPECHO SUPERIOR	1.97		1.70	2.00	6.70
MURO F	5.07		2.95	2.00	29.91
VENTANAS F2	1.02		1.29	-6.00	-7.89
MURO F1	0.71		0.62	1.00	0.44
MURO G	6.36		3.24	2.00	41.21
MURO H	5.18		3.45	2.00	35.74
VENTANAS H2	1.02		1.29	-6.00	-7.89
MURO I	8.48		2.92	2.00	49.52
PUERTAS I	1.01		2.46	-4.00	-9.94
MURO K CURVO	9.16		3.72	2.00	68.15
MURO L	1.50		2.92	2.00	8.76
MURO N	6.89		2.93	2.00	40.38
PUERTA N1	1.02		2.46	-2.00	-5.02
VENTANAS N 2	1.02		1.29	-4.00	-5.26
VENTANAS N 3	0.50		1.29	-4.00	-2.58
MURO O	11.30		3.35	2.00	75.71
PUERTA O	1.01		2.43	-2.00	-4.91
VENTANA O 1	0.76		1.29	-2.00	-1.96
VENTANA O 2	1.52		1.29	-4.00	-7.84
VENTANA O 3	0.51		1.29	-2.00	-1.32
VENTANA O 4	1.01		1.29	-2.00	-2.61
MURO P1	15.70		2.93	2.00	92.00
PUERTA P 2	2.03		2.48	-2.00	-10.07
VENTANA P 3	0.51		1.29	-2.00	-1.32
VENTANA P 4	1.52		0.32	-2.00	-0.97
VENTANA P 5	1.52		1.29	-2.00	-3.92
VENTANA P 6	0.51		1.29	-2.00	-1.32
VENTANA P 7	1.51		1.29	-2.00	-3.90
VENTANA P 8	1.01		1.29	-2.00	-2.61
MURO Q	7.99		2.95	1.00	23.57
MURO R	8.67		3.54	2.00	61.38
PUERTA R1	1.01		2.45	-4.00	-9.90
MURO S	3.59		3.54	2.00	25.42
MURO U	1.91		3.54	2.00	13.52
PUERTA U1	0.77		2.54	2.00	3.91
MURO V	2.64		3.00	1.00	7.92
PUERTA V	1.01		2.43	-1.00	-2.45
MURO Y	3.29		3.45	1.00	11.35
PUERTA Y1	0.90		2.45	-1.00	-2.21
PUERTA Y2	0.86		2.45	-1.00	-2.11
				SUBTOTAL	608.49
				VIENE	
				TOTAL	608.49

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
No Mat. 25202-105910

5092

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO:	GI-F022
VERSION:	01
FECHA:	MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	ITEM No.:	1.60007	DESCRIPCION DEL ITEM:	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

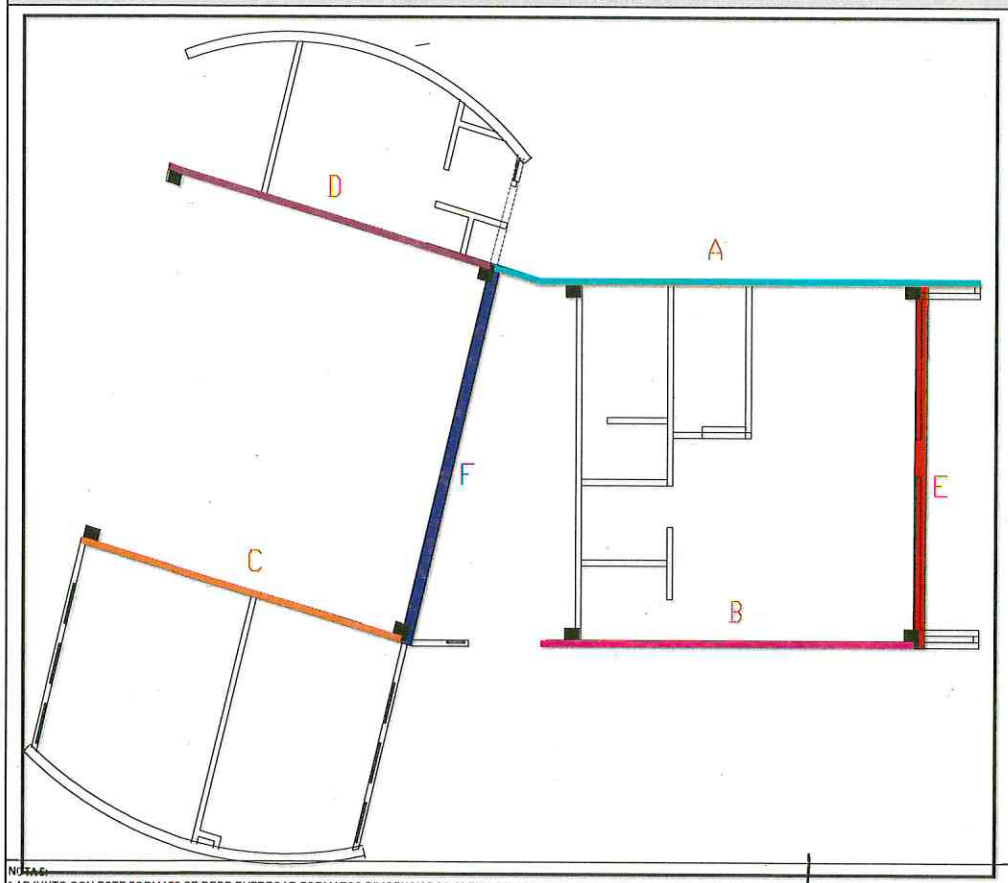

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
BLOQUE B					-
MUROS EN MAMPOSTERIA					-
MURO A	13.27		1.02	2.00	27.07
MURO B	10.10		1.02	2.00	20.60
MURO C	9.16		1.02	2.00	18.69
MURO D	9.16		1.02	2.00	18.69
MURO E	8.69		1.02	2.00	17.73
MURO F	9.37		1.02	2.00	19.11

SUBTOTAL	121.89
VIENE	608.49
TOTAL	730.38

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
No Mat. 25202-105910

5003


	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO: GI-F022 VERSION: 01 FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	MAMPOSTERIA Y PAÑETES	ITEM No.:	1.60007	DESCRIPCION DEL ITEM:	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

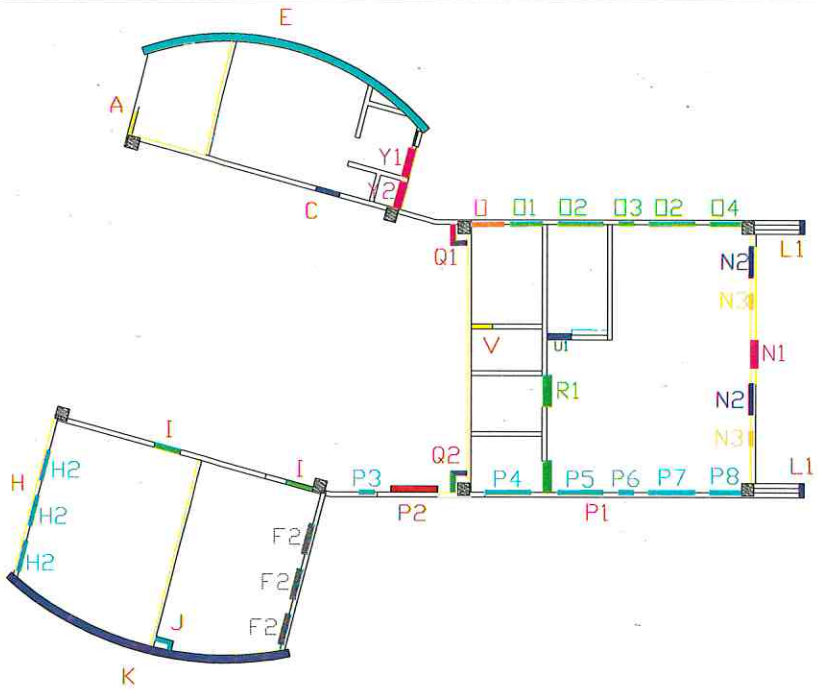

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			CANT	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO		
BLOQUE B						-
MUROS EN MAMPOSTERIA						-
MARCO PUERTA DINTEL A		1.00		0.12	1.00	0.12
MERCO PERTA LATERALES A		2.45		0.12	2.00	0.59
MARCO PUERTA DINTEL C		1.01		0.12	1.00	0.12
MARCO PUERTA LATERALES C		2.46		0.12	2.00	0.59
MURO E HILADA CHOCOLATE		10.21		0.36	1.00	3.68
VENTANAS HORIZONTAL F2		1.02		0.12	6.00	0.73
VENTANAS VERTICAL F2		1.29		0.12	6.00	0.93
VENTANAS HORIZONTAL H2		1.02		0.12	6.00	0.73
VENTANAS VERTICAL H2		1.29		0.12	6.00	0.93
PUERTAS DINTEL I		1.01		0.12	2.00	0.24
PUERTAS LATERALES I		2.46		0.12	4.00	1.18
MURO J LINEALES DUCTO		0.50		3.24	2.00	3.24
MURO K HILADA CHOCOLATE		10.72		0.36	1.00	3.86
MURO L1		0.50		2.92	2.00	2.92
PUERTA DINTEL N1		1.02		0.12	1.00	0.12
PUERTA LATERALES N1		2.46		0.12	2.00	0.59
VENTANAS HORIZONTAL N 2		1.02		0.12	2.00	0.24
VENTANAS VERTICAL N 2		1.29		0.12	2.00	0.31
VENTANAS HORIZONTAL N 3		0.50		0.12	2.00	0.12
VENTANAS VERTICAL N 3		1.29		0.12	2.00	0.31
PUERTA DINTEL O		1.01		0.12	1.00	0.12
PUERTA LATERALES O		2.43		0.12	2.00	0.58
VENTANA HORIZONTAL O 1		0.76		0.12	2.00	0.18
VENTANA VERTICAL O 1		1.29		0.12	2.00	0.31
VENTANA HORIZONTAL O 2		1.52		0.12	4.00	0.73
VENTANA VERTICAL O 2		1.29		0.12	4.00	0.62
VENTANA VERTICAL O 3		1.29		0.12	2.00	0.31
VENTANA HORIZONTAL O 3		0.51		0.12	1.00	0.06
VENTANA VERTICAL O 4		1.29		0.12	2.00	0.31
VENTANA HORIZONTAL O 4		1.01		0.12	1.00	0.12
PUERTA DINTEL P 2		2.03		0.12	1.00	0.24
PUERTA LATERALES P 2		2.48		0.12	2.00	0.60
VENTANA HORIZONTAL P 3		0.51		0.12	2.00	0.12
VENTANA VERTICAL P 3		1.29		0.12	2.00	0.31
VENTANA HORIZONTAL P 4		1.52		0.12	2.00	0.36
VENTANA VERTICAL P 4		0.32		0.12	2.00	0.08
VENTANA HORIZONTAL P 5		1.52		0.12	2.00	0.36
VENTANA VERTICAL P 5		1.29		0.12	2.00	0.31
VENTANA HORIZONTAL P 6		0.51		0.12	2.00	0.12
VENTANA VERTICAL P 6		1.29		0.12	2.00	0.31
VENTANA P 7		1.51		0.12	2.00	0.36
VENTANA P 7		1.29		0.12	2.00	0.31
VENTANA P 8		1.01		0.12	2.00	0.24
VENTANA P 8		1.29		0.12	2.00	0.31
MUROS Q1		0.50		2.95	2.00	2.95
MUROS Q2		0.50		2.95	2.00	2.95
PUERTA DINTEL R1		1.01		0.12	2.00	0.24
PUERTA LATERALES R1		2.45		0.12	4.00	1.18
