MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

TERRITORIAL NARIÑO

INFORME MENSUAL No. 18

PERÍODO: 01 al 28 de febrero de 2026

CONTRATO No. 1982 DE 2024

CARRETERAS:

CÓDIGO 1003 VÍA PASTO-LA PISCICULTURA-EL PEPINO SECTOR PASTO-LA PISCICULTURA PR005+0000-PR033+0000

CÓDIGO 2501A VÍA PASTO-BUESACO-MOJARRAS SECTOR PASTO-BUESACO-HIGUERONES PR002+0000-PR102+0000

CÓDIGO 25NRB VÍA VARIANTE DAZA SECTOR VARIANTE DAZA PR000+0000-PR003+0599

ADMINISTRADOR VIAL:

CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024 - LOTE 5 GRUPO AMV No. 5

SUPERVISOR TÉCNICO:

JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1. Objetivos 9

1.1 General 9

1.2 Específicos 9

2 . VÍAS A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 5 11

3 . ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO..... 12

3.1 INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: CTA CALIBIO, LA GRAN VÍA, EL PRADO Y EL ENCANO..... 12

3.2 TRABAJOS CON MANO DE OBRA DE CTA Y RECURSOS DE INSUMOS14

3.3 REPORTE DE INVASIONES EN EL PERÍODO 15

3.4 RECORRIDOS DEL PERSONAL DE LA AMVG5 POR LAS VÍAS A CARGO EN EL PERIODO. 15

3.5 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL (AMVNG5) REFERENTES AL ÁREA TÉCNICA Y SST. 15

3.5.1 INGENIERO RESIDENTE DE ADMINISTRACIÓN VIAL FRANCISCO ERAZO – ÁREA TÉCNICA..... 16

3.5.2 AUXILIAR I DE ADMINISTRACIÓN VIAL MAYA DELGADO BRAVO – ÁREA TÉCNICA 16

3.5.3 AUXILIAR II DE ADMINISTRACIÓN VIAL DANIEL COLLAZOS – ÁREA TÉCNICA 17

3.5.4 PROFESIONAL SST DE ADMINISTRACIÓN VIAL CLAUDIA OVIEDO – ÁREA SST..... 17

4 . correspondencia enviada y recibida 18

4.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA:..... 19

4.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA: 22

5 . ACTAS DE PAGO PARCIALES, ACUMULADOS Y SALDOS POR EJECUTAR. 24

6 . Conclusiones Y RECOMENDACIONES..... 26

ANEXO No.1 - REGISTRO FOTOGRÁFICO 28

LISTA DE FOTOS

Pág

Foto No. 1. 05/02/2026. Control de actividades y visita cooperativa el Calibio en el PR39+0000 Ruta 2501A. 28
Foto No. 2. 05/02/2026. Revisión actividades pendientes por ejecutar en cooperativa El Prado. PR87+0800 Ruta 2501A. 28
Foto No. 3. 09/02/2026 Control de actividades y visita cooperativa el Calibio en el PR44+0100 Ruta 2501A. 28
Foto No. 4. 05/02/2026 Recorrido con contratista de señalización. PR36+0680 Ruta 2501A. 28
Foto No. 5. 09/02/2026 Control de actividades y visita cooperativa el Calibio en el PR42+0850 Ruta 2501A. 28
Foto No. 6. 09/02/2026 Control de actividades y visita cooperativa el Calibio en el PR44+0650 Ruta 2501A. 28
Foto No. 7. 09/02/2026. Control de actividades y visita cooperativa Calibio en el PR44+0800 ruta 2501A. 29
Foto No. 8. 10/02/2026. Control y supervision en desalojo de rocas en el PR27+0520 Ruta 2501A. 29
Foto No. 9. 13/02/2026 Inspección sitio desalojo de derrumbes, PR94+0900 de la Ruta2501A. 29
Foto No. 10. 18/02/2026. Control de actividades y visita cooperativa el Calibio en el PR60+0680 Ruta 2501A. 29
Foto No. 11. 18/02/2026. Revisión actividades pendientes por ejecutar en cooperativa El Prado. PR94+0500 Ruta 2501A.. 29
Foto No. 12. 18/02/2026 toma de información de accidentalidad en el PR29+0660 de la Ruta 1003. 29

Foto No. 13. 18/02/2026. Control de actividades y visita cooperativa El Encano en el PR29+0660 Ruta 1003. 30
Foto No. 14. 19/02/2026 atención solicitud de peticionario en el PR75+0300 de la Ruta 2501A. 30
Foto No. 15. 25/02/2026. Atencion de emergencias PR53+0720 Ruta 2501A. 30
Foto No. 16. 25/02/2026 Atencion de emergencias, PR63+0010 Ruta 2501A. 30
Foto No. 17. 04/02/2026. Realización de pausas activas al grupo de trabajo Consorcio CI administradores 2024 en oficina. 31
Foto No. 18. 10/02/2026. Visita y Revisión de elementos de protección personal, recomendaciones del SST en el PR19+0080 Ruta1003. CTA El Encano 31
Foto No. 19. 18/02/2026 Visita y recomendaciones del SST en el PR27+0520 Ruta2501A. CTA La Gran Via. 31
Foto No. 20. 17/02/2026. Visita y Revisión de elementos de protección personal, recomendaciones del SST en el PR45+0120 Ruta2501A. CTA Calibio. 31
Foto No. 21. 03/02/2026. antes de la demolicion de rocas. PR27+0520 Ruta 2501A. 32
Foto No. 22. 03/02/2026. antes de la demolicion de rocas. PR27+0520 Ruta 2501A. 32
Foto No. 23. 10/02/2026. durante la perforacion y demolicion de rocas. PR27+0520 Ruta 2501A. 32
Foto No. 24. 10/02/2026. durante la perforacion y demolicion de rocas. PR27+0520 Ruta 2501A. 32
Foto No. 25. 10/02/2026. . durante la perforacion y demolicion de rocas. PR27+0520 Ruta 2501A. 32
Foto No. 26. 12/02/2026. . durante la perforacion y demolicion de rocas. PR27+0520 Ruta 2501A. 32
Foto No. 27. 16/02/2026. durante la perforacion y demolicion de rocas. PR27+0520 Ruta 2501A. 33

Foto No. 28. 14/02/2026 durante la perforacion y demolicion de rocas. PR27+0520 Ruta 2501A. 33
Foto No. 29. 17/02/2026 despues de la perforación y demolicion de rocas. PR27+0520 Ruta 2501A. 33
Foto No. 30. 14/02/2026 despues de la perforación y demolicion de rocas. PR27+0520 Ruta 2501A. 33
Foto No. 31. 11/11/2025. Antes de construccion de muro de contencion con sacos suelos con cemento PR 44+1010 Ruta 2501A..... 34
Foto No. 32. 11/11/2025. Antes de construccion de muro de contencion con sacos suelos con cemento PR 44+1010 Ruta 2501A..... 34
Foto No. 33. 11/11/2025. Antes de construccion de muro de contencion con sacos suelos con cemento PR 44+1010 Ruta 2501A..... 34
Foto No. 34. 11/11/2025. Antes de construccion de muro de contencion con sacos suelos con cemento PR 44+1010 Ruta 2501A..... 34
Foto No. 35. 09/02/2026. Durante la construccion de muro de contencion con sacos suelos con cemento PR 44+1010 Ruta 2501A..... 34
Foto No. 36. 09/02/2026. Durante la construccion de muro de contencion con sacos suelos con cemento PR 44+1010 Ruta 2501A..... 34
Foto No. 37. 09/02/2026. Durante la construccion de muro de contencion con sacos suelos con cemento PR 44+1010 Ruta 2501A..... 35
Foto No. 38. 09/02/2026. Durante la construccion de muro de contencion con sacos suelos con cemento PR 44+1010. Ruta 2501A..... 35
Foto No. 39. 09/02/2026. Durante la construccion de muro de contencion con sacos suelos con cemento PR 44+1010 Ruta 2501A..... 35
Foto No. 40. 09/02/2026. Durante la construccion de muro de contencion con sacos suelos con cemento PR 44+1010 Ruta 2501A..... 35
Foto No. 41. 09/02/2026. Despues de construccion de muro de contencion con sacos suelos con cemento PR 44+1010 Ruta 2501A 35

Foto No. 42. 09/02/2026. despues de construccion de muro de contencion con sacos suelos con cemento PR 44+1010 Ruta 2501A 35
Foto No. 43. 09/02/2026. Antes de construccion de muro de contencion con sacos suelos con cemento PR 44+0650 Ruta 2501A. 36
Foto No. 44. 09/02/2026. Antes de construccion de muro de contencion con sacos suelos con cemento PR 44+0650 Ruta 2501A 36
Foto No. 45. 09/02/2026. Durante de construccion de muro de contencion con sacos suelos con cemento PR 44+0650 Ruta 2501A. 36
Foto No. 46. 09/02/2026. Durante de construccion de muro de contencion con sacos suelos con cemento PR 44+0650 Ruta 2501A. 36
Foto No. 47. 18/02/2026. Despues de laconstruccion de muro de contencion con sacos suelos con cemento PR 44+0650 Ruta 2501A. 36
Foto No. 48. 18/02/2026. Despues de laconstruccion de muro de contencion con sacos suelos con cemento PR 44+0650 Ruta 2501A. 36
Foto No. 49. 18/02/2026. Antes de fundir bordillo y cunetas. PR 44+1010..Ruta 2501A. 37
Foto No. 50. 18/02/2026. Antes de fundir bordillo y cunetas. PR 44+0650 Ruta 2501A 37
Foto No. 51. 18/02/2026. Durante la fundición bordillo y cunetas. PR 44+1010..Ruta 2501A. 37
Foto No. 52. 18/02/2026. Durante la fundición bordillo y cunetas. PR 44+1010..Ruta 2501A. 37
Foto No. 53. 19/02/2026. Después de fundir bordillo y cunetas. PR 44+1010..Ruta 2501A. 37
Foto No. 54. 19/02/2026. Después de fundir bordillo y cunetas. PR 44+1010.Ruta 2501A. 37
Foto No. 55. 19/02/2026. Después de fundir bordillo y cunetas. PR 44+0650.Ruta 2501A 37

Foto No. 56. 19/02/2026. Después de fundir bordillo y cunetas. PR 44+0650.Ruta 2501A 37

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Información de los contratos de las Cooperativas. 12
Tabla 2 Calendario de recorridos realizados en el periodo. 15
Tabla 3 Correspondencia enviada periodo febrero de 2026. 19
Tabla 4 Correspondencia recibida periodo febrero de 2026. 22
Tabla 5 Control financiero. 24

1. OBJETIVOS

Se presenta el siguiente objetivo general y específicos.

1.1 General

Documentar de forma clara y concisa las actividades, procedimientos e incidencias relacionadas con la ejecución del contrato No. 1982 de 2024, cuyo objeto es la "Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Nariño, Grupo AMV 5 Lote 5", durante el periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2026.

1.2 Específicos

- Presentar un registro fotográfico que evidencie las actividades realizadas por los profesionales de la administración vial, microempresas de mantenimiento rutinario y del contrato 4121 de 2024 (contratista que realiza trabajos en la ruta 2501A) en el periodo del informe.

- Resumir de forma estructurada las actividades ejecutadas por el CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024, organizadas por capítulos y subcapítulos según la metodología establecida.


- Exponer las conclusiones y recomendaciones derivadas de la gestión realizada durante el periodo del 1 al 28 de febrero de 2026.

Información general del contrato:

Número de contrato	1982 de 2024
Objeto	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5.
Empresa ejecutora	CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024 NIT: 901838183
Duración del contrato	29 meses
Plazo	Hasta el 31 de julio de 2026
Valor inicial incluido IVA	$ 4,050,198,082.00
Supervisor	Jonny Andrés Fajardo Rosero
Fecha de orden de inicio	12 de septiembre de 2024
Fecha de terminación	31 de julio de 2026

2. VÍAS A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 5



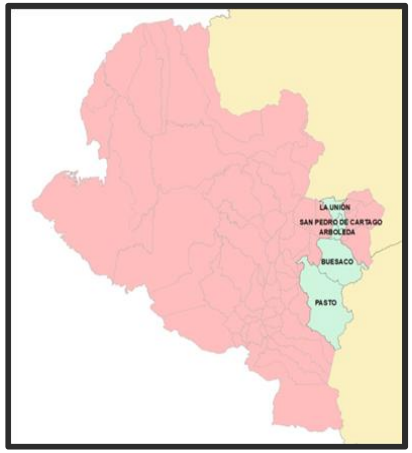

Localización de Nariño en Colombia (arriba)
Ubicación de municipios de influencia del proyecto (abajo)



Vías a cargo de la AMVG5 y algunos puntos de referencia y/o interés como centros poblados y/o municipios del área de influencia.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO.

Las actividades por exponer en el actual capítulo son: 1) Cuadro en donde se relaciona los contratos de Mantenimiento Rutinario, los cuales son ejecutados por cooperativas de trabajo asociado (CTA de ahora en adelante) y descripción de actividades de mantenimiento rutinario realizadas en el periodo. 2). Trabajos de mano de obra y recursos de insumos. 3) Reporte de invasiones. 4) Relación de fechas y rutas para recorridos diarios por parte del grupo de profesionales de la AMVNG5. 5) Resumen de actividades por cada profesional del grupo de trabajo CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024.

3.1 INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: CTA CALIBIO, LA GRAN VÍA, EL PRADO Y EL ENCANO.

Se relaciona un cuadro con los contratos de las cooperativas a las cuales se les hace interventoría:

Tabla 1 Información de los contratos de las Cooperativas.

CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	FECHA DE ORDEN DE INICIO
3711 DE 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA GRAN VÍA	“SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO Á LOS SECTORES 25NRB VARIANTE DE DAZA, PR 0+0000 - PR 3+0599/ 2501A PASTO - BUESACO - HIGUERONES, PR 2+0000 (PASTO) - PR38+0860 (BUESACO)”	7 DE OCTUBRE DE 2024
3665 DE 2024	COOPERATIVA COMUNITARIA DE SERVICIOS Y DE TRABAJO ASOCIADO DE CALIBIO	“SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO SECTORES 2501A PASTO - BUESACO - HIGUERONES, PR 38+0700 (BUESACO) - PR 70+0000 (MARTÍN)”	15 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	FECHA DE ORDEN DE INICIO
3695 DE 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL PRADO	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO EN LOS SECTORES 2501A PASTO - BUESACO - HIGUERONES, PR 70+0000 (MARTÍN) - PR 102+0000 (HIGUERONES)"	7 DE OCTUBRE DE 2024
3742 DE 2024.	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRACIÓN EL ENCANO	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO SECTORES 1003 PASTO - LA PISCICULTURA, PR5+0000 - PR 33+0000"	8 DE OCTUBRE DE 2024

Entre las actividades desarrolladas por cada CTA en el periodo del informe se enlistan así:

- Rocería.
- Poda de árboles y vegetación para despeje de señales verticales.
- Poda de árboles y vegetación para despeje de calzada (paisajismo y seguridad vial) a una altura superior a 4 metros.
- Desmonte manual de talud.
- Limpieza de cunetas.
- Limpieza de tubería de alcantarillas.
- Limpieza de encoles, descoles de alcantarillas y box culvert.
- Limpieza de bordillos.
- Limpieza y/o enderezamiento de señales verticales.
- Retiro y/o reemplazo de señales verticales dañadas o en mal estado.
- Limpieza de defensas metálicas.
- Reporte de atropellamiento a fauna.
- Jornadas de tapahuecos con material común.
- Jornadas de recolección de basura.
- Despeje de derrumbes menores con herramienta menor.

- Limpieza de calzada: despeje de obstáculos, basuras y rocas para circulación vehicular de usuarios viales en condiciones de seguridad y comodidad.
- Asistencia y participación a capacitación mensual orientada por AMVNG5.
- Reporte e informe a grupo de WhatsApp de la AMVNG5 “COOPERATIVAS NARIÑO G5”, de recorrido diario en horas de la mañana y de la tarde, así como también el reporte de las emergencias evidenciadas en los respectivos tramos asignados de vía.
- Señalización y refuerzo de señalización en sitios críticos, con colombinas reflectivas y cinta de peligro no pase.
- Apoyo al control de tráfico en implementación del PMT en actividades desarrolladas.

Los tramos y rendimientos de las actividades mencionadas se relacionan en el informe de indicadores para cada CTA. Adicionalmente, la programación semanal de las actividades ejecutadas es revisada y aprobada por la administración vial los lunes de cada semana.

3.2 TRABAJOS CON MANO DE OBRA DE CTA Y RECURSOS DE INSUMOS

- Las labores comprendieron trabajos de demolición y retiro de roca PR 27+0520 Ruta 2501A,
- Construccion de muro de contencion con sacos suelos con cemento PR 44+0650 y PR 44+1010
- Fundir bordillo y cunetas. PR 44+0650 y PR 44+1010 Ruta 2501A

3.3 REPORTE DE INVASIONES EN EL PERÍODO

En el periodo del actual informe se identificaron las siguientes contravenciones a la Ley, radicadas mediante comunicado y fecha como se muestra en el cuadro en la parte inferior:

3.4 RECORRIDOS DEL PERSONAL DE LA AMVG5 POR LAS VÍAS A CARGO EN EL PERIODO.

Se presenta un calendario del mes de febrero de 2026 con los recorridos diarios en las vías a cargo de la administración vial grupo 5 en este periodo.

Tabla 2 Calendario de recorridos realizados en el periodo.

DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1	2 **2501A**	3 **2501A**	4 **2501A**	5 **2501A**	6 **2501A**	7 **2501A**
8	9 **2501A**	10 **2501A**	11 **1003**	12 **2501A**	13 **1003**	14
15	16 1003	17 **2501A**	18 **2501A**	19 **1003**	20 **2501A**	21
22	23 **1003**	24 **1003**	25 **2501A**	26 **2501A**	27 **2501A**	28

Fuente: Propia.

3.5 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL (AMVNG5) REFERENTES AL ÁREA TÉCNICA Y SST.

Se presenta un breve subcapítulo para cada uno de los profesionales de la administración vial, tanto del área técnica como del área de SST, en el que se detallan las actividades desarrolladas en el marco del contrato durante el periodo correspondiente a este informe.

3.5.1 INGENIERO RESIDENTE DE ADMINISTRACIÓN VIAL FRANCISCO ERAZO – ÁREA TÉCNICA.

- Gestión técnica para la resolución de problemas de infraestructura vial por medio de mano de obra de CTA y recursos e insumos suministrados por la Administración Vial (AMVNG5).
- Respuesta a derechos de petición: visitas técnicas e informes.
- Recorridos con la Subdirección Territorial de INVIAS y contratistas de obra en las rutas a cargo.
- Supervisión de trabajos ejecutados con recursos en insumos y mano de obra de CTA.
- Reporte diario del estado o condiciones de la vía en el grupo de WhatsApp “RESIDENTES AMV”, durante las horas de la mañana y tarde. Así como también el debido reporte de emergencias en su respectivo formato anexando el registro fotográfico pertinente.
- Inspección técnica a los tramos de vía o rutas a cargo para coordinar con CTA cumplimiento de acuerdo con los indicadores contractuales del mantenimiento rutinario, en el cual se toma de evidencias y se hacen las recomendaciones verbales grupales, y en los casos donde se requiere por medio de comunicados escritos.
- Toma de registros fílmicos y fotográficos con el Dron adscrito a la Administración Vial (AMV G5).
- Elaboración, revisión y envío de informes técnicos a la Dirección Territorial Invias Nariño en cumplimiento del contrato 1982 de 2024.

3.5.2AUXILIAR I DE ADMINISTRACIÓN VIAL MAYA DELGADO BRAVO – ÁREA TÉCNICA

- Apoyo en la elaboración de informes: Recolección de información en campo, elaboración de informe de accidentalidad, mes inmediatamente anterior.
- Organización de registros fotográficos diario por cooperativa en almacenamiento de información de la empresa.
- Elaboración de informe mensual de acuerdo con las actividades, procedimientos e incidencias relacionadas en el presente mes.
- Supervisión de trabajos en ruta 2501A.
- Apoyo al diligenciamiento de información asociada a sitios críticos en ruta 1003 y 2501A en plataforma Survey.
- Toma de registros fotográficos de las actividades del contratista 4121 de 2024 para el reporte a la Dirección Territorial de Nariño.

- Inspección técnica a los tramos para exigir a CTA cumplimiento con indicadores: toma de evidencias y llamados de atención en grupo WhatsApp "COOPERATIVAS NARIÑO G5".
- Recorridos para verificación de estado de sitios críticos.
- Reporte del estado diario de las vías a cargo en las horas de la mañana en grupo interno de la empresa "AMV GRUPO 5".

3.5.3 AUXILIAR II DE ADMINISTRACIÓN VIAL DANIEL COLLAZOS – ÁREA TÉCNICA

- Seguimiento y/o control a avance y programación de actividades de cooperativas asociadas de trabajo
- Elaboración de oficios asociados a invasiones y reiteraciones al derecho de vía y respuestas a requerimientos de entidades municipales.
- Diligenciamiento y procesamiento de información diaria de administración vial y contratos de mantenimiento rutinario en bitácora.
- Elaboración de reporte de emergencias mensual.
- Diligenciamiento y elaboración de formatos asociados a encuestas de fauna SUKUBUN.
- Apoyo a la supervisión de ejecución de labores asociadas a bacheo con mezcla asfáltica en ruta 2501A.
- Actualización de reportes de sitios críticos en base de datos de plataforma survey para rutas 1003 y 2501A respectivamente.

3.5.4 PROFESIONAL SST DE ADMINISTRACIÓN VIAL CLAUDIA OVIEDO – ÁREA SST

En los recorridos viales realizados sobre las rutas a cargo durante el mes de febrero, se socializaron en las visitas y charlas de seguridad los siguientes temas, tanto al personal de la administración vial (AMV G5) como a las CTA:

- Análisis de accidentes laborales
- Seguridad en el trabajo
- Obligación del uso de elementos de protección personal
- Seguridad en la vía

Se realizaron actividades de:

- Se realizó la inspección del uso y estado de elementos de protección personal del personal de las cooperativas de trabajo.

- Se realizó inspección a vehículos (motos y carros) de las CTA, con el propósito de evidenciar las condiciones de estos; y prevenir accidentes de tránsito.
- Se realizó inspección de elementos de primeros auxilios: (botiquín; camilla de emergencia; extintores).
- Se realizaron pausas activas con el personal de la administración vial (AMV G5) y las CTA.
- Se realizó inspección de herramienta manual y menor de las CTA, todo ello con base a la herramienta mínima solicitada contractualmente para las labores de mantenimiento rutinario, asegurando el funcionamiento correcto para evitar accidentes e incidentes laborales.
- Se realiza seguimiento al diseño y ejecución al sistema de seguridad y salud en el trabajo a las cooperativas a cargo, con el fin de que ejecuten actividades encaminadas a velar por la seguridad y bienestar de los trabajadores y así cumplir con la normatividad vigente.
- Se realiza seguimiento a la planeación y ejecución del sistema de seguridad y salud en el trabajo de las cooperativas a cargo.
- Se visita, inspecciona y analiza lugares de trabajo con el fin de brindar recomendaciones para realizar acciones seguras en la ejecución de sus tareas.
- Después de las visitas a cada cooperativa se analiza los hallazgos y se solicita de manera verbal o escrita a los representantes legales con el fin de prevenir accidentes o incidentes laborales.
- Se solicita y revisa informes mensuales enviados por cada SST de las cooperativas a cargo, con el fin de verificar el cumplimiento en la ejecución de las actividades del sistema de seguridad y salud en el trabajo y así velar por el bienestar de cada uno de los trabajadores
- Apoyo en el desarrollo de capacitación mensual para trabajadores de CTA.
- Se realiza acompañamiento al desarrollo de actividades programadas desde la Administración vial, y ejecutadas por el personal de las cooperativas con el fin de velar por el cumplimiento de la señalización y plan de manejo de tránsito para así prevenir accidentes e incidentes tanto a los trabajadores como a las personas que transitan por el corredor vial.

4. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Se presentan dos cuadros uno para la correspondencia enviada y otro para la recibida para el periodo del actual informe, así:

4.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA:

Tabla 3 Correspondencia enviada periodo febrero de 2026.

FECHA	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	DEPENDENCIA	ASUNTO
04/02/2026	572-AMVNG5-CTO1982-2024	PROYECTOS Y DESARROLLOS DE LOS ANDES S.A.S	SAMUEL JOSÉ CURE SALAS Representante legal	Localización de señalización contrato 1767 de 2025. Ruta 2501A Pasto – Buesaco – Higuerones.
04/02/2026	573-AMVNG5-CTO1982-2024	Policía Nacional de Colombia Seccional de Tránsito y Transporte Nariño	WALTER FERNANDO RODRÍGUEZ LÓPEZ ALCALDE	Intendente VÍCTOR ALFONSO CIFUENTES CAYCEDO
03/02/2026	574-AMVNG5-CTO1982-2024	Secretaria Municipal de Tránsito (E) Municipio de Buesaco - Nariño	MARILUZ CRISTINA DELGADO GAVIRIA ALCALDESA	BAYRON ASDRUBAL ARGOTTY MONCAYO Secretario Municipal de Tránsito (E)
03/02/2026	575-AMVNG5-CTO1982-2024	Inspección de Policía Municipal Municipio de Arboleda – Nariño	OSWALDO PABÓN DIAZ ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BUESACO	ÁLVARO KENNETH BURBANO ARMERO Inspector de Policía

FECHA	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	DEPENDENCIA	ASUNTO
03/02/2026	576-AMVNG5-CTO1982-2024	Inspección de Policía San Pedro de Cartago - Nariño	GLADYS OLIVA LÓPEZ Inspectora de Policía	Solicitud reporte de accidentalidad enero de 2026.
03/02/2026	577-AMVNG5-CTO1982-2024	Inspección de Policía Municipio La Unión - Nariño	JAIME ANDRÉS ARMERO SOLARTE Inspector de Policía DIEGO NARVÁEZ Inspector de Policía	Solicitud reporte de accidentalidad enero de 2026.
03/02/2026	578-AMVNG5-CTO1982-2024	Inspección de Policía Florencia, Cauca	DEIBY ANTONY SOLARTE ARAUJO Inspector de Policía	Solicitud reporte de accidentalidad enero de 2026.
04/02/2026	579-AMVNG5-CTO1982-2024	SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS Ing. Juan Daniel Cardozo	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	Información de Accidentalidad desde inicio del Contrato 1982 de 2024
04/02/2026	580-AMVNG5-CTO1982-2024	Secretaria Municipal de Tránsito (E) Municipio de Buesaco - Nariño	BAYRON ASDRUBAL ARGOTTY MONCAYO Secretario Municipal de Tránsito (E)	Respuesta Oficio STTMB No. 2026 – 016, accidentalidad enero de 2026.
05/02/2026	581-AMVNG5-CTO1982-2024	Cooperativa de trabajo Calibio	JOSE TITO CHAGUENDO QUILINDO REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATO NUMERO 3665 DE 2024, SOLICITUD DE DOTACIÓN.
05/02/2026	582-AMVNG5-CTO1982-2024	Cooperativa de trabajo Calibio	JOSE TITO CHAGUENDO QUILINDO REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATO NUMERO 3665 DE 2024, SOLICITUD DE CAMBIO Y MANTENIMIENTO A GUADAÑAS.

FECHA	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	DEPENDENCIA	ASUNTO
06/02/2026	583-AMVNG5-CTO1982-2024	INVIAS	MARÍA CRISTINA RIASCOS ERASO Directora territorial	SOLICITUD ATENCIÓN DESLIZAMIENTOS RUTA 2501A, MEDIANTE CONTRATO 4121 DE 2024.
06/02/2026	584-AMVNG5-CTO1982-2024	INVIAS NARIÑO	MARÍA CRISTINA RIASCOS ERASO Directora territorial	Solicitud autorización uso de insumos para demolición de rocas de la Ruta 2501A Pasto – Buesaco – Higuerones. PR27+0520.
06/02/2026	585-AMVNG5-CTO1982-2024	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE PASTO	NICOLAS MARTIN TORO ALCALDE DEL MUNICIPIO DANIEL CAMILO BASTIDAS SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	REITERACIÓN OFICIO RADICADO No. 569-AMVNG5-CTO1982-2024 ''INVASIONES AL DERECHO DE VÍA, RUTA 1003 SECTOR PASTO-LA PISCICULTURA-EL PEPINO JURISDICCIÓN DE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE PASTO CORREGIMIENTO EL ENCANO – EXPLANACIÓN DE TALUD SUPERIOR SOBRE MARGEN DERECHO DE LA VÍA EN PR7+0120''
06/02/2026	586-AMVNG5-CTO1982-2024	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE PASTO	NICOLAS MARTIN TORO ALCALDE DEL MUNICIPIO DANIEL CAMILO BASTIDAS SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	INVASIONES AL DERECHO DE VÍA, RUTA 1003 SECTOR PASTO-LA PISCICULTURA-EL PEPINO JURISDICCIÓN DE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE PASTO CORREGIMIENTO EL ENCANO – CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA EN MADERA SOBRE MARGEN IZQUIERDO DE LA VÍA EN PR23+0400.
06/02/2026	587-AMVNG5-CTO1982-2024	Cooperativa de trabajo Calibio	JOSÉ TITO CHAGÜENDO QUILINDO REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATO NUMERO 3665 DE 2024, MORA EN PAGO DE SALARIOS DICIEMBRE 2025, ENERO 2026.
16/02/2026	588-AMVNG5-CTO1982-2024	INVIAS NARIÑO	MARÍA CRISTINA RIASCOS ERASO DIRECTORA TERRITORIAL	Solicitud autorización uso de insumos para construcción de colombinas en concreto reforzado y tubería PVC para señalización de rutas 1003, 25NRB y 2501A.
19/02/2026	589-AMVNG5-CTO1982-2024	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE PASTO	NICOLAS MARTIN TORO ALCALDE DEL MUNICIPIO DANIEL CAMILO BASTIDAS SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	INVASIONES AL DERECHO DE VÍA, RUTA 1003 SECTOR PASTO-LA PISCICULTURA-EL PEPINO, JURISDICCIÓN DE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE PASTO CORREGIMIENTO EL ENCANO – CONFORMACIÓN DE RELLENO SOBRE TALUD INFERIOR EN MARGEN IZQUIERDO DE LA VÍA EN PR9+0420.
11/02/2026	590-AMVNG5-CTO1982-2024	Personeria Municipal San Juan de Pasto	JENIFFER MEZA NARVAEZ Personera Delegada JAMER YOHAN MUÑOZ MARTINEZ Asesor Jurídico Secretaría de Planeación Pasto	RESPUESTA TRASLADO DE CONTESTACIÓN ACCIÓN PREVENTIVA 106- PR-2025-00132.
11/02/2026	591-AMVNG5-CTO1982-2024	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO DE CARTAGO - NARIÑO	WALTER FERNANDO RODRIGUEZ LOPEZ ALCALDE	INVASIÓN AL DERECHO DE VÍA, RUTA 2501A, PASTO-BUESACO-HIGUERONES JURISDICCIÓN DE MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO – CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN DE CERCO SOBRE MARGEN DERECHO DE LA VÍA EN PR78+0640.

FECHA	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	DEPENDENCIA	ASUNTO
11/02/2026	592-AMVNG5-CTO1982-2024	INVIAS NARIÑO	MARÍA CRISTINA RIASCOS ERASO DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO	Respuesta a solicitud de intervención tramo vial Vereda Buenos Aires, vía 2501A, Sector Pasto – Buesaco – Higuerones.
16/02/2026	593-AMVNG5-CTO1982-2024	INVIAS NARIÑO	MARÍA CRISTINA RIASCOS ERASO DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO	Solicitud autorización uso de insumos para desalojo de derrumbes Ruta 2501A Pasto – Buesaco – Higuerones.
18/02/2026	594-AMVNG5-CTO1982-2024	INVIAS NARIÑO	MARÍA CRISTINA RIASCOS ERASO DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO	Solicitud autorización uso de insumos para construcción de bordillo y cuneta PR44+0600 y PR44+1000 de la Ruta 2501A.
19/02/2026	595-AMVNG5-CTO1982-2024	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNIÓN - NARIÑO	JAVIER MONTENEGRO ALCALDE	INVASIÓN AL DERECHO DE VÍA, RUTA 2501A, PASTO-BUESACO-HIGUERONES JURISDICCIÓN DE MUNICIPIO DE LA UNIÓN – EXPLANACIÓN DE TALUD SUPERIOR MARGEN DERECHO DE LA VÍA EN PR94+0730.
19/02/2026	596-AMVNG5-CTO1982-2024	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNIÓN - NARIÑO	JAVIER MONTENEGRO ALCALDE	REITERACIÓN REPORTE DE INVASIÓN AL DERECHO DE VÍA, RUTA 2501A, PASTO-BUESACO-HIGUERONES, JURISDICCIÓN DE MUNICIPIO DE LA UNIÓN – EXCAVACIÓN SOBRE TALUD SUPERIOR, OBSTRUCCIÓN DE CUNETA Y CALZADA SOBRE MARGEN IZQUIERDO DE LA VÍA EN PR85+0300.
19/02/2026	597-AMVNG5-CTO1982-2024	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE PASTO	NICOLAS MARTIN TORO ALCALDE DEL MUNICIPIO DANIEL CAMILO BASTIDAS SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	INVASIONES AL DERECHO DE VÍA, RUTA 1003 SECTOR PASTO-LA PISCICULTURA-EL PEPINO JURISDICCIÓN DE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE PASTO CORREGIMIENTO EL ENCANO – ESTRUCTURA EN MADERA SOBRE MARGEN IZQUIERDO DE LA VÍA EN PR10+0650.
19/02/2026	598-AMVNG5-CTO1982-2024	Cooperativa de trabajo el Prado	MILTON FABIAN GOMEZ TULANDE REPRESENTANTE LEGAL	Invitación a capacitación mensual mes de febrero de 2026.
19/02/2026	599-AMVNG5-CTO1982-2024	Cooperativa de trabajo la Gran Via	MAIRA LEONELA BURBANO CHICANGANA REPRESENTANTE LEGAL	Invitación a capacitación mensual mes de febrero de 2026.
19/02/2026	600-AMVNG5-CTO1982-2024	Cooperativa de trabajo Integración el Encano	JOSE SILVIO YAMA REPRESENTANTE LEGAL	Invitación a capacitación mensual mes de febrero de 2026.
19/02/2026	601-AMVNG5-CTO1982-2024	Cooperativa de trabajo Calibio	JOSÉ TITO CHAGUENDO QUILINDO REPRESENTANTE LEGAL	Invitación a capacitación mensual mes de febrero de 2026.
19/02/2026	602-AMVNG5-CTO1982-2024	Cooperativa de trabajo Calibio	JOSÉ TITO CHAGUENDO QUILINDO REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATO NUMERO 3665 DE 2024, REITERACIÓN SOLICITUD DE DOTACIÓN.
19/02/2026	603-AMVNG5-CTO1982-2024	Alcaldia municipal de Buesaco	OSWALDO PABÓN DIAZ ALCALDE	SOLICITUD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA POR OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA CON MAQUINARIA Y ESCOMBROS – RUTA 2501A, SECTOR PASTO–BUESACO–HIGUERONES, PR36+0850.
20/02/2026	604-AMVNG5-CTO1982-2024	INVIAS - NARIÑO	MARÍA CRISTINA RIASCOS ERASO DIRECTORA TERRITORIAL	Respuesta a solicitud de instalación de barreras de seguridad – Vereda San

FECHA	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	DEPENDENCIA	ASUNTO
				Isidro, San Pedro de Cartago, PR75+0280 Vía 2501A Pasto – Buesaco – Mojarras.
24/02/2026	605-AMVNG5-CTO1982-2024	INVIAS - NARIÑO	MARÍA CRISTINA RIASCOS ERASO DIRECTORA TERRITORIAL	Respuesta a solicitud documentos IRMA GRACIELA NARVAEZ JOJOA Corregimiento del Encano, Pasto, PR22+0520 Vía 1003 Pasto – La Piscicultura.
25/02/2026	606-AMVNG5-CTO1982-2024			INFORME SITUACIÓN DE RIESGO POR CAÍDA DE MURO Y SOLICITUD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA POR OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA CON ESCOMBROS – RUTA 2501A, SECTOR PASTO–BUESACO–HIGUERONES, PR37+0090.

Fuente: Propia.

4.2CORRESPONDENCIA RECIBIDA:

Tabla 4 Correspondencia recibida periodo febrero de 2026.

NÚMERO	FECHA DE RECIBIDO	ENVIADO POR	RESPONSABLE Y DEPENDENCIA	ASUNTO
Oficio STTMB No. 2026 - 016	03/02/2026	Secretaria de transito municipio de Buesaco	JONATHAN DAVILA LOPEZ Inspector de Tránsito	Respuesta a Oficio 574-AMVNG5-CTO-1982-2024 con de fecha 03 de febrero de 2026.
140.09.01_072	03/02/2026	Alcaldia municipio de Buesaco	BAYRON ASDRUBAL ARGOTTY MONCAYO Secretario de Planeación	Respuesta a requerimiento No. 086 INVIAS de 22 de enero de 2026.
140.09.01_073	03/02/2026	Alcaldia municipio de Buesaco	BAYRON ASDRUBAL ARGOTTY MONCAYO Secretario de Planeación	Respuesta a requerimiento No. 087 INVIAS de 22 de enero de 2026.
2026I-VBOG-002591	04/02/2026	INVIAS NARIÑO	CARLOS ANDRES MENDOZA RENDON SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	Solicitud envió informes de accidentalidad desde inicios de contratos 2024.

NÚMERO	FECHA DE RECIBIDO	ENVIADO POR	RESPONSABLE Y DEPENDENCIA	ASUNTO
	05/02/2026	Alcaldia San Pedro de Cartago	LIZETH ESTEFANÍA ZAMBRANO Apoyo de Secretaria de Planeación	ACTA DE VISITA OCULAR VEREDA SAN ISIDRO
SUTRA-SETRA - 13.0	05/02/2026	Policia Nacional SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORT E DENAR	Roberto Bautista Escobar (Mayor)	Respuesta a solicitud reporte de accidentalidad mes de enero.
	05/02/2026	Alcaldia San Pedro de Cartago	Daniela Elizabeth Martinez Erazo Secretaria de planeación municipal	Respuesta requerimiento invasión al derecho de vía, ruta 2501a, Pasto- Buesaco-Higuerones jurisdicción de municipio de Buesaco – construcción de estructura en concreto reforzado sobre margen izquierdo en PR76+0820.
2026I-VBOG-003360	06/02/2026	INVIAS	JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA Subdirector de Gestion Del Riesgo	Solicitud de remisión del Plan de Contingencia - Temporada de lluvias 2026.
106-02-00573	09/02/2026	Personeria delegada para bienes municipales	JENIFFER MEZA NARVAEZ Personera Delegada	TRASLADO DE CONTESTACION ACCION PREVENTIVA 106-PR-2025-00132
2026I-VBOG-005715	12/02/2026	INVIAS	CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON Subdirector de Gestion Integral de Carreteras Nacionales	MEMOCIR_AMV_RUT_SGI_DT_APOYOS A LA SUPERVISIÓN AMV-MTO RUT
2026S-VNAR-004483	12/02/2026	INVIAS	MARIA CRISTINA RIASCOS ERAZO DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-009356
OFIC-IP-082 -2026	12/02/2026	Alcaldia municipal Florencia, Cauca	DEIBY ANTONY SOLARTE ARAUJO Inspector de Convivencia y Paz	Acompañamiento para visita técnica, en atención a una petición puesta por un integrante de la familia Jansansoy, en el municipio de Buesaco, Nariño.
	12/02/2026	Alcaldia municipal de Arboleda	Jose Viveros Erazo Inspector de Policia municipal Arboleda, Nariño	Respuesta a Oficio 552-AMVNG5-CTO-1982-2024 con fecha 13 de enero de 2026.

NÚMERO	FECHA DE RECIBIDO	ENVIADO POR	RESPONSABLE Y DEPENDENCIA	ASUNTO
	13/02/2026	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA GRAN VÍA	Maira Leonela Burbano Chicangana Representante Legal	Resultado de visita técnica por movimientos de masa y solicitud de señalización preventiva
IPM N.087	13/02/2026	Alcaldia municipal la Unión Nariño	JOSÉ VIVEROS ERAZO INSPECTOR DE POLICÍA ARBOLEDA	Respuesta oficio 553-AMVG5-CTO-1982-2024
	13/02/2026	Ministerio de trabajo	Carlos Eduardo Garcia Secretario de Planeación	Solicitud de actuaciones por infracción urbanistica PR 95+0920.

Fuente: Propia.

5. ACTAS DE PAGO PARCIALES, ACUMULADOS Y SALDOS POR EJECUTAR.

A continuación, se relacionan las actas de obra hasta la fecha y el saldo actual del contrato:

Tabla 5 Control financiero.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
Valor Inicial	12/09/2024	$ 4.050.198.082,00		$ 4.050.198.082,00
Adiciones	-	-	-	-
Acta No.1	12 al 30 de septiembre de 2024	**$ 4.050.198.082,00**	$ 55.830.078,00	$ 3.994.368.004,00
Acta No.2	01 al 31 de octubre de 2024	**$ 4.050.198.082,00**	$ 77.889.022,00	$ 3.916.478.982,00
Acta No.3	01 al 30 de noviembre de 2024	**$ 4.050.198.082,00**	$ 86.900.464,00	$ 3.829.578.518,00
Acta No.4	01 al 31 de diciembre de 2024	**$ 4.050.198.082,00**	$ 89.423.264,00	$ 3.740.155.254,00
Acta No.5	01 al 31 de enero de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 89.734.092,00	$ 3.650.421.162,00

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
Acta No.6	01 al 28 de febrero de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 89.734.092,00	$ 3.560.687.070,00
Acta No.7	01 al 31 de marzo de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 138.537.658,00	$ 3.422.149.412,00
Acta No.8	01 al 30 de abril de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 97.837.754,00	$ 3.324.311.658,00
Acta No.9	01 al 31 de mayo de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 117.812.856,00	$ 3.206.498.802,00
Acta No.10	01 al 30 de junio de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 96.628.000,00	$ 3.109.870.802,00
Acta No.11	01 al 31 de julio de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 91.739.718,00	$ 3.018.131.084,00
Acta No.12	01 al 31 de agosto de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 137.869.116,00	$ 2.880.261.968,00
Acta No.13	01 al 30 de septiembre de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 117.106.710,00	$ 2.763.155.258,00
Acta No.14	01 al 31 de octubre de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 100.967.026,00	$ 2.662.188.232,00
Acta No.15	01 al 30 de noviembre de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 159.378.842,00	$ 2.502.809.390,00
Acta No.16	01 al 31 de diciembre de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 90.402.634,00	$ 2.412.406.756,00
Acta No.17	01 al 31 de enero de 2026	**$ 4.050.198.082,00**	$ 127.205.050,00	$ 2.285.201.706,00
Acta No.18	01 al 28 de febrero de 2026	**$ 4.050.198.082,00**	$ 103.290.429,00	$ 2.181.911.277,00
TOTALES		**$ 4.050.198.082,00**	**$ 1.868.286.805,00**	**$ 2.181.911.277,00**

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se realiza recorridos y seguimiento a las actividades ejecutadas por parte de las cooperativas y en su defecto, reprogramación en las actividades con el fin de dar cumplimiento en los respectivos indicadores.

- Se realiza a cabalidad el reporte del estado de la vía en el presente mes y así mismo, los días domingos y festivos las CTA se encargan de verificar e informar las novedades presentadas.

- El equipo de profesionales de la AMV G5 ejecutaron sus funciones a cabalidad, atendiendo las obligaciones contractuales y cumplimiento de entrega de los informes y gestiones a tiempo.

- En cumplimiento de las funciones administrativas la AMV G5, realiza la remisión de comunicados a las diferentes entidades competentes, con la finalidad de asegurar la atención oportuna de los requerimientos de tipo técnico, ambiental, gestión predial, entre otros.

- Se realizó capacitación mensual por parte de la administración vial a las microempresas encargadas del mantenimiento rutinario. Por lo tanto, para el presente periodo, se realizó en el municipio de Buesaco el 20 de febrero de 2026.

- En el periodo se ejecutaron actividades por parte de la mano de obra de las cooperativas mediante recursos de insumos suministrados. Las labores comprendieron trabajos de demolición y retiro de roca PR 27+0520 Ruta 2501A, construccion de muro de contencion con sacos suelos con cemento PR 44+0650 y PR 44+1010 fundir bordillo y cunetas. PR 44+0650 y PR 44+1010 Ruta 2501A Pasto Buesaco Higuerones.

- La gestión SST de la administración vial realizó charlas de seguridad, pausas activas y control de alcoholemia a los conductores, entre otras labores.

ANEXO NO.1 - REGISTRO FOTOGRÁFICO

SALIDAS TÉCNICAS Y RECORRIDOS.

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Foto No. 1. 05/02/2026. Control de actividades y visita cooperativa el Calibio en el PR39+0000 Ruta 2501A.</td><td>Foto No. 2. 05/02/2026. Revisión actividades pendientes por ejecutar en cooperativa El Prado. PR87+0800 Ruta 2501A.</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Foto No. 3. 09/02/2026 Control de actividades y visita cooperativa el Calibio en el PR44+0100 Ruta 2501A.</td><td>Foto No. 4. 05/02/2026 Recorrido con contratista de señalización. PR36+0680 Ruta 2501A.</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Foto No. 5. 09/02/2026 Control de actividades y visita cooperativa el Calibio en el PR42+0850 Ruta 2501A.</td><td>Foto No. 6. 09/02/2026 Control de actividades y visita cooperativa el Calibio en el PR44+0650 Ruta 2501A.</td></tr>
</table>

	
Foto No. 7. 09/02/2026. Control de actividades y visita cooperativa Calibio en el PR44+0800 ruta 2501A.	*Foto No. 8. 10/02/2026. Control y supervision en desalojo de rocas en el PR27+0520 Ruta 2501A.*
	
Foto No. 9. 13/02/2026 Inspección sitio desalojo de derrumbes, PR94+0900 de la Ruta2501A.	*Foto No. 10. 18/02/2026. Control de actividades y visita cooperativa el Calibio en el PR60+0680 Ruta 2501A.*
	
Foto No. 11. 18/02/2026. Revisión actividades pendientes por ejecutar en cooperativa El Prado. PR94+0500 Ruta 2501A..	*Foto No. 12. 18/02/2026 toma de información de accidentalidad en el PR29+0660 de la Ruta 1003.*

	
Foto No. 13. 18/02/2026. Control de actividades y visita cooperativa El Encano en el PR29+0660 Ruta 1003.	*Foto No. 14. 19/02/2026 atención solicitud de peticionario en el PR75+0300 de la Ruta 2501A.*
	
Foto No. 15. 25/02/2026. Atencion de emergencias PR53+0720 Ruta 2501A.	*Foto No. 16. 25/02/2026 Atencion de emergencias, PR63+0010 Ruta 2501A.*

INSPECCIONES Y VISITAS INSPECTORA SST



Foto No. 17. 04/02/2026. Realización de pausas activas al grupo de trabajo Consorcio CI administradores 2024 en oficina.



Foto No. 18. 10/02/2026. Visita y Revisión de elementos de protección personal, recomendaciones del SST en el PR19+0080 Ruta1003. CTA El Encano



Foto No. 19. 18/02/2026 Visita y recomendaciones del SST en el PR27+0520 Ruta2501A. CTA La Gran Via.



Foto No. 20. 17/02/2026. Visita y Revisión de elementos de protección personal, recomendaciones del SST en el PR45+0120 Ruta2501A. CTA Calibio.



Foto No.21. 09/02/2026. Visita y Revisión de elementos de protección personal, recomendaciones del SST en el PR89+0150 Ruta2501A. CTA El Prado..



Foto No.22. 17/02/2026. Visita y Revisión de elementos de protección personal, recomendaciones del SST en el PR99+0500 Ruta2501A. CTA El Prado.

REGISTRO FOTOGRÁFICO INSUMOS PARA DEMOLICION DE ROCAS DEL. PR27+0520.

	
Foto No. 21. 03/02/2026. antes de la demolicion de rocas. PR27+0520 Ruta 2501A.	*Foto No. 22. 03/02/2026. antes de la demolicion de rocas. PR27+0520 Ruta 2501A.*
	
Foto No. 23. 10/02/2026. durante la perforacion y demolicion de rocas. PR27+0520 Ruta 2501A.	*Foto No. 24. 10/02/2026. durante la perforacion y demolicion de rocas. PR27+0520 Ruta 2501A.*
	
Foto No. 25. 10/02/2026. . durante la perforacion y demolicion de rocas. PR27+0520 Ruta 2501A.	*Foto No. 26. 12/02/2026. . durante la perforacion y demolicion de rocas. PR27+0520 Ruta 2501A.*

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Foto No. 27. 16/02/2026. durante la perforacion y demolicion de rocas. PR27+0520 Ruta 2501A.</td><td>Foto No. 28. 14/02/2026 durante la perforacion y demolicion de rocas. PR27+0520 Ruta 2501A.</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Foto No. 29. 17/02/2026 despues de la perforación y demolicion de rocas. PR27+0520 Ruta 2501A.</td><td>Foto No. 30. 14/02/2026 despues de la perforación y demolicion de rocas. PR27+0520 Ruta 2501A.</td></tr>
</table>

REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTENCION POR MEDIO DE UN MURO EN TIERRA ARMADA UTILIZANDO SACOS SUELOS CON CEMENTO CON INSUMOS PR 44+0650 Y PR 44+1010

	
Foto No. 31. 11/11/2025. Antes de construccion de muro de contencion con sacos suelos con cemento PR 44+1010 Ruta 2501A	*Foto No. 32. 11/11/2025. Antes de construccion de muro de contencion con sacos suelos con cemento PR 44+1010 Ruta 2501A*
	
Foto No. 33. 11/11/2025. Antes de construccion de muro de contencion con sacos suelos con cemento PR 44+1010 Ruta 2501A.	*Foto No. 34. 11/11/2025. Antes de construccion de muro de contencion con sacos suelos con cemento PR 44+1010 Ruta 2501A*
	
Foto No. 35. 09/02/2026. Durante la construccion de muro de contencion con sacos suelos con cemento PR 44+1010 Ruta 2501A..	*Foto No. 36. 09/02/2026. Durante la construccion de muro de contencion con sacos suelos con cemento PR 44+1010 Ruta 2501A..*

	
Foto No. 37. 09/02/2026. Durante la construccion de muro de contencion con sacos suelos con cemento PR 44+1010 Ruta 2501A..	*Foto No. 38. 09/02/2026. Durante la construccion de muro de contencion con sacos suelos con cemento PR 44+1010. Ruta 2501A.*
	
Foto No. 39. 09/02/2026. Durante la construccion de muro de contencion con sacos suelos con cemento PR 44+1010 Ruta 2501A..	*Foto No. 40. 09/02/2026. Durante la construccion de muro de contencion con sacos suelos con cemento PR 44+1010 Ruta 2501A..*
	
Foto No. 41. 09/02/2026. Despues de construccion de muro de contencion con sacos suelos con cemento PR 44+1010 Ruta 2501A	*Foto No. 42. 09/02/2026. despues de construccion de muro de contencion con sacos suelos con cemento PR 44+1010 Ruta 2501A*

	
Foto No. 43. 09/02/2026. Antes de construccion de muro de contencion con sacos suelos con cemento PR 44+0650 Ruta 2501A.	*Foto No. 44. 09/02/2026. Antes de construccion de muro de contencion con sacos suelos con cemento PR 44+0650 Ruta 2501A*
	
Foto No. 45. 09/02/2026. Durante de construccion de muro de contencion con sacos suelos con cemento PR 44+0650 Ruta 2501A.	*Foto No. 46. 09/02/2026. Durante de construccion de muro de contencion con sacos suelos con cemento PR 44+0650 Ruta 2501A.*
	
Foto No. 47. 18/02/2026. Despues de laconstruccion de muro de contencion con sacos suelos con cemento PR 44+0650 Ruta 2501A.	*Foto No. 48. 18/02/2026. Despues de laconstruccion de muro de contencion con sacos suelos con cemento PR 44+0650 Ruta 2501A.*

	
Foto No. 49. 18/02/2026. Antes de fundir bordillo y cunetas. PR 44+1010..Ruta 2501A.	*Foto No. 50. 18/02/2026. Antes de fundir bordillo y cunetas. PR 44+0650 Ruta 2501A*
	
Foto No. 51. 18/02/2026. Durante la fundición bordillo y cunetas. PR 44+1010..Ruta 2501A.	*Foto No. 52. 18/02/2026. Durante la fundición bordillo y cunetas. PR 44+1010..Ruta 2501A.*
	
Foto No. 53. 19/02/2026. Después de fundir bordillo y cunetas. PR 44+1010..Ruta 2501A.	*Foto No. 54. 19/02/2026. Después de fundir bordillo y cunetas. PR 44+1010.Ruta 2501A.*
	
Foto No. 55. 19/02/2026. Después de fundir bordillo y cunetas. PR 44+0650.Ruta 2501A	*Foto No. 56. 19/02/2026. Después de fundir bordillo y cunetas. PR 44+0650.Ruta 2501A*
