
Palestina Caldas, 04 de Febrero de 2026

INFORME TÉCNICO DE VISITA

Inspección Red de Alcantarillado – Vereda La Plata

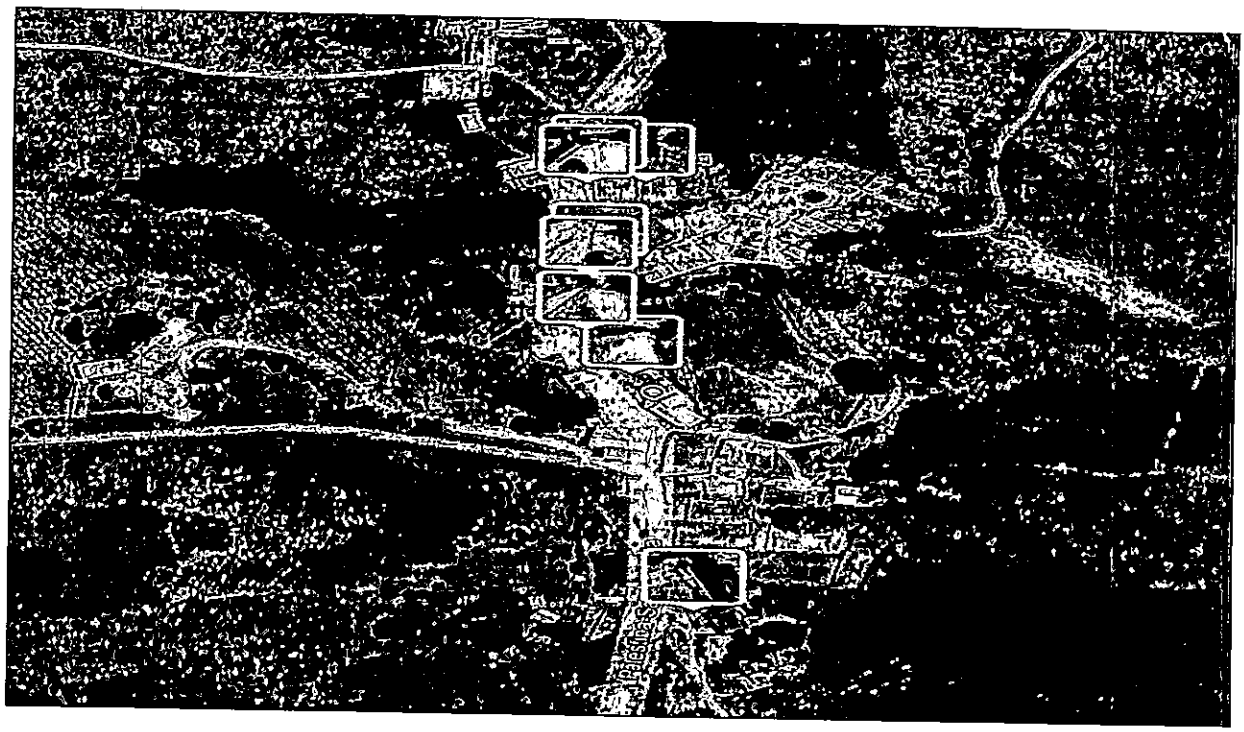

1

Se Realiza visita técnica de inspección a la red de alcantarillado ubicada en la vereda La Plata, con el fin de evaluar el estado actual del sistema y verificar las afectaciones reportadas por la comunidad.


Se evidencian tramos de tubería con averías estructurales producto del tiempo de uso, presentando fisuras, fracturas y pérdida parcial de segmentos, lo que genera filtraciones hacia viviendas aledañas y riesgo sanitario para la comunidad.


Las cámaras de inspección existentes no cuentan con la capacidad hidráulica suficiente para el caudal actual, presentando acumulación de sedimentos y reducción de la sección útil del flujo.





2

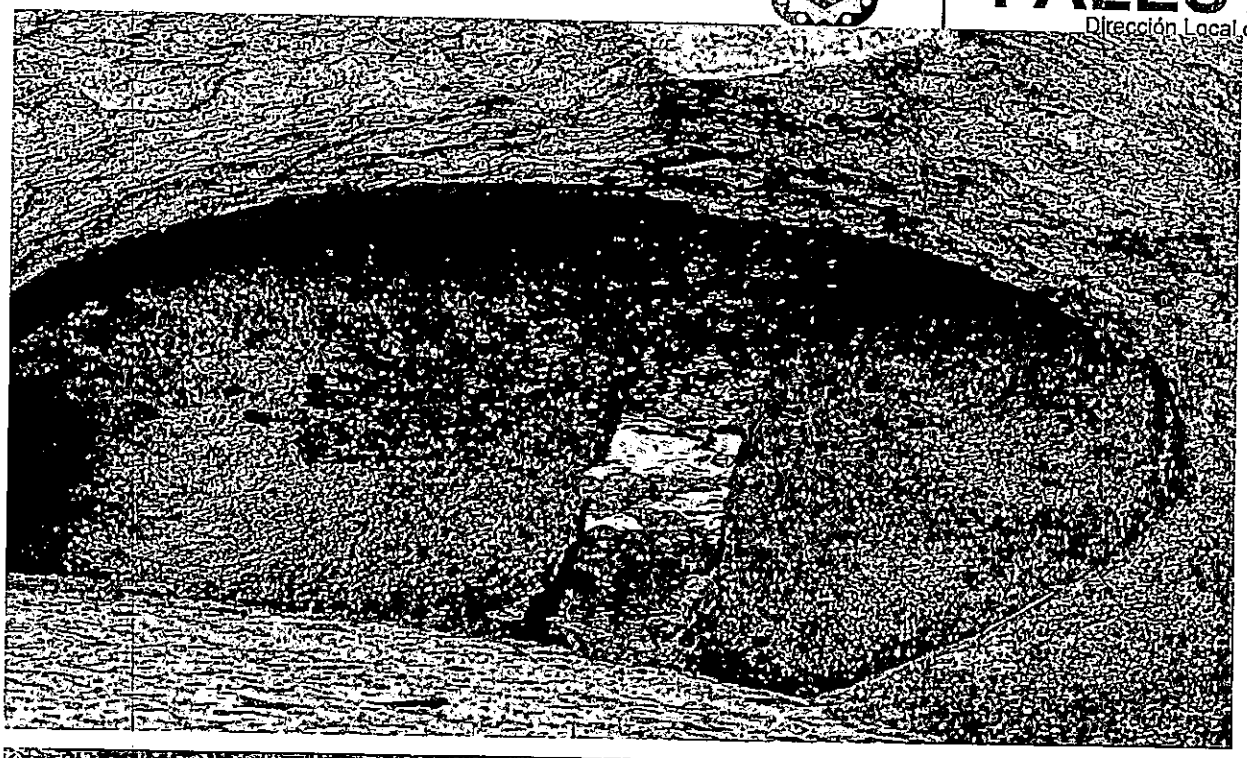

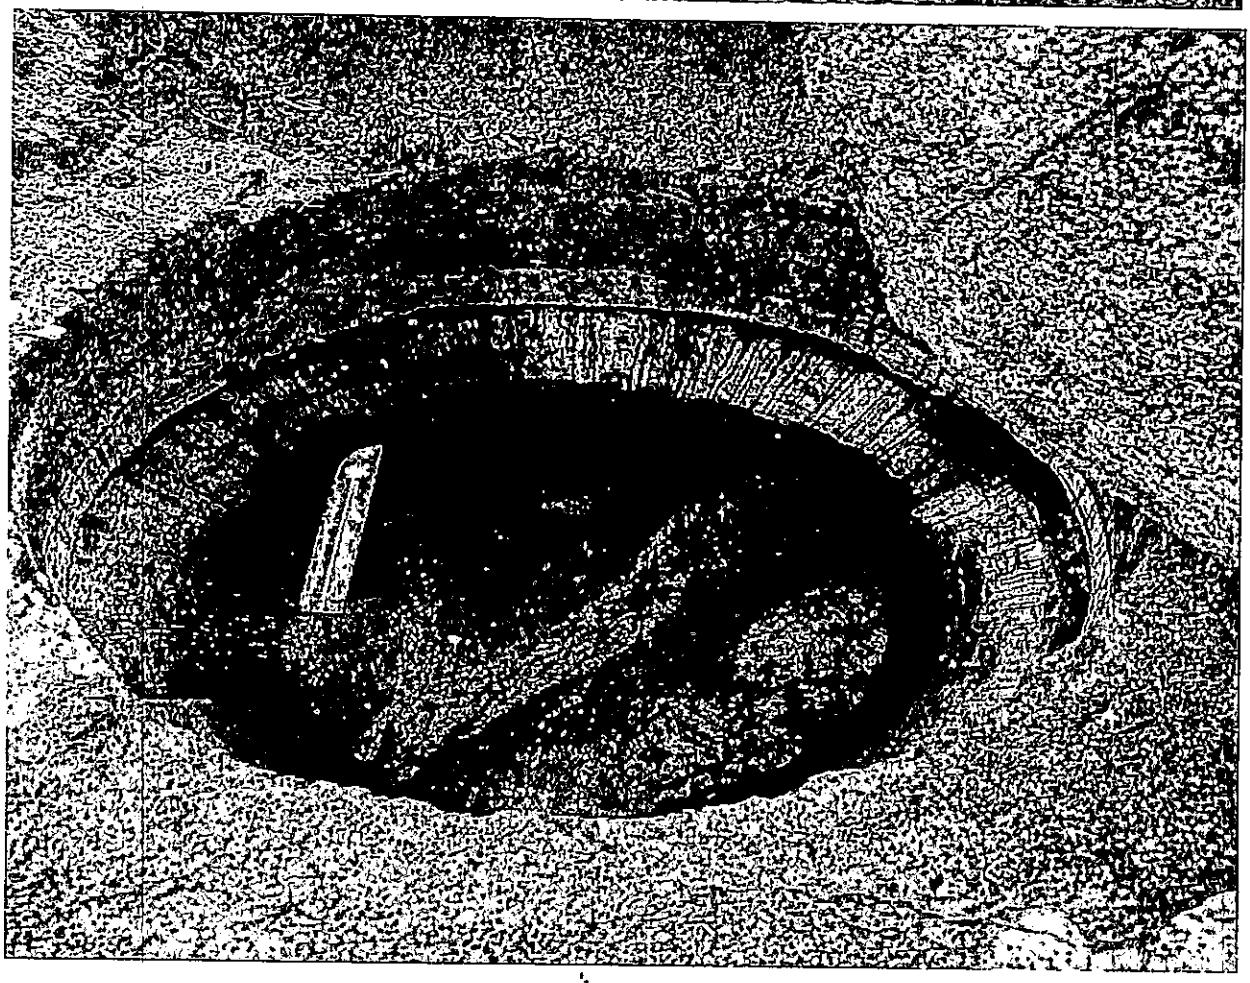

3

En el tramo correspondiente a la vía al Resguardo de los Ambachekes se evidenció pérdida de red y afectación del material de soporte, generando riesgo estructural y posible afectación a la estabilidad de la vía.

La red de alcantarillado presenta deterioro avanzado, insuficiencia hidráulica y filtraciones activas, lo que representa riesgo sanitario y estructural.

Se requiere reposición de la red en los tramos afectados inmediatamente ya que esta presentando afectaciones sanitarias.

ANEXO FOTOGRÁFICO




4



5



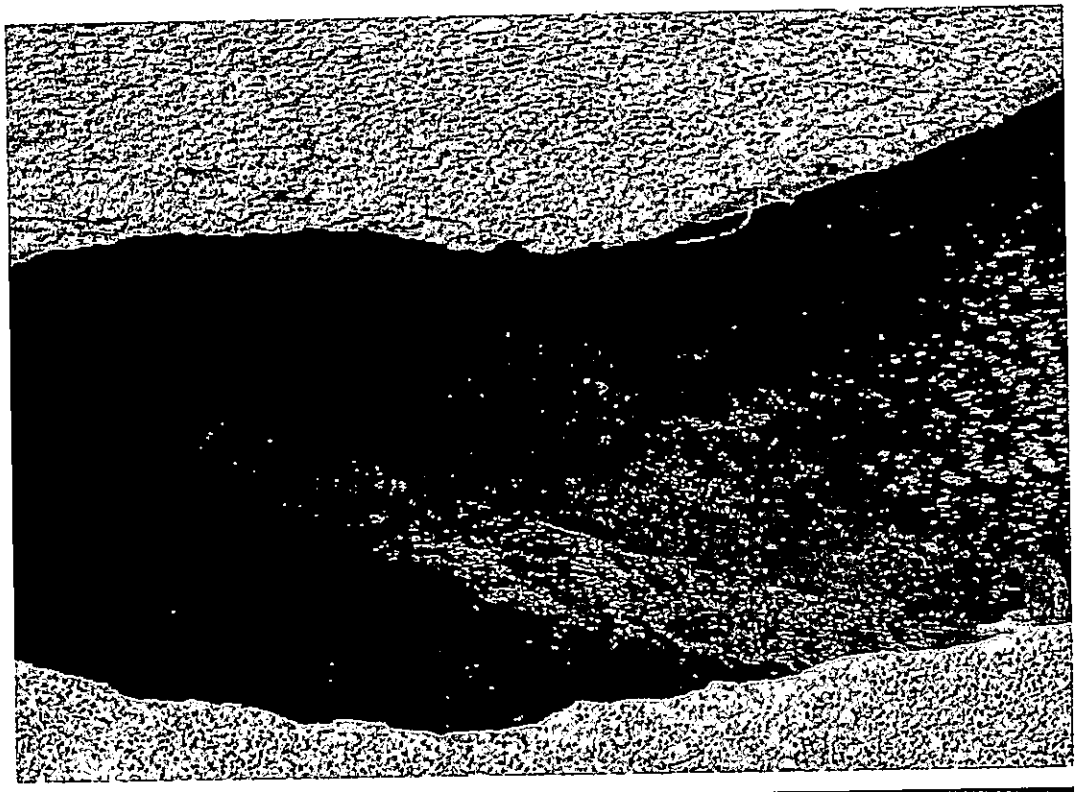

6 ψ


304° NW
4627.1Pie
5.038275°N, 75.679097°W
Alcantarillado la plata
camara 1
14 de feb 2026 7:11:21
Palestina, Palestina, Caldas
Timemark
Foto 100% Real


334° NW
4618.5Pie
5.038466°N, 75.679312°W
Punto de Venta
Alcantarillado la plata
camara 2
14 de feb 2026 11:14
Palestina, Palestina, Caldas
Timemark
Timemark Verified

7



172° S
4618.7Pie
5.038770°N, 75.679415°W
Alcantarillado la plata
camara 3
de feb 2026 11:14
Palestina, Palestina, Caldas
Timemark
Timemark Verified


108° E
4568.2Pie
5.039302°N, 75.679589°W
Alcantarillado la plata
14 de feb 2026 11
Palestina, Palestina, Cal
Timemark
Foto 100% Real


155° SE
4570.0Pie
5.039358°N, 75.679429°W
Alcantarillado la plata
14 de feb 2026 12:19
Palestina, Palestina, Caldas
Timemark
Foto 100% Real

8 4



Alcantarillado la plata

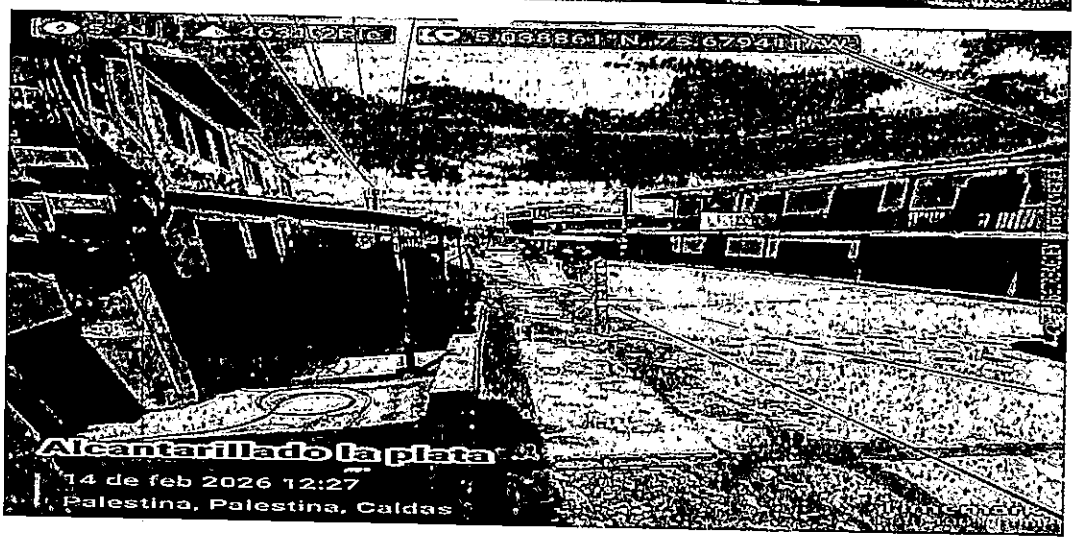
Alcantarillado la plata
14 de feb 2026 12:27
Palestina, Palestina, Caldas

9







Es fundamental resaltar que las viviendas se encuentran inundadas por aguas residuales, lo que constituye una grave problemática tanto en términos de seguridad como de salubridad para los habitantes del sector. Esta situación incrementa el riesgo de enfermedades, deterioro estructural de las edificaciones y afectaciones ambientales.

En atención a lo anterior, se recomienda realizar el cambio de la red de alcantarillado en los tramos afectados, así como el redimensionamiento de las cámaras existentes para garantizar su adecuada capacidad hidráulica. De igual manera, se sugiere la intervención prioritaria del tramo mencionado, con el fin de mitigar los riesgos actuales y prevenir futuras emergencias

JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ MEJIA
Secretario de Planeación y Desarrollo Integral
Elaboro: Ing. Juan David Gamboa
