PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES PARQUE NACIONAL NATURAL EL COCUY
INFRAESTRUCTURA

INSTALACIÓN DE PUNTO - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA DE GARAJE
Oficina Administrativa de El Cocuy

FECHAS: 02 de marzo de 2026

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:

Realizar la instalación de un punto de suministro de agua potable en la zona de garaje de la Sede Administrativa de El Cocuy, con el fin de facilitar labores de mantenimiento, limpieza y operación de los vehículos institucionales, mejorando las condiciones de trabajo y optimizando el uso del recurso hídrico en esta zona.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:


Se llevó a cabo la instalación de un grifo de agua potable en el área de garaje de la Sede Administrativa de El Cocuy, con el propósito de contar con un punto de abastecimiento cercano para actividades de mantenimiento de motocicletas y camionetas pertenecientes al área protegida.


Para el desarrollo de la actividad, inicialmente se realizó el corte de la tubería existente de media pulgada, permitiendo la adecuación del punto de conexión. Posteriormente, se instaló un codo de media pulgada con el fin de direccionar correctamente la salida del agua hacia el área requerida.

Seguidamente, se efectuó la instalación de una unión hembra, utilizando limpiador y soldadura de PVC para garantizar una conexión segura y resistente a posibles fugas. Finalmente, se procedió a la instalación del grifo, asegurando su correcto funcionamiento y fijación.

Esta adecuación permite disponer de agua potable directamente en la zona de parqueadero o garaje, lo que facilita significativamente las labores de limpieza y mantenimiento de los vehículos. Asimismo, contribuye a un uso más eficiente del recurso hídrico al evitar traslados innecesarios de agua desde otros puntos de la sede o desperdicios de agua.

Registro Fotográfico:

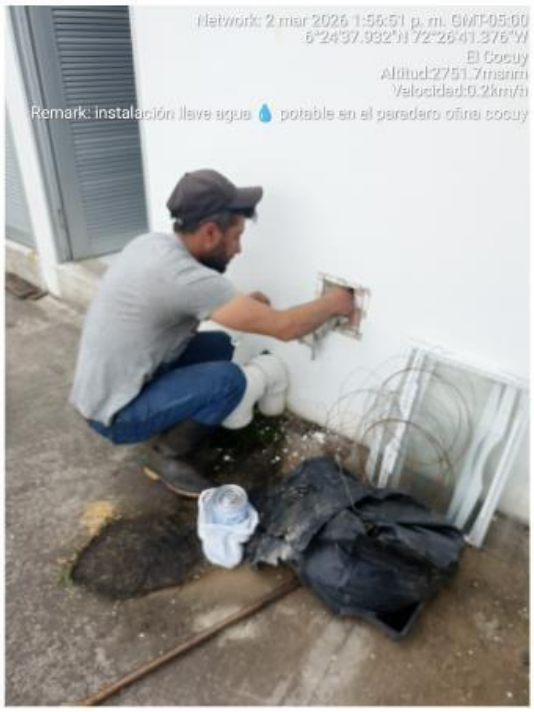

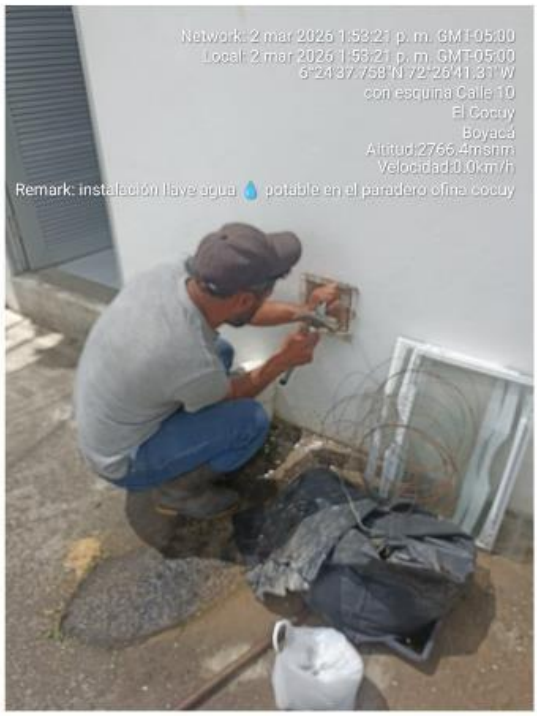

Informe elaborado por: Isidro Flórez
Operario de Infraestructura
