INFORME DE INSPECCIONES
CONTRATO 218 DEL 2025

LOTE N° 2 CUNDINAMARCA

FECHA: Bogotá, 11 de diciembre del 2025

Objeto del contrato: "*Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la señalética turística priorizada por la entidad*"

Contratista: SEÑALVIAS S.A.S.

DESARROLLO

Para el Lote N° 2 Cundinamarca se visitaron 46 puntos distribuidos de la siguiente manera:

Etiquetas de fila	Direccional RLD	Panel horizontal RLD	Panel rural RDL	Tótem	Total, general
Chía				1	1
Choachí			3		3
Facatativá		1			1
Guatavita				3	3
La Calera			2		2
Pasca				1	1
Sesquilé	1			3	4
Sibaté				1	1
Soacha			3	2	5
Sopó			1		1
Suesca			1		1
Sutatausa			2	3	5
Tabio			1		1
Tausa			1	2	3
Tenjo			2		2
Tocancipá			1	1	2
Ubaque			1	1	2
Ubaté		2			2
Villapinzón			1	1	2
Zipaquirá		2		2	4
Total, general	**1**	**5**	**19**	**21**	**46**

Como resultado de las visitas técnicas se identificaron variaciones frente a las fichas iniciales. En consecuencia:

- Se ajustó el inventario técnico del lote, pasando de 46 a 44 señales a intervenir.

- Se generó un presupuesto de $62.226.953, correspondiente a las actividades requeridas para la correcta intervención de las señales.

Este valor se sustenta en las cantidades verificadas en campo y en los ítems del contrato aplicables para cada señal.

A continuación, se presenta el detalle de los ítems necesarios para la implementación del Lote N.° 2, conforme a las cantidades ajustadas durante la inspección:

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1. Lavado general de señal turística				
1.2. Panel rural RLD	Und	11	$ 652.732	$ 7.180.053
1.4. Tótem	Und	12	$ 461.851	$ 5.542.215
2. Actualización de contenidos, impresión e instalación de pieza gráfica en vinilo				
2.9. Panel informativo	Und	23	$ 527.760	$ 12.138.489
2.12. Panel interpretativo	Und	0	$ 451.638	$ 0
2.13. Panel rural RDL	Und	23	$ 690.139	$ 15.873.200
3. Suministro, actualización de contenidos, impresión e instalación de piezas gráficas en madera				
3.1. Direccional de naturaleza	Und	0	$ 275.733	$ 0
4. Suministro e instalación de película antigrafiti				
4.4. Tótem	Und	7	$ 422.400	$ 2.956.800
5. Pintura sobre superficie metálica				
5.5. Panel horizontal RLD	Und	3	$ 365.949	$ 1.097.846
5.7. Base de Tótem	Und	16	$ 267.027	$ 4.272.435
5.8. Panel rural RLD	Und	14	$ 363.706	$ 5.091.881
6. Pintura sobre superficie en madera				
6.1. Direccional de naturaleza o biciturística	Und	0	$ 283.060	$ 0
6.2. Panel de bienvenida de pie atractivo natural	Und	0	$ 366.076	$ 0
6.4. Panel interpretativo atractivo natural	Und	0	$ 267.326	$ 0
7. Suministro e instalación de lámina metálica galvanizada (cal 18)				
7.9. Panel rural RDL	Und	4	$ 187.458	$ 749.833
8. Suministro e instalación de lámina en acero inoxidable (cal 18)				
8.4. Tótem	Und	3	$ 444.844	$ 1.334.531
9. Suministro, impresión e instalación en 3D de regleta braille				
9.1. Regleta en vinilo	Und	25	$ 136.924	$ 3.423.112
10. Suministro e instalación de identificador de señal metálico - i				
10.3. Código identificador de placa	Und	46	$ 34.676	$ 1.595.074
11. Suministro, impresión e instalación de identificador de señal - i (acrílico o vinilo)				
11.2. i en vinilo	Und	40	$ 24.287	$ 971.485
			TOTAL	**$ 62.226.953**

A continuación, se relacionan las señales que permanecen en el alcance luego de los ajustes, junto con su enlace de ubicación geográfica y municipio correspondiente:

Placa IDT	Google maps	Departamento	Municipio / Localidad	Tipo de señal
24448	https://maps.app.goo.gl/EFNQi3skjw4812mv8	Cundinamarca	Tausa	Panel rural RDL
24449	https://maps.app.goo.gl/xCyWhbiw3q61kFJT9	Cundinamarca	Tausa	Tótem
24450	https://maps.app.goo.gl/tFb4HXPWWKcdwiU19	Cundinamarca	Tausa	Tótem
24451	https://maps.app.goo.gl/jzo93iHAJG75ZzSz5	Cundinamarca	Sutatausa	Tótem
24452	https://maps.app.goo.gl/oFgfDVYaU3SC5ZpMA	Cundinamarca	Sutatausa	Tótem
24453	https://maps.app.goo.gl/udU9notQMt8T7Ru48	Cundinamarca	Sutatausa	Panel rural RDL
24454	https://maps.app.goo.gl/VRrySA4hJUtwDnir9	Cundinamarca	Sutatausa	Tótem
24455	https://maps.app.goo.gl/oyDeGdpDXzeh7FGi9	Cundinamarca	Zipaquirá	Panel horizontal RLD
24456	https://maps.app.goo.gl/auN8mpR4ABT6oiiV8	Cundinamarca	Zipaquirá	Panel horizontal RLD
24457	https://maps.app.goo.gl/eiqEwJ2wJ61XFCFs5	Cundinamarca	Villapinzón	Tótem
24458	https://maps.app.goo.gl/QjU91PkjUY5vUsgG9	Cundinamarca	Sopó	Panel rural RDL
24459	https://maps.app.goo.gl/9nvUzFPNjZwjgPq56	Cundinamarca	Facatativá	Panel horizontal RLD
24460	https://maps.app.goo.gl/Wd2v2Rkp6xjC8UrG8	Cundinamarca	Soacha	Panel rural RDL
24461	https://maps.app.goo.gl/oT7tFaHsgDojHRZc8	Cundinamarca	Soacha	Panel rural RDL
24462	https://maps.app.goo.gl/fFQwxfUn7K2tPbNy7	Cundinamarca	Soacha	Panel rural RDL
24463	https://maps.app.goo.gl/aL1JeCxobbRhCpQv5	Cundinamarca	Pasca	Tótem
24464	https://maps.app.goo.gl/NDVQTpsumKjZqiMo9	Cundinamarca	Choachí	Panel rural RDL
24465	https://maps.app.goo.gl/mnqHeQtunqTocqwC9	Cundinamarca	Chía	Tótem
24466	https://maps.app.goo.gl/imt3rHsoMuHNnxX69	Cundinamarca	Choachí	Panel rural RDL
24468	https://maps.app.goo.gl/sXPMCBhXbYL1Krws8	Cundinamarca	Ubaté	Panel horizontal RLD
24470	https://maps.app.goo.gl/Agq9gfXh2DrgPNey9	Cundinamarca	Choachí	Panel rural RDL
24490	https://maps.app.goo.gl/VrpR6uTewgncvCZM6	Cundinamarca	Sutatausa	Panel rural RDL
24494	https://maps.app.goo.gl/ZiXRcUA8ShPkDbTQ9	Cundinamarca	La Calera	Panel rural RDL
24495	https://maps.app.goo.gl/rbk6PFnQ4AccbpPGA	Cundinamarca	La Calera	Panel rural RDL
24498	https://maps.app.goo.gl/KwcgJomEwTbDwnRr6	Cundinamarca	Ubaque	Tótem
24499	https://maps.app.goo.gl/q6ybTQUtxCpZAo5R6	Cundinamarca	Ubaque	Panel rural RDL
24500	https://maps.app.goo.gl/YMDxja8DcobuJmmV6	Cundinamarca	Sibaté	Tótem
24508	https://maps.app.goo.gl/87quhHdwGZ8amoks6	Cundinamarca	Ubaté	Panel horizontal RLD
24513	https://maps.app.goo.gl/VSCat5LHj4yUjyCG6	Cundinamarca	Sesquilé	Tótem
24514	https://maps.app.goo.gl/bFZ1WAk7KG2o6QNJA	Cundinamarca	Sesquilé	Tótem
24516	https://maps.app.goo.gl/EKScz9U2uEVdUxbd9	Cundinamarca	Zipaquirá	Tótem
24517	https://maps.app.goo.gl/6PFB5Ke9jWknuUYS6	Cundinamarca	Tocancipá	Tótem
24518	https://maps.app.goo.gl/efgruyo1sDAVecq69	Cundinamarca	Tocancipá	Panel rural RDL
24519	https://maps.app.goo.gl/4UmaS5noHRZWg2K46	Cundinamarca	Tenjo	Panel rural RDL
24520	https://maps.app.goo.gl/PBQMziHWwWsPo7rx9	Cundinamarca	Tenjo	Panel rural RDL

Placa IDT	Google maps	Departamento	Municipio / Localidad	Tipo de señal
24521	https://maps.app.goo.gl/8ApbYa1K9CQZdud86	Cundinamarca	Tabio	Panel rural RDL
24522	https://maps.app.goo.gl/YJjbPQAkdNVjUBU5A	Cundinamarca	Guatavita	Tótem
24523	https://maps.app.goo.gl/LwVTxak6n1Bj4j5u6	Cundinamarca	Guatavita	Tótem
24524	https://maps.app.goo.gl/cw1ajnKg3oHVqF5JA	Cundinamarca	Guatavita	Tótem
24526	https://maps.app.goo.gl/vFjYGq1v8pjQeG6MA	Cundinamarca	Suesca	Panel rural RDL
24539	https://maps.app.goo.gl/HBm1PNEXDNjML2X2A	Cundinamarca	Zipaquirá	Tótem
24541	https://maps.app.goo.gl/6yMrQrikrAfi4gbJ6	Cundinamarca	Soacha	Tótem
24550	https://maps.app.goo.gl/ziiZFv7yWiB8rXnC9	Cundinamarca	Sesquilé	Tótem
24551	https://maps.app.goo.gl/Zgpr7NEWgAogTVxg9	Cundinamarca	Villapinzón	Panel rural RDL

Se hace entrega del consolidado de fichas técnicas y del presupuesto correspondiente a cada uno de los diseños verificados en campo, con el fin de que la entidad realice su revisión, validación y aprobación.

PLAN DE TRABAJO PARA LAS INSPECCIONES

Después de hacer la validación de los puntos requeridos por la entidad “Instituto Distrital de Turismo – IDT” para las visitas técnicas y evaluación correspondiente al estado de cada señal para determinar el tipo de intervención referida al mantenimiento de cada una y la consolidación de los Ítems, se realiza la respectiva planeación de las rutas en el departamento de Cundinamarca, para dar cumplimiento en un periodo optimo, con los insumos y colaboradores necesarios para la actividad, previa revisión y coordinación con la entidad IDT y SEÑALVIAS SAS, descrito en el siguiente cronograma así:

Días de inspección

Se programan tres (3) días específicos con tres (3) equipos a cargo para las inspecciones comprendidos entre el 12 de noviembre y el 14 de noviembre de 2025 así:

REGISTRO FOTOGRÁFICO CHÍA





REGISTRO FOTOGRÁFICO CHOACHÍ





REGISTRO FOTOGRÁFICO CHÍA







REGISTRO FOTOGRÁFICO FACATATIVÁ





REGISTRO FOTOGRÁFICO GUATAVITA





REGISTRO FOTOGRÁFICO LA CALERA





REGISTRO FOTOGRÁFICO PASCA





REGISTRO FOTOGRÁFICO SESQUII.E





REGISTRO FOTOGRÁFICO SIBATÉ





REGISTRO FOTOGRÁFICO SOACHA







REGISTRO FOTOGRÁFICO SOPO



REGISTRO FOTOGRÁFICO SUTATAUSA







REGISTRO FOTOGRÁFICO SUESCA



REGISTRO FOTOGRÁFICO TABIO



REGISTRO FOTOGRÁFICO SOPO





REGISTRO FOTOGRÁFICO TENJO





REGISTRO FOTOGRÁFICO TOCANCIPÁ





REGISTRO FOTOGRÁFICO UBAQUE





REGISTRO FOTOGRÁFICO UBATÉ





REGISTRO FOTOGRÁFICO VILLAPINZÓN




.

..

REGISTRO FOTOGRÁFICO ZIPAQUIRÁ







RUTAS OPTIMAS (recorridos por lote)

Para la logística de inspección se contemplaron los siguientes recorridos con los horarios proyectados y las variaciones presentadas en el cronograma final, dando cumplimiento al cronograma inicial de visitas programadas.

Fecha	Placa_IDT	Coordenadas	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO/LOCALIDAD	Tipología	HORA DE LLEGADA	HORA DE SALIDA
Dia 01		4.615135, -74.070325	Bogotá D.C.	IDT		5:50	6:00
	24499	4.500833,-73.933056	Cundinamarca	Ubaque	Panel rural RLD	8:00	8:10
	24498	4.482422,-73.934981	Cundinamarca	Ubaque	Tótem	8:30	8:40
	24470	4.559444,-73.942778	Cundinamarca	Choachí	Panel rural RLD	9:30	9:40
	24466	4.5615,-74.00125	Cundinamarca	Choachí	Panel rural RLD	10:00	10:10
	24464	4.565556,-74.005833	Cundinamarca	Choachí	Panel rural RLD	10:10	10:20
	24495	4.723273, -73.954972	Cundinamarca	La Calera	Panel rural RLD	11:20	11:30
	24494	4.721732,-73.94818	Cundinamarca	La Calera	Panel rural RLD	11.30	11:40

	24458	4.905278,-73.921111	Cundinamarca	Sopó	Panel rural RLD	12:30	12:40
	24518	5.000023, -73.938922	Cundinamarca	Tocancipá	Panel rural RDL	13:20	13:30
	24517	4.965833,-73.913611	Cundinamarca	Tocancipá	Tótem	13:50	14:00
	24523	4.934907,-73.834112	Cundinamarca	Guatavita	Tótem	14:40	14:50
	24524	4.935,-73.835556	Cundinamarca	Guatavita	Tótem	14:50	15:00
	24522	4.935833,-73.835	Cundinamarca	Guatavita	Tótem	15:00	15:10
	24550	5.044115,-73.785183	Cundinamarca	Sesquilé	Tótem	15:40	15:50
	24515	5.040278,-73.788333	Cundinamarca	Sesquilé	Direccional RLD	15:50	16:00
	24514	5.044722,-73.796111	Cundinamarca	Sesquilé	Tótem	16:00	16:10
	24513	5.044891,-73.796385	Cundinamarca	Sesquilé	Tótem	16:10	16:20
	24526	5.096389,-73.790556	Cundinamarca	Suesca	Panel rural RDL	16:40	16:50
	24525	5.103734,-73.756709	Cundinamarca	Suesca	Panel rural RDL	17:10	17:20
	Pernoctar en Villapinzón						
Dia 02	24551	5.209167,-73.547778	Cundinamarca	Villapinzón	Panel rural RDL	6:00	6:00
	24457	5.216111,-73.596389	Cundinamarca	Villapinzón	Tótem	6:30	6:40
	24468	5.309405,-73.81224	Cundinamarca	Ubaté	Panel horizontal RLD	8:20	8:30
	24508	5.307886,-73.814264	Cundinamarca	Ubaté	Panel horizontal RLD	8:40	8:50
	24490	5.2514,-73.85265	Cundinamarca	Sutatausa	Panel rural RDL	9:10	9:20
	24453	5.250666,-73.853034	Cundinamarca	Sutatausa	Panel rural RDL	9:20	9:30
	24452	5.248359,-73.852377	Cundinamarca	Sutatausa	Tótem	9:30	9:40
	24451	5.246713,-73.852631	Cundinamarca	Sutatausa	Tótem	9:40	9:50
	24454	5.246112,-73.852929	Cundinamarca	Sutatausa	Tótem	9:50	10:00

	24449	5.195797,-73.886064	Cundinamarca	Tausa	Tótem	10:10	10:20
	24450	5.195829,-73.885955	Cundinamarca	Tausa	Tótem	10:20	10:30
	24448	5.195052,-73.893459	Cundinamarca	Tausa	Panel rural RDL	10:40	10:50
	24491	5.064167,-73.875	Cundinamarca	Nemocón	Tótem	11:40	11:50
	24492	5.064053,-73.874887	Cundinamarca	Nemocón	Tótem	11:50	12:00
	24493	5.063301,-73.875068	Cundinamarca	Nemocón	Tótem	12:20	12:40
	24539	5.01968,-74.000131	Cundinamarca	Zipaquirá	Tótem	13:20	13:30
	24456	5.021002,-74.007677	Cundinamarca	Zipaquirá	Panel horizontal RLD	13:40	13:50
	24455	5.019671,-74.009239	Cundinamarca	Zipaquirá	Panel horizontal RLD	13:50	14:00
	24516	5.019195,-74.009007	Cundinamarca	Zipaquirá	Tótem	14:00	14:10
	24520	4.876289,-74.148298	Cundinamarca	Tenjo	Panel rural RDL	15:00	15:10
	24519	4.896389,-74.112778	Cundinamarca	Tenjo	Panel rural RDL	15:30	15:40
	24521	4.923284, -74.104694	Cundinamarca	Tabio	Panel rural RDL	16:00	16:10
	24465	4.861471, -74.060418	Cundinamarca	Chía	Tótem	16:50	17:00
	24497	4.809965, -74.101574	Cundinamarca	Cota	Tótem	17:20	17:30
	24543	4.812222,-74.107778	Cundinamarca	Cota	Panel rural RDL	17:40	17:50
	Regreso a Bogotá						
Día 03		4.615135, -74.070325	Bogotá D.C.	IDT		5:50	6:00
	24176	4.729917,-74.148103	Cundinamarca	Cota	Panel de bienvenida de pie atractivo natural	7:20	7:30
	24177	4.730039,-74.148228	Cundinamarca	Cota	Panel interpretativo	7:30	7:40


	24178	4.730228,-74.148533	Cundinamarca	Cota	Direccional de naturaleza	7:40	7:50
	24181	4.730244,-74.1491	Cundinamarca	Cota	Direccional de naturaleza	7:50	8:00
	24182	4.731417,-74.149083	Cundinamarca	Cota	Panel interpretativo	8:00	8:10
	24179	4.725872,-74.149914	Cundinamarca	Cota	Panel interpretativo	8:10	8:20
	24180	4.725947,-74.149883	Cundinamarca	Cota	Direccional de naturaleza	8:20	8:30
	24184	4.725991,-74.149823	Cundinamarca	Cota	Panel informativo	8:30	8:40
	24183	4.726044,-74.149567	Cundinamarca	Cota	Panel informativo	8:40	8:50
	24459	4.816667,-74.349167	Cundinamarca	Facatativá	Panel horizontal RLD	9:50	10:00
	24496	4.582008,-74.217674	Cundinamarca	Soacha	Tótem		
	24541	4.582222,-74.22	Cundinamarca	Soacha	Tótem		
	24460	4.558333,-74.259444	Cundinamarca	Soacha	Panel rural RDL		
	24462	4.553889,-74.259167	Cundinamarca	Soacha	Panel rural RDL		
	24461	4.576501,-74.296813	Cundinamarca	Soacha	Panel rural RDL		
	24463	4.308818,-74.300058	Cundinamarca	Pasca	Tótem		
	24500	4.491389,-74.259444	Cundinamarca	Sibaté	Tótem		
	Regreso a Bogotá						

Anexo mapas de vistas y recorridos propuestos, provistos por la entidad IDT

CUNDINAMARCA - MAPA 01




CUNDINAMARCA - MAPA 02

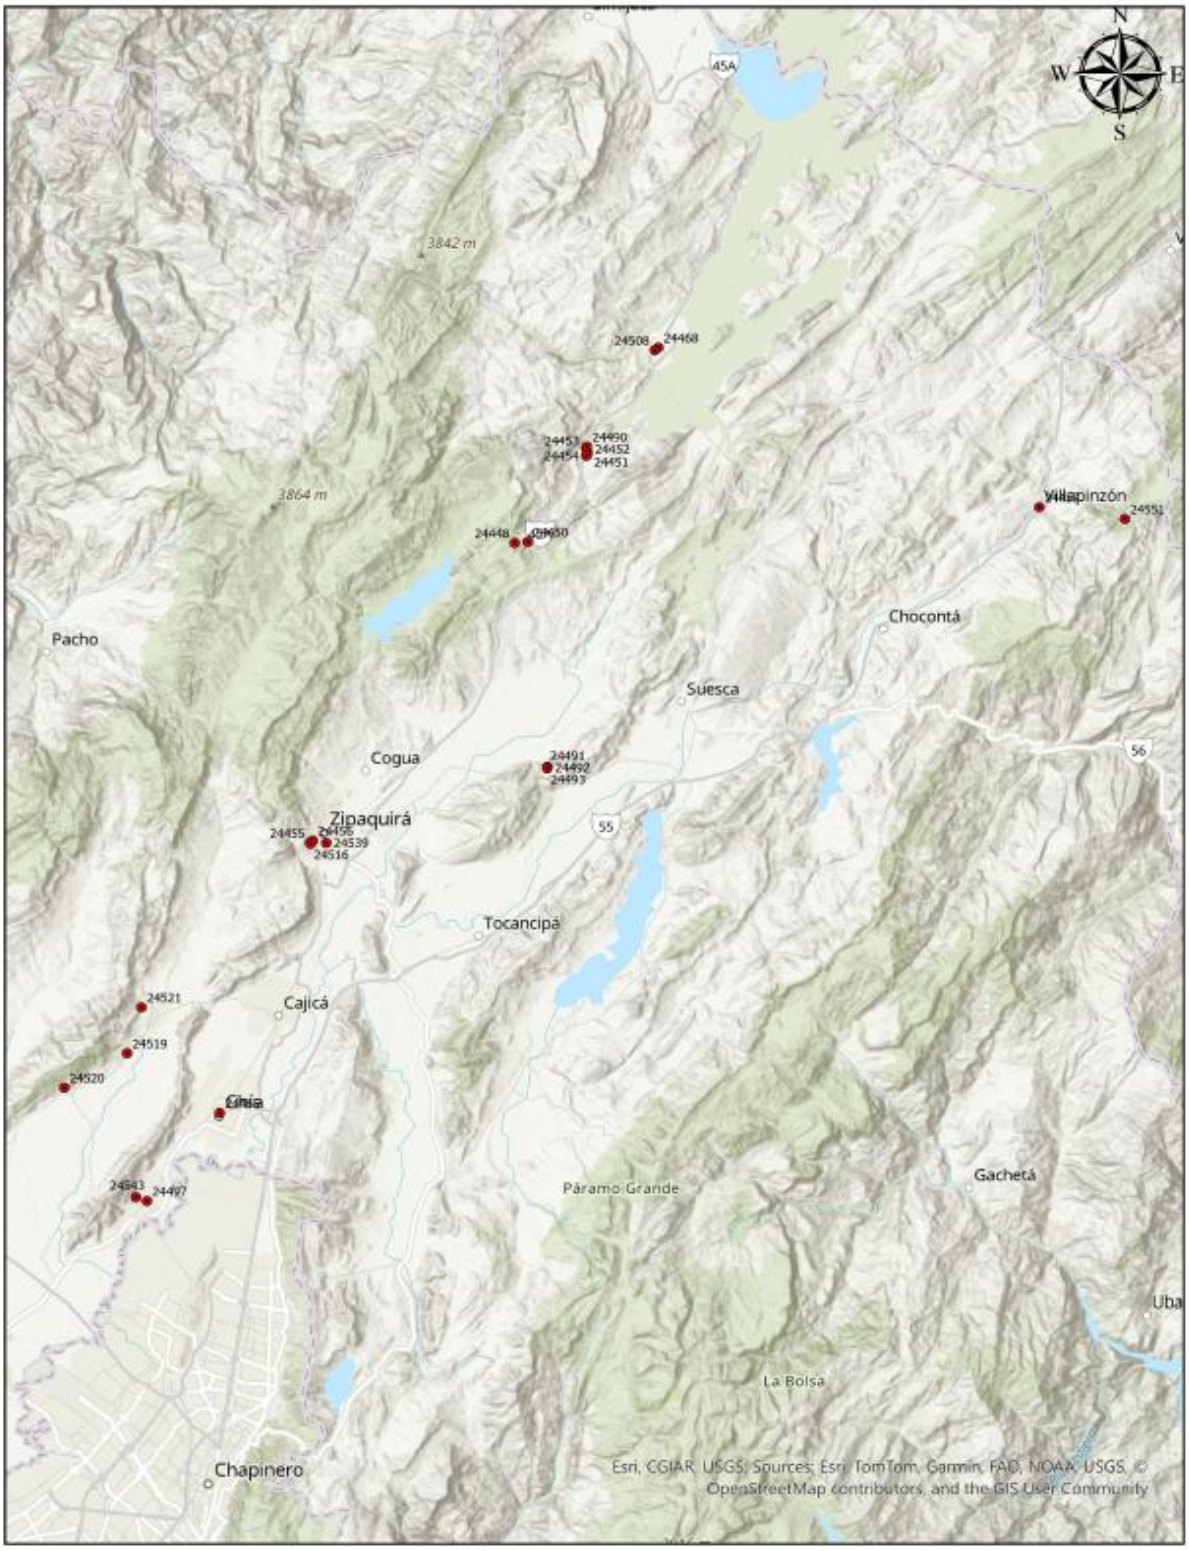

7,6 3,8 0 7,6 15,2 22,8 30,4
Kilometers

CUNDINAMARCA - MAPA 03

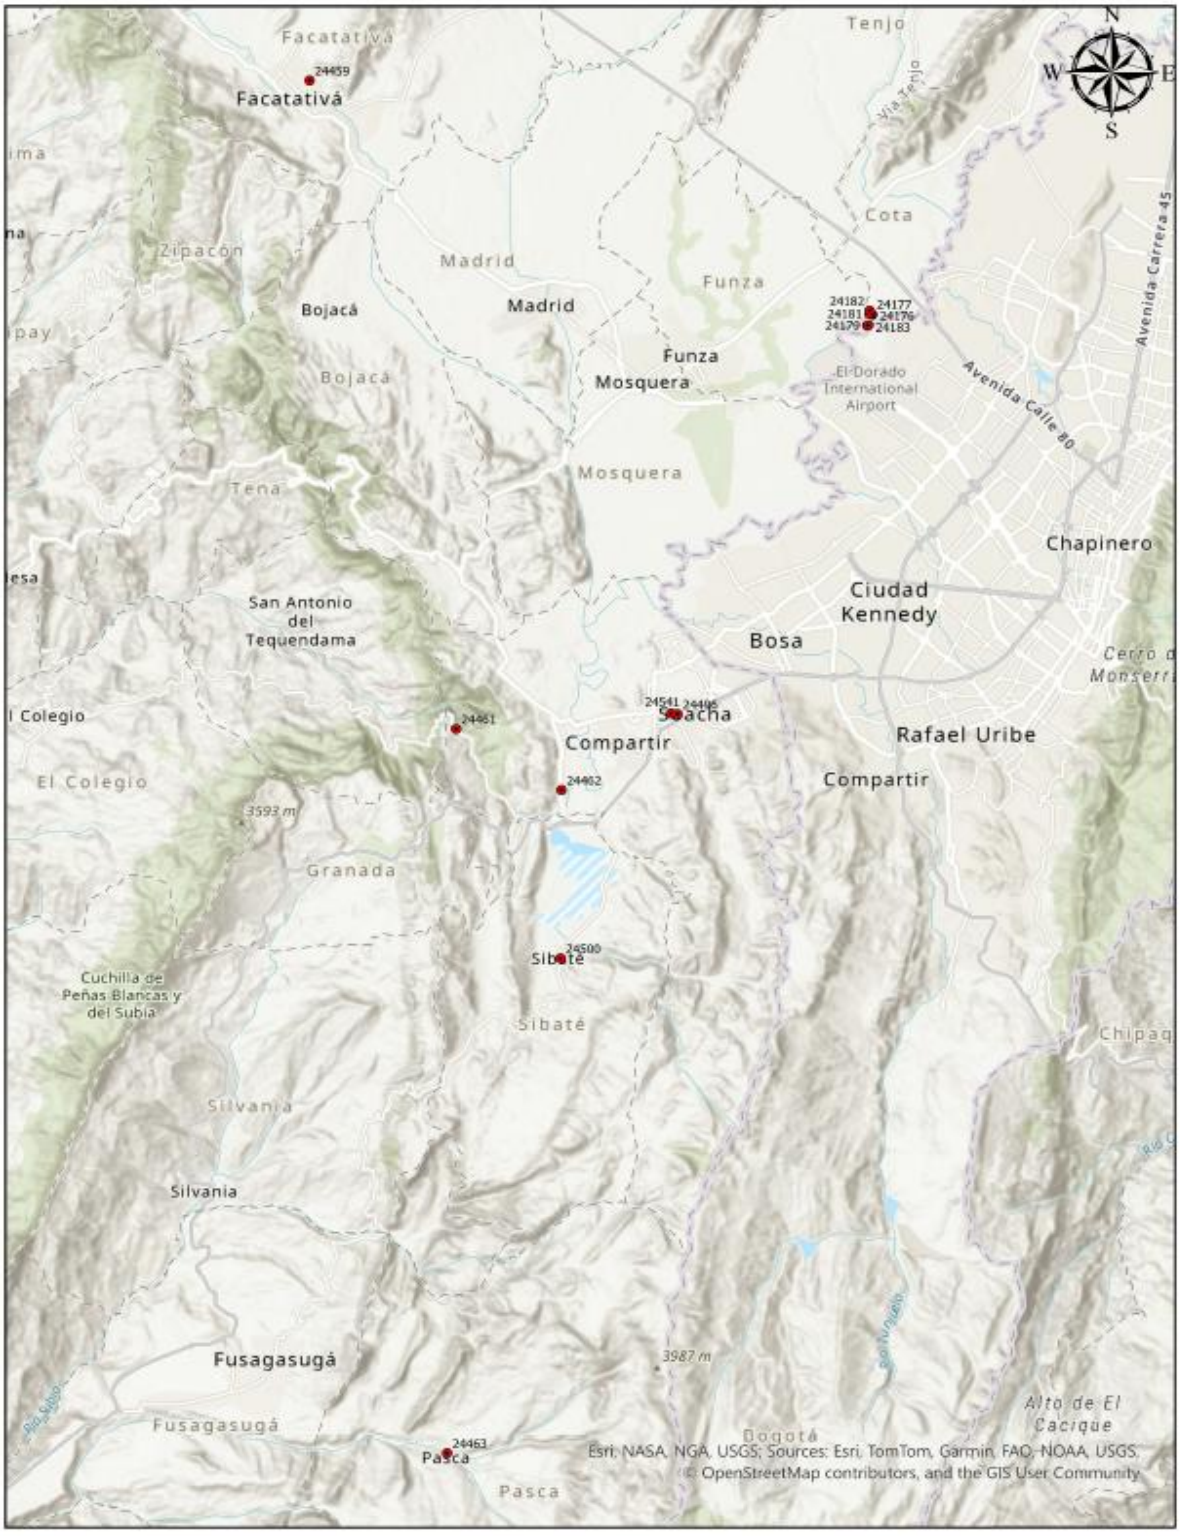


Observaciones generales

Para todas las visitas realizadas se aprecia en las señales, de todo tipo, vandalismo asociado con grafitis y rotura de las piezas, predominando el desgaste de las estructuras en razón del estado de la pintura, se evalúan condiciones de acceso para las vías rurales y aledaños, se contemplan los cambios de contenidos que se relacionan con los hitos y puntos turísticos relevantes en la información contemplando en la iconografía de las impresiones.


Relación de profesionales a cargo Lote 1

Lote 2

Profesional de infraestructura: Francy Paola Duarte – C.C. 52.887.126

Firma

Diseñador: David Fernando Pineda Fontecha – C.C. 1.099.202.774

Firma

HSQ: David Alberto Orejuela – C.C. 79.766.747

Firma
