DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

TUNJA, BOYACA, **01/12/2025**
COLOMBIA,
A quien interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ** con **Cédula de Ciudadanía** número **7172415**

Posee en el banco Davivienda:


CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**05504884568676 36**
Fecha de apertura	**01/12/2025**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

INFORME DE CORTE FINAL
DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA No. 249 - 2025 SAMC 020-2025 CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO A LA VEREDA FALDA DE MOLINO EN EL SECTOR PERIQUITERA DEL MUNICIPIO DE GUACHETA CUNDINAMARCA BAJO CONVENIO No. ICCU 637-2025"

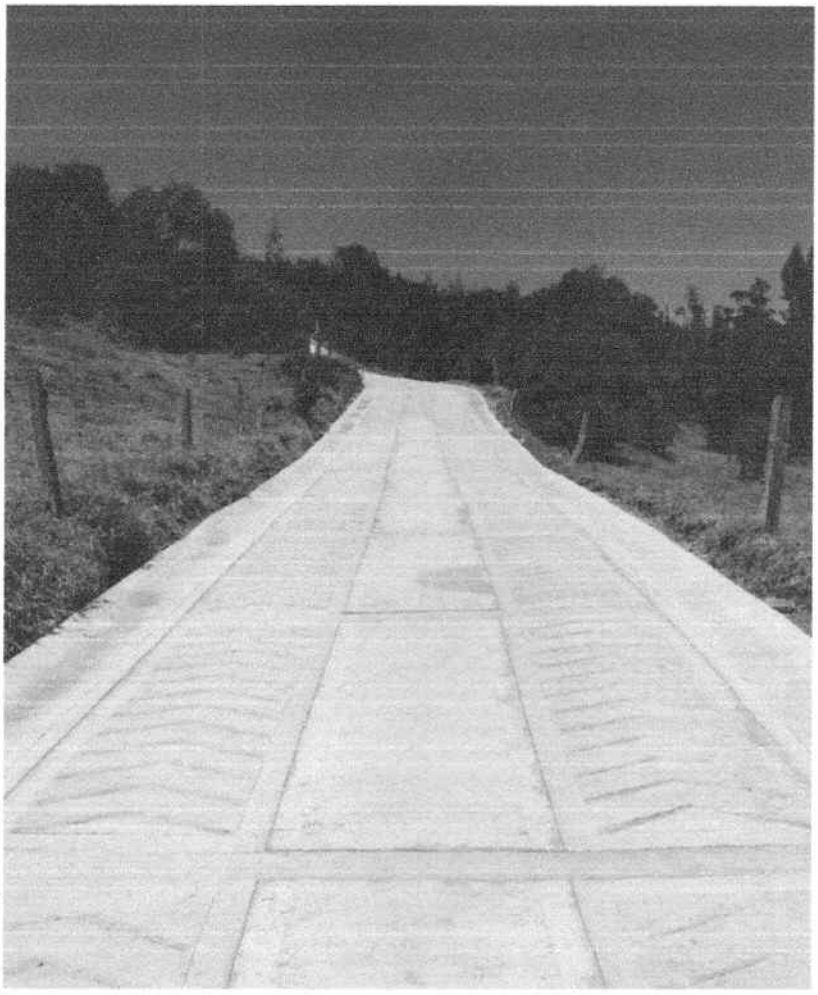

CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUACHETÁ - CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA: CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

SUPERVISOR: SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

MARZO DE 2026

MUNICIPIO DE GUCAHETÁ - CUNDINAMARCA

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
1. OBJETIVOS 3
1.1 OBJETIVO GENERAL 3
1.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 3
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 3
2.1. ANTECEDENTES 3
2.2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 4
3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ENTORNO DEL PROYECTO 5
3.1. LOCALIZACIÓN DE PROYECTO 5
3.2. CONDICIONES CLIMÁTICAS 5
4. AVANCE DE OBRA 6
5. ACTIVIDADES SOCIALES 6
6. EQUIPO, MAQUINARIA Y MATERIALES 7
7. PERSONAL EN OBRA. 7
8. AVANCE DE OBRA, INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN FISICA, FINANCIERA DEL PERIODO ACUMULADO: 8
9. ESTADO FINANCIERO 8
10. ACTAS SUSCRITAS 9
11. POLIZAS 9
12. REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES REALIZADAS 10
13. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 16
ANEXOS 17

INTRODUCCIÓN

El presente informe describe las actividades realizadas durante el tiempo de ejecución para el contrato de Obra No. 249-2025, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO A LA VEREDA FALDA DE MOLINO EN EL SECTOR PERIQUITERA DEL MUNICIPIO DE GUACHETA CUNDINAMARCA BAJO CONVENIO No. ICCU 637-2025", comprendido entre el 24 de febrero (acta de corte N.1) y el 04 de Marzo de 2026.

1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Dar a conocer los avances, actividades, acciones y herramientas empleadas en el periodo de ejecución del contrato, comprendido entre el 24 y el 04 de febrero de 2026, en el lugar de ejecución de la obra.

1.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS

- Ejecutar las obras teniendo en cuenta la programación de obra planteada.
- Exponer mediante un registro fotográfico las actividades realizadas durante la ejecución del contrato.
- Ejecutar las actividades en cumplimiento de la normatividad vigente y usando materiales con certificados de calidad.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

2.1. ANTECEDENTES

La administración municipal de Guachetá Cundinamarca ha evidenciado la necesidad de contar con infraestructura de calidad para los habitantes de la zona rural y urbana del municipio, especialmente para contar con infraestructura vial idónea para propios y visitantes; es por ello por lo que se propone la construcción de placas huella, con el fin de mejorar las condiciones actuales de la vía y, con esta, la calidad de vida de los habitantes de la zona.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la administración municipal suscribió el contrato de obra No. 249-2025 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO A LA VEREDA FALDA DE MOLINO EN EL SECTOR PERIQUITERA DEL MUNICIPIO DE GUACHETA CUNDINAMARCA BAJO CONVENIO No. ICCU 637-2025", con el fin de suplir las necesidades identificadas y brindar un mejor servicio a la ciudadanía con la construcción de dicha placa huella.

2.2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

Tabla 1. Información de contrato de obra

DETALLES CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO	249-2025, SAMC 020-2025
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO A LA VEREDA FALDA DE MOLINO EN EL SECTOR PERIQUITERA DEL MUNICIPIO DE GUACHETA CUNDINAMARCA BAJO CONVENIO No. ICCU 637-2025
CONTRATISTA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
C.C. CONTRATISTA	7.172.415 expedida en Tunja
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GUACHETÁ
NIT CONTRATANTE	899.999.362-0
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR	SANDRA MILENA CORTES MURCIA
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	DOS (02) MESES
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	19 DE DICIEMBRE DE 2025 - 31/12/2025
FECHA ACTA DE INICIO	05 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE CORTE N. 1	24 DE FEBRERO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SIETEMIL TREINTA Y SESIS PESOS M/CTE. ($199.607.036,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SIETEMIL TREINTA Y SESIS PESOS M/CTE. ($199.607.036,00)
FECHA DE TERMINACION:	05 DE MARZO DE 2026

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ENTORNO DEL PROYECTO

3.1. LOCALIZACIÓN DE PROYECTO

El proyecto se localiza en la vereda Falda de Molino del municipio de Guachetá más exactamente sobre la vía del sector "Periquitera". GUACHETA es un municipio del departamento de Cundinamarca (Colombia), ubicado en la Provincia de Ubaté, a 118 km al norte de Bogotá, Guachetá limita al norte con los municipios boyacenses de Ráquira y San Miguel de Sema; al oriente con Ventaquemada y Samacá; al sur con los municipios cundinamarqueses de Lenguazaque y Ubaté; al occidente con Fúquene y la Laguna de Fúquene.

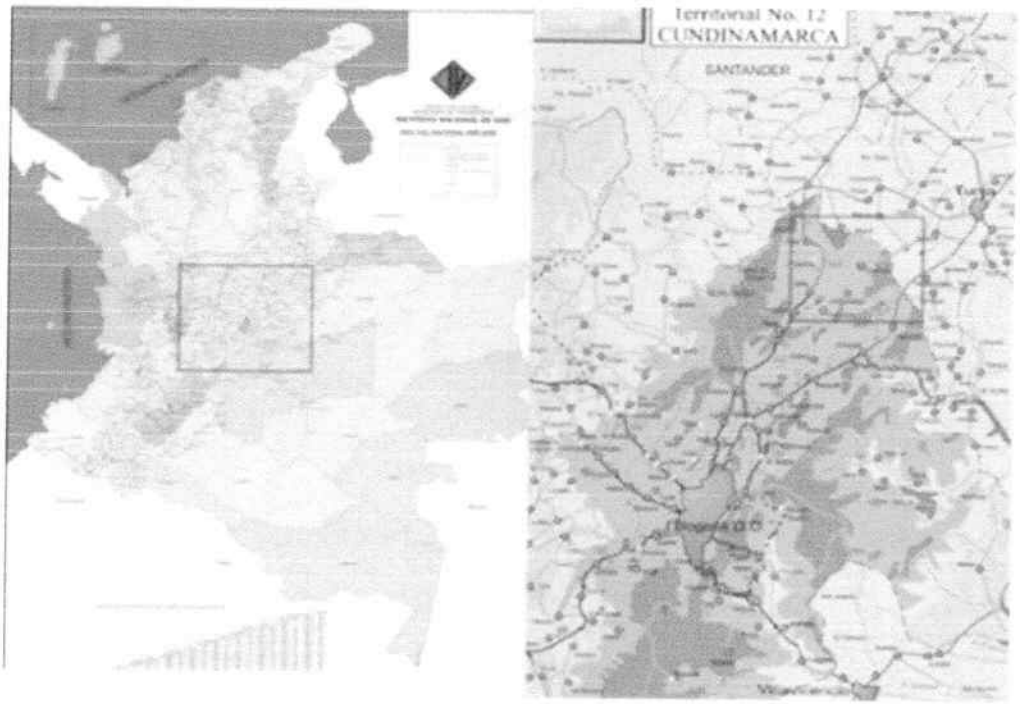


ILUSTRACIÓN 1. LOCALIZACIÓN

3.2. CONDICIONES CLIMÁTICAS

Las condiciones climáticas a nivel general fueron favorables y, aunque se han presentado días con lluvia, no ha sido necesario suspender actividades.

4. AVANCE DE OBRA

A continuación, se expone la lista de las actividades ejecutadas dentro del periodo del presente corte; es de tener en cuenta que para el presente corte se exponen el avance del 20% en la ejecución, para llegar al 100% de ejecución del contrato.

Actividades desarrolladas entre el 24 de febrero y el 4 de marzo de 2026:

> Es de tener en cuenta que debido al ancho de la vía la placa huella se está construyendo de 3.90m y no de 5m como se tenía contemplada inicialmente, es importante aclarar que dicha situación aumenta el alcance de esta; es decir, se construyeron 237,15 m de placa huella.

Excavaciones varias en material común. Corresponde a las actividades de excavaciones para elementos como vigas riostra y cunetas.

Una vez listo el terreno de la placa huella que falta por ejecutar y con el material en sitio se continua con la instalación de formaleta para el vaciado de concreto; de manera paralela se lleva a cabo la actividad de SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI.

- Con la formaleta lista y el acero puesto en cada uno de los cajones que conformaran las huellas faltantes, se procede a fundir el CONCRETOS CLASE C, f´c =3000 psi (placas).
- De igual forma se procede con la ejecución de la actividad de CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES, para las huellas faltantes.
- Seguido de esto y para finalizar, se ejecuta la actividad de CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR

Las obras se desarrollan según las instrucciones dadas por el director y el residente de obra y la supervisión, se realiza el debido seguimiento técnico

El suministro de materiales, insumos y herramientas se da de manera oportuna brindando rapidez y cumplimiento en el desarrollo de las diferentes etapas de los procesos constructivos y del proyecto.

Adicional a las actividades ejecutadas en el lugar de la obra, se llevaron a cabo comités y visitas de obra en compañía de la supervisión.

5. ACTIVIDADES SOCIALES

Antes de iniciar la obra se realizó la socialización del contrato en conjunto con la administración (se adjunta en el corte N. 1 acta de socialización); contando con la participación de la comunidad de la vereda Falda del Molino, así mismo la

secretaria de planeación e infraestructura del municipio de Guachetá, personal de la alcaldía, concejales del municipio y un delegado del contratista de obra.

6. EQUIPO, MAQUINARIA Y MATERIALES

Para poder realizar las actividades anteriormente mencionadas y cumplir con el cronograma de obra es necesario contar con la maquinaria y equipos idóneos de cada actividad, así como materiales:

➢ HERRAMIENTA MENOR

- Picas
- Palas
- Carretillas
- Martillo
- Pulidora
- Flexómetro
- Serrucho
- Segueta
- Puntero
- Rodillos

➢ MAQUINARIA

- Una mezcladora de concreto
- Un vibrador para concreto

7. PERSONAL EN OBRA.

Para el desarrollo de las actividades se cuenta con el siguiente personal:

- Director de obra
- Ingeniero Residente
- Maestro
- Ayudantes

El personal de obra desempeña las siguientes funciones: Dirección de actividades de construcción de obras, dirección del personal de obra, administración de materiales, realizar los distintos procesos constructivos.

8. AVANCE DE OBRA, INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN FISICA, FINANCIERA DEL PERIODO ACUMULADO:

Cuadro de actividades realizadas y acumuladas dentro del periodo

			CONDICIONES INICIALES			CORTE 1	
Nº	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1- PRELIMINARES, EXCAVACIONES, RELLENOS							
1,3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	16,51	$ 86.000,00	$ 1.419.860,00	12,25	$ 1.053.500,00
Subtotal					**$ 1.419.860,00**		**$ 1.053.500,00**
2. CONCRETOS							
2,1	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	61,14	$ 1.007.600,00	$ 61.604.664,00	47,73	$ 48.092.748,00
2,2	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	55,56	$ 708.600,00	$ 39.383.988,00	20,78	$ 14.724.708,00
2,3	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	36,86	$ 828.000,00	$ 30.520.080,00	29,16	$ 24.144.480,00
Subtotal					**$ 131.508.732,00**		**$ 86.961.936,00**
3, ACEROS							
3,1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	6.173,93	$ 10.800,00	$ 66.678.444,00	6.636,74	$ 71.676.792,00
Subtotal					**$ 66.678.444,00**		**$ 71.676.792,00**
SUBTOTAL OBRAS SECTOR EL RECREO					**$ 199.607.036,00**		**$ 159.692.228,00**

Porcentaje de avance ejecutado, acta corte final: 20,003%
Porcentaje de avance cobrado, acta corte parcial 1: 80,00%
Valor COBRADO: ($ 159.685.628,80 M/CTE)

Porcentaje a cobrar corte final: 20,00%
Valor COBRADO: ($ 39.921.407,20M/CTE)

Valor Por Cobrar en el presente corte FINAL: TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS CUATROCIENTOS SIETE PESOS CON VEINTE CENTIMOS MONEDA CORRIENTE

Se hace avance de obra final del 20,00%, para culminar el 100% con respecto al contrato, según las condiciones iniciales; dentro del periodo comprendido entre el 24 y el 04 de febrero del presente año, se adjuntan las memorias de las cantidades de obra ejecutadas y los soportes solicitados.

9. ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		$ 199.607.036,00
VALOR ACTA No. 1:		$ 159.685.628,80
VALOR ACTA FINAL	:	$ 39.921.407,20
SALDO FAVOR MUNICIPIO:		$ 0.00


10. ACTAS SUSCRITAS


NO.	FECHA	CONCEPTO
1	05 DE FEBRERO DE 2026	DE INICIO
2	24 DE FEBRERO DE 2026	ACTA DE PAGO 1
3	5 DE MARZO DE 2026	ACTA DE PAGO FINAL
4	5 DE MARZO DE 2026	ACTA DE CORTE FINAL


11. POLIZAS



NOMBRE DE LA EMPRESA	POLIZA	NUMERO PÓLIZA	INICIO DE VIGENCIA	TERMINACIÓN DE VIGENCIA	BENEFICIARIO
SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	BY-100062590	31/12/2025	23/03/2031	Municipio de Guachetá
SEGUROS MUNDIAL	RESPONSABILIDAD CIVIL	BY-100010507	31/12/2025	23/03/2026	Municipio de Guachetá



12. REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES REALIZADAS

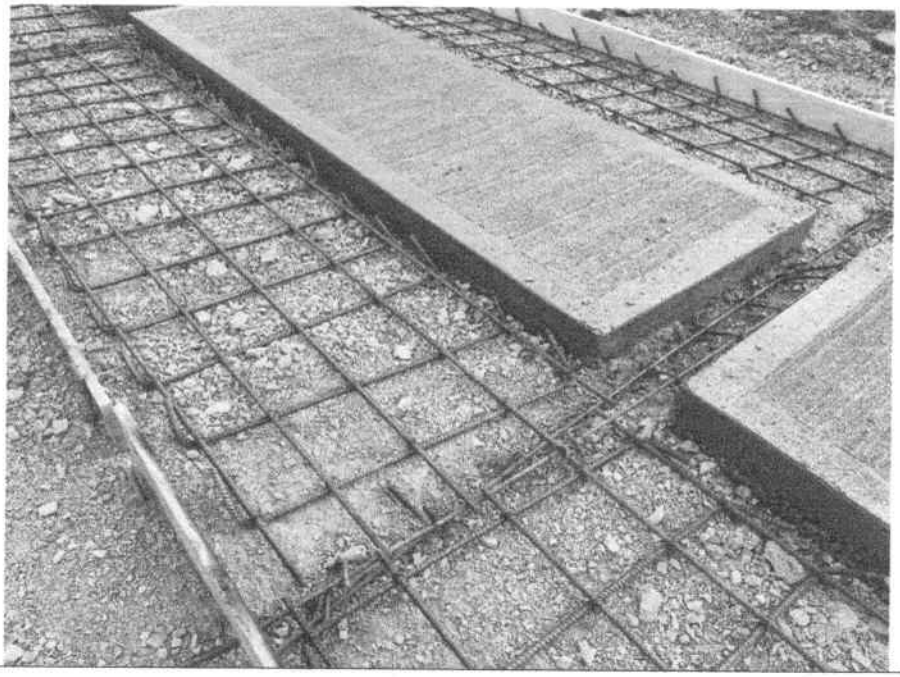ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
ACTIVIDADES EJECUTADAS ENTRE EL 05 Y EL 24 DE FEBRERO	
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	 

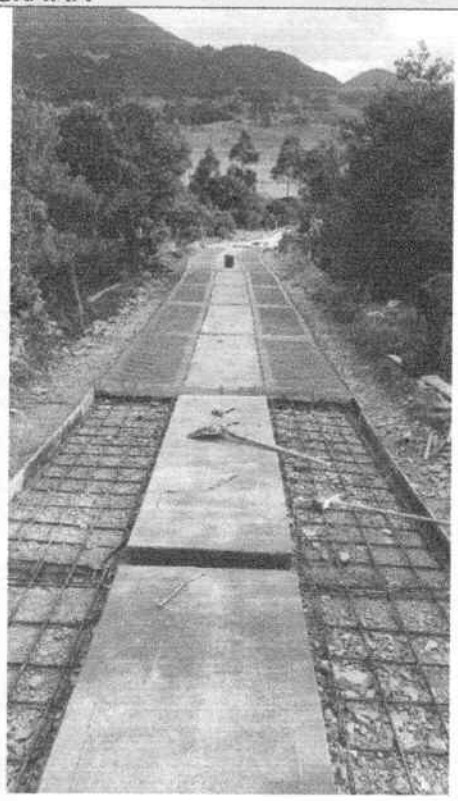ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
	  

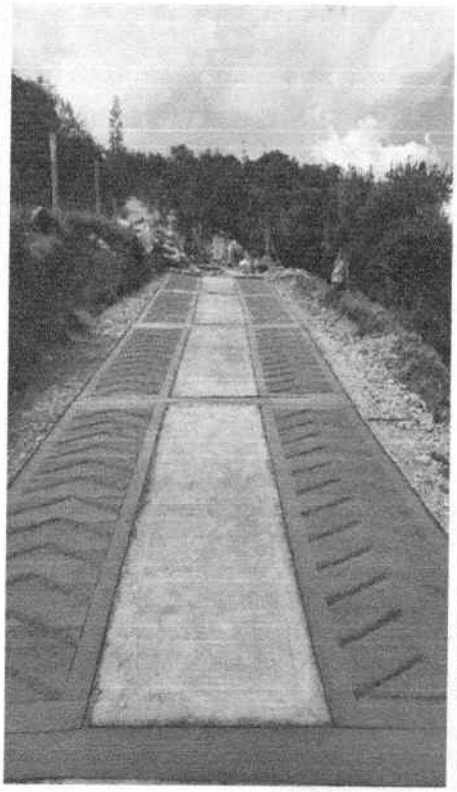ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) RAMPA Y HUELLAS	  

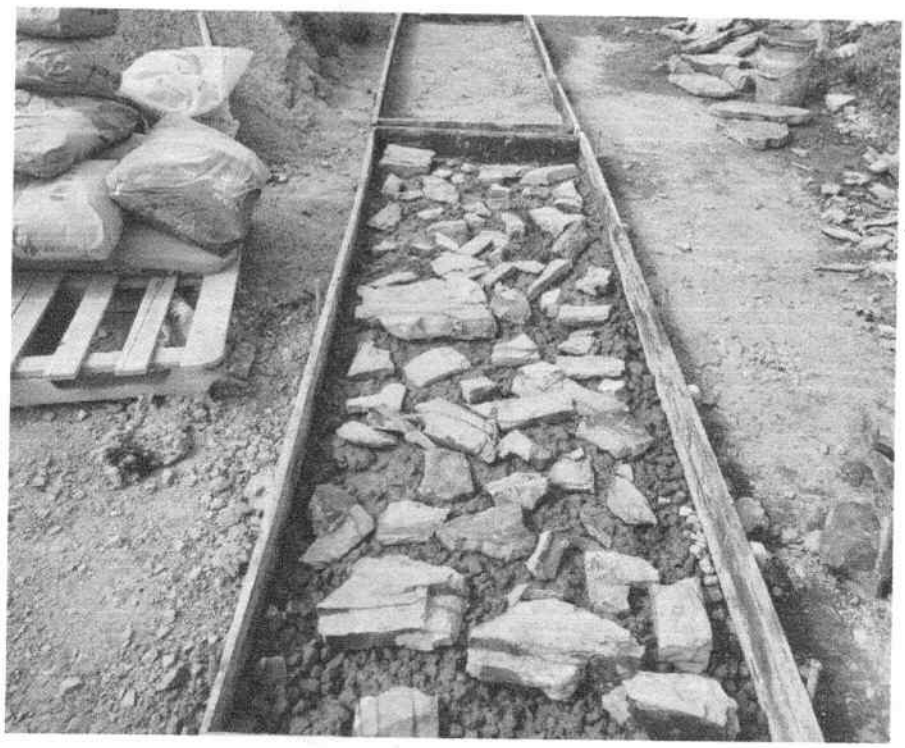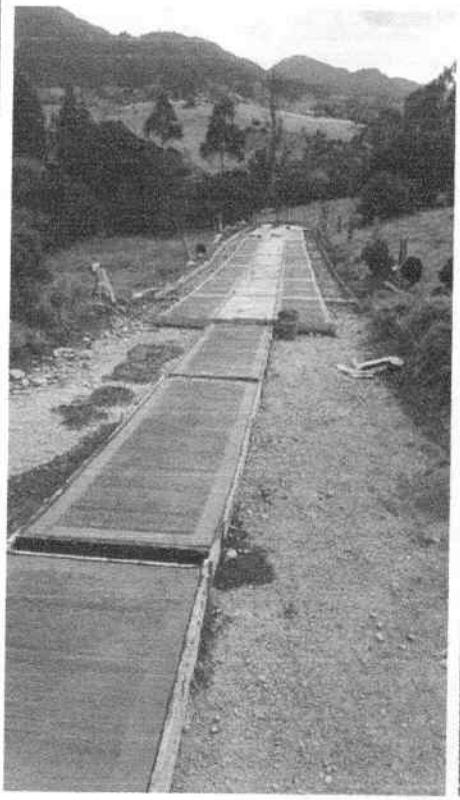
ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	  

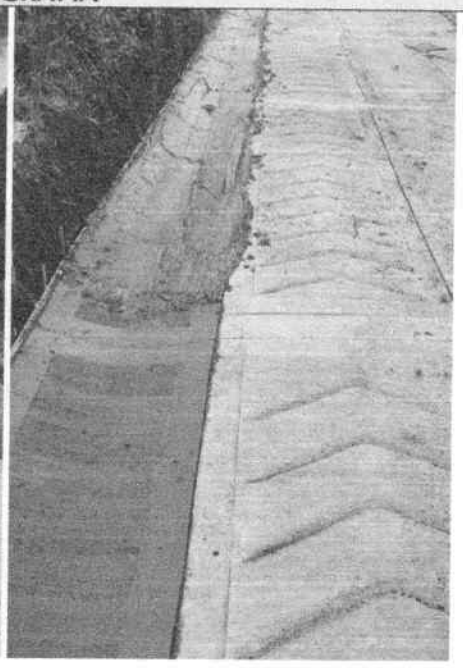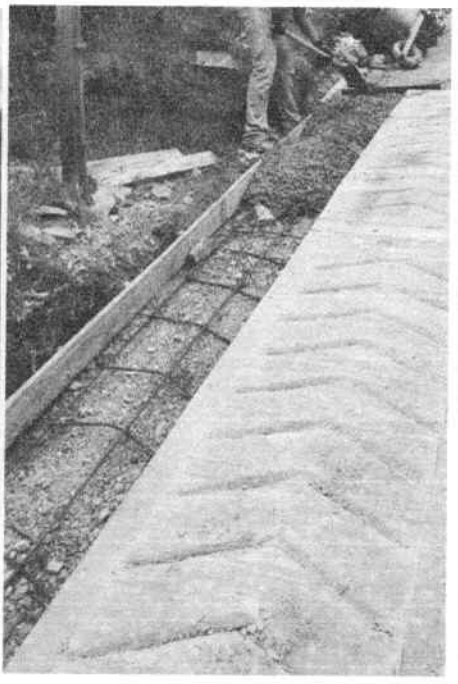ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	   

ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
	 
TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO	

13. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

- Hasta la fecha de terminación no hubo situaciones que alteren el normal desarrollo de las actividades contractuales.
- El contratista estubo presto a las observaciones, comentarios y recomendaciones que emite de manera verbal y/o escrita la supervisión.
- Se asiste de manera oportuna en cada uno de los comités convocados por la supervisión.
- Las actividades desarrolladas dentro del periodo descrito en el presente informe hacen referencia a las requeridas por los diseños allegados por el municipio.



CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
C.C. 7.172.415 de Tunja

ANEXOS

CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

ACTA DE CORTE FINAL Y MEMORIAS DE CANTIDADES

CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

ACTA DE CORTE FINAL CONTRATO DE OBRA NUMERO 249-2025

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO A LA VEREDA FALDA DE MOLINO EN EL SECTOR PERIQUITERA DEL MUNICIPIO DE GUACHETA CUNDINAMARCA BAJO CONVENIO No. ICCU 637-2025

CONTRATO DE OBRA	249 DE 2025 SAMC 020-2025	**FECHA PRESENTE ACTA**	jueves, 5 de marzo de 2026
CONTRATISTA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	**FECHA ACTA DE RECIBO FINAL**	jueves, 5 de marzo de 2026
SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	**PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA FINAL**	19,997%
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES	**PORCENTAJE COBRADO PRESENTE ACTA FINAL**	20%
ACTA DE INICIO	5 DE FEBRERO DE 2026	**VALOR COBRADO EN LA PRESENTE ACTA**	TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTI UN MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS CON VEINTE CENTIMOS MONEDA CORRIENTE ($ 39.921.407,20 M/CTE)
VALOR INICIAL	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SIETEMIL TREINTA Y SESIS PESOS M/CTE. ($199.607.036,00)	**VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA**	TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 39.914.808,00 M/CTE)

						CONDICIONES INICIALES			CORTE 1		CORTE FINAL		ACUMULADO	
Nº	**ITEM DE PAGO**	**ESPECIFICACIONES**		**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
		GENERAL	**PARTICULAR**											
1- PRELIMINARES, EXCAVACIONES, RELLENOS														
1,3	2,13	600,4P INVIAS	VIAS	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	16,51	$ 86.000,00	$ 1.419.860,00	12,25	$ 1.053.500,00	5,79	$ 498.114,00	18,04	$ 1.551.614,00
Subtotal								**$ 1.419.860,00**		**$ 1.053.500,00**		**$ 498.114,00**		**$ 1.551.614,00**
2. CONCRETOS														
2,1	4,6	630,4 INVIAS	VIAS	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	61,14	$ 1.007.600,00	$ 61.604.664,00	47,73	$ 48.092.748,00	21,51	$ 21.673.476,00	69,24	$ 69.766.224,00
2,2	4,25	630,7 INVIAS	VIAS	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	55,58	$ 708.600,00	$ 39.383.988,00	20,78	$ 14.724.708,00	9,23	$ 6.540.378,00	30,01	$ 21.265.086,00
2,3	4,21	671,1 INVIAS	VIAS	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	36,86	$ 828.000,00	$ 30.520.080,00	29,16	$ 24.144.480,00	13,53	$ 11.202.840,00	42,69	$ 35.347.320,00
Subtotal								**$ 131.508.732,00**		**$ 86.961.936,00**		**$ 39.416.694,00**		**$ 126.378.630,00**

3, ACEROS														
3,1	4,52	640,1 INVIAS	VIAS	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	6.173,93	$ 10.800,00	$ 66.678.444,00	6.636,74	$ 71.676.792,00		$ -	6.636,74	$ 71.676.792,00
Subtotal								**$ 66.678.444,00**		**$ 71.676.792,00**				**$ 71.676.792,00**
SUBTOTAL OBRAS SECTOR EL RECREO								**$ 199.607.036,00**		**$ 159.692.228,00**		**$ 39.914.808,00**		**$ 199.607.036,00**


SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 199.607.036,00**	**$ 159.692.228,00**	**$ 39.914.808,00**	**$ 199.607.036,00**
VALOR TOTAL	**$ 199.607.036,00**	**$ 159.692.228,00**	**$ 39.914.808,00**	**$ 199.607.036,00**


SUPERVISOR MUNICIPIO DE GUACHETA
ING. SANDRA MILENA CORTES MURCIA

CONTRATISTA
CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	MUNICIPIO DE GUACHETA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

CONTRATO N°:	249-2025	OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO A LA VEREDA FALDA DE MOLINO EN EL SECTOR PERIQUITERA DEL MUNICIPIO DE GUACHETA CUNDINAMARCA BAJO CONVENIO No. ICCU 637-2025		
CONTRATISTA:	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		FECHA :	jueves, 5 de marzo de 2026	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DEGUACHETA				
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				
ITEM N°:	1,3	DESCRIPCION ITEM	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UND:	M3

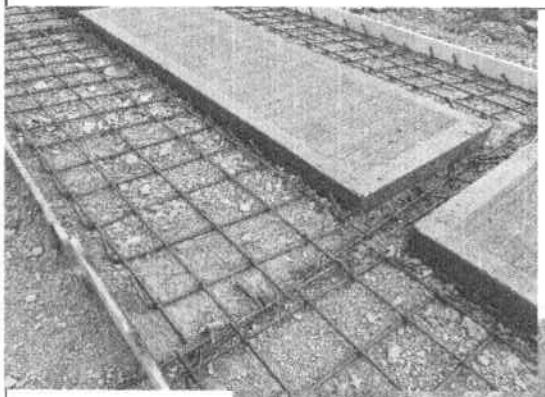

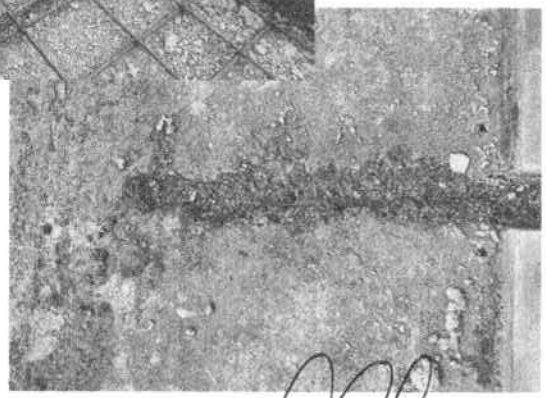


LOCALIZACION / DESCRIPCION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Longitud / Espesor	Ancho (m)	Altura (m)			
Vigas	2,70	0,15	0,10		24,00	0,97
Cunetas	75,15	0,60	0,05		2,00	4,52
Rampas	1,50	2,70	0,08		1,00	0,30
(I)TOTAL						5,79

SUPERVISOR
MPIO. GUACHETA ING. SANDRA MILENA CORTES MURCIA

CONTRATISTA
CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	MUNICIPIO DE GUACHETA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

CONTRATO N°:	249-2025	OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO A LA VEREDA FALDA DE MOLINO EN EL SECTOR PERIQUITERA DEL MUNICIPIO DE GUACHETA CUNDINAMARCA BAJO CONVENIO No. ICCU 637-2025		
CONTRATISTA:	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		FECHA :	jueves, 5 de marzo de 2026	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DEGUACHETA				
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				
ITEM N°:	2,1	DESCRIPCION ITEM	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	UND:	M3

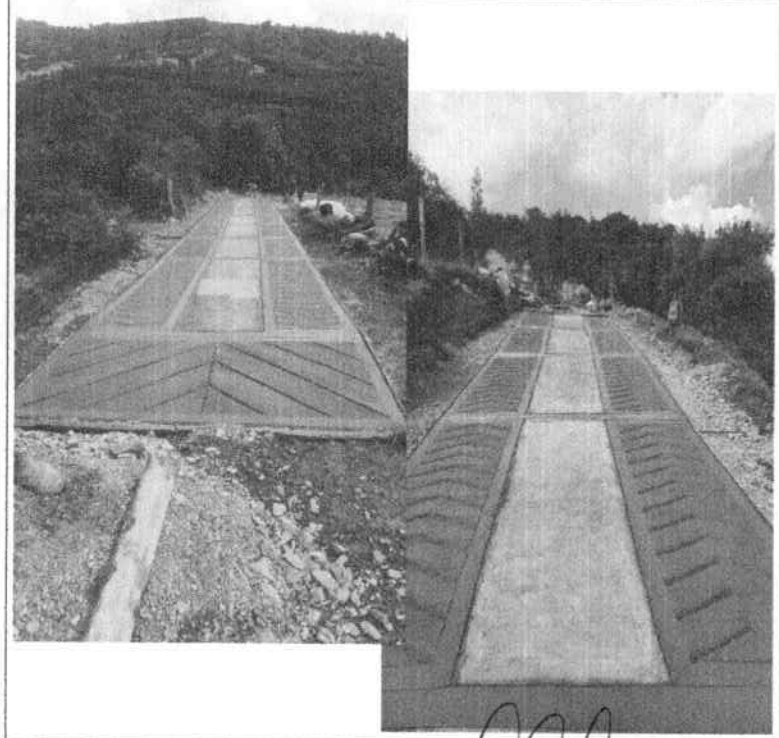


LOCALIZACION / DESCRIPCION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Longitud / Espesor	Ancho (m)	Altura (m)			
Losas	2,85	0,90	0,15		46,00	18,47
Vigas	2,70	0,15	0,25		24,00	2,43
Rampas de acceso	1,50	2,70	0,15		1,00	0,61
(I)TOTAL						21,51

SUPERVISOR
MPIO. GUACHETA ING. SANDRA MILENA CORTES MURCIA

CONTRATISTA
CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	MUNICIPIO DE GUACHETA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

CONTRATO N°:	249-2025	OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO A LA VEREDA FALDA DE MOLINO EN EL SECTOR PERIQUITERA DEL MUNICIPIO DE GUACHETA CUNDINAMARCA BAJO CONVENIO No. ICCU 637-2025		
CONTRATISTA:	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		FECHA :	jueves, 5 de marzo de 2026	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DEGUACHETA				
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				
ITEM N°:	2,2	DESCRIPCION ITEM	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	UND:	M3

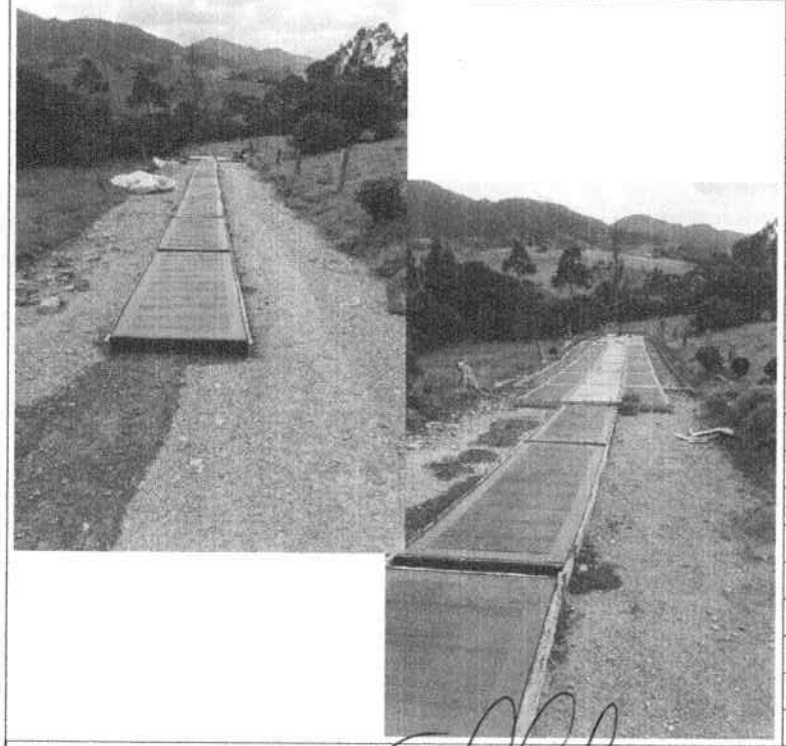


LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
DESCRIPCION	Longitud / Espesor	Ancho (m)	Altura (m)			
Centro	2,85	0,90	0,15		24,00	9,23
(I)TOTAL						9,23

SUPERVISOR
MPIO. GUACHETA ING. SANDRA MILENA CORTES MURCIA

CONTRATISTA
CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	MUNICIPIO DE GUACHETA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

CONTRATO N°:	249-2025	OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO A LA VEREDA FALDA DE MOLINO EN EL SECTOR PERIQUITERA DEL MUNICIPIO DE GUACHETA CUNDINAMARCA BAJO CONVENIO No. ICCU 637-2025		
CONTRATISTA:	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		FECHA :	jueves, 5 de marzo de 2026	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DEGUACHETA				
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				
ITEM N°:	2,3	DESCRIPCION ITEM	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	UND:	M3

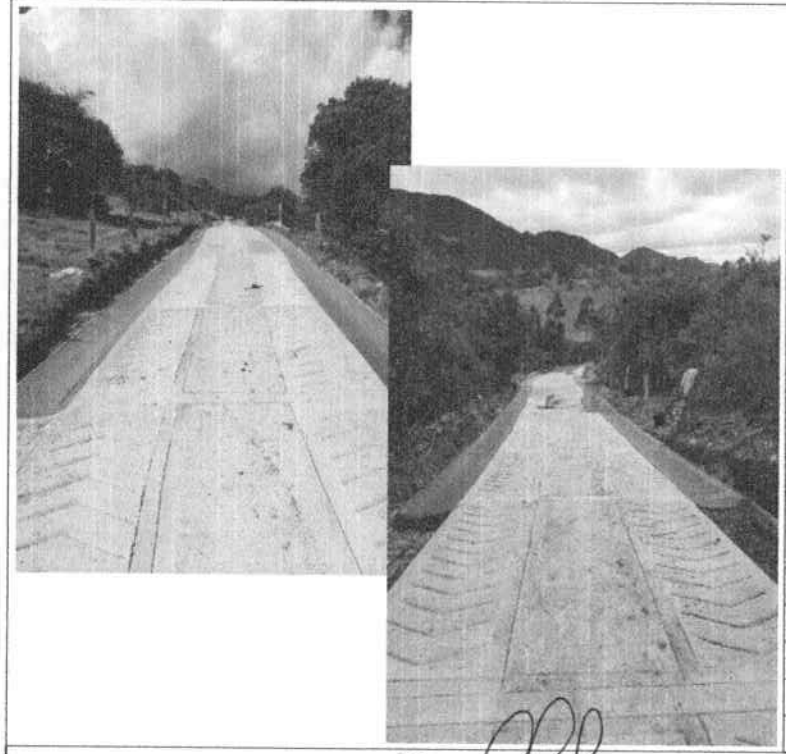

LOCALIZACION / DESCRIPCION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Longitud / Espesor	Ancho (m)	Altura (m)			
Cunetas	75,15	0,60	0,15		2,00	13,53
(I)TOTAL						13,53

SUPERVISOR
MPIO. GUACHETA ING. SANDRA MILENA CORTES MURCIA

CONTRATISTA
CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

FACTURA

CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

CERTIFICADO DE PARAFISCALES

CERTIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ identificado con C.C. 7.172.415 en nombre propio, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha, Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

DEISY VIVIANA PÉREZ PINTO identificada con C.C.1.058.275.149 y con tarjeta profesional No. 284566-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contadora de CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ identificado con C.C. 7.172.415, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en TUNJA, a los 5 días del mes de MARZO de 2026

CC 7.172.415.
CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
C.C 7.172.415 de Tunja

DEISY VIVIANA PEREZ PINTO
T.P 284566-T
Contador Público

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.058.275.149**

PEREZ PINTO

APELLIDOS

DEISY VIVIANA

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **07-NOV-1994**

MONGUA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

21-ENE-2013 MONGUA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0715400-00444907-F-1058275149-20130630 0033775914A 1 33346022

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



284566-T

DEISY VIVIANA
PEREZ PINTO
C.C. 1068275149
RES. INSCRIPCION 1795 DEL 04/08/2021
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

307156 326355

Identificación Plástica S.A. 200524/1220

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

CERTIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ identificado con C.C. 7.172.415 en nombre propio, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha, Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

DEISY VIVIANA PÉREZ PINTO identificada con C.C.1.058.275.149 y con tarjeta profesional No. 284566-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contadora de CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ identificado con C.C. 7.172.415, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en TUNJA, a los 25 días del mes de MARZO de 2026

CC 7.172.415.
CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ
C.C 7.172.415 de Tunja

DEISY VIVIANA PEREZ PINTO
T.P 284566-T
Contador Público

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.058.275.149
PEREZ PINTO
APELLIDOS
DEISY VIVIANA
NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 07-NOV-1994
MONGUA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

21-ENE-2013 MONGUA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0715400-00444907-F-1058275149-20130630 0033775914A 1 33346022

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

284566-T



DEISY VIVIANA
PEREZ PINTO
C.C. 1088276149
RES. INSCRIPCION 1795 DEL 04/08/2021
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

307156

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

326355

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

7 5 4 5 4 6 3 C A F 3 C A 3 8 E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DEISY VIVIANA PEREZ PINTO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1058275149 de MONGUA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 284566-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *
