Pinchote 27 de abril de 2026

Señores
**ALCALDÍA MUNICIPAL**
**PINCHOTE SANTANDER**

**REFERENCIA:** solicitud de suspensión Proceso de contratación CONTRATO DE OBRA No. SAMC-006-2025"


**Objeto:** REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DESDE EL BIODIGESTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER HASTA LA ZONA LIMITE CON LA VIA NACIONAL

Estimados señores:

La suscrita **YULY MILENA ANAYA GONZÁLEZ** identificada con cedula de ciudadanía No. 37.898.707 de San Gil, obrando como Representante Legal de INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS identificado con Nit. 900588731-4, en mi calidad de contratista del contrato de la referencia, me permito presentar formalmente solicitud de suspensión temporal de las actividades contractuales, con fundamento en circunstancias de fuerza mayor y factores externos que afectan de manera directa la normal ejecución del proyecto.

Durante los últimos días, el área de influencia del proyecto, ubicada en el municipio de Pinchote, Santander, ha presentado condiciones climáticas adversas, caracterizadas por precipitaciones intensas y continuas, las cuales han generado:

- Saturación de suelos y pérdida de capacidad portante en las zonas de excavación.
- Incremento del nivel freático, dificultando las labores de conformación de zanjas.
- Imposibilidad técnica de garantizar la correcta compactación de rellenos y cumplimiento En atención a lo anterior,

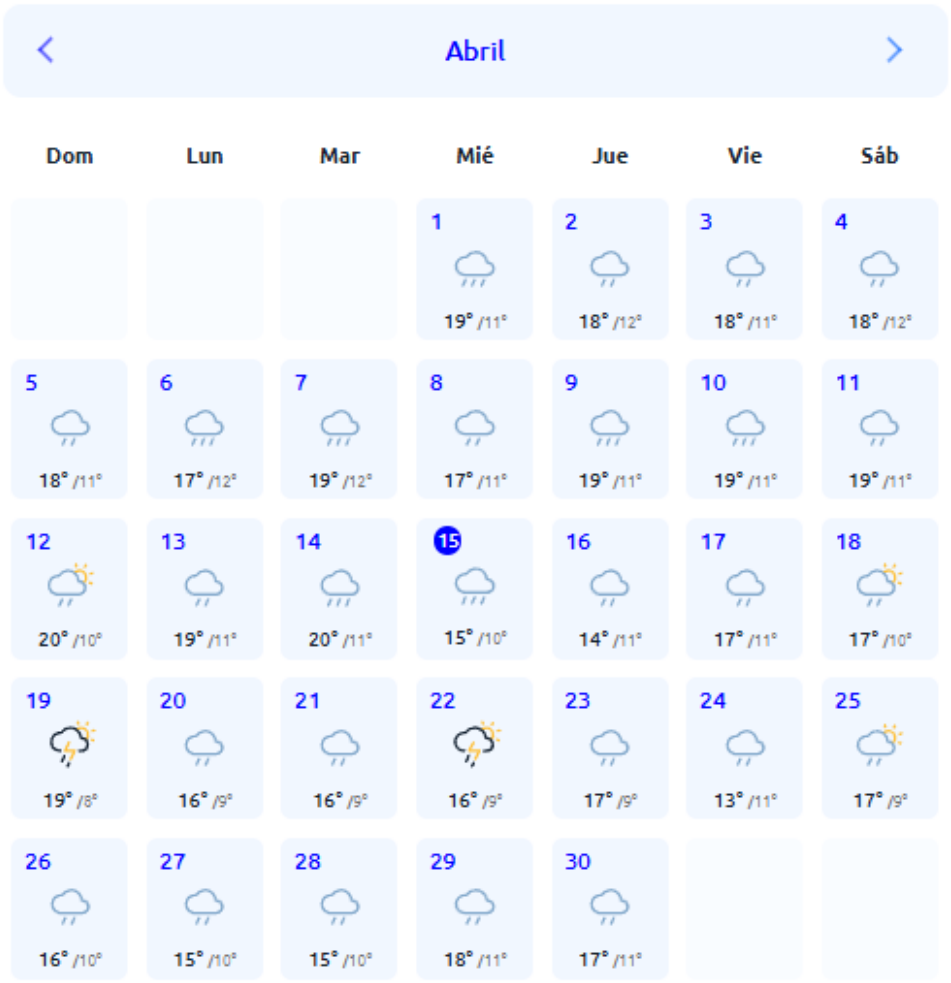


Resultados lluvias mes de abril 2026

Información tomada de la pagina [Clima en Colombia en abril 2026 | Tiempo3.com]

Lo anterior, sin perjuicio de que, en caso de persistir las condiciones que dieron origen a esta solicitud, se evalúe conjuntamente la necesidad de prorrogar dicha suspensión.

- Durante el periodo de suspensión se garantizará la protección de las obras ejecutadas, implementando medidas de manejo y señalización necesarias.
- Se mantendrá vigilancia sobre las condiciones del proyecto para evitar afectaciones a terceros y al entorno.

- Una vez superadas las causas que originan la suspensión, se procederá a la reactivación inmediata de las actividades, ajustando el cronograma conforme a lo establecido contractualmente.

En virtud de lo expuesto, solicito muy respetuosamente la aprobación de la presente suspensión, con el fin de salvaguardar la integridad del proyecto, garantizar la calidad de las obras y proteger la seguridad del personal involucrado.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier requerimiento adicional.

Cordialmente,

Nombre del proponente: INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
Nombre del representante legal: YULY MILENA ANAYA GONZALEZ
C. C. No. 37.898.707 de San Gil
