	FORMATO	Código: F-INF-16
QUINDIO 1966	Registro de visita	Versión: 08 Fecha: 15/02/2022
		Página 1 de 3

FECHA DE VISITA :		7 de abril de 2026
OBJETO DE LA SOLICITUD:		Evaluacion para terminacion de pavimentacion
LOCALIZACION / MUNICIPIO :		Armenia, Quindio
FUNCIONARIO QUE REALIZA LA VISITA:		Juliana Cotaro R - Juan Miguel Arias
CONTACTO	NOMBRE:	Sandra Liliana Mesa
	DIRECCIÓN:	Barrio la alameda manzana 3 Casa # 1. Pablo bonito
	TELÉFONO:	3052346850
	Email:	Sandramesa432@gmail.com.

REQUERIMIENTO DE LA VISITA:

Realizar la inspeccion tecnica del area con el fin de identificar el estado actual de la via pavimentacion y levantar un listado preliminar de materiales.

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA – SITUACIÓN ACTUAL

Durante la visita se evidencio que el tramo presenta condiciones mixtas en su superficie:

- Existen sectores que ya cuentan con pavimentacion en concreto.
- se identifican areas con presencia de material pétreo (piedra) sin tratamiento estructural definido
- se observan zonas con cobertura vegetal.

VERIFICACIÓN DE ACCESOS:

Scanned with CamScanner

	FORMATO	Código: F-INF-16
QUINDIO 1966	**Registro de visita**	Versión: 08 Fecha: 15/02/2022
		Página 2 de 3


VIAS DE ACCESO SI X NO ___

CATEGORIA DE LA VIA: _____

TIPO DE VÍA: Asfalto___ Concreto X Afirmado ___ Placa Huella___ Otro _____

ESTADO: Bueno X Regular ___ Malo ___

DIAGRAMA DE OBRAS

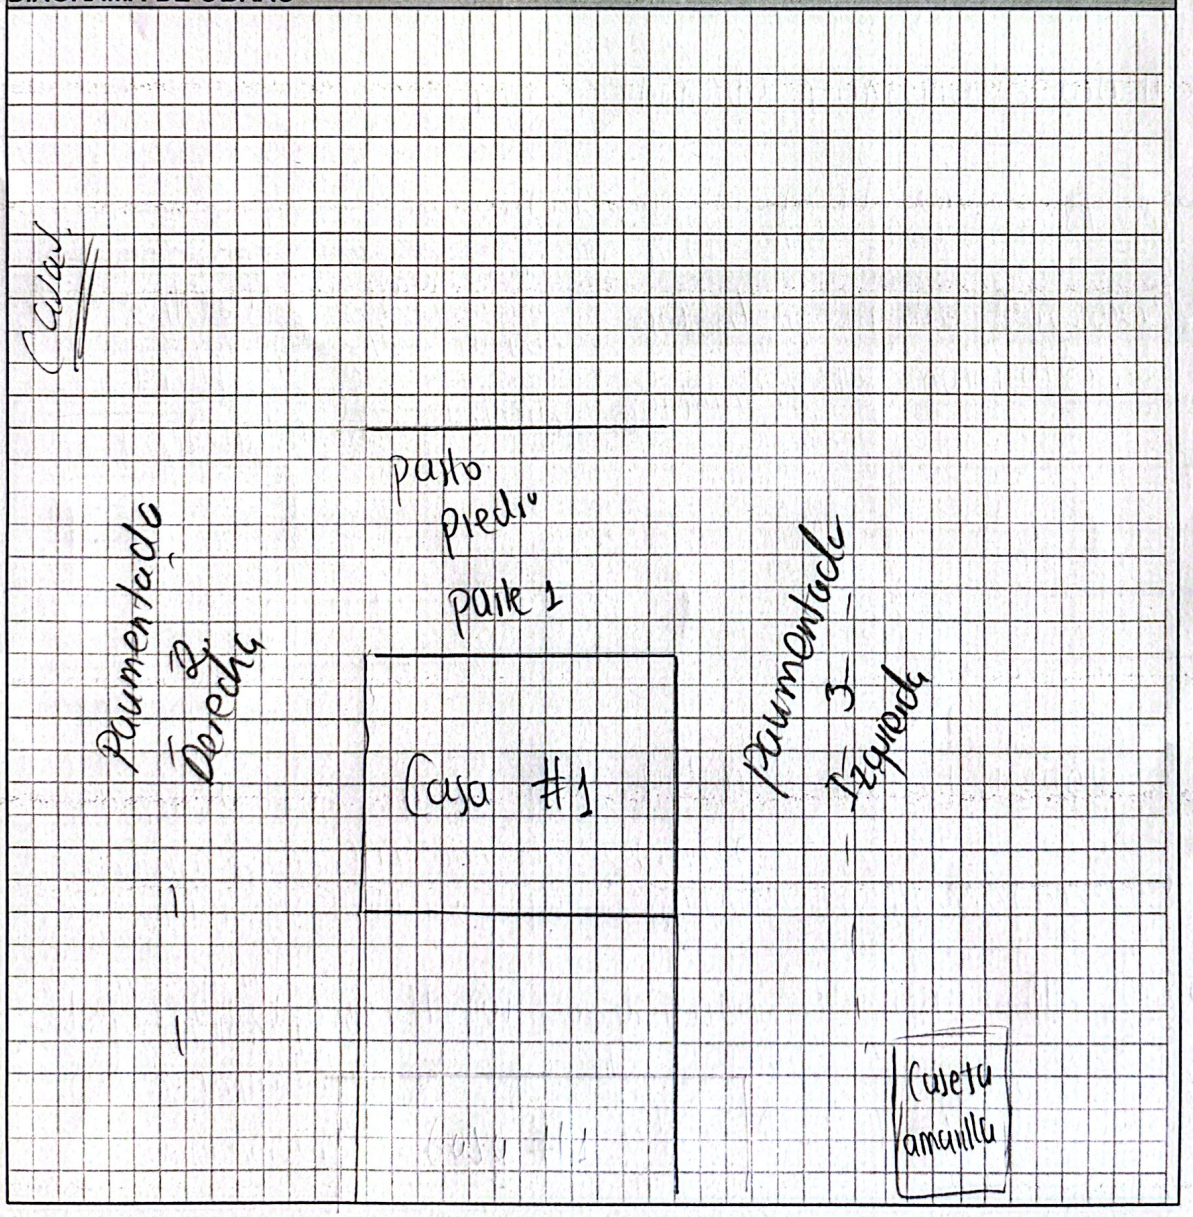

CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD Y/O RECOMENDACIONES GENERALES

Scanned with CamScanner

	FORMATO	Código: F-INF-16
QUINDIO 1966	Registro de visita	Versión: 08 Fecha: 15/02/2022
		Página 3 de 3

- Realizar limpieza y retiro de material vegetal.
- Ejecutar excavacion y conformacion de subrasante en los tramos de piedra.
- Realizar una adecuada compactacion del terreno
- verificar el estado del concreto existente

DESCRIPCION OBRAS REQUERIDAS

TIPO	UNIDAD	LONGITUD /CANTIDAD	ANCHO	ESPESOR	ALTURA
tramo 1 sin pavimentar	17,25m²	6,6 m	2,8m		
Tramo 2 deteriorado	15,68m²	5,6 m	2,8m		
Tramo 3 " sin pavimentar	6,63m²	3,9 m	1,7m		
tramo izquierdo	117,6m²	28m	4,2m		
tramo derecho	83,23m²	20,30 m	4,1m		

ASISTENTES:

Nombre	Entidad / Cargo	Teléfono	Firma
Sandra Liliana Mesa	Lider	3005234685	Sandra Mesa
Juliana Cataño R.	Contratista	3164204455	Juliana.
Juan Miguel Arial Hoyos	Contratista	3108331321	

Scanned with CamScanner
