INFORME DE SUPERVISION Y ACTA DE PAGO No 1

CLASE DE CONTRATO: PROCESO MINIMA CUANTIA PMC				**No: 055**		**Del Año:**		**2025**	
CONTRATISTA:	**TALLER INDUSTRIAL MECANIZADOS GALLEGOS SAS**				**NIT. No.:**	**901141394-1**			
PERIODO DEL INFORME:	**Desde:**	**18**	**DICIEMBRE**	**2025**	**Hasta:**	**23**	**DICIEMBRE**	**2025**
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA A CARGO DEL MUNICIPIO DE RESTREPO VALLE.	
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE ($ 26.945.300)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	0001062 del 20 de noviembre de 2025
NUMERO REGISTRO PRESUPUESTAL:	0001854 del 18 de diciembre de 2025
TOTAL PERIODO:	**$ 22.000.000**

Fecha de inicio	18	DICIEMBRE	2025	**Fecha de terminación**	30	DICIEMBRE	2025
	Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

Valor Periodo a Cancelar	Valor Cancelado	Saldo por Ejecutar
$ 22.000.000	**0**	**4.495.300**

INFORME DE SUPERVISION Y ACTA DE PAGO No 1

La **forma de pago** se encuentra establecida de la siguiente forma en los documentos contractuales: ***FORMA DE PAGO***

"EL MUNICIPIO cancelará el valor del contrato resultante del presente proceso, de la siguiente manera:
Mediante pagos parciales hasta completar el cien por ciento (100%) del valor total del contrato, al cumplimiento de los servicios requeridos y/o el cumplimento de la ejecución de la totalidad del objeto contractual previa presentación de los siguientes soportes:

- *Factura que incluya los servicios y repuestos efectivamente prestados e instalados.*
- *Informe de actividades de los mantenimientos preventivos o correctivos realizados y repuestos suministrados.*
- *Documentos que certifiquen que se encuentra al día con el pago al sistema general de seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, además de parafiscales cuando a ello haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente.*
- *Informe de supervisión y acta parcial, elaborado por el supervisor del contrato, quien verificará que los bienes cumplan con las especificaciones contratadas."*

Por consiguiente, para el presente desembolso, se considera lo siguiente:

EVALUACIÓN DE AVANCE DE EJECUCIÓN A LA FECHA:

Porcentaje de ejecución del contrato: 81,6%

Del mismo modo, teniendo en cuenta la clausula de **VALOR ESTIMADO Y SU JUSTIFICACIÓN,** la cual reza: *"Teniendo en cuenta que el estado mecánico de los vehículos solo puede diagnosticarse completamente una vez se inicie la intervención, y que omitir el reemplazo de ciertos elementos puede comprometer la seguridad, operatividad y durabilidad de los vehículos, se hace necesario prever la posibilidad de autorizar la adquisición y cobro de repuestos adicionales, conforme a la normatividad contractual y presupuestal vigente.*

En esta situación, el repuesto y/o servicios que no estén incluidos en la oferta económica de valores de referencia, el valor de estos será soportado con dos cotizaciones los cuales serán discriminados a solicitud del contratante y autorizados por el supervisor del contrato. De acuerdo con lo anterior, y como no es posible estimar ni el momento ni las cantidades reales de repuestos con mano de obra, que serán requeridas para cada uno de las Máquinas y Vehículos durante la ejecución del contrato, a fin de establecer el valor

INFORME DE SUPERVISION Y ACTA DE PAGO No 1

total del mismo, la supervisión realizara el análisis con los valores promedios obtenidos en el estudio de mercado producto de las cotizaciones realizadas, la frecuencia y el costo histórico de las intervenciones mantenimiento del Banco de maquinaria amarilla. El valor total obtenido producto de este análisis debe ser aprobado por la supervisión."

Asi las cosas y teniendo en cuenta el diagnostico realizado por el contratista, este solicita la aprobación de un (01) item no contemplado en los precios de referencia iniciales. Una vez realizado el análisis de costos para estos casos estipulado en el contrato queda aprobado el item con las siguientes condiciones:

INSPECCION Y CORRECION DEL SISTEMA ELECTRICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA, CORRECCION DE CORTO Y AISLAMIENTO EN CAJA DE FUSIBLES, REPARACION DE CABLEADO, INSTALACION Y SUMINISTRO DE LUCES Y ESTACIONACIONARIAS FRONTALES, INSTALACION Y SUMINISTRO DE LUCES POSTERIORES, INSTALACION Y SUMINISTRO DE PITO FRONTAL Y POSTERIOR, INSTALACION Y SUMINISTRO DE SIRENA DE RETROCESO, INSPECCION Y CORRECCION DE AISLAMIENTO ECU	**$ 3.698.200**

El contratista relaciona cuenta de cobro y/o factura, la cual se verifica su ejecución por parte de esta supervisión. los ítems facturados, las cantidades y valores relacionados se relacionan a continuación:

EQUIPO / ÍTEM	ACTIVIDAD / DESCRIPCIÓN
TRACTOR KUBOTA L4400DT	DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL ESTADO DE LA MÁQUINA/VEHÍCULO, QUE COMPRENDE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, INSPECCIÓN FÍSICA Y MECÁNICA, EVALUACIÓN OPERATIVA, CONCEPTO TÉCNICO Y AVALÚO COMERCIAL O DE SALVAMENTO.

INFORME DE SUPERVISION Y ACTA DE PAGO No 1

RETROEXCAVADORA CAT 416 B	DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL ESTADO DE LA MÁQUINA/VEHÍCULO, QUE COMPRENDE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, INSPECCIÓN FÍSICA Y MECÁNICA, EVALUACIÓN OPERATIVA, CONCEPTO TÉCNICO Y AVALÚO COMERCIAL O DE SALVAMENTO.
MOTONIVELADORA CAT 120 G	DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL ESTADO DE LA MÁQUINA/VEHÍCULO, QUE COMPRENDE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, INSPECCIÓN FÍSICA Y MECÁNICA, EVALUACIÓN OPERATIVA, CONCEPTO TÉCNICO Y AVALÚO COMERCIAL O DE SALVAMENTO.
VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC	DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL ESTADO DE LA MÁQUINA/VEHÍCULO, QUE COMPRENDE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, INSPECCIÓN FÍSICA Y MECÁNICA, EVALUACIÓN OPERATIVA, CONCEPTO TÉCNICO Y AVALÚO COMERCIAL O DE SALVAMENTO.
VOLQUETA INT. DURASTAR	DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL ESTADO DE LA MÁQUINA/VEHÍCULO, INSPECCIÓN FÍSICA Y MECÁNICA, EVALUACIÓN OPERATIVA Y CONCEPTO TÉCNICO.
VOLQUETA INT. DURASTAR	CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTROS ORIGINALES, INCLUYE FILTROS DE AIRE, FILTROS DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE ACEITE.
VOLQUETA INT. DURASTAR	CAMBIO ACEITE DIFERENCIAL.
RETROEXCAVADORA CAT 416 E	DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL ESTADO DE LA MÁQUINA/VEHÍCULO, INSPECCIÓN FÍSICA Y MECÁNICA, EVALUACIÓN OPERATIVA, CONCEPTO TÉCNICO Y AVALÚO.
	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS ORIGINALES, INCLUYE FILTROS DE AIRE, FILTROS DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE ACEITE.
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUETADURA DE GEMELOS.

INFORME DE SUPERVISION Y ACTA DE PAGO No 1

	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUCHILLA BALDE DELANTERO INCLUYE TUERCAS Y TORNILLOS Y DESMONTE DE LA AVERIADA.
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE CUCHILLA BALDE DELANTERO E INCLUYE DESMONTE DE CUCHILLA AVERIADA.
	INSPECCION Y CORRECION DEL SISTEMA ELECTRICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA, CORRECCION DE CORTO Y AISLAMIENTO EN CAJA DE FUSIBLES, REPARACION DE CABLEADO, INSTALACION Y SUMINISTRO DE LUCES Y ESTACIONACIONARIAS FRONTALES, INSTALACION Y SUMINISTRO DE LUCES POSTERIORES, INSTALACION Y SUMINISTRO DE PITO FRONTAL Y POSTERIOR, INSTALACION Y SUMINISTRO DE SIRENA DE RETROCESO, INSPECCION Y CORRECCION DE AISLAMIENTO ECU
CAMPERO CHEV. TROOPER	DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL ESTADO DE LA MÁQUINA/VEHÍCULO, INSPECCIÓN FÍSICA Y MECÁNICA, CONCEPTO TÉCNICO Y AVALÚO COMERCIAL O DE SALVAMENTO.
VOLQUETA MB 1314	DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL ESTADO DE LA MÁQUINA/VEHÍCULO, INSPECCIÓN FÍSICA Y MECÁNICA, CONCEPTO TÉCNICO Y AVALÚO COMERCIAL O DE SALVAMENTO.
CAMPERO DAIHATSU F75	DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL ESTADO DE LA MÁQUINA/VEHÍCULO, INSPECCIÓN FÍSICA Y MECÁNICA, CONCEPTO TÉCNICO Y AVALÚO COMERCIAL O DE SALVAMENTO.

INFORME DE SUPERVISION Y ACTA DE PAGO No 1

Se dio cumplimiento al pago de los aportes de salud y pensiones de conformidad con lo señalado por la Ley. Las evidencias contractuales se anexan en el informe de actividades.

Por lo anterior:

CERTIFICO:

Que ***TALLER INDUSTRIAL MECANIZADPS GALLEGOS SAS,*** identificado con NIT N° 901141394-1 **CUMPLIÓ** con el Objeto del Contrato que consiste CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA A CARGO DEL MUNICIPIO DE RESTREPO VALLE.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el día veintitrés (23) del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

JUAN JOSE GONZALEZ CONDE
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos

Gestión documental
Proyecto y Reviso: Juan Jose Gonzalez Conde
Elaboro: Natalia escobar Velazco

TALLER INDUSTRIAL MECANIZADOS GALLEGOS S.A.S. NIT: 901141394-1
FECHA: 23 de Diciembre de 2025 **REF:** INFORME DE AVANCE TÉCNICO – DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE FLOTA Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO/PREVENTIVO.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE RESTREPO – VALLE DEL CAUCA.

ASUNTO: Presentación de hallazgos preliminares, estado de intervenciones críticas y avance en el levantamiento de inventario de maquinaria.

Por medio del presente documento, **TALLER INDUSTRIAL MECANIZADOS GALLEGOS S.A.S.** hace entrega del informe de avance correspondiente a la ejecución contractual de la referencia. Este informe detalla las intervenciones técnico-mecánicas realizadas hasta la fecha, el diagnóstico crítico de los equipos operativos y el estado del proceso de peritaje y avalúo de la maquinaria inactiva.

A continuación, se desglosa la información técnica por equipos:

1. ANÁLISIS CRÍTICO: RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416E (Equipo Operativo)

Estado Actual: Operativo con restricciones severas de seguridad y eficiencia.

Condición General: CRÍTICA.

Durante la intervención de mantenimiento preventivo y la inspección visual detallada, se han evidenciado fallas estructurales y sistémicas que comprometen la integridad de la máquina y la seguridad del operador. La omisión de una gestión de mantenimiento correctivo inmediato sobre los siguientes hallazgos podría derivar en fallos de gran magnitud, lucro cesante prolongado y sobrecostos por daños colaterales a componentes mayores.

Hallazgos Técnicos y Novedades:

- **Integridad Estructural (Chasis y Articulaciones):** Se evidencian múltiples **fisuras por fatiga de material** en el bastidor principal (chasis). Esta condición es de alto riesgo, ya que debilita la capacidad de carga y tracción del equipo. Adicionalmente, existe un **desgaste excesivo en los pines y bujes** de las articulaciones de la herramienta, generando holguras que restringen la precisión operativa y aceleran la degradación del metal base.
- **Sistema de Potencia (Motor y Turbo):** El equipo presenta una **pérdida de potencia significativa** bajo carga. Se ha detectado **humedad y trazas de aceite en la tubería de lubricación del turbocargador**, lo que sugiere un fallo en los sellos del turbo o excesiva presión en el cárter.
    - *Acción en curso:* Se ha realizado la toma de muestras de aceite motor para análisis tribológico en laboratorio. Los resultados determinarán el desgaste

interno de camisas, anillos y metales, permitiendo diagnosticar una causa raíz de la pérdida de potencia.

- **Sistema Hidráulico:** Se detecta pérdida de estanqueidad con **fugas activas de fluido hidráulico** en:
  - Cilindros gemelos de rotación del brazo principal (Swing).
  - Cilindros de los estabilizadores traseros.
  - Estas fugas provocan caídas de presión, movimientos erráticos y contaminación ambiental en la zona de trabajo.
- **Implementos (Balde Frontal):** Avería severa en la estructura del balde frontal y desgaste crítico en la cuchilla de corte. Se está realizando la intervención de soldadura especializada y recargue duro para la base, tambien la sustitución de elementos de desgaste como las dos cuchillas y tornillos de alta carga.
- **Sistema Eléctrico y Seguridad:**
  - **Sistema de Carga:** El alternador presenta fallo funcional, no suministrando el voltaje necesario para la carga de baterías, lo que pone en riesgo el arranque y funcionamiento de los sistemas electrónicos.
  - **Iluminación y Señalización:** Por parámetros de seguridad, se procedió a la validación del sistema de luces. Se halló la ausencia de la direccional frontal izquierda (producto de un impacto previo en la cabina que deformó el alojamiento) y la inoperatividad de la direccional derecha. Se están ejecutando las correcciones necesarias para cumplir con la normativa de tránsito y operación.

Actividades Ejecutadas: Lavado general a presión para inspección de fisuras, engrase general de puntos críticos, toma de muestras de fluidos y desmontaje de componentes para diagnóstico eléctrico.

2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: VOLQUETA INTERNATIONAL DURASTAR 4300SBA

Estado Actual: En proceso de Mantenimiento Preventivo.

Condición General: FUNCIONAL.

Este equipo ingresó a las instalaciones para su rutina de mantenimiento programado. A diferencia de la maquinaria amarilla, este vehículo de carga no presenta novedades correctivas mayores que impidan su operación inmediata tras el servicio.

Intervenciones Realizadas:

- Sustitución de aceite de motor y reemplazo de filtros originales (Aceite, Aire, Combustible y trampa/decantador).
- Cambio de aceite de diferencial.
- Inspección y corrección del sistema eléctrico del freno de motor (se restaura funcionalidad para garantizar seguridad en descenso).
- Validación y puesta a punto del sistema de luces generales.

- Lavado general, grafitado y engrase de sistemas en general.

3. LEVANTAMIENTO DE FLOTA Y PERITAJE (Maquinaria Inactiva)

Para el resto del parque automotor y de maquinaria amarilla, se está ejecutando un proceso riguroso de **Levantamiento de Información Técnica y Avalúo**. Dado que estos equipos presentan un tiempo prolongado de inactividad (lucro cesante histórico), el protocolo de diagnóstico incluye un inventario detallado componente por componente para determinar la viabilidad económica de su recuperación o su destino como salvamento.

Actualmente, se está procesando la evidencia fotográfica, consolidando los *checklists* de inspección física y mecánica, y estructurando el concepto técnico para los siguientes equipos:

1. Tractor Kubota L4400DT.
2. Retroexcavadora Caterpillar 416 B.
3. Motoniveladora Caterpillar 120 G.
4. Vibrocompactador Dynapac VC-02.
5. Campero Chevrolet Trooper.
6. Volqueta Mercedes Benz 1314.
7. Campero Daihatsu Rocky F75.

Nota: La documentación final de estos equipos incluirá la evaluación operativa (en los casos que aplique), el concepto técnico de falla y el avalúo comercial ajustado a los precios de mercado actuales.

4. RELACIÓN DETALLADA DE ACTIVIDADES Y ESTADO DE AVANCE

Conforme a lo solicitado, se presenta el desglose del estado actual de cada ítem contractual:


EQUIPO / ÍTEM	ACTIVIDAD / DESCRIPCIÓN	ESTADO
TRACTOR KUBOTA L4400DT	DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL ESTADO DE LA MÁQUINA/VEHÍCULO, QUE COMPRENDE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, INSPECCIÓN FÍSICA Y MECÁNICA, EVALUACIÓN OPERATIVA, CONCEPTO TÉCNICO Y AVALÚO COMERCIAL O DE SALVAMENTO.	**ACTIVIDAD EN DESARROLLO**


RETROEXCAVADORA CAT 416 B	DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL ESTADO DE LA MÁQUINA/VEHÍCULO, QUE COMPRENDE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, INSPECCIÓN FÍSICA Y MECÁNICA, EVALUACIÓN OPERATIVA, CONCEPTO TÉCNICO Y AVALÚO COMERCIAL O DE SALVAMENTO.	**ACTIVIDAD EN DESARROLLO**
MOTONIVELADORA CAT 120 G	DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL ESTADO DE LA MÁQUINA/VEHÍCULO, QUE COMPRENDE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, INSPECCIÓN FÍSICA Y MECÁNICA, EVALUACIÓN OPERATIVA, CONCEPTO TÉCNICO Y AVALÚO COMERCIAL O DE SALVAMENTO.	**ACTIVIDAD EN DESARROLLO**
VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC	DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL ESTADO DE LA MÁQUINA/VEHÍCULO, QUE COMPRENDE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, INSPECCIÓN FÍSICA Y MECÁNICA, EVALUACIÓN OPERATIVA, CONCEPTO TÉCNICO Y AVALÚO COMERCIAL O DE SALVAMENTO.	**ACTIVIDAD EN DESARROLLO**
VOLQUETA INT. DURASTAR	DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL ESTADO DE LA MÁQUINA/VEHÍCULO, INSPECCIÓN FÍSICA Y MECÁNICA, EVALUACIÓN OPERATIVA Y CONCEPTO TÉCNICO.	**ACTIVIDAD EN DESARROLLO**
	CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTROS ORIGINALES, INCLUYE FILTROS DE AIRE, FILTROS DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE ACEITE.	**ACTIVIDAD EJECUTADA**
VOLQUETA INT. DURASTAR	CAMBIO ACEITE DIFERENCIAL.	**ACTIVIDAD EJECUTADA**


RETROEXCAVADORA CAT 416 E	DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL ESTADO DE LA MÁQUINA/VEHÍCULO, INSPECCIÓN FÍSICA Y MECÁNICA, EVALUACIÓN OPERATIVA, CONCEPTO TÉCNICO Y AVALÚO.	**ACTIVIDAD EN DESARROLLO**
	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS ORIGINALES, INCLUYE FILTROS DE AIRE, FILTROS DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE ACEITE.	**ACTIVIDAD EN DESARROLLO**
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUETADURA DE GEMELOS.	**ACTIVIDAD EN DESARROLLO**
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUCHILLA BALDE DELANTERO INCLUYE TUERCAS Y TORNILLOS Y DESMONTE DE LA AVERIADA.	**ACTIVIDAD EN DESARROLLO**
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE CUCHILLA BALDE DELANTERO E INCLUYE DESMONTE DE CUCHILLA AVERIADA.	**ACTIVIDAD EN DESARROLLO**
CAMPERO CHEV. TROOPER	DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL ESTADO DE LA MÁQUINA/VEHÍCULO, INSPECCIÓN FÍSICA Y MECÁNICA, CONCEPTO TÉCNICO Y AVALÚO COMERCIAL O DE SALVAMENTO.	**ACTIVIDAD EN DESARROLLO**
VOLQUETA MB 1314	DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL ESTADO DE LA MÁQUINA/VEHÍCULO, INSPECCIÓN FÍSICA Y MECÁNICA, CONCEPTO TÉCNICO Y AVALÚO COMERCIAL O DE SALVAMENTO.	**ACTIVIDAD EN DESARROLLO**
CAMPERO DAIHATSU F75	DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL ESTADO DE LA MÁQUINA/VEHÍCULO, INSPECCIÓN FÍSICA Y MECÁNICA, CONCEPTO	**ACTIVIDAD EN DESARROLLO**

	TÉCNICO Y AVALÚO COMERCIAL O DE SALVAMENTO.	

Anexo (Evidencia fotográfica)

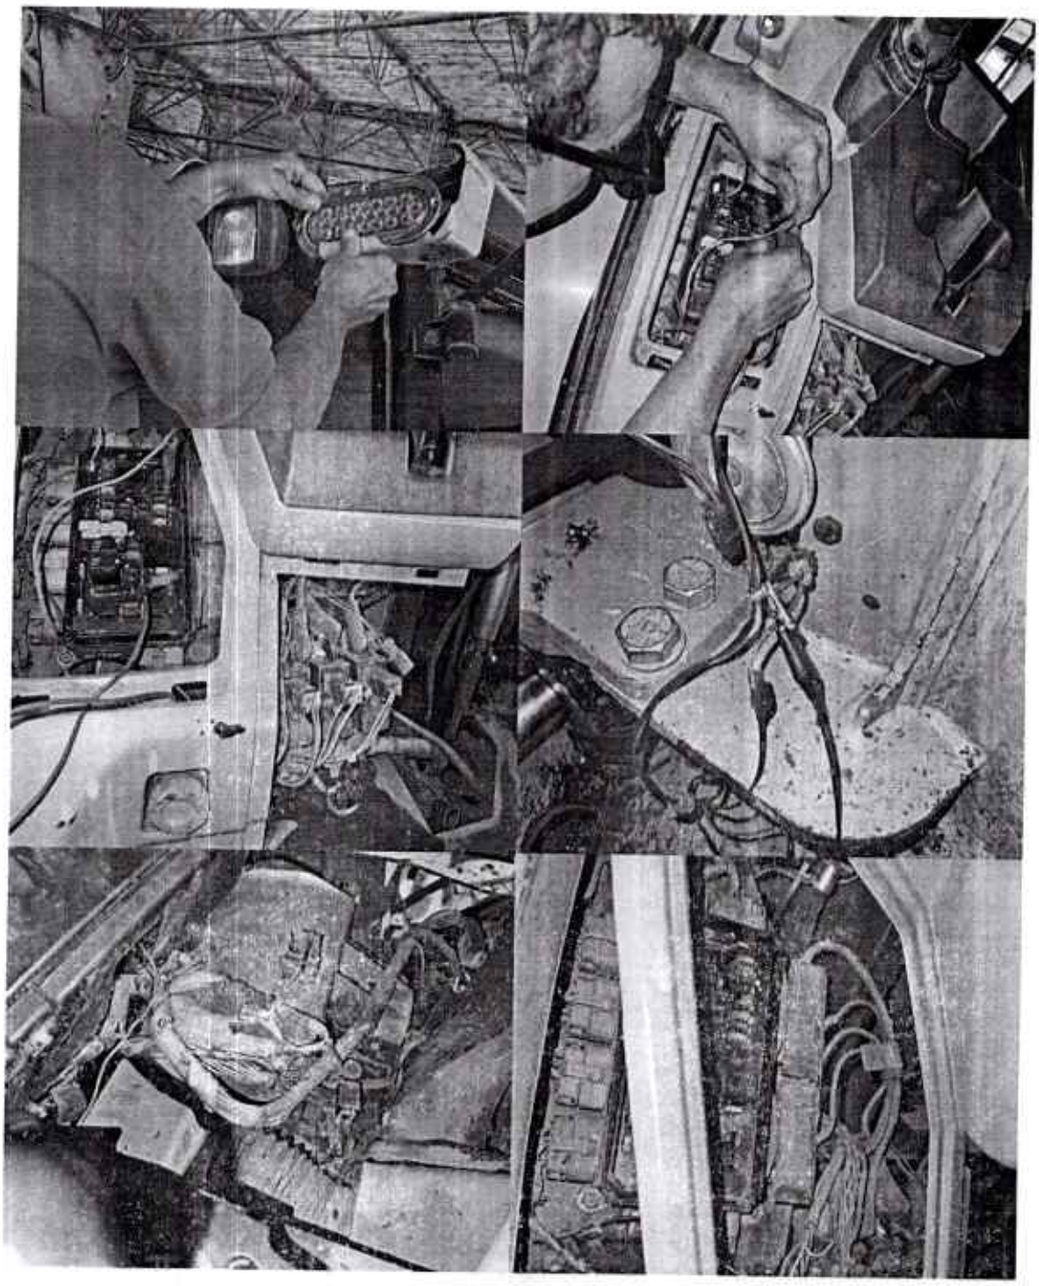

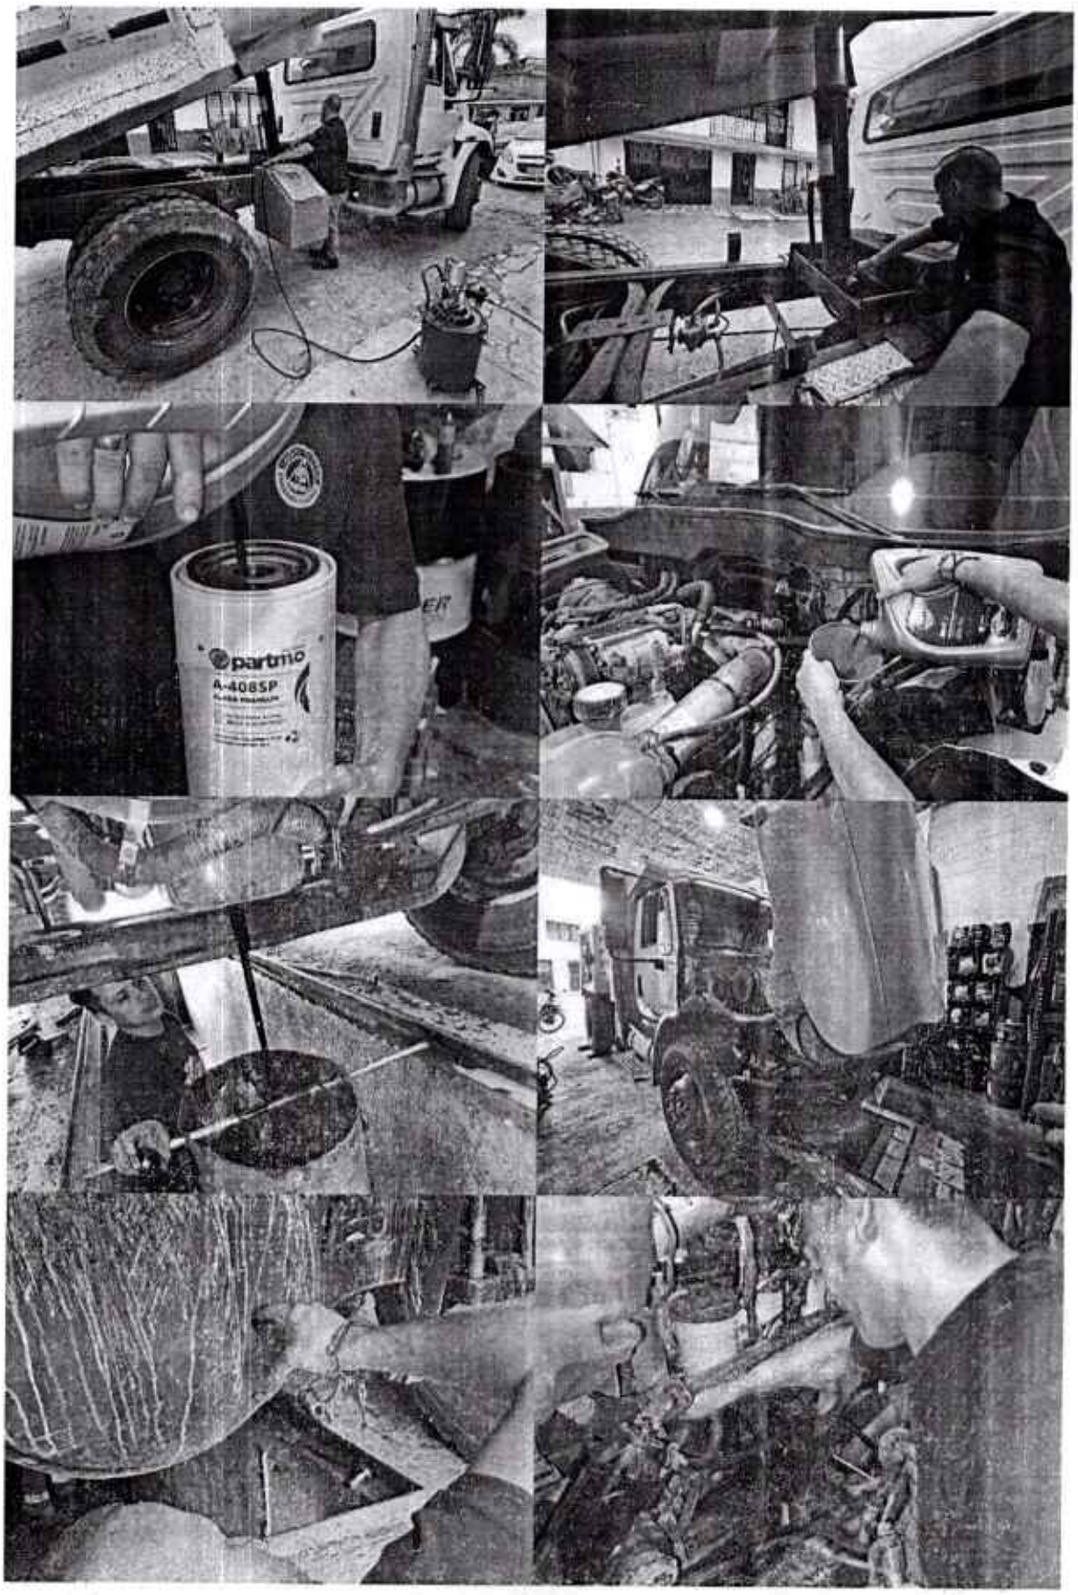
partmo
A-4085P

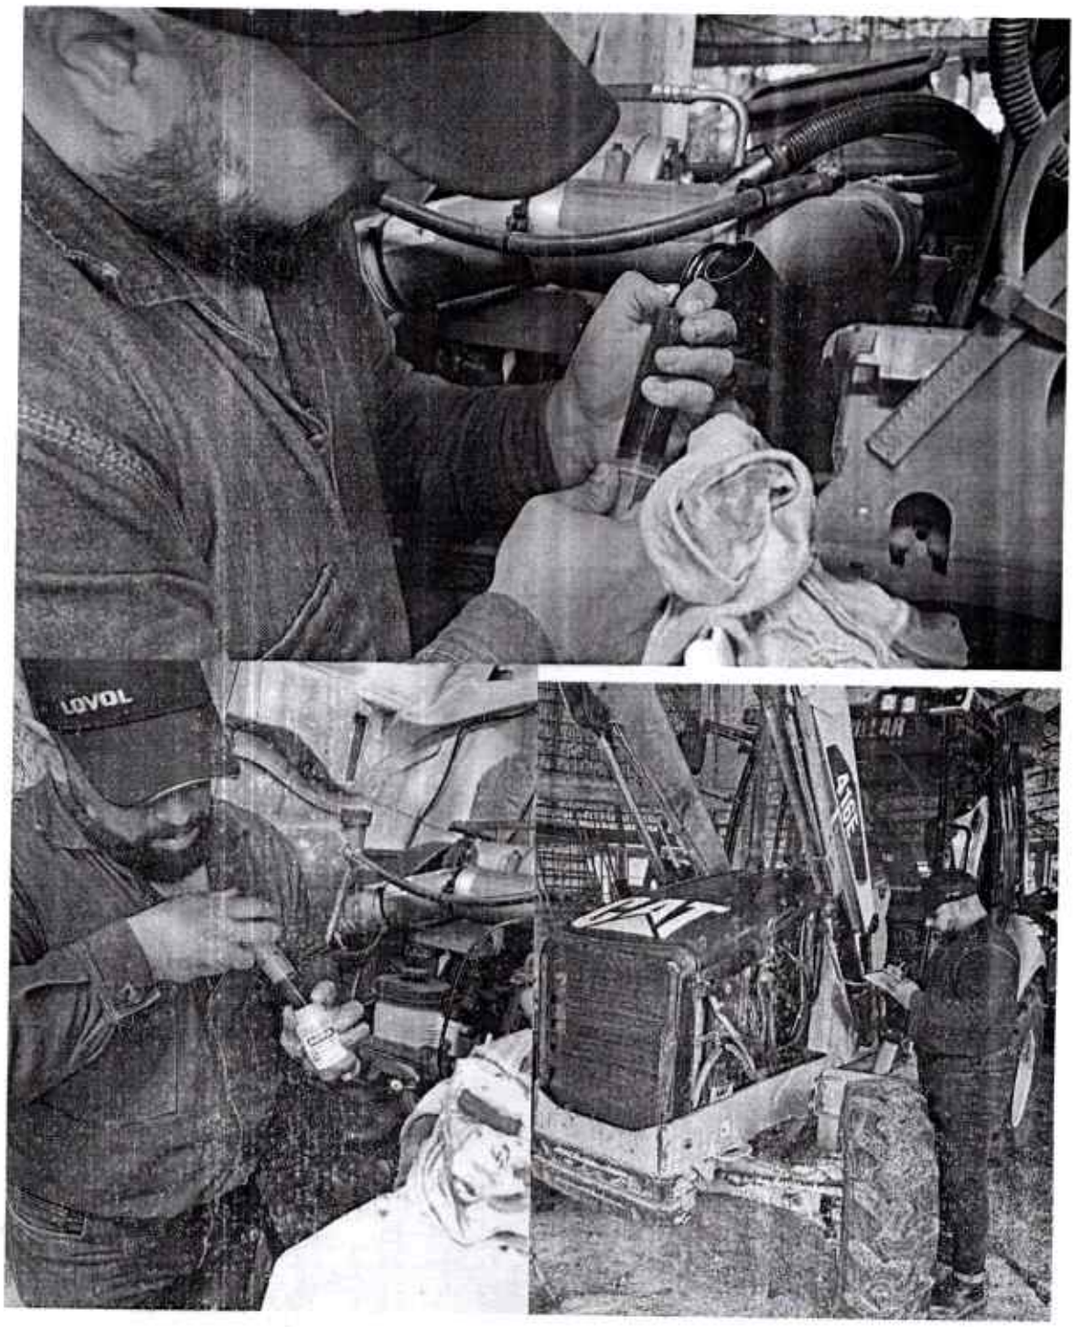
LOVOL
CAT


110022
ALTERNADOR MARELLI
CATERPILLAR 120A 12V

Cordialmente,



GALLEGO MESIAS KID GUSTAVO

Representante Legal TALLER INDUSTRIAL MECANIZADOS GALLEGOS S.A.S.

TALLER INDUSTRIAL MECANIZADOS GALLEGOS SAS
NIT. 901,141,394
SERVICIO DE TORNO, FRESA, PRENSA HIDRÁULICA, TALADRO RADIAL, SOLDADURAS Y OXICORTE

CUENTA DE COBRO #1

LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE RESTREPO

VALLE DEL CAUCA

NIT 891902191-2

DEBE A

TALLER INDUSTRIAL MECANIZADOS GALLEGOS SAS

NIT 901141394-1

LA SUMA DE:

VEINTIDOS MILLONES DE PESOS MTC ($22.000.000)

Por concepto de:
Oferta Mínima Cuantía No. PMC-055-2025 valor total $26.945.300
Con un valor de anticipo ($22.000.000) Veintidós millones de pesos mtc relacionados en la Factura #1008 con fecha del 23/12/2025.
Saldo a favor $4.945.300 Para constancia se firma el 23 diciembre 2025 Cordialmente,

Kid Gustavo Gallego Mesías
C.C.1115065813
Representante Legal

TALLER INDUSTRIAL MECANIZADOS GALLEGOS SAS

EQUIPO / ÍTEM	ACTIVIDAD / DESCRIPCIÓN	VALOR
TRACTOR KUBOTA L4400DT	DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL ESTADO DE LA MÁQUINA/VEHÍCULO, QUE COMPRENDE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, INSPECCIÓN FÍSICA Y MECÁNICA, EVALUACIÓN OPERATIVA, CONCEPTO TÉCNICO Y AVALÚO COMERCIAL O DE SALVAMENTO.	**$ 826.000**
RETROEXCAVADORA CAT 416 B	DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL ESTADO DE LA MÁQUINA/VEHÍCULO, QUE COMPRENDE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, INSPECCIÓN FÍSICA Y MECÁNICA, EVALUACIÓN OPERATIVA, CONCEPTO TÉCNICO Y AVALÚO COMERCIAL O DE SALVAMENTO.	**$ 933.380**
MOTONIVELADORA CAT 120 G	DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL ESTADO DE LA MÁQUINA/VEHÍCULO, QUE COMPRENDE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, INSPECCIÓN FÍSICA Y MECÁNICA, EVALUACIÓN OPERATIVA, CONCEPTO TÉCNICO Y AVALÚO COMERCIAL O DE SALVAMENTO.	**$ 1.165.840**
VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC	DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL ESTADO DE LA MÁQUINA/VEHÍCULO, QUE COMPRENDE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, INSPECCIÓN FÍSICA Y MECÁNICA, EVALUACIÓN OPERATIVA, CONCEPTO TÉCNICO Y AVALÚO COMERCIAL O DE SALVAMENTO.	**$ 826.000**
VOLQUETA INT. DURASTAR	DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL ESTADO DE LA MÁQUINA/VEHÍCULO, INSPECCIÓN FÍSICA Y MECÁNICA, EVALUACIÓN OPERATIVA Y CONCEPTO TÉCNICO.	**$ 826.000**
VOLQUETA INT. DURASTAR	CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTROS ORIGINALES, INCLUYE FILTROS DE AIRE, FILTROS DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE ACEITE.	**$ 1.711.000**
VOLQUETA INT. DURASTAR	CAMBIO ACEITE DIFERENCIAL.	**$ 542.800**
RETROEXCAVADORA CAT 416 E	DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL ESTADO DE LA MÁQUINA/VEHÍCULO, INSPECCIÓN FÍSICA Y MECÁNICA, EVALUACIÓN OPERATIVA, CONCEPTO TÉCNICO Y AVALÚO.	**$ 933.380**
	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS ORIGINALES, INCLUYE FILTROS DE AIRE, FILTROS DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE ACEITE.	**$ 2.159.400**
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUETADURA DE GEMELOS.	**$ 2.147.600**
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUCHILLA BALDE DELANTERO INCLUYE TUERCAS Y TORNILLOS Y DESMONTE DE LA AVERIADA.	**$ 2.383.600**

TALLER INDUSTRIAL MECANIZADOS GALLEGOS SAS

	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE CUCHILLA BALDE DELANTERO E INCLUYE DESMONTE DE CUCHILLA AVERIADA.	$	1.368.800
	INSPECCION Y CORRECION DEL SISTEMA ELECTRICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA, CORRECCION DE CORTO Y AISLAMIENTO EN CAJA DE FUSIBLES, REPARACION DE CABLEADO, INSTALACION Y SUMINISTRO DE LUCES Y ESTACIONACIONARIAS FRONTALES, INSTALACION Y SUMINISTRO DE LUCES POSTERIORES, INSTALACION Y SUMINISTRO DE PITO FRONTAL Y POSTERIOR, INSTALACION Y SUMINISTRO DE SIRENA DE RETROCESO, INSPECCION Y CORRECCION DE AISLAMIENTO ECU	$	3.698.200
CAMPERO CHEV. TROOPER	DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL ESTADO DE LA MÁQUINA/VEHÍCULO, INSPECCIÓN FÍSICA Y MECÁNICA, CONCEPTO TÉCNICO Y AVALÚO COMERCIAL O DE SALVAMENTO.	$	826.000
VOLQUETA MB 1314	DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL ESTADO DE LA MÁQUINA/VEHÍCULO, INSPECCIÓN FÍSICA Y MECÁNICA, CONCEPTO TÉCNICO Y AVALÚO COMERCIAL O DE SALVAMENTO.	$	826.000
CAMPERO DAIHATSU F75	DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL ESTADO DE LA MÁQUINA/VEHÍCULO, INSPECCIÓN FÍSICA Y MECÁNICA, CONCEPTO TÉCNICO Y AVALÚO COMERCIAL O DE SALVAMENTO.	$	826.000
	TOTAL	$	**22.000.000**

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FEG1008

FECHA DE EMISIÓN: 2025-12-23 14:37:37-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-12-23 14:38:01

FEC.VEN: **2025-12-23**

Nº.Resolución: 18764102929999 **Prefijo:** FEG **Consecutivo:** 1001 hasta 5000 **Fecha** 2025-12-11 Hasta 2027-12-11 **Vigencia** 24 Meses

Datos del Emisor

Razón Social/Nombre:
TALLER INDUSTRIAL MECANIZADOS GALLEGOS S.A.S.

CC/NIT: 901141394-1

Responsabilidad: No aplica – Otros / No responsable de IVA

Dirección:
CL 1 2 03-Valle del Cauca-Yotoco-CO

Teléfonos: 3104506940

Contacto:

E-mail: gallegos@mecanizadosgallegos.com

Datos del Adquiriente

Razón Social/Nombre:
MUNICIPIO DE RESTREPO

CC/NIT: 891902191-2

Actividad Económica:

Dirección:
CRA 11 # 9-47-Valle del Cauca-Restrepo-CO

Teléfonos: 602-2521198

E-mail: hacienda@restrepo-valle.gov.co

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	RES1/23/12/2025	1.00	UND	DIAGNOSTICO TECNICO MAQ TRACTOR KUBOTA L4400DT	694,117.65	IVA	19.00	131,882.35		826,000.00
2	RES2/23/12/2025	1.00	UND	DIAGNOSTICO TECNICO MAQ RETROEXCABADORA CAT 416 B	784,352.94	IVA	19.00	149,027.06		933,380.00
3	RES3/23/12/2025	1.00	UND	DIAGNOSTICO TECNICO MAQ MOTONIVELADORA CAT 120 G	979,697.48	IVA	19.00	186,142.52		1,165,840.00
4	RES4/23/12/2025	1.00	UND	DIAGNOSTICO TECNICO MAQ VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC	694,117.65	IVA	19.00	131,882.35		826,000.00
5	RES5/23/12/2025	1.00	UND	DIAGNOSTICO TECNICO MAQ VOLQUETA INT DURASTAR	694,117.65	IVA	19.00	131,882.35		826,000.00
6	RES6/23/12/2025	1.00	UND	CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTROS VOLQUETA INT DURASTAR	1,437,815.13	IVA	19.00	273,184.87		1,711,000.00
7	RES7/23/12/2025	1.00	UND	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL VOLQUETA INT DURASTAR	456,134.45	IVA	19.00	86,665.55		542,800.00
8	RES8/23/12/2025	1.00	UND	DIAG TEC MAQUINA RETROEXCAVADORA CAT 416E	784,352.94	IVA	19.00	149,027.06		933,380.00
9	RES9/23/12/2025	1.00	UND	CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTROS RETROEXCAVADORA CAT 416E	1,814,621.85	IVA	19.00	344,778.15		2,159,400.00
10	RES10/23/12/2025	1.00	UND	SUMINISTRO E INST EMPAQUETADURA DE GEMELOS RETROEXCAVADORA CAT 416E	1,804,705.88	IVA	19.00	342,894.12		2,147,600.00
11	RES11/23/12/2025	1.00	UND	SUMINISTRO INSTALACION CUCHILLA BALDE DELANTERO RETROEXCAVADORA CAT 416 E	2,003,025.21	IVA	19.00	380,574.79		2,383,600.00
12	RES12/23/12/2025	1.00	UND	SUMINISTRO E INST BASE CUCHILLA BASE DELANTERA RETROEXCAVADORA CAT 416E	1,150,252.10	IVA	19.00	218,547.90		1,368,800.00
13	RES13/23/12/2025	1.00	UND	INSP Y CORRECION SISTEMA ELÉCTRICO, BATERIA, PITO FRONTAL Y PST RETROEXCAVADORA CAT 416E	3,107,731.09	IVA	19.00	590,468.91		3,698,200.00
14	RES14/23/12/2025	1.00	UND	DIAGNOSTICO TECNICO MAQ CAMPERO CHEV TROOPER	694,117.65	IVA	19.00	131,882.35		826,000.00
15	RES15/23/12/2025	1.00	UND	DIAGNOSTICO TECNICO MAQ VOLQUETA MB1314	694,117.65	IVA	19.00	131,882.35		826,000.00
16	RES16/23/12/2025	1.00	UND	DIAGNOSTICO TECNICO MAQ CAMPERO DAIHATSU F75	694,117.65	IVA	19.00	131,882.35		826,000.00

Total Items 16 **TOTAL en letras: veintiuno millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve con cien COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	18,487,394.97	3,512,605.03

Totales	
SUBTOTAL:	18,487,394.97
Base Imponible:	18,487,394.97
IVA	3,512,605.03
TOTAL:	22,000,000.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Contado	Efectivo	2025-12-23	891902191

Nota

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FEG1008

FECHA DE EMISIÓN: 2025-12-23 14:37:37-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-12-23 14:38:01

FEC.VEN: **2025-12-23**

Nº.Resolución: 18764102929999 **Prefijo:** FEG **Consecutivo:** 1001 hasta 5000 **Fecha** 2025-12-11 Hasta 2027-12-11 **Vigencia** 24 Meses

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: 2a80a8b1ebe4aa9b571712b002377ddabe78b1cce07a4acd24c48c9c82990767a2ef05949859dabedae80b9323bbec8c

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: VALTIA

Documento Generado por CADENA S.A. N.I.T. 890.930.534-0

TALLER INDUSTRIAL MECANIZADOS GALLEGOS SAS
NIT. 901,141,394
SERVICIO DE TORNO, FRESA, PRENSA HIDRÁULICA, TALADRO RADIAL,
SOLDADURAS Y OXICORTE

FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

KID GUSTAVO GALLEGO MESIAS identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.115.065.813 en mi condición de Representante Legal de TALLER MECANIZADOS GALLEGOS S.A.S identificada con NIT 901.141.394-1, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Parágrafo; la empresa se encuentra beneficiada con la exención del pago de salud en la porción correspondiente a la empresa, ICBF Y SENA, según lo estipula el Art 114-ET

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.La presente se expide a los veintitrés (23) días del mes de diciembre (12) de 2025, en Yotoco, Valle del Cauca.

GALLEGO MESIAS KID GUSTAVO

Representante Legal TALLER INDUSTRIAL MECANIZADOS GALLEGOS S.A.S.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901141394	1	TALLER INDUSTRIAL MECANISADOS GALLEGOS	9 - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOTOCO	CALLE 1 2 67	YOTOCO-VALLE	3044330404	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION


Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias mora	Valor
2025-11	2025-12	2026409047	94946288	E	2025/12/23	2025/12/22	BANCOLOMBIA	0	$3,681,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES


| EMPLEADO | | | | | | | | | | APORTES | | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

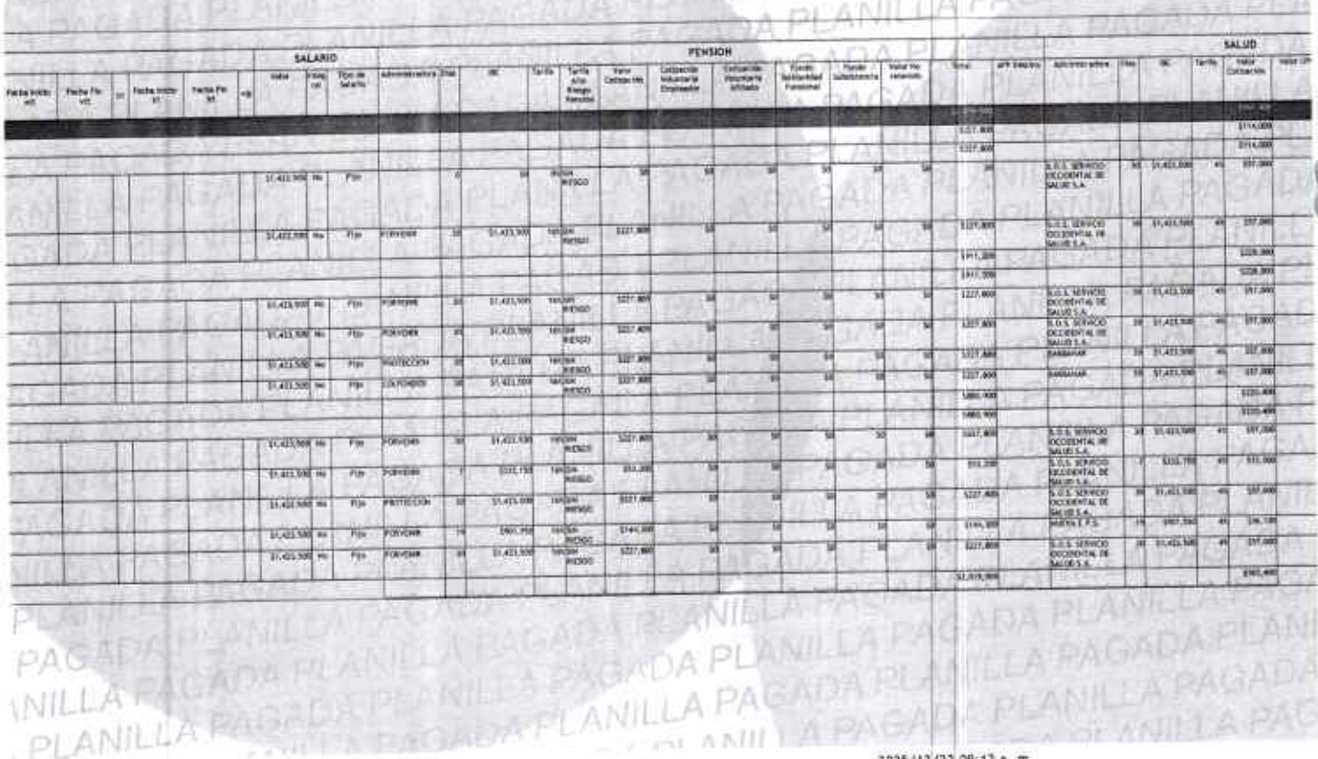

| | | |

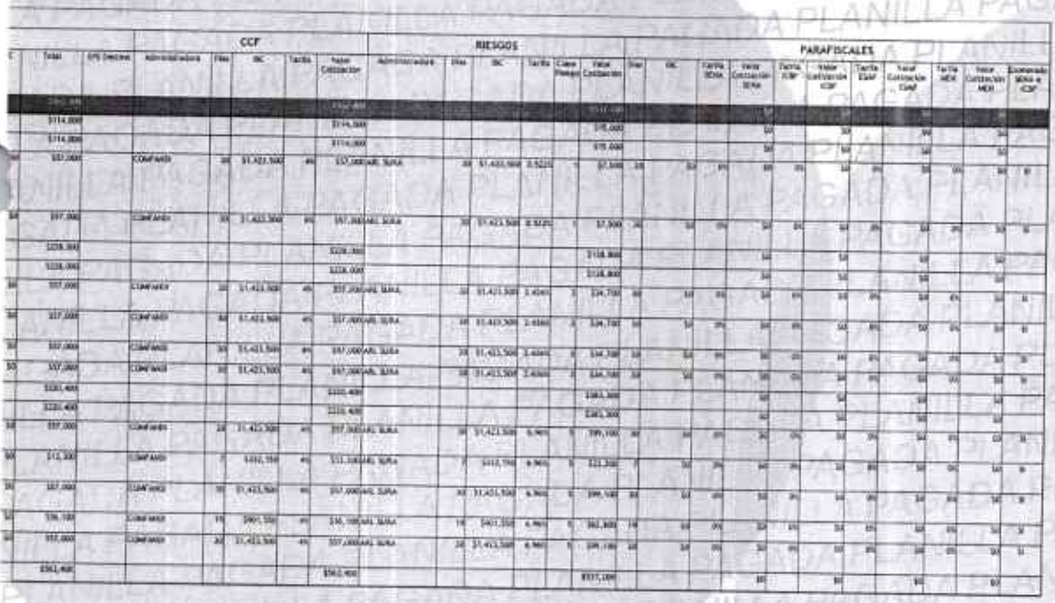

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	SYS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa CCF	Valor Cotización CCF	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$161,400						$161,400						$111,100				$0		$0		$0		$0	
	$114,000						$114,000						$78,000				$0		$0		$0		$0	
	$114,000						$114,000						$78,000				$0		$0		$0		$0	
	$37,000		COMFAMA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	0.522%	1	$7,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
	$37,000		COMFAMA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	0.522%	1	$7,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
	$228,000						$228,000						$158,000				$0		$0		$0		$0	
	$228,000						$228,000						$158,000				$0		$0		$0		$0	
	$57,000		COMFAMA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	2.436%	3	$34,700	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
	$57,000		COMFAMA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	2.436%	3	$34,700	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
	$57,000		COMFAMA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	2.436%	3	$34,700	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
	$57,000		COMFAMA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	2.436%	3	$34,700	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
	$380,400						$380,400						$363,300				$0		$0		$0		$0	
	$380,400						$380,400						$363,300				$0		$0		$0		$0	
	$57,000		COMFAMA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
	$12,300		COMFAMA	7	$442,750	4%	$17,700	ARL SURA	7	$442,750	6.96%	5	$23,000	7	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
	$57,000		COMFAMA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
	$36,100		COMFAMA	19	$901,550	4%	$36,100	ARL SURA	19	$901,550	6.96%	5	$62,800	19	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
	$57,000		COMFAMA	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
	$561,400						$561,400						$377,100				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901141394	1	TALLER INDUSTRIAL MECANIZADOS BALLESTEROS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOTOCO	CALLE 1 3 03	YOTOCO-VALLE	3044586694	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	352840947	644438838	E	2025/12/13	2025/12/22	BANCOLOMBIA	0	$3,681,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$2,019,900	$0	$0	$2,019,900
COLFONDOS	230001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,336,500	$0	$0	$1,336,500
PROTECCION	230501	800,229,739	0	2	$455,600	$0	$0	$455,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$537,100	$0	$0	$537,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$537,100	$0	$0	$537,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$562,400	$0	$0	$562,400
COMFAMA	CCF57	890,303,208	5	11	$562,400	$0	$0	$562,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$562,400	$0	$0	$562,400
EMSANAR	ESS018	901,021,565	8	2	$114,000	$0	$0	$114,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$36,100	$0	$0	$36,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	8	$412,300	$0	$0	$412,300
TOTAL				11	$3,681,800	$0	$0	$3,681,800

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2025/12/22 09:12 a. m.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.115.065.813
APELLIDOS GALLEGO MESIAS
NOMBRES KID GUSTAVO
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 18-ABR-1987
BUGA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.71 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO
02-MAY-2005 BUGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO
P-3102200-0139215-M-1115065813-20050801 05963 06212A 02 19850230

Certificado
Bancario

Jueves, 6 de noviembre de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que TALLER INDUSTRIAL MECANIZADOS GALLEGOS S identificado(a) con NIT 901141394, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	84886879171	2017/12/28	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE RESTREPO

Nit: 891902191

COMPROBANTE DE EGRESO

COMPROBANTE No 0002517

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	24	12	202

A favor de : TALLER INDUSTRIAL ME CANIZADOS GALL **Cédula o NIT : 901141394**

Concepto : CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA A CARGO DEL MUNICIPIO DE RESTREPO VALLE.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0002964	22,000,000.00	2,125,740.00	1,267,000.00	18,607,260.00
TOTALES :	22,000,000.00	2,125,740.00	1,267,000.00	18,607,260.00

NOTA Nro. : 00001031 **BANCO :** 2056 Bfe. 1583-6 Proposito General SGP 18,607,260.0(

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-00	-	111005-22	-	18,607,260.00

BENEFICIARIO:

TALLER INDUSTRIAL ME CANIZADOS GALL
901141394

SECRETARIA DE HACIENDA

ELA

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2025 CIM Ltda.

TOTAL NETO A PAGAR : 18,607,260.00000

LUIS EDILMER ORTEGA MENESES
ALCALDE MUNICIPAL

DIANA LILIANA DESCANCE RESTREPO
SECRETARIA DE HACIENDA

219

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) MARIA FERNANDA VELASQUEZ RAIGOZA
NIT 8919021912 - MUNICIPIO DE RESTREPO

martes 6 de enero de 2026

Consulta Estado de Pago de Proveedores

N° Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo de Rechazo
10046727	901141394	TALLER INDUSTRIAL MECANIZADOS GALLEGO	24/12/2025	24/12/2025	3100824020418714	Cuenta Corriente	0000000115015836	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	84886879171	BANCOLOMBIA	$ 18.607.260,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial
