INFORME MENSUAL N° 01
(25 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2025)

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. CONVENIO MP039 DE 2025

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE DIFERENTES TRAMOS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LOS SECTORES LLANO GRANDE, TOIBITA, PABLO SOLANO, BONZA Y CANAL CARTAGENA, UBICADOS EN LAS ZONAS RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONVENIO 4

2. RELACION ASPECTOS JURIDICOS 6

2.1 POLIZAS DEL CONVENIO 6

3 RELACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO POR LA EMPRESA 7

4 RELACIÓN DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL 8

5. LOCALIZACIÓN 10
5.1 LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA VÍAS A INTERVENIR 10

6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO 12
6.1 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 15

7. CANTIDADES EJECUTADAS 20

8. OBSERVACIONES 24

INTRODUCCIÓN

La ejecución del presente proyecto se desarrolla en el marco del Convenio Interadministrativo N° 039 de 2025, suscrito entre el Municipio de Paipa y la Empresa Red Vital Paipa S.A. E.S.P., cuyo objeto consiste en aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y operativos para la construcción y ampliación de diferentes tramos de redes de alcantarillado sanitario y pluvial en los sectores Llano Grande, Toibita, Pablo Solano, Bonza y Canal Cartagena, ubicados en las zonas urbana y rural del municipio de Paipa, departamento de Boyacá.

El convenio tiene como propósito fortalecer la infraestructura de saneamiento básico del municipio mediante la optimización de redes existentes que presentan condiciones de deterioro estructural, insuficiencia hidráulica y limitaciones operativas, así como ampliar la cobertura del servicio para responder al crecimiento urbano y a las necesidades actuales de la población. Estas intervenciones se desarrollan a través de la articulación institucional entre la administración municipal y el prestador del servicio público domiciliario, orientadas al mejoramiento de las condiciones de salubridad pública, sostenibilidad ambiental y calidad de vida de las comunidades beneficiarias.

El presente documento corresponde al Primer Informe de Avance de Obra del Convenio Interadministrativo N° 039 de 2025, el cual consolida las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 25 de noviembre de 2025 al 24 de diciembre de 2025, en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas. El informe tiene como finalidad presentar las actividades desarrolladas durante el periodo reportado, así como el avance físico, técnico y administrativo alcanzado en la etapa inicial de ejecución.

En el marco del convenio se contempla la intervención de doce (12) tramos de redes de alcantarillado sanitario y pluvial, mediante obras de reposición y construcción nueva que en conjunto suman aproximadamente seis (6) kilómetros de infraestructura, beneficiando de manera directa a cerca de cuatrocientas veinte (420) familias distribuidas en distintos sectores del municipio. Durante el periodo evaluado se adelantaron principalmente actividades preliminares, procesos de planeación y organización técnica, socialización con la comunidad, alistamiento operativo y demás acciones necesarias para garantizar el inicio adecuado de las obras proyectadas.

El presente informe constituye un instrumento técnico de seguimiento y control que permite evidenciar el avance del proyecto frente a las metas establecidas, asegurando la trazabilidad de las actividades ejecutadas y el cumplimiento de los lineamientos técnicos, contractuales y normativos aplicables al sector de saneamiento básico. La ejecución progresiva de estas obras representa un avance significativo en el fortalecimiento de la infraestructura de alcantarillado del municipio de Paipa, contribuyendo a la protección de los recursos hídricos, la reducción de impactos ambientales y el mejoramiento integral del servicio para las comunidades urbanas y rurales beneficiadas.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONVENIO

TIPO DE CONTRATO/CONVENIO:	OBRA	
CONTRATO No. Y FECHA:	CONV MP 039 2025	07 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PAIPA NIT 891.801.240-1 R/L GERMAN RICARDO CAMACHO BARRERA C.C. No. 80.470.658	
CONTRATISTA:	RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. NIT 900.259.348-5 R/L YEISON ROKNEY TORRES SUAREZ C.C. No. 1.053.611.160	
SUPERVISOR:	JORGE EDWIN LÓPEZ TORREZ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPIO DE PAIPA	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE DIFERENTES TRAMOS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LOS SECTORES LLANO GRANDE, TOIBITA, PABLO SOLANO, BONZA Y CANAL CARTAGENA, UBICADOS EN LAS ZONAS RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	
APORTE RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.	$ 764.870.788,[79]	
APORTE MUNICIPIO	$ 1.329.278.260,[44]	
VALOR TOTAL:	$ 2.094.149.049,[23]	
FORMA DE DESEMBOLSO:	Los aportes a transferir por parte del MUNICIPIO a RED VITAL, por concepto del presente convenio interadministrativo serán transferidos una vez suscrita el acta de inicio; siendo en todo caso necesario el desarrollo de las siguientes actividades:	
	Primer desembolso: equivalente al cuarenta por ciento (40 %), que se efectuará una vez el Convenio se encuentre debidamente perfeccionado y legalizado, y se haya suscrito el Acta de Inicio, los recursos serán girados a la cuenta bancaria establecida previa firma del acta de inicio.	

	Segundo desembolso: equivalente al cuarenta por ciento (40 %) del valor total del aporte, el cual se efectuará previa presentación y aprobación, por parte del Supervisor del Convenio, del informe de avance que acredite la ejecución del ochenta por ciento (80 %) de las actividades programadas, junto con los soportes técnicos, financieros y administrativos que demuestren la efectiva realización de las mismas y su verificación y conformidad por parte de la supervisión.
	Tercer y último desembolso: equivalente al veinte por ciento (20%) restante, que se efectuará una vez RED VITAL presente el informe final de ejecución y la correspondiente acta de liquidación, acompañado de los documentos soporte, la relación de gastos debidamente justificados, previa aprobación del Supervisor del Convenio.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO:	2.45%
PORCENTAJE DE DESEMBOLSO:	0%
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA ACTA DE INICIO:	25 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE MAYO DE 2026



2. RELACION ASPECTOS JURIDICOS

A continuación, se relacionan, las pólizas del CONV MP 039 2025 expedidas por seguros del estado S.A con sus respectivas actualizaciones, así mismo la relación del seguimiento jurídico y legal del contrato bajo las siguientes consideraciones

2.1 POLIZAS DEL CONVENIO

Pólizas Iniciales del convenio

Póliza de Seguro de cumplimiento entidad estatal No. 39-44-101177343 anexo 0			
Aprobada mediante acta de aprobación de pólizas de fecha 14/11/2025			
AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		Desde (DD/MM/AA)	Hasta (DD/MM/AA)
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 209.414.904.92	07/11/2025	10/11/2026
PAGO SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	$ 104.707.452.46	07/11/2025	10/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 418.829.809.85	SI AMPARA 5 AÑOS 0 MESES Y 0 DÍAS	

Póliza de Seguro de responsabilidad civil extracontractual derivadas de cumplimiento RCE CONTRATOS No. 39-40-101046621 anexo 0			
Aprobada mediante acta de aprobación de pólizas de fecha 14/11/2025			
AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		Desde (DD/MM/AA)	Hasta (DD/MM/AA)
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$ 427.050.000	07/11/2025	10/11/2026
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 427.050.000	07/11/2025	10/05/2026
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 427.050.000	07/11/2025	10/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	$ 427.050.000	07/11/2025	10/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	$ 427.050.000	07/11/2025	10/05/2026
GASTOS MÉDICOS	$ 427.050.000	07/11/2025	10/05/2026
DAÑO EMERGENTE Y	$ 427.050.000	07/11/2025	10/05/2026

LUCRO CESANTE			
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	$ 427.050.000	07/11/2025	10/05/2026

2.2 DOCUMENTOS LEGALES DEL CONVENIO

Se realiza la relación correspondiente a las diferentes modificaciones y/o actualizaciones que se legales que se han realizado al convenio tales como actas de inicio

Estado legal del CONV MP 039 2025:

No	Objeto	Fecha de firma
1	Suscripción del convenio	07/11/2025
2	Acta de Inicio	25/11/2025

3 RELACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO POR LA EMPRESA

El personal utilizado en la ejecución del contrato se relaciona en el siguiente cuadro: El personal solicitado según el pliego de condiciones o términos de referencia son:

CARGO	% DE DEDICACIÓN	NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE INGRESO	FECHA DE TERMINACIÓN
Director de obra	100%	María Amalfi Valderrama López	23856977	25-11-2025	24-05-2026
Residente de obra	100%	David Felipe Puentes Fuentes	1002647527	25-11-2025	24-05-2026
Residente SG-SST	50%	Amaury Amet Varela Patarroyo	4192656	25-11-2025	30-11-2026
Residente SG-SST	50%	Andrew Masami Asakura García	1053605825	01-12-2025	30-01-2026
Oficial de Obra	100%	Luis Alberto Camargo Avella	4192865	25-11-2025	24-05-2026
Oficial de Obra	100%	Hernando Monroy Rodríguez	4192776	25-11-2025	24-05-2026
Oficial de Obra	100%	Edilberto Monroy Rodríguez	4192455	25-11-2025	24-05-2026
Conductor	20%	Yovany Tibata Jiménez	1053610862	25-11-2025	24-05-2026

4 RELACIÓN DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, laborales y legales aplicables a la ejecución del Convenio Interadministrativo N° 039 de 2025, el contratista de obra garantiza la afiliación y el pago oportuno de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del personal vinculado a las actividades del proyecto.

Durante el periodo comprendido entre el 25 de noviembre de 2025 al 24 de diciembre de 2025, se efectuaron los aportes correspondientes a salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales, conforme a lo establecido en la normatividad vigente y en las disposiciones contractuales aplicables a la ejecución de obras públicas.

El personal relacionado con la ejecución del convenio, cuya identificación y funciones se presentan en el ítem anterior del presente informe, cuenta con afiliación activa al Sistema de Seguridad Social Integral, garantizando condiciones adecuadas de protección laboral y cumplimiento de las obligaciones del empleador frente a la seguridad social de los trabajadores y contratistas que intervienen en la obra.

Como soporte del cumplimiento de dichas obligaciones, al final del presente informe se anexan las planillas de pago de seguridad social correspondientes al personal vinculado para la ejecución del avance de obra de la empresa, así como las planillas del residente de obra contratado por prestación de servicios, las cuales evidencian el pago efectivo de los aportes durante el periodo reportado.

Lo anterior se realiza en concordancia con la normativa laboral vigente y los lineamientos establecidos para la ejecución contractual en materia de seguridad social y protección del talento humano vinculado al proyecto.

En el siguiente cuadro se relaciona la relación de pago de seguridad social de los trabajadores de la empresa y planillas de pago de seguridad social del Residente de Obra. A continuación, se relaciona los pagos del período, a saber:

RELACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL					
CARGO	IBC	NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	N° DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
PERIODO: NOVIEMBRE DEL 2025					
Director de obra	$ 3.332.627	María Amalfi Valderrama López	23856977	9495763638	1/12/2025
Residente de obra	$ 1.423.500	David Felipe Puentes Fuentes	1002647527	35287888	03/12/2025
Residente SG-SST	$ 1.423.500	Amaury Amet Varela Patarroyo	4192656	91535712	27/11/2025
Oficial de Obra	$ 1.953.371	Luis Alberto Camargo Avella	4192865|	9495763638	1/12/2025
Oficial de Obra	$ 1.861.267	Hernando Monroy Rodríguez	4192776	9495763638	1/12/2025
Oficial de Obra	$ 1.495.744	Edilberto Monroy Rodríguez	4192455	9495763638	1/12/2025
Conductor	$2.114.554	Yovany Tibata Jiménez	1053610862	9495763638	1/12/2025
PERIODO: DICIEMBRE DEL 2025					
Director de obra	$ 3.332.627	María Amalfi Valderrama López	23856977	9497698938	08/01/2026
Residente de obra	$ 1.423.500	David Felipe Puentes Fuentes	1002647527	35593289	06/01/2026
Residente SG-SST	$3.131529	Andrew Masami Asakura García	1053605825	9497698938	08/01/2026
Oficial de Obra	100%	Luis Alberto Camargo Avella	4192865	9497698938	08/01/2026
Oficial de Obra	100%	Hernando Monroy Rodríguez	4192776	9497698938	08/01/2026
Oficial de Obra	100%	Edilberto Monroy Rodríguez	4192455	9497698938	08/01/2026
Conductor	20%	Yovany Tibata Jiménez	1053610862	9497698938	08/01/2026


Anexo 1 planilla seguridad social mes de noviembre 2025

Anexo 2 planilla seguridad social mes de diciembre 2025

5. LOCALIZACIÓN

El proyecto se localiza en el municipio de Paipa, ubicado en la región centro-oriental del país y en el sector noroccidental del departamento de Boyacá, dentro de la provincia de Tundama, sobre la Cordillera Oriental de Colombia, a una altitud aproximada de 2.525 m s. n. m. Las intervenciones se desarrollan tanto en zona urbana como rural, en áreas priorizadas por sus condiciones operativas y por la necesidad de optimizar y ampliar la infraestructura existente de saneamiento básico, contribuyendo al fortalecimiento del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial del municipio.


Figura 1. Localización del municipio de Paipa

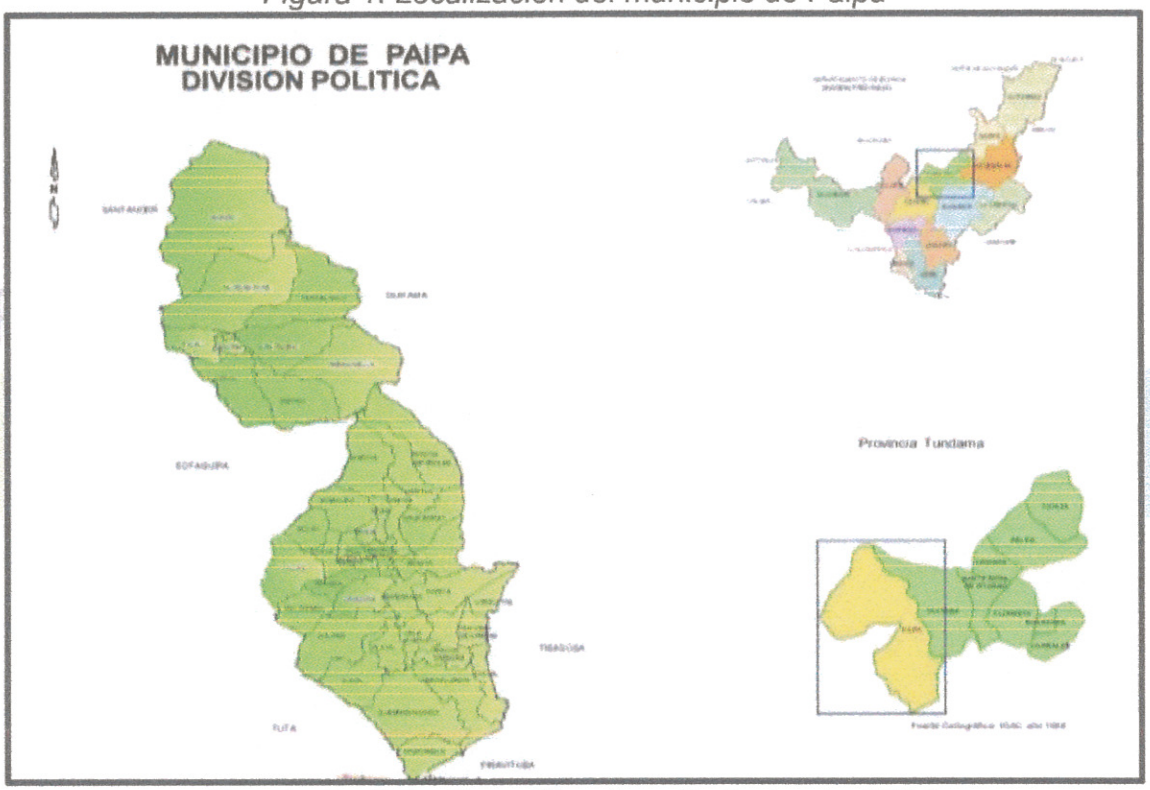

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC

5.1 LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA VÍAS A INTERVENIR

Aunque el convenio contempla la ejecución de diferentes frentes de obra distribuidos estratégicamente en el territorio municipal, durante el periodo comprendido entre el 25 de noviembre de 2025 al 24 de diciembre de 2025 las actividades constructivas se concentraron exclusivamente en el frente correspondiente al alcantarillado sanitario Llano Grande – Calle 14.

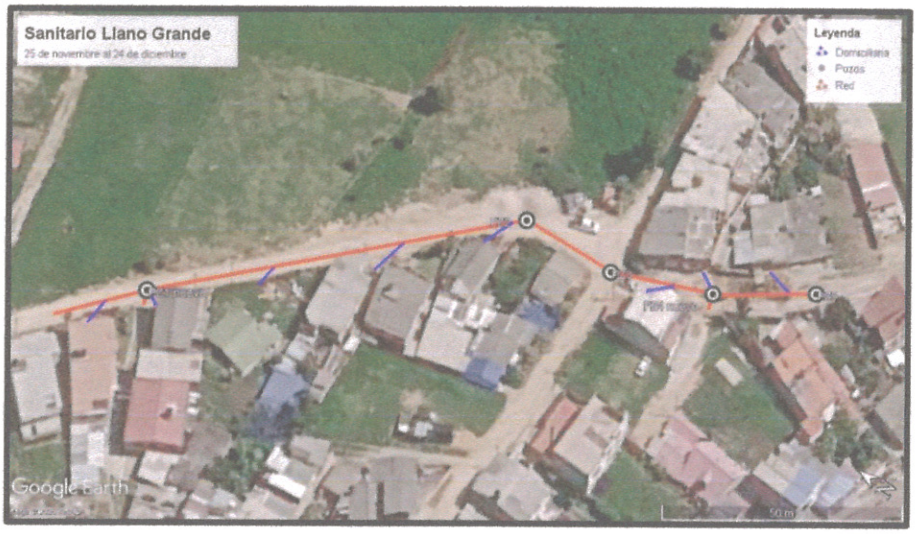

DESARROLLO DEL CONVENIO

El presente informe describe el desarrollo y ejecución de las actividades de obras enunciadas dentro del objeto contractual contenido en el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 039 DE 2025, suscrito entre el Municipio de Paipa y la Empresa de Servicios Públicos Red Vital Paipa S.A. E.S.P. Se interviene el tramo de alcantarillado sanitario Llano Grande (Calle 14) sobre la diagonal 11A de la vía que limita con la vereda El Rosal y Llano Grande.

Este sector fue priorizado para el inicio de las intervenciones debido a que esta red había cumplido con su vida útil, las condiciones operativas identificadas en la red existente, relacionadas con su estado estructural y capacidad hidráulica, así como por la necesidad de mejorar la conducción adecuada de las aguas residuales y garantizar la correcta prestación del servicio de alcantarillado sanitario a la población beneficiaria.

Las actividades ejecutadas en este frente constituyen la etapa inicial de implementación del convenio, permitiendo el alistamiento técnico, operativo y constructivo para el desarrollo progresivo de los demás tramos contemplados dentro del alcance contractual.

Adicionalmente, durante el desarrollo del convenio se realizaron tres (3) comités técnicos: el **10 de noviembre de 2025**, Comité Cero para definición de compromisos previos al perfeccionamiento contractual; el **14 de noviembre de 2025**, comité previo al Acta de Inicio; y el **27 de noviembre de 2025**, comité de socialización del cronograma, en el cual se realizaron observaciones técnicas y se priorizaron tramos de intervención.

6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO

Durante el periodo comprendido entre el 25 de noviembre de 2025 al 24 de diciembre de 2025, las actividades ejecutadas en el marco del Convenio Interadministrativo N° 039 de 2025 estuvieron orientadas al inicio administrativo, social, técnico y constructivo del proyecto, concentrándose exclusivamente en el frente correspondiente al alcantarillado sanitario Llano Grande – Calle 14.

El día 25 de noviembre de 2025 se suscribió el Acta de Inicio, dando apertura formal a la ejecución contractual. Posteriormente, el 26 de noviembre de 2025, se elaboró el cronograma general de obra por parte de la Empresa Red Vital Paipa S.A. E.S.P., estableciendo la programación inicial de las actividades. El 27 de noviembre de 2025 se llevó a cabo comité de obra en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura Municipal, en el cual se socializó el cronograma, se realizaron ajustes a la programación y se establecieron compromisos técnicos y operativos entre las partes, definiéndose además la realización de la socialización comunitaria del proyecto.

El 28 de noviembre de 2025 se programó la primera reunión con la comunidad; sin embargo, debido a condiciones climáticas adversas no fue posible su desarrollo, siendo reprogramada para el 01 de diciembre de 2025, fecha en la cual se realizó la socialización del proyecto con los habitantes del sector Llano Grande – Calle 14. Durante esta jornada se expusieron el alcance de las intervenciones, metodología constructiva, tiempos estimados de ejecución y medidas de manejo durante la obra, atendiendo igualmente las inquietudes manifestadas por la comunidad y dejando registro de asistencia.


Socialización del proyecto a la comunidad





Entre los días 03, 05, 09 y 10 de diciembre de 2025 se adelantó la elaboración de actas de vecindad, con el propósito de registrar el estado inicial de las viviendas, accesos y áreas aledañas al frente de intervención previo al inicio de las actividades constructivas.



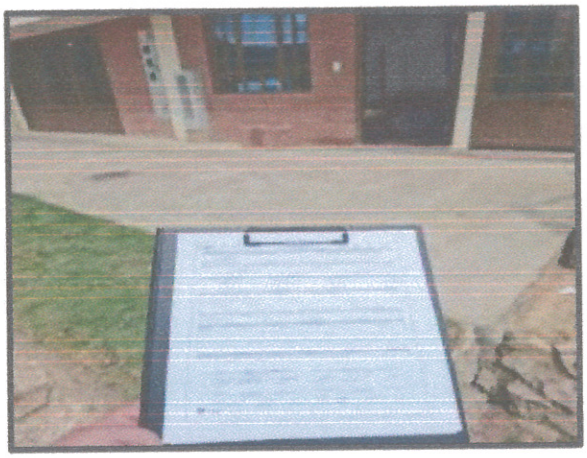


El 09 de diciembre de 2025 se dió inicio a las actividades de obra mediante el alistamiento del frente de trabajo, incluyendo acopio de materiales, señalización preventiva y organización operativa del personal y maquinaria. Durante el periodo se realizó la recepción y suministro progresivo de materiales necesarios para la ejecución, tales como recebo, arena, grava, cemento, ladrillo tolete, tubería corrugada sanitaria de 10 pulgadas, elementos de señalización vial, lubricantes y demás insumos requeridos para el desarrollo de las actividades constructivas.







Las actividades ejecutadas comprendieron el replanteo del eje de la red sanitaria, excavación mecánica de zanjas mediante retroexcavadora, alineación y nivelación de tubería, instalación de tubería corrugada sanitaria de 10 pulgadas, atraque con recebo, relleno y conformación de zanjas con material afirmado, retiro del material producto de excavación y adecuación progresiva del frente intervenido.

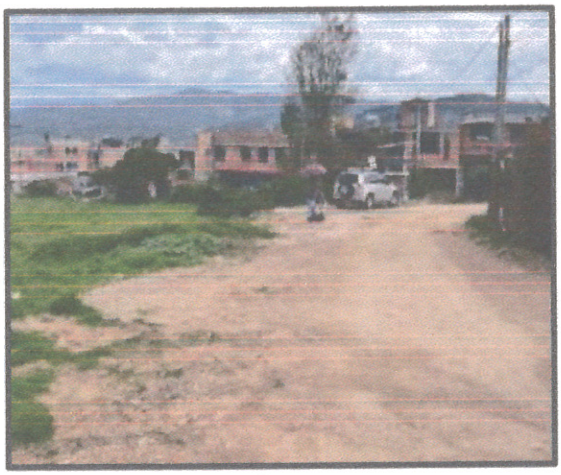





Como resultado de las labores ejecutadas durante el periodo reportado, se instalaron aproximadamente 150 metros lineales de tubería de alcantarillado corrugada de 10 pulgadas, avanzando en la conformación del sistema de alcantarillado proyectado. Adicionalmente, se ejecutaron obras complementarias consistentes en la construcción de un (1) pozo de inspección con altura de 1,60 m, un (01) pozo de inspección con altura de 1,80 m, la construcción de una (1) caja de inspección en mampostería, la instalación de seis (06) conexiones domiciliarias mediante silla YEE de 10" x 6", así como dos (02) conexiones domiciliarias directas al pozo de inspección, también se realizó la conexión de la tubería de dos (02) callejones, garantizando la correcta integración de los usuarios al sistema.

Durante el desarrollo del periodo se contó con personal operativo permanente en obra y apoyo de maquinaria amarilla para las actividades de excavación, manejo y retiro de

material. Las labores se ejecutaron bajo condiciones climáticas variables, predominando jornadas soleadas con algunos episodios de lluvia que incidieron parcialmente en la programación diaria sin afectar el avance general previsto.

El cronograma de obra presentó interrupciones justificadas debido a factores externos y administrativos, entre los factores determinantes se encuentran las condiciones climáticas adversas, la agenda cultural de la Administración Municipal y el ejercicio de permisos sindicales por parte del personal afiliado al SUNET. Asimismo, se consideraron las jornadas compensatorias institucionales y los requerimientos de la comunidad para facilitar la movilidad y el desarrollo de festividades durante la temporada decembrina.


Las actividades desarrolladas durante el periodo permitieron consolidar la etapa inicial de ejecución del proyecto, garantizando el adecuado inicio técnico, social y operativo del Convenio Interadministrativo N° 039 de 2025 y estableciendo las condiciones necesarias para la continuidad de las obras en los periodos siguientes.

6.1 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Llegada de materiales.





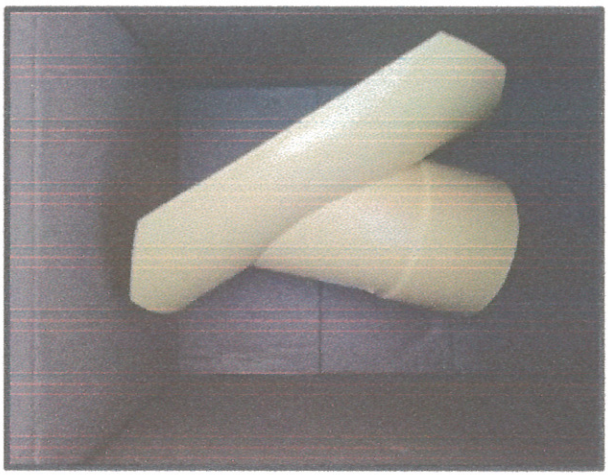

Excavaciones.







Instalación tubería principal.



Instalación de conexiones domiciliarias.





PAIPA S.A. E.S.P.

Construcción de estructuras pozos y cajas.



Señalización y cerramiento de la obra.













7. CANTIDADES EJECUTADAS

	CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES			CANTIDADES EJECUTADAS INFORME 1			CANTIDAD EJECUTADA ANTERIORES INFORMES	CANTIDAD TOTAL ACUMULADO	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	SUMINISTRO/ TRANSPORTE (MUNICIPIO DE PAIPA)	OBRA CIVIL (RED VITAL)	PORCENTAJE DE AVANCE			
				CANTIDAD SUMINISTRADA	CANTIDAD EJECUTADA				
1.1	**PRELIMINARES**								
1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	km	6.08	0.00	0.15	2.45%	-	0.15	2.45%
	SUB TOTAL PRELIMINARES								
1.2	**EXCAVACIONES**								
1.2.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	m^3	463.73	0.00	23.28	5.02%	-	23.28	5.02%
1.2.2	EXCAVACIONES MECÁNICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	m^3	5,117.62	0.00	234.67	4.59%	-	234.67	4.59%
	SUB TOTAL EXCAVACIÓN								
1.3	TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC								
1.3.1	TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=6"	m	753.00	6.00	45.50	6.04%	-	45.50	6.04%
1.3.2	TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"	m	274.00	0.00	0.00	0.00%	-	0.00	0.00%

1.3.3	TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10"	m	1,915.13	132.50	132.50	6.92%	-	132.50	6.92%
1.3.4	TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	m	1,899.68	0.00	0.00	0.00%	-	0.00	0.00%
1.3.5	TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=14"	m	983.39	0.00	0.00	0.00%	-	0.00	0.00%
1.3.6	TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=16"	m	62.99	0.00	0.00	0.00%	-	0.00	0.00%
1.3.7	TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=18"	m	63.64	0.00	0.00	0.00%	-	0.00	0.00%
	SUB TOTAL TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO PVC								
1.4	RELLENOS								
1.4.1	RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.	m^3	994.03	65.28	65.28	6.57%	-	65.28	6.57%
1.4.2	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBRO COMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	m^3	2,083.31	171.97	171.97	8.25%	-	171.97	8.25%
1.4.3	ACARREO DE MATERIALES PÉTREOS, TIERRA Y VARIOS (DESPUÉS DE 5 KM.).	m^3-km	13,541.52	1,117.80	0.00	0.00%	-	0.00	0.00%
1.4.4	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	m^3	1,965.64	0.00	0.00	0.00%	-	0.00	0.00%
	SUB TOTAL RELLENOS								
1.5	POZOS DE INSPECCIÓN								
1.5.1	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.0 M. (H < = 1.0 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).	und	33.00	0.00	0.00	0.00%	-	0.00	0.00%

1.5.2	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.00 M. < H < 1.50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).	und	15.00	0.00	0.00	0.00%	-	0.00	0.00%
1.5.3	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.50 M. < H < 2.00 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).	und	9.00	2.00	2.00	22.22%	-	2.00	22.22%
1.5.4	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M. (2.00 M. < H < 2.50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).	und	4.00	0.00	0.00	0.00%	-	0.00	0.00%
1.5.5	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.5 M. (2.50 M. < H < 3.50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).	und	2.00	0.00	0.00	0.00%	-	0.00	0.00%
1.5.6	ARO Y TAPA POZOS INSP EN HF	und	82.00	1.00	1.00	1.22%	-	1.00	1.22%
	SUB TOTAL POZOS								
1.6	CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO								
1.6.1	CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 200 MM. X 160 MM. KIT SILLA YEE 8" x 6"	und	39.00	0.00	0.00	0.00%	-	0.00	0.00%
1.6.2	CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 250 MM. X 160 MM. KIT SILLA YEE 10" x 6"	und	57.00	0.00	6.00	10.53%	-	6.00	10.53%
1.6.3	CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 315 MM. X 160 MM. KIT SILLA YEE 12" x 6"	und	64.00	0.00	0.00	0.00%	-	0.00	0.00%
1.6.4	CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 350 MM. X 160 MM. KIT SILLA YEE 14" x 6"	und	56.00	0.00	0.00	0.00%	-	0.00	0.00%
1.6.5	CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 400 MM. X 160 MM.	und	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	0.00	0.00%
1.6.6	CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 450 MM. X 160 MM.	und	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	0.00	0.00%
	SUB TOTAL SUMINISTRO CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO								

1.7	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.40 X 0.40 x 0.40 M. (NO INCLUYE TAPA).								
1.7.1	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0.40 X 0.40 X 0.40 MTS LADRILLO	und	216.00	0.00	1.00	0.46%	-	1.00	0.46%
1.7.2	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	m^3	5.18	0.00	0.02	0.46%	-	0.02	0.46%
	SUB TOTAL CAJAS DE INSPECCIÓN								
1.8	SUMIDEROS								
1.8.1	SUMIDERO LATERAL EN LADRILLO. DIMENSIONES INTERNAS 0.40 X 0.80 M. H = 1.10 M. (INCLUYE REJILLA PLÁSTICA TRÁFICO PESADO).	und	12.00	0.00	0.00	0.00%	-	0.00	0.00%
	SUB TOTAL CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS								
					PROMEDIO	2.58%		PROMEDIO	2.58%

8. OBSERVACIONES

Durante el periodo comprendido entre el 25 de noviembre de 2025 al 24 de diciembre de 2025 se presentan las siguientes observaciones asociadas a la ejecución del proyecto:

- Durante el periodo reportado las actividades se ejecutaron únicamente en el frente correspondiente al alcantarillado sanitario Llano Grande – Calle 14.
- El inicio de obra requirió la ejecución previa de actividades administrativas, socialización comunitaria y levantamiento de actas de vecindad, necesarias para el arranque constructivo.
- Se presentaron jornadas sin ejecución de obra debido a condiciones climáticas, actividades comunitarias programadas y permisos sindicales del personal operativo.
- El suministro de materiales se realizó de manera gradual conforme al avance del frente de trabajo.
- Las condiciones climáticas variables incidieron parcialmente en el rendimiento diario de las actividades.
- No se presentaron situaciones de orden público ni conflictos sociales que afectaran la ejecución del proyecto.
- El frente de obra permaneció señalizado y bajo condiciones adecuadas de seguridad industrial y manejo del tránsito local.
- El avance ejecutado corresponde a la etapa inicial del proyecto conforme a la programación establecida para el periodo.

Emite	**YEISON ROKNEY TORRES SUAREZ**
Empleo	Gerente General

Validación	Nombre Completo / Empleo	Vo.Bo.
Elaboró	María Amalfi Valderrama López Profesional Planeación y Proyectos	
Elaboró	David Felipe Puentes Fuentes Apoyo Planeación y Proyectos	
Revisó	Helmer Herrera Rivera Subgerente General Operativo	
Aprobó	Yeison Rokney Torres Suarez Gerente General	

No	Archivado en

No	Anexos	Folios
1	Planillas PILA Red Vital Paipa S.A. E.S.P.	10
2	Planillas PILA residentes obra y SG-SST	4
3	Acta socialización	4
4	Memoria de cantidades informe 1	3
5	Sabana mayores y menores informe 1	2

No	Tipo	Gestión Documental (¿A Quién? - Empleo)

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900259348	5	RED VITAL PAIPA SA E.S.P	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PAIPA COMFABOY	KM 1 VIA FRANCISCO MONTAÑA	PAIPA-BOYACA	7853051	SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PAIPA COMFABOY (98 Afiliados)						$199,131,326	$31,918,700			$199,131,326	$7,948,700			$224,321,670	$8,551,800			$199,131,326	$3,417,500		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (98 Afiliados)						$199,131,326	$31,918,700			$199,131,326	$7,948,700			$224,321,670	$8,551,800			$199,131,326	$3,417,500		$0	$0
Ciudad: PAIPA Depto: BOYACA (98 Afiliados)						$199,131,326	$31,918,700			$199,131,326	$7,948,700			$224,321,670	$8,551,800			$199,131,326	$3,417,500		$0	$0
1	CC	74323988	ALFONSO PUERTO JORGE ORLANDO	25-14	30	$1,949,534	$312,000	EPS037	30	$1,949,534	$78,000	CCF10	30	$2,042,984	$81,800	14-23	30	$1,949,534	$47,500	30	$0	$0
2	CC	74130745	ALVARADO PEDRAZA ELKIN DARIO	25-14	30	$1,918,832	$307,100	EPS005	30	$1,918,832	$76,800	CCF10	30	$2,012,282	$80,500	14-23	30	$1,918,832	$46,800	30	$0	$0
3	CC	1053613961	AMAYA REYES JULIAN ALFONSO	230201	30	$2,740,513	$438,500	EPS017	30	$2,740,513	$109,700	CCF10	30	$2,833,963	$113,400	14-23	30	$2,740,513	$14,400	30	$0	$0
4	CC	52158241	AREVALO ZAMBRANO MIRYAM MAGNOLIA	25-14	1	$48,721	$7,800	EPS017	1	$48,721	$2,000	CCF10	1	$0	$0	14-23	1	$48,721	$0	1	$0	$0
5	CC	52158241	AREVALO ZAMBRANO MIRYAM MAGNOLIA	25-14	29	$1,412,918	$226,100	EPS017	29	$1,412,918	$56,600	CCF10	29	$1,503,253	$60,200	14-23	29	$1,412,918	$14,800	29	$0	$0
6	CC	1032436013	ARGUELLO FLOREZ JULIANA	230201	30	$3,332,627	$533,300	EPS005	30	$3,332,627	$133,400	CCF10	30	$3,332,627	$133,400	14-23	30	$3,332,627	$17,400	30	$0	$0
7	CC	1053605825	ASAKURA GARCIA ANDREW MASAMI	230201	11	$1,148,227	$183,800	EPS017	11	$1,148,227	$46,000	CCF10	11	$1,148,227	$0	14-23	11	$1,148,227	$0	11	$0	$0
8	CC	1053605825	ASAKURA GARCIA ANDREW MASAMI	230201	19	$1,983,302	$317,400	EPS017	19	$1,983,302	$79,400	CCF10	19	$1,983,302	$79,400	14-23	19	$1,983,302	$20,800	19	$0	$0
9	CC	1053604212	AVENDAÑO PACHECO OSCAR IVAN	25-14	30	$1,940,026	$310,500	EPS017	30	$1,940,026	$77,700	CCF10	30	$2,033,476	$81,400	14-23	30	$1,940,026	$47,200	30	$0	$0
10	CC	23857282	AVILA FONSECA MIREYA	25-14	30	$1,510,360	$241,700	EPS037	30	$1,510,360	$60,500	CCF10	30	$1,603,810	$64,200	14-23	30	$1,510,360	$15,800	30	$0	$0
11	CC	1053608242	BARON ALBARRACIN MANUEL ANTONIO	25-14	30	$1,661,092	$265,800	EPS005	30	$1,661,092	$66,500	CCF10	30	$1,754,542	$70,200	14-23	30	$1,661,092	$40,500	30	$0	$0
12	CC	74360014	BRIÑEZ PARDO JAMIX JENID	231001	30	$1,738,959	$278,300	EPS037	30	$1,738,959	$69,600	CCF10	30	$1,832,409	$73,300	14-23	30	$1,738,959	$75,700	30	$0	$0
13	CC	4117063	CAMARGO AVELLA JAVIER	25-14	30	$1,559,082	$249,500	EPS017	30	$1,559,082	$62,400	CCF10	30	$1,652,532	$66,200	14-23	30	$1,559,082	$38,000	30	$0	$0
14	CC	74130567	CAMARGO CAMARGO JAVIER ANTONIO	25-14	19	$1,166,650	$186,700	EPS005	19	$1,166,650	$46,700	CCF10	19	$1,166,650	$0	14-23	19	$1,166,650	$0	19	$0	$0
15	CC	74130567	CAMARGO CAMARGO JAVIER ANTONIO	25-14	11	$675,429	$108,100	EPS005	11	$675,429	$27,100	CCF10	11	$3,230,804	$129,300	14-23	11	$675,429	$7,100	11	$0	$0
16	CC	1053612397	CAMARGO PEDRAZA JULIETH PAOLA	25-14	30	$3,131,529	$501,100	EPS017	30	$3,131,529	$125,300	CCF10	30	$3,131,529	$125,300	14-23	30	$3,131,529	$32,700	30	$0	$0
17	CC	4192865	CAMARGO AVELLA LUIS ALBERTO	25-14	9	$552,624	$66,400	EPS017	9	$552,624	$0	CCF10	9	$0	$0	14-23	9	$552,624	$0	9	$0	$0
18	CC	4192865	CAMARGO AVELLA LUIS ALBERTO	25-14	21	$1,400,747	$224,200	EPS017	21	$1,400,747	$56,100	CCF10	21	$1,466,162	$58,700	14-23	21	$1,400,747	$34,200	21	$0	$0
19	CC	74322901	CAMARGO SALAMANCA NORBERTO	25-14	30	$1,501,284	$240,300	EPS005	30	$1,501,284	$60,100	CCF10	30	$1,594,734	$63,800	14-23	30	$1,501,284	$36,600	30	$0	$0
20	CC	74130492	CAMARGO AVELLA SAUL	25-14	30	$1,461,639	$233,900	EPS037	30	$1,461,639	$58,500	CCF10	30	$1,555,089	$62,300	14-23	30	$1,461,639	$35,700	30	$0	$0
21	CC	74360447	CANADULCE URIEL	25-14	30	$1,895,806	$303,400	EPS037	30	$1,895,806	$75,900	CCF10	30	$1,989,256	$79,600	14-23	30	$1,895,806	$46,200	30	$0	$0
22	CC	1053609616	CARDENAS DE LA CRUZ CARLOS AUGUSTO	230301	30	$1,501,284	$240,300	EPS005	30	$1,501,284	$60,100	CCF10	30	$1,594,734	$63,800	14-23	30	$1,501,284	$36,600	30	$0	$0
23	CC	4192800	CEPEDA VERDUGO CARLOS YOVANNI	231001	30	$1,461,639	$233,900	EPS017	30	$1,461,639	$58,500	CCF10	30	$1,555,089	$62,300	14-23	30	$1,461,639	$35,700	30	$0	$0
24	CC	1053615208	CETINA VELANDIA ANGELA NATALIA	230301	5	$365,402	$58,500	EPS005	5	$365,402	$14,700	CCF10	5	$0	$0	14-23	5	$365,402	$0	5	$0	$0
25	CC	1053615208	CETINA VELANDIA ANGELA NATALIA	230301	25	$2,283,761	$365,500	EPS005	25	$2,283,761	$91,400	CCF10	25	$2,361,636	$94,500	14-23	25	$2,283,761	$12,000	25	$0	$0
26	CC	1053613469	CHAPARRO RUIZ JUAN CAMILO	25-14	18	$1,878,917	$300,700	EPS002	18	$1,878,917	$75,200	CCF10	18	$1,878,917	$0	14-23	18	$1,878,917	$0	18	$0	$0
27	CC	1053613469	CHAPARRO RUIZ JUAN CAMILO	25-14	12	$1,252,612	$200,500	EPS002	12	$1,252,612	$50,200	CCF10	12	$4,840,024	$193,700	14-23	12	$1,252,612	$30,600	12	$0	$0
28	CC	1053606736	CHAPARRO RODRIGUEZ LEIDY ALEXANDRA	230301	30	$1,461,639	$233,900	EPS041	30	$1,461,639	$58,500	CCF10	30	$1,555,089	$62,300	14-23	30	$1,461,639	$35,700	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
29	CC	74130511	CIPAGAUTA RINCON BERNARDO	230201	3	$146,164	$23,400	EPS017	3	$146,164	$5,900	CCF10	3	$0	$0	14-23	3	$146,164	$0	3	$0	$0
30	CC	74130511	CIPAGAUTA RINCON BERNARDO	230201	27	$1,315,476	$210,500	EPS017	27	$1,315,476	$52,700	CCF10	27	$1,399,580	$56,000	14-23	27	$1,315,476	$13,800	27	$0	$0
31	CC	1053607751	CORCHUELO LARA LEIDY ELIANA	230301	13	$1,356,996	$217,200	EPS017	13	$1,356,996	$54,300	CCF10	13	$1,356,996	$54,300	14-23	13	$1,356,996	$7,100	13	$0	$0
32	CC	1053604596	DIAZ MANCIPE SANDRA PATRICIA	25-14	30	$1,461,639	$233,900	EPS017	30	$1,461,639	$58,500	CCF10	30	$1,555,089	$62,300	14-23	30	$1,461,639	$35,700	30	$0	$0
33	CC	46681148	DOÑEZ PACHECO MAYERLINE	230301	30	$1,794,349	$287,100	EPS002	30	$1,794,348	$71,800	CCF10	30	$1,887,799	$75,600	14-23	30	$1,794,349	$43,800	30	$0	$0
34	CC	1053606149	ESPEJO RODRIGUEZ ELKIN FERNEY	230301	30	$3,131,529	$501,100	EPS017	30	$3,131,529	$125,300	CCF10	30	$3,131,529	$125,300	14-23	30	$3,131,529	$76,300	30	$0	$0
35	CC	74359604	ESPEJO VASQUEZ VICTOR HUGO	25-14	30	$1,559,082	$249,900	EPS017	30	$1,559,082	$62,400	CCF10	30	$1,652,532	$66,200	14-23	30	$1,559,082	$38,000	30	$0	$0
36	CC	1053611961	ESPEJO BOSIGA YBISON FABIAN	230301	30	$1,546,901	$247,600	EPS017	30	$1,546,901	$61,900	CCF10	30	$1,640,351	$65,700	14-23	30	$1,546,901	$37,700	30	$0	$0
37	CC	46680754	FIGUEREDO GUTIERREZ RUTH MIREYA	230201	30	$3,216,281	$514,700	EPS005	30	$3,216,281	$128,700	CCF10	30	$3,216,281	$128,700	14-23	30	$3,216,281	$78,300	30	$0	$0
38	CC	1053607571	FLOREZ GRANADOS DIEGO ARMANDO	230201	30	$1,842,079	$294,800	EPS017	30	$1,842,079	$73,700	CCF10	30	$1,935,529	$77,500	14-23	30	$1,842,079	$44,900	30	$0	$0
39	CC	74324456	FONSECA CASTRO GILBERTO	230201	30	$1,595,623	$255,300	EPS037	30	$1,595,623	$63,900	CCF10	30	$1,689,073	$67,600	14-23	30	$1,595,623	$38,900	30	$0	$0
40	CC	1053604562	FONSECA BARON JHON EDISON	25-14	9	$1,084,990	$173,600	EPS017	9	$1,084,990	$43,400	CCF10	9	$1,084,990	$0	14-23	9	$1,084,990	$0	9	$0	$0
41	CC	1053604562	FONSECA BARON JHON EDISON	25-14	21	$2,531,644	$405,100	EPS017	21	$2,531,644	$101,300	CCF10	21	$6,925,810	$277,100	14-23	21	$2,531,644	$13,300	21	$0	$0
42	CC	74323433	FONSECA ROJAS JORGE	25-14	30	$2,284,360	$365,500	EPS017	30	$2,284,360	$91,400	CCF10	30	$2,377,810	$95,200	14-23	30	$2,284,360	$55,700	30	$0	$0
43	CC	39662885	GACHA PULIDO MARTHA INES	25-14	17	$828,262	$132,600	EPS017	17	$828,262	$33,200	CCF10	17	$828,262	$0	14-23	17	$828,262	$0	17	$0	$0
44	CC	39662885	GACHA PULIDO MARTHA INES	25-14	13	$718,639	$115,000	EPS017	13	$718,639	$28,800	CCF10	13	$2,831,114	$113,300	14-23	13	$718,639	$7,600	13	$0	$0
45	CC	1007343312	GALAN HERNANDEZ RUBEN DARIO	230301	30	$3,131,529	$501,100	EPS037	30	$3,131,529	$125,300	CCF10	30	$3,131,529	$125,300	14-23	30	$3,131,529	$76,300	30	$0	$0
46	CC	74359655	GAMBOA CAMARGO GUILLERMO ENRIQUE	230301	3	$144,893	$23,200	EPS017	3	$144,893	$5,800	CCF10	3	$0	$0	14-23	3	$144,893	$0	3	$0	$0
47	CC	74359655	GAMBOA CAMARGO GUILLERMO ENRIQUE	230301	27	$1,473,819	$235,900	EPS017	27	$1,473,819	$59,000	CCF10	27	$1,557,924	$62,400	14-23	27	$1,473,819	$64,200	27	$0	$0
48	CC	30352577	GARCIA FANY	25-14	30	$1,461,639	$233,900	EPS017	30	$1,461,639	$58,500	CCF10	30	$1,555,089	$62,300	14-23	30	$1,461,639	$35,700	30	$0	$0
49	CC	1053604772	GARZON BUITRAGO CAMILO INDALECIO	230201	30	$1,842,079	$294,800	EPS017	30	$1,842,079	$73,700	CCF10	30	$1,935,529	$77,500	14-23	30	$1,842,079	$44,900	30	$0	$0
50	CC	46680595	GOMEZ MONTENEGRO YENNY	231001	30	$1,461,639	$233,900	EPS017	30	$1,461,639	$58,500	CCF10	30	$1,555,089	$62,300	14-23	30	$1,461,639	$35,700	30	$0	$0
51	CC	74120530	GONZALEZ FONSECA WILDER ALEJANDRO	25-14	30	$1,546,901	$247,600	EPS017	30	$1,546,901	$61,900	CCF10	30	$1,640,351	$65,700	14-23	30	$1,546,901	$37,700	30	$0	$0
52	CC	51684052	GRANADOS CASTRO FLOR DE MARIA	231001	30	$1,501,284	$240,300	EPS017	30	$1,501,284	$60,100	CCF10	30	$1,594,734	$63,800	14-23	30	$1,501,284	$36,600	30	$0	$0
53	CC	1053613608	GRANADOS MEDINA JIMMY ALEXANDER	25-14	30	$1,842,079	$294,800	EPS017	30	$1,842,079	$73,700	CCF10	30	$1,935,529	$77,500	14-23	30	$1,842,079	$44,900	30	$0	$0
54	CC	40019727	HERNANDEZ MARIA ROSALBA	231001	30	$1,461,639	$233,900	EPS017	30	$1,461,639	$58,500	CCF10	30	$1,555,089	$62,300	14-23	30	$1,461,639	$35,700	30	$0	$0
55	CC	74359629	HERRERA RIVERA HELMER	230201	30	$5,581,772	$893,100	EPS005	30	$5,581,772	$223,300	CCF10	30	$5,581,772	$223,300	14-23	30	$5,581,772	$136,000	30	$0	$0
56	CC	23856706	HIGUERA ALVARADO NUBIA TERESA	230301	30	$1,461,639	$233,900	EPS017	30	$1,461,639	$58,500	CCF10	30	$1,555,089	$62,300	14-23	30	$1,461,639	$15,300	30	$0	$0
57	CC	1053606359	HURTADO FIGUEREDO DIANA KATHERINE	230201	30	$5,581,772	$893,100	EPS017	30	$5,581,772	$223,300	CCF10	30	$5,581,772	$223,300	14-23	30	$5,581,772	$29,200	30	$0	$0
58	CC	46683315	JIMENEZ NIÑO LUZ MARLEN	230301	30	$1,510,360	$241,700	EPS037	30	$1,510,360	$60,500	CCF10	30	$1,603,810	$64,200	14-23	30	$1,510,360	$36,800	30	$0	$0
59	CC	24069673	JIMENEZ DE TIBATA MARIA EULALIA	25-14	30	$1,461,639	$233,900	EPS017	30	$1,461,639	$58,500	CCF10	30	$1,555,089	$62,300	14-23	30	$1,461,639	$35,700	30	$0	$0
60	CC	74322520	LARA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO	230301	30	$1,842,079	$294,800	EPS005	30	$1,842,079	$73,700	CCF10	30	$1,935,529	$77,500	14-23	30	$1,842,079	$44,900	30	$0	$0
61	CC	46395482	LOPEZ CETINA ROSALBA	230201	30	$1,510,360	$241,700	EPS037	30	$1,510,360	$60,500	CCF10	30	$1,603,810	$64,200	14-23	30	$1,510,360	$36,800	30	$0	$0
62	CC	1051588795	MACHUCA OJEDA JOHHN JAIRO	25-14	30	$1,738,959	$278,300	EPS017	30	$1,738,959	$69,600	CCF10	30	$1,832,409	$73,300	14-23	30	$1,738,959	$42,400	30	$0	$0
63	CC	74373225	MALAVER CERCADO HECTOR PABLO	25-14	30	$2,045,476	$327,300	EPS005	30	$2,045,476	$81,900	CCF10	30	$2,138,926	$85,600	14-23	30	$2,045,476	$21,400	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
64	CC	74359649	MALAVER BENAVIDES LUIS GABRIEL	231001	30	$1,794,349	$287,100	EPS005	30	$1,794,349	$71,800	CCF10	30	$1,887,799	$75,600	14-23	30	$1,794,349	$9,400	30	$0	$0
65	CC	73120570	MATEUS JIMENEZ CESAR AUGUSTO	25-14	30	$1,842,079	$294,800	EPS005	30	$1,842,079	$73,700	CCF10	30	$1,935,529	$77,500	14-23	30	$1,842,079	$44,900	30	$0	$0
66	CC	4192455	MONROY RODRIGUEZ EDILBERTO	25-14	6	$292,328	$46,800	EPS041	6	$292,328	$11,700	CCF10	6	$292,328	$0	14-23	6	$292,328	$0	6	$0	$0
67	CC	4192455	MONROY RODRIGUEZ EDILBERTO	25-14	24	$1,203,416	$192,600	EPS041	24	$1,203,416	$48,200	CCF10	24	$1,278,176	$51,200	14-23	24	$1,203,416	$29,400	24	$0	$0
68	CC	4192776	MONROY RODRIGUEZ HERNANDO	25-14	30	$1,861,267	$297,900	EPS017	30	$1,861,267	$74,500	CCF10	30	$1,954,717	$78,200	14-23	30	$1,861,267	$19,500	30	$0	$0
69	CC	1053606329	MONROY RODRIGUEZ PAOLA ANDREA	230301	30	$1,794,349	$287,100	EPS005	30	$1,794,349	$71,800	CCF10	30	$1,887,799	$75,600	14-23	30	$1,794,349	$9,400	30	$0	$0
70	CC	1053615891	OCHOA DIAZ WILFREDY	230201	30	$1,982,154	$317,200	EPS037	30	$1,982,154	$79,300	CCF10	30	$2,075,604	$83,100	14-23	30	$1,982,154	$20,700	30	$0	$0
71	CC	93124198	ORJUELA CAMPOS JOSE ALBEIRO	25-14	30	$1,607,803	$257,300	EPS017	30	$1,607,803	$64,400	CCF10	30	$1,701,253	$68,100	14-23	30	$1,607,803	$39,200	30	$0	$0
72	CC	46680659	PACHECO MARTINEZ GLADYS JACKELINNE	25-14	30	$1,794,349	$287,100	EPS005	30	$1,794,349	$71,800	CCF10	30	$1,887,799	$75,600	14-23	30	$1,794,349	$9,400	30	$0	$0
73	CC	60423066	PARRA MARIÑO BRIGIDA	230301	30	$1,510,360	$241,700	EPS017	30	$1,510,360	$60,500	CCF10	30	$1,603,810	$64,200	14-23	30	$1,510,360	$36,800	30	$0	$0
74	CC	46683468	PATARROYO RAMIREZ ALICIA	25-14	1	$48,721	$7,800	EPS017	1	$48,721	$2,000	CCF10	1	$0	$0	14-23	1	$48,721	$0	1	$0	$0
75	CC	46683468	PATARROYO RAMIREZ ALICIA	25-14	29	$1,461,639	$233,900	EPS017	29	$1,461,639	$58,500	CCF10	29	$1,551,974	$62,100	14-23	29	$1,461,639	$15,360	29	$0	$0
76	CC	74130943	PATARROYO SANCHEZ JUAN FERNANDO	230201	30	$1,461,639	$233,900	CCFC55	30	$1,461,639	$58,500	CCF10	30	$1,555,089	$62,300	14-23	30	$1,461,639	$35,700	30	$0	$0
77	CC	74333939	PEREZ BECERRA MARCO AURELIO	25-14	30	$2,283,603	$365,400	EPS037	30	$2,283,603	$91,400	CCF10	30	$2,377,053	$95,100	14-23	30	$2,283,603	$55,700	30	$0	$0
78	CC	52442246	PIRABAN NIDIA ESPERANZA	25-14	30	$1,510,360	$241,700	EPS005	30	$1,510,360	$60,500	CCF10	30	$1,603,810	$64,200	14-23	30	$1,510,360	$36,800	30	$0	$0
79	CC	74360605	PUERTO CAMARGO IVAN HERNAN	230301	30	$1,794,349	$287,100	EPS005	30	$1,794,349	$71,800	CCF10	30	$1,887,799	$75,600	14-23	30	$1,794,349	$9,400	30	$0	$0
80	CC	4192111	RACHE MONGUA JORGE ANTONIO	231001	30	$1,501,284	$240,300	EPS017	30	$1,501,284	$60,100	CCF10	30	$1,594,734	$63,800	14-23	30	$1,501,284	$15,760	30	$0	$0
81	CC	1053609802	RICO VALDERRAMA LINA MARIA	25-14	30	$3,332,627	$533,300	EPS017	30	$3,332,627	$133,400	CCF10	30	$3,332,627	$133,400	14-23	30	$3,332,627	$17,400	30	$0	$0
82	CC	1053613345	RODRIGUEZ FONSECA DUVAN ALBENIO	230301	30	$1,890,050	$302,500	EPS017	30	$1,890,050	$75,700	CCF10	30	$1,983,500	$79,400	14-23	30	$1,890,050	$19,800	30	$0	$0
83	CC	1053615468	RODRIGUEZ IBAÑEZ DUVAN ANDRES	25-14	18	$1,105,247	$176,900	EPS017	18	$1,105,247	$44,300	CCF10	18	$1,105,247	$0	14-23	18	$1,105,247	$0	18	$0	$0
84	CC	1053615468	RODRIGUEZ IBAÑEZ DUVAN ANDRES	25-14	12	$736,832	$117,900	EPS017	12	$736,832	$29,500	CCF10	12	$3,221,171	$128,900	14-23	12	$736,832	$18,000	12	$0	$0
85	CC	74323446	RODRIGUEZ BARRERA ISRAEL	25-14	30	$1,461,639	$233,900	EPS017	30	$1,461,639	$58,500	CCF10	30	$1,555,089	$62,300	14-23	30	$1,461,639	$35,700	30	$0	$0
86	CC	1053606365	RODRIGUEZ DIAZ MARTHA LILIANA	25-14	30	$1,510,360	$241,700	ESSC24	30	$1,510,360	$60,500	CCF10	30	$1,603,810	$64,200	14-23	30	$1,510,360	$36,800	30	$0	$0
87	CC	1053613382	RODRIGUEZ ALFONSO MONICA JESENIA	25-14	3	$144,893	$23,200	ESSC24	3	$144,893	$5,800	CCF10	3	$0	$0	14-23	3	$144,893	$0	3	$0	$0
88	CC	1053613382	RODRIGUEZ ALFONSO MONICA JESENIA	25-14	2	$97,443	$15,600	ESSC24	2	$97,443	$3,900	CCF10	2	$0	$0	14-23	2	$97,443	$0	2	$0	$0
89	CC	1053613382	RODRIGUEZ ALFONSO MONICA JESENIA	25-14	25	$1,266,753	$202,700	ESSC24	25	$1,266,753	$50,700	CCF10	25	$1,344,628	$53,800	14-23	25	$1,266,753	$30,900	25	$0	$0
90	CC	74322563	RODRIGUEZ HURTADO PEDRO ANTONIO	230301	1	$50,043	$8,100	EPS037	1	$50,043	$2,100	CCF10	1	$0	$0	14-23	1	$50,043	$0	1	$0	$0
91	CC	74322563	RODRIGUEZ HURTADO PEDRO ANTONIO	230301	19	$950,813	$152,200	EPS037	19	$950,813	$38,100	CCF10	19	$950,813	$0	14-23	19	$950,813	$0	19	$0	$0
92	CC	74322563	RODRIGUEZ HURTADO PEDRO ANTONIO	230301	10	$500,428	$80,100	EPS037	10	$500,428	$20,100	CCF10	10	$2,650,361	$106,100	14-23	10	$500,428	$12,200	10	$0	$0
93	CC	1053605397	ROJAS ARAQUE MARIO ANDRES	231001	30	$1,869,381	$299,200	EPS017	30	$1,869,381	$74,600	CCF10	30	$1,962,831	$78,600	14-23	30	$1,869,381	$45,600	30	$0	$0
94	CC	74322163	ROMERO ESPITIA JAIME ANTONIO	25-14	10	$487,213	$78,000	EPS037	10	$487,213	$19,500	CCF10	10	$487,213	$0	14-23	10	$487,213	$0	10	$0	$0
95	CC	74322163	ROMERO ESPITIA JAIME ANTONIO	25-14	20	$974,426	$156,000	EPS037	20	$974,426	$39,000	CCF10	20	$1,036,726	$41,500	14-23	20	$974,426	$23,600	20	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
96	CC	8731958	ROSAS HIGUERA SANTOS MIGUEL	230301	30	$1,883,872	$301,500	EPS005	30	$1,883,872	$75,400	CCF10	30	$1,977,322	$79,100	14-23	30	$1,883,872	$45,900	30	$0	$0
97	CC	74323801	RUIZ RUIZ JOSE MIGUEL	25-14	30	$1,851,673	$296,300	EPS037	30	$1,851,673	$74,100	CCF10	30	$1,945,123	$77,900	14-23	30	$1,851,673	$19,400	30	$0	$0
98	CC	1053604273	RUIZ CAÑADULCE SANDRA PAOLA	230201	30	$2,106,878	$337,200	EPS037	30	$2,106,878	$84,300	CCF10	30	$2,200,328	$88,100	14-23	30	$2,106,878	$51,400	30	$0	$0
99	CC	74324119	SALAMANCA GABRIEL	25-14	30	$1,842,079	$294,800	EPS017	30	$1,842,079	$73,700	CCF10	30	$1,935,529	$77,500	14-23	30	$1,842,079	$44,900	30	$0	$0
100	CC	74322662	SALAZAR ANDRADE HERNAN FRANCISCO	230301	30	$1,620,136	$259,300	EPS017	30	$1,620,136	$64,900	CCF10	30	$1,713,586	$68,600	14-23	30	$1,620,136	$39,500	30	$0	$0
101	CC	46683220	SALCEDO RODRIGUEZ NINI GIOVANNA	230201	13	$633,377	$101,400	EPS041	13	$633,377	$25,400	CCF10	13	$633,377	$0	14-23	13	$633,377	$0	13	$0	$0
102	CC	46683220	SALCEDO RODRIGUEZ NINI GIOVANNA	230201	17	$876,983	$140,400	EPS041	17	$876,983	$35,100	CCF10	17	$929,938	$37,200	14-23	17	$876,983	$21,400	17	$0	$0
103	CC	74323507	SANA TORRES MIGUEL ANGEL	25-14	30	$1,922,670	$307,700	EPS002	30	$1,922,670	$77,000	CCF10	30	$2,016,120	$80,700	14-23	30	$1,922,670	$46,900	30	$0	$0
104	CC	74322585	SANCHEZ PULIDO HECTOR JULIO	25-14	30	$1,461,639	$233,900	EPS017	30	$1,461,639	$58,500	CCF10	30	$1,555,089	$62,300	14-23	30	$1,461,639	$35,700	30	$0	$0
105	CC	4042060	SIMBACICA GUTIERREZ JOSE RICARDO	25-14	30	$1,461,639	$233,900	EPS005	30	$1,461,639	$58,500	CCF10	30	$1,555,089	$62,300	14-23	30	$1,461,639	$35,700	30	$0	$0
106	CC	74130153	SUAREZ BOCIGA JOSE RICARDO	230301	30	$1,546,901	$247,600	EPS037	30	$1,546,901	$61,900	CCF10	30	$1,640,351	$65,700	14-23	30	$1,546,901	$37,700	30	$0	$0
107	CC	1049609304	SUAREZ MOLINA LEIDY LILIANA	230301	30	$3,131,529	$501,100	EPS005	30	$3,131,529	$125,300	CCF10	30	$3,131,529	$125,300	14-23	30	$3,131,529	$76,300	30	$0	$0
108	CC	1053610862	TIBATA JIMENEZ YOVANY	25-14	30	$2,114,554	$338,400	EPS017	30	$2,114,554	$84,600	CCF10	30	$2,208,004	$88,400	14-23	30	$2,114,554	$51,600	30	$0	$0
109	CC	1053611160	TORRES SUAREZ YEISON ROKNEY	25-14	30	$7,340,036	$1,248,100	EPS037	30	$7,340,036	$293,700	CCF10	30	$7,340,036	$293,700	14-23	30	$7,340,036	$38,400	30	$0	$0
110	CC	1053613769	URIBE CORREDOR EDWIN SEBASTIAN	230301	30	$1,842,079	$294,800	EPS017	30	$1,842,079	$73,700	CCF10	30	$1,935,529	$77,500	14-23	30	$1,842,079	$19,300	30	$0	$0
111	CC	74359861	VALDERRAMA CARLOS	25-14	30	$1,907,320	$305,200	EPS005	30	$1,907,320	$76,300	CCF10	30	$2,000,770	$80,100	14-23	30	$1,907,320	$46,500	30	$0	$0
112	CC	7226057	VALDERRAMA PEDRAZA JOSE TRINIDAD	230201	30	$1,461,639	$233,900	EPS002	30	$1,461,639	$58,500	CCF10	30	$1,555,089	$62,300	14-23	30	$1,461,639	$63,600	30	$0	$0
113	CC	23856977	VALDERRAMA LOPEZ MARIA AMALFI	25-14	30	$3,332,627	$533,300	EPS017	30	$3,332,627	$133,400	CCF10	30	$3,332,627	$133,400	14-23	30	$3,332,627	$34,800	30	$0	$0
114	CC	74322488	VARGAS SANDOVAL JOSE FERNANDO	25-14	18	$1,105,247	$176,900	EPS002	18	$1,105,247	$44,300	CCF10	18	$1,105,247	$0	14-23	18	$1,105,247	$0	18	$0	$0
115	CC	74322488	VARGAS SANDOVAL JOSE FERNANDO	25-14	12	$736,832	$117,900	EPS002	12	$736,832	$29,500	CCF10	12	$3,221,171	$128,900	14-23	12	$736,832	$18,000	12	$0	$0
116	CC	1053614462	VARGAS RODRIGUEZ MARCOL FERNANDO	230201	30	$1,559,082	$249,500	EPS037	30	$1,559,082	$62,400	CCF10	30	$1,652,532	$66,200	14-23	30	$1,559,082	$38,060	30	$0	$0
117	CC	74359989	VASQUEZ CAMARGO ANGEL ROSENDO	230301	30	$1,842,079	$294,800	EPS005	30	$1,842,079	$73,700	CCF10	30	$1,935,529	$77,500	14-23	30	$1,842,079	$44,900	30	$0	$0
118	CC	53083888	VILLAMIL TOVAR KAROL IVON	230301	30	$3,477,532	$556,500	EPS005	30	$3,477,532	$139,200	CCF10	30	$3,477,532	$139,200	14-23	30	$3,477,532	$18,200	30	$0	$0
Total			**Afiliados(98)**			**$199,131,326**	**$31,918,700**			**$199,131,326**	**$7,948,700**			**$224,321,670**	**$8,551,800**			**$199,131,326**	**$3,417,500**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1971348349	9495763636	E	2025/12/11	2025/12/01	BANCO POPULAR	0	$51,836,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				98	$31,918,700	$0	$0	$31,918,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$2,046,900	$0	$0	$2,046,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	49	$15,667,700	$0	$0	$15,667,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	22	$6,968,700	$0	$0	$6,968,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	$7,235,400	$0	$0	$7,235,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				98	$3,417,500	$0	$0	$3,417,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	98	$3,417,500	$0	$0	$3,417,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				98	$8,551,800	$0	$0	$8,551,800
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	98	$8,551,800	$0	$0	$8,551,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				98	$7,948,700	$0	$0	$7,948,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$58,500	$0	$0	$58,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$120,900	$0	$0	$120,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	46	$3,611,100	$0	$0	$3,611,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	18	$1,518,600	$0	$0	$1,518,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$178,900	$0	$0	$178,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$406,500	$0	$0	$406,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	23	$2,054,200	$0	$0	$2,054,200
TOTAL				98	$51,836,700	$0	$0	$51,836,700

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900259348	5	RED VITAL PAIPA SA E.S.P	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PAIPA COMFABOY	KM 1 VIA FRANCISCO MONTAÑA	PAIPA-BOYACA	7853051	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2068106583	9497698938	E	2026/01/14	2026/01/08	BANCO POPULAR	0	$52,647,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PAIPA COMFABOY (99 Afiliados)						$199,973,552	$32,074,900			$199,973,552	$8,003,700			$227,211,522	$9,017,900			$199,973,552	$3,551,200		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (99 Afiliados)						$199,973,552	$32,074,900			$199,973,552	$8,003,700			$227,211,522	$9,017,900			$199,973,552	$3,551,200		$0	$0
Ciudad: DUITAMA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$779,541	$124,800			$779,541	$31,200			$829,381	$33,200			$779,541	$54,300		$0	$0
1	CC	1052396359	BECERRA VALDERRAMA WILSON ARIEL	25-14	16	$779,541	$124,800	EPS037	16	$779,541	$31,200	CCF10	16	$829,381	$33,200	14-23	16	$779,541	$54,300	16	$0	$0
Ciudad: PAIPA Depto: BOYACA (98 Afiliados)						$199,194,011	$31,950,100			$199,194,011	$7,972,500			$226,382,141	$8,984,700			$199,194,011	$3,496,900		$0	$0
2	CC	74323988	ALFONSO PUERTO JORGE ORLANDO	25-14	30	$2,056,988	$329,200	EPS037	30	$2,056,988	$82,300	CCF10	30	$2,150,438	$86,100	14-23	30	$2,056,988	$50,200	30	$0	$0
3	CC	74130745	ALVARADO PEDRAZA ELKIN DARIO	25-14	30	$1,842,079	$294,800	EPS005	30	$1,842,079	$73,700	CCF10	30	$1,935,529	$77,500	14-23	30	$1,842,079	$44,900	30	$0	$0
4	CC	1053613961	AMAYA REYES JULIAN ALFONSO	230201	30	$2,740,513	$438,500	EPS017	30	$2,740,513	$109,700	CCF10	30	$2,833,963	$113,400	14-23	30	$2,740,513	$14,400	30	$0	$0
5	CC	52158241	AREVALO ZAMBRANO MIRYAM MAGNOLIA	25-14	2	$97,443	$15,600	EPS017	2	$97,443	$3,900	CCF10	2	$0	$0	14-23	2	$97,443	$0	2	$0	$0
6	CC	52158241	AREVALO ZAMBRANO MIRYAM MAGNOLIA	25-14	3	$144,893	$23,200	EPS017	3	$144,893	$5,800	CCF10	3	$0	$0	14-23	3	$144,893	$0	3	$0	$0
7	CC	52158241	AREVALO ZAMBRANO MIRYAM MAGNOLIA	25-14	25	$1,218,033	$194,900	EPS017	25	$1,218,033	$48,800	CCF10	25	$1,295,907	$51,900	14-23	25	$1,218,033	$12,800	25	$0	$0
8	CC	1032436013	ARGUELLO FLOREZ JULIANA	230201	30	$3,332,627	$533,300	EPS005	30	$3,332,627	$133,400	CCF10	30	$3,332,627	$133,400	14-23	30	$3,332,627	$17,400	30	$0	$0
9	CC	1053605825	ASAKURA GARCIA ANDREW MASAMI	230201	30	$3,131,529	$501,100	EPS017	30	$3,131,529	$125,300	CCF10	30	$3,131,529	$125,300	14-23	30	$3,131,529	$32,700	30	$0	$0
10	CC	1053604212	AVENDAÑO PACHECO OSCAR IVAN	25-14	30	$2,121,168	$339,400	EPS017	30	$2,121,168	$84,900	CCF10	30	$2,214,618	$88,600	14-23	30	$2,121,168	$51,700	30	$0	$0
11	CC	23857282	AVILA FONSECA MIREYA	25-14	30	$1,510,360	$241,700	EPS037	30	$1,510,360	$60,500	CCF10	30	$1,603,810	$64,200	14-23	30	$1,510,360	$15,800	30	$0	$0
12	CC	1053608342	BARON ALBARRACIN MANUEL ANTONIO	25-14	30	$1,461,639	$233,900	EPS005	30	$1,461,639	$58,500	CCF10	30	$1,555,089	$62,300	14-23	30	$1,461,639	$35,700	30	$0	$0
13	CC	74360014	BRIÑEZ PARDO JAMIX JENID	231001	30	$1,999,803	$320,000	EPS037	30	$1,999,803	$80,000	CCF10	30	$2,093,253	$83,800	14-23	30	$1,999,803	$87,000	30	$0	$0
14	CC	4117063	CAMARGO AVELLA JAVIER	25-14	30	$1,644,344	$263,100	EPS017	30	$1,644,344	$65,800	CCF10	30	$1,737,794	$69,600	14-23	30	$1,644,344	$40,100	30	$0	$0
15	CC	74130567	CAMARGO CAMARGO JAVIER ANTONIO	25-14	30	$1,842,079	$294,800	EPS005	30	$1,842,079	$73,700	CCF10	30	$1,935,529	$77,500	14-23	30	$1,842,079	$19,300	30	$0	$0
16	CC	1053612397	CAMARGO PEDRAZA JULIETH PAOLA	25-14	1	$104,384	$16,800	EPS017	1	$104,384	$4,200	CCF10	1	$0	$0	14-23	1	$104,384	$0	1	$0	$0
17	CC	1053612397	CAMARGO PEDRAZA JULIETH PAOLA	25-14	5	$521,921	$83,600	EPS017	5	$521,921	$20,900	CCF10	5	$0	$0	14-23	5	$521,921	$0	5	$0	$0
18	CC	1053612397	CAMARGO PEDRAZA JULIETH PAOLA	25-14	22	$2,296,455	$367,500	EPS017	22	$2,296,455	$91,900	CCF10	22	$6,910,996	$276,500	14-23	22	$2,296,455	$24,000	22	$0	$0
19	CC	4192865	CAMARGO AVELLA LUIS ALBERTO	25-14	30	$1,842,079	$294,800	EPS017	30	$1,842,079	$73,700	CCF10	30	$1,935,529	$77,500	14-23	30	$1,842,079	$44,900	30	$0	$0
20	CC	74322901	CAMARGO SALAMANCA NORBERTO	25-14	30	$1,667,051	$266,800	EPS005	30	$1,667,051	$66,700	CCF10	30	$1,760,501	$70,500	14-23	30	$1,667,051	$40,700	30	$0	$0
21	CC	74130492	CAMARGO AVELLA SAUL	25-14	30	$1,461,639	$233,900	EPS037	30	$1,461,639	$58,500	CCF10	30	$1,555,089	$62,300	14-23	30	$1,461,639	$35,700	30	$0	$0
22	CC	74360447	CAÑADULCE URIEL	25-14	7	$429,818	$68,800	EPS037	7	$429,818	$17,200	CCF10	7	$0	$0	14-23	7	$429,818	$0	7	$0	$0
23	CC	74360447	CAÑADULCE URIEL	25-14	23	$1,412,261	$226,000	EPS037	23	$1,412,261	$56,500	CCF10	23	$1,926,261	$77,100	14-23	23	$1,412,261	$34,500	23	$0	$0
24	CC	1053609616	CARDENAS DE LA CRUZ CARLOS AUGUSTO	230301	30	$1,540,380	$246,500	EPS005	30	$1,540,380	$61,700	CCF10	30	$1,633,830	$65,400	14-23	30	$1,540,380	$37,600	30	$0	$0
25	CC	4192800	CEPEDA VERDUGO CARLOS YOVANNI	231001	1	$48,721	$7,800	EPS017	1	$48,721	$2,000	CCF10	1	$0	$0	14-23	1	$48,721	$0	1	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
26	CC	4192800	CEPEDA VERDUGO CARLOS YOVANNI	231001	29	$1,498,180	$239,800	EPS017	29	$1,498,180	$60,000	CCF10	29	$1,588,515	$63,600	14-23	29	$1,498,180	$36,500	29	$0	$0
27	CC	1053615208	CETINA VELANDIA ANGELA NATALIA	230301	30	$2,740,513	$438,500	EPS005	30	$2,740,513	$109,700	CCF10	30	$2,833,963	$113,400	14-23	30	$2,740,513	$14,400	30	$0	$0
28	CC	1053613469	CHAPARRO RUIZ JUAN CAMILO	25-14	30	$3,131,529	$501,100	EPS002	30	$3,131,529	$125,300	CCF10	30	$3,131,529	$125,300	14-23	30	$3,131,529	$76,300	30	$0	$0
29	CC	1053606736	CHAPARRO RODRIGUEZ LEIDY ALEXANDRA	230301	30	$1,559,082	$249,500	EPS041	30	$1,559,082	$62,400	CCF10	30	$1,652,532	$66,200	14-23	30	$1,559,082	$38,000	30	$0	$0
30	CC	74130511	CIPAGAUTA RINCON BERNARDO	230201	2	$97,443	$15,600	EPS017	2	$97,443	$3,900	CCF10	2	$0	$0	14-23	2	$97,443	$0	2	$0	$0
31	CC	74130511	CIPAGAUTA RINCON BERNARDO	230201	28	$1,364,197	$218,300	EPS017	28	$1,364,197	$54,600	CCF10	28	$1,451,416	$58,100	14-23	28	$1,364,197	$14,300	28	$0	$0
32	CC	1053607751	CORCHUELO LARA LEIDY ELIANA	230301	30	$3,131,529	$501,100	EPS017	30	$3,131,529	$125,300	CCF10	30	$3,131,529	$125,300	14-23	30	$3,131,529	$16,400	30	$0	$0
33	CC	1053604596	DIAZ MANCIPE SANDRA PATRICIA	25-14	1	$48,721	$7,800	EPS017	1	$48,721	$2,000	CCF10	1	$0	$0	14-23	1	$48,721	$0	1	$0	$0
34	CC	1053604596	DIAZ MANCIPE SANDRA PATRICIA	25-14	29	$1,510,361	$241,700	EPS017	29	$1,510,361	$60,500	CCF10	29	$1,600,696	$64,100	14-23	29	$1,510,361	$36,800	29	$0	$0
35	CC	46681148	DUEÑEZ PACHECO MAYERLINE	230301	30	$1,794,349	$287,100	EPS002	30	$1,794,349	$71,800	CCF10	30	$1,887,799	$75,600	14-23	30	$1,794,349	$43,800	30	$0	$0
36	CC	1053606149	ESPEJO RODRIGUEZ ELKIN FERNEY	230301	30	$3,131,529	$501,100	EPS017	30	$3,131,529	$125,300	CCF10	30	$3,131,529	$125,300	14-23	30	$3,131,529	$76,300	30	$0	$0
37	CC	743596C4	ESPEJO VASQUEZ VICTOR HUGO	25-14	30	$1,644,344	$263,100	EPS017	30	$1,644,344	$65,800	CCF10	30	$1,737,794	$69,600	14-23	30	$1,644,344	$40,100	30	$0	$0
38	CC	1053611961	ESPEJO BOSIGA YEISON FABIAN	230301	30	$1,644,344	$263,100	EPS017	30	$1,644,344	$65,800	CCF10	30	$1,737,794	$69,600	14-23	30	$1,644,344	$40,100	30	$0	$0
39	CC	46680754	FIGUEREDO GUTIERREZ RUTH MIREYA	230201	30	$3,216,281	$514,700	EPS005	30	$3,216,281	$128,700	CCF10	30	$3,216,281	$128,700	14-23	30	$3,216,281	$16,800	30	$0	$0
40	CC	1053607571	FLOREZ GRANADOS DIEGO ARMANDO	230201	4	$217,705	$34,900	EPS017	4	$217,705	$8,800	CCF10	4	$0	$0	14-23	4	$217,705	$0	4	$0	$0
41	CC	1053607571	FLOREZ GRANADOS DIEGO ARMANDO	230201	26	$1,627,169	$260,400	EPS017	26	$1,627,169	$65,100	CCF10	26	$1,708,159	$68,400	14-23	26	$1,627,169	$39,700	26	$0	$0
42	CC	74324456	FONSECA CASTRO GILBERTO	230201	10	$657,738	$105,300	EPS037	10	$657,738	$26,400	CCF10	10	$3,129,948	$125,200	14-23	10	$657,738	$16,100	10	$0	$0
43	CC	1053604562	FONSECA BARON JHON EDISON	25-14	10	$1,205,544	$192,900	EPS017	10	$1,205,544	$48,300	CCF10	10	$1,205,544	$0	14-23	10	$1,205,544	$0	10	$0	$0
44	CC	1053604562	FONSECA BARON JHON EDISON	25-14	20	$2,833,030	$453,300	EPS017	20	$2,833,030	$113,400	CCF10	20	$5,292,310	$211,700	14-23	20	$2,833,030	$14,800	20	$0	$0
45	CC	74323433	FONSECA ROJAS JORGE	25-14	30	$2,461,442	$393,900	EPS017	30	$2,461,442	$98,500	CCF10	30	$2,554,892	$102,200	14-23	30	$2,461,442	$60,000	30	$0	$0
46	CC	39662885	GACHA PULIDO MARTHA INES	25-14	2	$97,443	$15,600	EPS017	2	$97,443	$3,900	CCF10	2	$97,443	$0	14-23	2	$97,443	$0	2	$0	$0
47	CC	39662885	GACHA PULIDO MARTHA INES	25-14	28	$1,364,197	$218,300	EPS017	28	$1,364,197	$54,600	CCF10	28	$1,451,416	$58,100	14-23	28	$1,364,197	$14,300	28	$0	$0
48	CC	1007343312	GALAN HERNANDEZ RUBEN DARIO	230301	30	$3,131,529	$501,100	EPS037	30	$3,131,529	$125,300	CCF10	30	$3,131,529	$125,300	14-23	30	$3,131,529	$76,300	30	$0	$0
49	CC	74359655	GAMBOA CAMARGO GUILLERMO ENRIQUE	230301	30	$1,718,949	$275,100	EPS017	30	$1,718,949	$68,800	CCF10	30	$1,812,399	$72,500	14-23	30	$1,718,949	$74,800	30	$0	$0
50	CC	30352577	GARCIA FANY	25-14	30	$1,461,639	$233,900	EPS017	30	$1,461,639	$58,500	CCF10	30	$1,555,089	$62,300	14-23	30	$1,461,639	$35,700	30	$0	$0
51	CC	1053604772	GARZON BUITRAGO CAMILO INDALECIO	230201	30	$1,842,079	$294,800	EPS017	30	$1,842,079	$73,700	CCF10	30	$1,935,529	$77,500	14-23	30	$1,842,079	$44,900	30	$0	$0
52	CC	46680595	GOMEZ MONTENEGRO YENNY	231001	30	$1,559,082	$249,500	EPS017	30	$1,559,082	$62,400	CCF10	30	$1,652,532	$66,200	14-23	30	$1,559,082	$38,000	30	$0	$0
53	CC	74130530	GONZALEZ FONSECA WILDER ALEJANDRO	25-14	30	$1,461,639	$233,900	EPS017	30	$1,461,639	$58,500	CCF10	30	$1,555,089	$62,300	14-23	30	$1,461,639	$35,700	30	$0	$0
54	CC	51684052	GRANADOS CASTRO FLOR DE MARIA	231001	30	$1,501,284	$240,300	EPS017	30	$1,501,284	$60,100	CCF10	30	$1,594,734	$63,800	14-23	30	$1,501,284	$36,600	30	$0	$0
55	CC	1053613608	GRANADOS MEDINA JIMMY ALEXANDER	25-14	30	$1,913,076	$306,100	EPS017	30	$1,913,076	$76,600	CCF10	30	$2,006,526	$80,300	14-23	30	$1,913,076	$46,700	30	$0	$0
56	CC	40019727	HERNANDEZ MARIA ROSALBA	231001	3	$144,893	$23,200	EPS017	3	$144,893	$5,800	CCF10	3	$0	$0	14-23	3	$144,893	$0	3	$0	$0
57	CC	40019727	HERNANDEZ MARIA ROSALBA	231001	27	$1,315,476	$210,500	EPS017	27	$1,315,476	$52,700	CCF10	27	$1,399,580	$56,000	14-23	27	$1,315,476	$32,100	27	$0	$0
58	CC	74359629	HERRERA RIVERA HELMER	230201	30	$5,581,772	$893,100	EPS005	30	$5,581,772	$223,300	CCF10	30	$5,581,772	$223,300	14-23	30	$5,581,772	$136,000	30	$0	$0
59	CC	23856706	HIGUERA ALVARADO NUBIA TERESA	230301	30	$1,461,639	$233,900	EPS017	30	$1,461,639	$58,500	CCF10	30	$1,555,089	$62,300	14-23	30	$1,461,639	$15,300	30	$0	$0
60	CC	1053606359	HURTADO FIGUEREDO DIANA KATHERINE	230201	30	$5,581,772	$893,100	EPS017	30	$5,581,772	$223,300	CCF10	30	$5,581,772	$223,300	14-23	30	$5,581,772	$29,200	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
61	CC	46683315	JIMENEZ NIÑO LUZ MARLEN	230301	30	$1,559,082	$249,500	EPS037	30	$1,559,082	$62,400	CCF10	30	$1,652,532	$66,200	14-23	30	$1,559,082	$38,000	30	$0	$0
62	CC	24069673	JIMENEZ DE TIBATA MARIA EULALIA	25-14	30	$1,461,639	$233,900	EPS017	30	$1,461,639	$58,500	CCF10	30	$1,555,089	$62,300	14-23	30	$1,461,639	$35,700	30	$0	$0
63	CC	74322520	LARA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO	230301	30	$1,842,079	$294,800	EPS005	30	$1,842,079	$73,700	CCF10	30	$1,935,529	$77,500	14-23	30	$1,842,079	$44,900	30	$0	$0
64	CC	40395482	LOPEZ CETINA ROSALBA	230201	30	$1,510,360	$241,700	EPS037	30	$1,510,360	$60,500	CCF10	30	$1,603,810	$64,200	14-23	30	$1,510,360	$36,800	30	$0	$0
65	CC	1051588795	MACHUCA OJEDA JOHNN JAIRO	25-14	30	$1,738,959	$278,300	EPS017	30	$1,738,959	$69,600	CCF10	30	$1,832,409	$73,300	14-23	30	$1,738,959	$42,400	30	$0	$0
66	CC	74373225	MALAVER CERCADO HECTOR PABLO	25-14	30	$2,336,370	$373,900	EPS005	30	$2,336,370	$93,500	CCF10	30	$2,429,820	$97,200	14-23	30	$2,336,370	$24,400	30	$0	$0
67	CC	74359649	MALAVER BENAVIDES LUIS GABRIEL	231001	30	$1,794,349	$287,100	EPS005	30	$1,794,349	$71,800	CCF10	30	$1,887,799	$75,600	14-23	30	$1,794,349	$9,400	30	$0	$0
68	CC	73120570	MATEUS JIMENEZ CESAR AUGUSTO	25-14	10	$614,026	$98,300	EPS005	10	$614,026	$24,600	CCF10	10	$614,026	$0	14-23	10	$614,026	$0	10	$0	$0
69	CC	73120570	MATEUS JIMENEZ CESAR AUGUSTO	25-14	20	$1,228,053	$196,500	EPS005	20	$1,228,053	$49,200	CCF10	20	$3,811,463	$152,500	14-23	20	$1,228,053	$30,000	20	$0	$0
70	CC	4192455	MONROY RODRIGUEZ EDILBERTO	25-14	30	$1,461,639	$233,900	EPS041	30	$1,461,639	$58,500	CCF10	30	$1,555,089	$62,300	14-23	30	$1,461,639	$35,700	30	$0	$0
71	CC	4192776	MONROY RODRIGUEZ HERNANDO	25-14	30	$1,842,079	$294,800	EPS017	30	$1,842,079	$73,700	CCF10	30	$1,935,529	$77,500	14-23	30	$1,842,079	$19,300	30	$0	$0
72	CC	1053606329	MONROY RODRIGUEZ PAOLA ANDREA	230201	30	$1,794,349	$287,100	EPS005	30	$1,794,349	$71,800	CCF10	30	$1,887,799	$75,600	14-23	30	$1,794,349	$9,400	30	$0	$0
73	CC	1053615891	OCHOA DIAZ WILFREDY	230201	30	$1,861,267	$297,900	EPS037	30	$1,861,267	$74,500	CCF10	30	$1,954,717	$78,200	14-23	30	$1,861,267	$19,500	30	$0	$0
74	CC	93124198	ORJUELA CAMPOS JOSE ALBEIRO	25-14	30	$1,632,164	$261,200	EPS017	30	$1,632,164	$65,300	CCF10	30	$1,725,614	$69,100	14-23	30	$1,632,164	$39,800	30	$0	$0
75	CC	46680659	PACHECO MARTINEZ GLADYS JACKELINNE	25-14	3	$167,073	$26,800	EPS005	3	$167,073	$6,700	CCF10	3	$0	$0	14-23	3	$167,073	$0	3	$0	$0
76	CC	46680659	PACHECO MARTINEZ GLADYS JACKELINNE	25-14	3	$167,073	$26,800	EPS005	3	$167,073	$6,700	CCF10	3	$0	$0	14-23	3	$167,073	$0	3	$0	$0
77	CC	46680659	PACHECO MARTINEZ GLADYS JACKELINNE	25-14	22	$1,315,856	$210,600	EPS005	22	$1,315,856	$52,700	CCF10	22	$4,190,178	$167,700	14-23	22	$1,315,856	$6,900	22	$0	$0
78	CC	60423066	PARRA MARIÑO BRIGIDA	230301	30	$1,559,082	$249,500	EPS017	30	$1,559,082	$62,400	CCF10	30	$1,652,532	$66,200	14-23	30	$1,559,082	$38,000	30	$0	$0
79	CC	46683468	PATARROYO RAMIREZ ALICIA	25-14	30	$1,461,639	$233,900	EPS017	30	$1,461,639	$58,500	CCF10	30	$1,555,089	$62,300	14-23	30	$1,461,639	$15,300	30	$0	$0
80	CC	74130943	PATARROYO SANCHEZ JUAN FERNANDO	230201	30	$1,461,639	$233,900	CCFC55	30	$1,461,639	$58,500	CCF10	30	$1,555,089	$62,300	14-23	30	$1,461,639	$35,700	30	$0	$0
81	CC	74333939	PEREZ BECERRA MARCO AURELIO	25-14	30	$1,842,079	$294,800	EPS037	30	$1,842,079	$73,700	CCF10	30	$1,935,529	$77,500	14-23	30	$1,842,079	$44,900	30	$0	$0
82	CC	52442246	PIRABAN NIDIA ESPERANZA	25-14	30	$1,510,360	$241,700	EPS005	30	$1,510,360	$60,500	CCF10	30	$1,603,810	$64,200	14-23	30	$1,510,360	$36,800	30	$0	$0
83	CC	74360605	PUERTO CAMARGO IVAN HERNAN	230301	30	$1,794,349	$287,100	EPS005	30	$1,794,349	$71,800	CCF10	30	$1,887,799	$75,600	14-23	30	$1,794,349	$9,400	30	$0	$0
84	CC	4192111	RACHE MONGUA JORGE ANTONIO	231001	30	$1,501,284	$240,300	EPS017	30	$1,501,284	$60,100	CCF10	30	$1,594,734	$63,800	14-23	30	$1,501,284	$15,700	30	$0	$0
85	CC	1053609802	RICO VALDERRAMA LINA MARIA	25-14	10	$1,110,876	$177,800	EPS017	10	$1,110,876	$44,500	CCF10	10	$5,513,552	$220,600	14-23	10	$1,110,876	$5,800	10	$0	$0
86	CC	1053613345	RODRIGUEZ FONSECA DUVAN ALBENIO	230301	30	$1,882,374	$301,200	EPS017	30	$1,882,374	$75,300	CCF10	30	$1,975,824	$79,100	14-23	30	$1,882,374	$19,700	30	$0	$0
87	CC	1053615468	RODRIGUEZ IBAÑEZ DUVAN ANDRES	25-14	6	$368,416	$59,000	EPS017	6	$368,416	$14,800	CCF10	6	$0	$0	14-23	6	$368,416	$0	6	$0	$0
88	CC	1053615468	RODRIGUEZ IBAÑEZ DUVAN ANDRES	25-14	24	$1,523,552	$243,800	EPS017	24	$1,523,552	$61,000	CCF10	24	$1,966,728	$78,700	14-23	24	$1,523,552	$37,200	24	$0	$0
89	CC	74323446	RODRIGUEZ BARRERA ISRAEL	25-14	30	$1,461,639	$233,900	EPS017	30	$1,461,639	$58,500	CCF10	30	$1,555,089	$62,300	14-23	30	$1,461,639	$35,700	30	$0	$0
90	CC	1053606365	RODRIGUEZ DIAZ MARTHA LILIANA	25-14	30	$1,559,082	$249,500	ESSC24	30	$1,559,082	$62,400	CCF10	30	$1,652,532	$66,200	14-23	30	$1,559,082	$38,000	30	$0	$0
91	CC	1053613382	RODRIGUEZ ALFONSO MONICA JESENIA	25-14	30	$1,461,639	$233,900	ESSC24	30	$1,461,639	$58,500	CCF10	30	$1,555,089	$62,300	14-23	30	$1,461,639	$35,700	30	$0	$0
92	CC	74322563	RODRIGUEZ HURTADO PEDRO ANTONIO	230201	30	$1,548,199	$247,800	EPS037	30	$1,548,199	$62,000	CCF10	30	$1,641,649	$65,700	14-23	30	$1,548,199	$37,800	30	$0	$0
93	CC	1053605397	ROJAS ARAQUE MARIO ANDRES	231001	2	$115,931	$18,600	EPS017	2	$115,931	$4,700	CCF10	2	$0	$0	14-23	2	$115,931	$0	2	$0	$0
94	CC	1053605397	ROJAS ARAQUE MARIO ANDRES	231001	28	$1,883,872	$301,500	EPS017	28	$1,883,872	$75,400	CCF10	28	$1,971,092	$78,900	14-23	28	$1,883,872	$45,900	28	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
95	CC	74322163	ROMERO ESPITIA JAIME ANTONIO	25-14	2	$97,443	$15,600	EPS037	2	$97,443	$3,900	CCF10	2	$0	$0	14-23	2	$97,443	$0	2	$0	$0
96	CC	74322163	ROMERO ESPITIA JAIME ANTONIO	25-14	28	$1,364,197	$218,300	EPS037	28	$1,364,197	$54,600	CCF10	28	$1,451,416	$58,100	14-23	28	$1,364,197	$33,300	28	$0	$0
97	CC	8731958	ROSAS HIGUERA SANTOS MIGUEL	230301	30	$1,883,872	$301,500	EPS005	30	$1,883,872	$75,400	CCF10	30	$1,977,322	$79,100	14-23	30	$1,883,872	$45,900	30	$0	$0
98	CC	74323801	RUIZ RUIZ JOSE MIGUEL	25-14	30	$1,842,079	$294,800	EPS037	30	$1,842,079	$73,700	CCF10	30	$1,935,529	$77,500	14-23	30	$1,842,079	$19,300	30	$0	$0
99	CC	1053604273	RUIZ CAÑADULCE SANDRA PAOLA	230201	7	$429,818	$68,800	EPS037	7	$429,818	$17,200	CCF10	7	$0	$0	14-23	7	$429,818	$0	7	$0	$0
100	CC	1053604273	RUIZ CAÑADULCE SANDRA PAOLA	230201	23	$1,412,261	$226,000	EPS037	23	$1,412,261	$56,500	CCF10	23	$1,975,511	$79,100	14-23	23	$1,412,261	$34,500	23	$0	$0
101	CC	74324119	SALAMANCA GABRIEL	25-14	30	$1,842,079	$294,800	EPS017	30	$1,842,079	$73,700	CCF10	30	$1,935,529	$77,500	14-23	30	$1,842,079	$44,900	30	$0	$0
102	CC	74322662	SALAZAR ANDRADE HERNAN FRANCISCO	230301	20	$954,186	$152,700	EPS017	20	$954,186	$38,200	CCF10	20	$0	$0	14-23	20	$954,186	$0	20	$0	$0
103	CC	74322662	SALAZAR ANDRADE HERNAN FRANCISCO	230301	10	$500,428	$80,100	EPS017	10	$500,428	$20,100	CCF10	10	$531,578	$21,300	14-23	10	$500,428	$12,200	10	$0	$0
104	CC	46683220	SALCEDO RODRIGUEZ NINI GIOVANNA	230201	30	$1,510,360	$241,700	EPS041	30	$1,510,360	$60,500	CCF10	30	$1,603,810	$64,200	14-23	30	$1,510,360	$36,800	30	$0	$0
105	CC	74323507	SANA TORRES MIGUEL ANGEL	25-14	30	$1,451,405	$232,300	EPS002	30	$1,451,405	$58,100	CCF10	30	$0	$0	14-23	30	$1,451,405	$0	30	$0	$0
106	CC	74322535	SANCHEZ PULIDO HECTOR JULIO	25-14	30	$1,461,639	$233,900	EPS017	30	$1,461,639	$58,500	CCF10	30	$1,555,089	$62,300	14-23	30	$1,461,639	$35,700	30	$0	$0
107	CC	4042060	SIMBACICA GUTIERREZ JOSE RICARDO	25-14	30	$1,461,639	$233,900	EPS005	30	$1,461,639	$58,500	CCF10	30	$1,555,089	$62,300	14-23	30	$1,461,639	$35,700	30	$0	$0
108	CC	74130153	SUAREZ BOCIGA JOSE RICARDO	230301	30	$1,619,983	$259,200	EPS037	30	$1,619,983	$64,800	CCF10	30	$1,713,433	$68,600	14-23	30	$1,619,983	$39,500	30	$0	$0
109	CC	1049609304	SUAREZ MOLINA LEIDY LILIANA	230301	30	$3,131,529	$501,100	EPS005	30	$3,131,529	$125,300	CCF10	30	$3,131,529	$125,300	14-23	30	$3,131,529	$76,300	30	$0	$0
110	CC	1053610862	TIBATA JIMENEZ YOVANY	25-14	30	$2,010,936	$321,800	EPS017	30	$2,010,936	$80,500	CCF10	30	$2,104,386	$84,200	14-23	30	$2,010,936	$49,000	30	$0	$0
111	CC	1053611160	TORRES SUAREZ YEISON ROKNEY	25-14	30	$7,340,036	$1,248,100	EPS037	30	$7,340,036	$293,700	CCF10	30	$7,340,036	$293,700	14-23	30	$7,340,036	$38,400	30	$0	$0
112	CC	1053613769	URIBE CORREDOR EDWIN SEBASTIAN	230301	30	$1,842,079	$294,800	EPS017	30	$1,842,079	$73,700	CCF10	30	$1,935,529	$77,500	14-23	30	$1,842,079	$19,300	30	$0	$0
113	CC	74359861	VALDERRAMA CARLOS	25-14	30	$1,842,079	$294,800	EPS005	30	$1,842,079	$73,700	CCF10	30	$1,935,529	$77,500	14-23	30	$1,842,079	$44,900	30	$0	$0
114	CC	7226057	VALDERRAMA PEDRAZA JOSE TRINIDAD	230201	30	$1,461,639	$233,900	EPS002	30	$1,461,639	$58,500	CCF10	30	$1,555,089	$62,300	14-23	30	$1,461,639	$63,600	30	$0	$0
115	CC	23856977	VALDERRAMA LOPEZ MARIA AMALFI	25-14	30	$3,332,627	$533,300	EPS017	30	$3,332,627	$133,400	CCF10	30	$3,332,627	$133,400	14-23	30	$3,332,627	$34,800	30	$0	$0
116	CC	74322488	VARGAS SANDOVAL JOSE FERNANDO	25-14	30	$1,842,079	$294,800	EPS002	30	$1,842,079	$73,700	CCF10	30	$1,935,529	$77,500	14-23	30	$1,842,079	$44,900	30	$0	$0
117	CC	1053614462	VARGAS RODRIGUEZ MAICOL FERNANDO	230201	30	$1,632,164	$261,200	EPS037	30	$1,632,164	$65,300	CCF10	30	$1,725,614	$69,100	14-23	30	$1,632,164	$39,800	30	$0	$0
118	CC	74359989	VASQUEZ CAMARGO ANGEL ROSENDO	230301	30	$1,842,079	$294,800	EPS005	30	$1,842,079	$73,700	CCF10	30	$1,935,529	$77,500	14-23	30	$1,842,079	$44,900	30	$0	$0
119	CC	53083888	VILLAMIL TOVAR KAROL IVON	230301	30	$4,593,240	$735,000	EPS005	30	$4,593,240	$183,800	CCF10	30	$9,583,877	$383,400	14-23	30	$4,593,240	$24,000	30	$0	$0
Total			**Afiliados(99)**			$199,973,552	$32,074,900			$199,973,552	$8,003,700			$227,211,522	$9,017,900			$199,973,552	$3,551,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				99	$32,074,900	$0	$0	$32,074,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$2,138,600	$0	$0	$2,138,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	50	$15,394,900	$0	$0	$15,394,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	22	$7,498,300	$0	$0	$7,498,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	$7,043,100	$0	$0	$7,043,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				99	$3,551,200	$0	$0	$3,551,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	99	$3,551,200	$0	$0	$3,551,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				99	$9,017,900	$0	$0	$9,017,900
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	99	$9,017,900	$0	$0	$9,017,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				99	$8,003,700	$0	$0	$8,003,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$58,500	$0	$0	$58,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$120,900	$0	$0	$120,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	46	$3,652,000	$0	$0	$3,652,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	19	$1,500,700	$0	$0	$1,500,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$181,400	$0	$0	$181,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$387,400	$0	$0	$387,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	23	$2,102,800	$0	$0	$2,102,800
TOTAL				99	$52,647,700	$0	$0	$52,647,700

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DAVID FELIPE PUENTES FUENTES
IDENTIFICACIÓN:	CC-1002647527
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-05
FECHA DE PAGO:	2025-12-03
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35287888
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35287888
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
CCF10	891800213	COMFABOY	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.500	$ 28.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441.800	$ 441.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/01/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DAVID FELIPE PUENTES FUENTES
IDENTIFICACIÓN:	CC-1002647527
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-01-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-08
FECHA DE PAGO:	2026-01-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35593289
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35593289
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
CCF10	891800213	COMFABOY	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.500	$ 28.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441.800	$ 441.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/02/2026

PAGADO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	4192858	AMAURY AMET VARELA PATARROYO		CRA 21A N 23 12	3163795313	amauryamet@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I.- Independiente			BOYACÁ	PAIPA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	1	27/11/2025	91535712	$413.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	900811321-5	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	413.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	4192656	AMAURY AMET VARELA PATARROYO	CRA 21A N 23 12	3163795313	amauryamet@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I -- Independiente		BOYACÁ	PAIPA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	27/11/2025	91535712	$413.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Cód. AFP	ING AFP	Cotización	Voluntario a Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	ING EPS	Cotización Valor IBC	Cód. ARL	ING ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	ING CCF	Aporte CCF	SIN otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	4192656	VARELA PATARROYO AMAURY AMET	59	0		N															X		231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-03	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAIPA S.A. E.S.P. Red Vital	RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.	CÓDIGO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PE-SIG-SCC-FO-05	
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	14/03/2023
		VERSIÓN	04
		PÁGINA	1 de 1

REUNIÓN SOCIALIZACIÓN LLANO GRANDE

FECHA	01	12	2025	HORA INICIO	06:00 p.m.
DEPENDENCIA	PLANEACIÓN Y PROYECTOS RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.				
DIRIGIDA POR	Ingeniero Yeison Rokney Torres Suarez Arquitecto Jorge Edwin López Torres				

ASUNTO/OBJETIVO

Socialización intervención reposición alcantarillado sanitario Llano Grande a la comunidad beneficiada sector Llano Grande.

DESARROLLO

1. Saludo.
2. Intervención por parte del Arquitecto Jorge Edwin López Torres, secretario de Infraestructura Pública y Movilidad.
3. Intervención del Ingeniero Yeison Rokney Torres Suarez, Gerente General Red Vital Paipa S.A. E.S.P.
4. Preguntas de la comunidad sobre la intervención y el alcance de la misma.
5. Respuestas a las preguntas de la comunidad.


ACUERDOS Y COMPROMISOS

1. Se acuerda entregar la vía en las mismas condiciones en que fue encontrada antes de la intervención.
2. La comunidad se compromete a suministrar los accesorios necesarios para cada conexión domiciliaria. Ya que los usuarios son responsables de la conexión domiciliaría de cada una de sus viviendas. "El mantenimiento de las redes internas o domiciliarias está a cargo de los suscriptores o usuarios (sean estos individuales o agrupados en una propiedad horizontal)" Ley 142 de 1994
3. Se acordó con la comunidad que, una vez iniciadas las intervenciones, se evite el tránsito por la zona donde se adelanten los trabajos, con el fin de prevenir accidentes.
4. Se solicitó a la comunidad que, durante la ejecución de las conexiones domiciliarias, se abstenga en lo posible de hacer uso del sistema de alcantarillado, para permitir una adecuada instalación.

PROPOSICIONES Y VARIOS

No se presentaron.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FECHA PRÓXIMA REUNIÓN	No se programa próxima reunión.

Para constancia del presente documento se anexa lista de asistencia:

PAIPA S.A. E.S.P. Red Vital	RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.	CÓDIGO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PE-SIG-SGC-FO-08	
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA	14/03/2023
		VERSIÓN	04
		PÁGINA	1 de 1

NOMBRE DEL EVENTO	Socialización intervención alcantarillado sanitario	HORA	6:00 pm	FECHA	01/12/2025
REALIZADO POR	Red Vital Paipa Secretaria de infraestructura	TEMAS A TRATAR			
DIRIGIDO A	Comunidad beneficiada llano grande	Socialización de las intervenciones			

Pag 1

No.	No. IDENTIFICACIÓN	NOMBRE ASISTENTE	CELULAR	CARGO	FIRMA
	1053607482	Felix Giovanni Camargo Lopez	320476850	Usuario	
	74322783	Felix Yobany Camargo B	3219276255	Usuario	
	23855755	Rita Maria Martinez	3203393047	Vecino	
	19486012	CARLOS ARTURO PERILLA B	3002129653	USUARIO	
	74.130.739	Hector E. Soarez B	3132261013	Usuario	
	1057578648	CINDY OSORIO	3205538219	USUARIO	
	51'993689	MARTHA M. REYES O.	3002129599	USUARIA	
	23855357	[illegible] Medina	23855357	Paipa.	
	23854965	Flor Ilba Pacheco Ochoa	3114450483	Paipa	
	23854923	YEYONIRA PACHECO HIGUERA	3143811784	Ptc. JAC.	
	23855509	Maritelle Ochoa ch.	3208089930	— —	
	31079092114	[illegible]	31079092114	— — — —	
	23550927	Maria Alexia Aguilla	3134507574	Paipa	
	23856617	Aura Nelyi Vargas	3123973848	Vecino	
Telfo	3204534066	Ana Mercedes Vargas		Vecino	

PAIPA S.A. E.S.P. Red Vital	RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.	CÓDIGO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PE-SIG-SGC-FO-08	
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA	14/03/2023
		VERSIÓN	04
		PÁGINA	1 de 1

NOMBRE DEL EVENTO	Socialización intervención alcantarillado sanitario	HORA	6:00 pm	FECHA	01/12/2025
REALIZADO POR	Red Vital Paipa Secretaria de infraestructura	TEMAS A TRATAR	Socialización de las intervenciones		
DIRIGIDO A	Comunidad beneficiada Llano Grande				

Pag 2

No.	No. IDENTIFICACIÓN	NOMBRE ASISTENTE	CELULAR	CARGO	FIRMA
	23.856.977	Maria Amulfo Valderrama	3107918713	profesional Plan-pol	
	74'130.470	Diley Fabian Ochoa	74'130.970		
	46.681292	Yadira Isabel Garzón	3138975378	—	Yadira Garzón
	74360766	RUBEN ALEXANDER	3163025575		
	1053606919	Daniel Cordoba A.	3203624458		
	1053606783	Madelyn Ochoa	3125682001		
	1023868588	Diego Ojeda Vargas	3134953621		Diego Ojeda
	1002551361	Nancy Salamanca	3144694307		Nancy S.
	74322636	Gregorio Salomonca	3243922029		
	1053605838	Dina Salamanca	1053605838		
	1053605010.	Laura Fernanda Baez	3125643751.		
	1053605010	Bayron Ernesto Mal.	3142896274.		
	1053612097.	Jaime Ernesto Mal	3154562297		
	39761118.	Rosa elvia Piñeros.	3213256575		Rosa Elvia Piñeros.
	1056 928 291	Maria Elena Becerra	323 2 4874 55		Maria Becerra

PAIPA S.A. E.S.P. Red Vital	RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.	CÓDIGO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PE-SIG-SGC-FO-08	
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA	14/03/2023
		VERSIÓN	04
		PÁGINA	1 de 1

NOMBRE DEL EVENTO	Socialización intervención alcantarillado sanitario	HORA	6:00 pm	FECHA	01/12/2025
REALIZADO POR	Red Vital Paipa Secretaria de infraestructur.	TEMAS A TRATAR Socialización de las intervenciones			
DIRIGIDO A	Comunidad beneficiada Llano Grande				

Pag 3

No.	No. IDENTIFICACIÓN	NOMBRE ASISTENTE	CELULAR	CARGO	FIRMA
	74'323-945	Jaime E. Gil	3112007418	Usuario	
	4191993	Julio Contreras	3222456037	Hogar	
	4042274	Rubem Dario Cocobuena	3229004883		
	74.359.996	Laura Rico Martinez	74.359.996		
	46682054	Dora Luz Gil O.	3214198121	JAC	
	1053614915	Jenny Paola Cantor	3209336049	Prof. Apoyo Apoyo - Alcaldía de Paipa	
	1002647527	David Felipe Puentes	3104804214	Apoyo Planeación y P. Red Vital Paipa	
	1053610143	Karina del Pilar Córdoba F.	3138759816	Prof. Apoyo Red Vital	

Km 1 Vía Francisco Montaña / Código Postal 150444
Números de Contacto: +(57) 320 8587785 – 320 8585284
Correo electrónico: redvital@paipa-boyaca.gov.co / sig@redvitalpaipa.com
Página Web: www.redvitalpaipasaesp.com

PAIPA S.A. E.S.P. Red Vital	RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIÓN MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS	CÓDIGO: PE-GPD-FO-14 FECHA: 02/02/2026 VERSIÓN: 01 PAGINA: ENCABEZADO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 039 DE 2025

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE DIFERENTES TRAMOS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LOS SECTORES LLANO GRANDE, TOIBITA, PABLO SOLANO, BONZA Y CANAL CARTAGENA, UBICADOS EN LAS ZONAS RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

INFORME MENSUAL N° 01
(25 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2025)

ÍTEM 1.1.1 — LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL — UNIDAD: km




LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	UNIDAD:	CANTIDAD	TOTAL
INICIO - PZ1	17.41			km	1.00	0.02
PZ1 - PZ2	71.78			km	1.00	0.07
PZ2 - PZ3	19.71			km	1.00	0.02
PZ3 - PZ4	20.55			km	1.00	0.02
PZ4 - PZ5	19.56			km	1.00	0.02

OBSERVACIONES:

TOTAL ÍTEM: 0.15

ÍTEM 1.2.1 — EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN — UNIDAD: m3




LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	UNIDAD:	CANTIDAD	TOTAL
DOMICILIARIA 1	5.00	0.40	1.20	m3	1.00	2.40
PROYECCIÓN VÍA	3.00	0.40	1.20	m3	1.00	1.44
DOMICILIARIA 2	3.07	0.40	1.20	m3	1.00	1.47
DOMICILIARIA 3	4.47	0.40	1.20	m3	1.00	2.14
DOMICILIARIA 4	7.47	0.40	1.20	m3	1.00	3.58
DOMICILIARIA 5	6.88	0.40	1.20	m3	1.00	3.30
DOMICILIARIA 6	5.81	0.40	1.20	m3	1.00	2.79
DOMICILIARIA 7	4.30	0.40	1.20	m3	1.00	2.06
PROYECCIÓN VÍA	3.00	0.40	1.20	m3	1.00	1.44
DOMICILIARIA 8	5.50	0.40	1.20	m3	1.00	2.64

OBSERVACIONES:

TOTAL ÍTEM: 23.28

ÍTEM 1.2.2 — EXCAVACIONES MECÁNICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) — UNIDAD: m3




LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	UNIDAD:	CANTIDAD	TOTAL
INICIO - PZ1	17.11	0.80	1.75	m3	1.00	23.95
PZ1 - PZ2	71.18	0.80	1.80	m3	1.00	102.50
PZ2 - PZ3	19.11	0.80	1.97	m3	1.00	30.12
PZ3 - PZ4	19.95	0.80	2.01	m3	1.00	32.08
PZ4 - PZ5	19.26	0.80	2.00	m3	1.00	30.82
PZ1	2.00	2.00	1.80	m3	1.00	7.20
PZ4	2.00	2.00	2.00	m3	1.00	8.00

OBSERVACIONES:

TOTAL ÍTEM: 234.67

ÍTEM 1.3.1 — TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=6" — UNIDAD: m





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	UNIDAD:	CANTIDAD	TOTAL
DOMICILIARIA 1	5.00			m	1	5.00
PROYECCIÓN VÍA	3.00			m	1	3.00
DOMICILIARIA 2	3.07			m	1	3.07
DOMICILIARIA 3	4.47			m	1	4.47
DOMICILIARIA 4	7.47			m	1	7.47
DOMICILIARIA 5	6.88			m	1	6.88
DOMICILIARIA 6	5.81			m	1	5.81
DOMICILIARIA 7	4.30			m	1	4.30
DOMICILIARIA 8	5.50			m	1	5.50

OBSERVACIONES:

TOTAL ÍTEM: 46.50

ÍTEM 1.3.3 — TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10" — UNIDAD: m






LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	UNIDAD:	CANTIDAD	TOTAL
INICIO - PZ1	17.11			m	1.00	17.11
PZ1 - PZ2	71.18			m	1.00	71.18
PZ2 - PZ3	19.11			m	1.00	19.11
PZ3 - PZ4	19.95			m	1.00	19.95
PZ4 - PZ5	19.26			m	1.00	19.26
PROYECCIÓN VÍA	3.00			m	1.00	3.00

OBSERVACIONES:

TOTAL ÍTEM: 132.50

PAIPA S.A. E.S.P. Red Vital	RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.	CÓDIGO
	GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIÓN	PE-GPD-FO-14
	MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS	FECHA: 02/02/2025
		VERSIÓN: 01
		PAGINA: ENCABEZADO

ÍTEM	1.4.1	RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.	UNIDAD:	m3

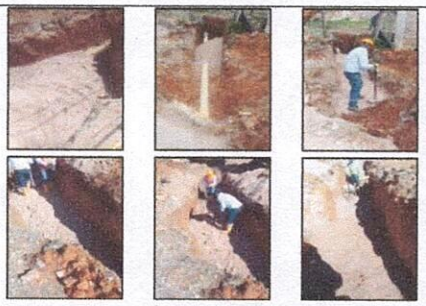

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	UNIDAD:		
INICIO - PZ1	17.11	0.80	0.55	m3	1.00	6.69
PZ1 - PZ2	71.18	0.80	0.55	m3	1.00	27.83
PZ2 - PZ3	19.11	0.80	0.55	m3	1.00	7.47
PZ3 - PZ4	19.95	0.80	0.55	m3	1.00	7.80
PZ4 - PZ5	19.26	0.80	0.55	m3	1.00	7.53
DOMICILIARIA 1	5.00	0.40	0.46	m3	1.00	0.82
PROYECCIÓN VÍA	3.00	0.40	0.46	m3	1.00	0.49
DOMICILIARIA 2	3.07	0.40	0.46	m3	1.00	0.50
DOMICILIARIA 3	4.47	0.40	0.46	m3	1.00	0.73
DOMICILIARIA 4	7.47	0.40	0.46	m3	1.00	1.22
DOMICILIARIA 5	6.88	0.40	0.46	m3	1.00	1.13
DOMICILIARIA 6	5.81	0.40	0.46	m3	1.00	0.95
DOMICILIARIA 7	4.30	0.40	0.46	m3	1.00	0.70
PROYECCIÓN VÍA	3.00	0.40	0.55	m3	1.00	0.51
DOMICILIARIA 8	5.50	0.40	0.46	m3	1.00	0.90

OBSERVACIONES:

TOTAL ÍTEM: 65.28

ÍTEM	1.4.2	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBRO COMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	UNIDAD:	m3



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	UNIDAD:		
INICIO - PZ1	17.11	0.80	1.20	m3	1.00	16.43
PZ1 - PZ2	71.18	0.80	1.25	m3	1.00	71.18
PZ2 - PZ3	19.11	0.80	1.42	m3	1.00	21.71
PZ3 - PZ4	19.95	0.80	1.46	m3	1.00	23.30
PZ4 - PZ5	19.26	0.80	1.45	m3	1.00	22.34
PZ1	2.00	2.00	1.60	m3	1.00	1.54
PZ4	2.00	2.00	1.80	m3	1.00	1.23
DOMICILIARIA 1	5.00	0.40	0.74	m3	1.00	1.48
PROYECCIÓN VÍA	3.00	0.40	0.74	m3	1.00	0.89
DOMICILIARIA 2	3.07	0.40	0.74	m3	1.00	0.91
DOMICILIARIA 3	4.47	0.40	0.74	m3	1.00	1.32
DOMICILIARIA 4	7.47	0.40	0.74	m3	1.00	2.21
DOMICILIARIA 5	6.88	0.40	0.74	m3	1.00	2.04
DOMICILIARIA 6	5.81	0.40	0.74	m3	1.00	1.72
DOMICILIARIA 7	4.30	0.40	0.74	m3	1.00	1.27
PROYECCIÓN VÍA	3.00	0.40	0.65	m3	1.00	0.78
DOMICILIARIA 8	5.50	0.40	0.74	m3	1.00	1.63

OBSERVACIONES:

TOTAL ÍTEM: 171.97

ÍTEM	1.4.3	ACARREO DE MATERIALES PÉTREOS, TIERRA Y VARIOS (DESPUÉS DE 5 KM.).	UNIDAD:	m3-km



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL
	VOLUMEN (m^3)	DISTANCIA (km)	EXPANSIÓN (%)	UNIDAD:		
MATERIAL AFIRMADO TOTAL	171.97	5.00	1.30	m3-km	1.00	1117.80

OBSERVACIONES:

TOTAL ÍTEM: 1117.80

ÍTEM	1.5.3	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.50 M. < H < 2.00 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).	UNIDAD:	und



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	UNIDAD:		
PZ1		1.20	1.60	und	1.00	1.00
PZ4		1.20	1.80	und	1.00	1.00

OBSERVACIONES:

TOTAL ÍTEM: 2.00

ÍTEM	1.5.6	ARO Y TAPA POZOS INSP EN HF	UNIDAD:	und



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	UNIDAD:		
PZ4				und	1.00	1.00

OBSERVACIONES:

TOTAL ÍTEM: 1.00

PAIPA S.A. E.S.P. Red Vital	RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIÓN MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS	CÓDIGO PE-GPD-FO-14 FECHA 02/02/2026 VERSIÓN 01 PAGINA ENCABEZADO

ÍTEM	1.6.2	CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 250 MM. X 160 MM. KIT SILLA YEE 10" x 6"	UNIDAD:	und





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	UNIDAD:		
DOMICILIARIA 1				und	1.00	1.00
DOMICILIARIA 3				und	1.00	1.00
DOMICILIARIA 4				und	1.00	1.00
DOMICILIARIA 5				und	1.00	1.00
DOMICILIARIA 6				und	1.00	1.00
DOMICILIARIA 8				und	1.00	1.00

OBSERVACIONES:

TOTAL ÍTEM: 6.00

ÍTEM	1.7.1	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0.40 X 0.40 X 0.40 MTS LADRILLO	UNIDAD:	und





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	UNIDAD:		
DOMICILIARIA 4				und	1.00	1.00

OBSERVACIONES:

TOTAL ÍTEM: 1.00

ÍTEM	1.7.2	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	UNIDAD:	m3

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL
	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	UNIDAD:		
CAJA 1	0.60	0.60	0.07	m3	1.00	0.024

OBSERVACIONES:

TOTAL ÍTEM: 0.024

MARÍA AMALFI VALDERRAMA LÓPEZ
DIRECTORA DE OBRA

R/LYEISON ROQUE TORRES SUAREZ
CONTRATISTA

Elaboro:	David Felipe Puentes Fuentes - Apoyo Planeación y Proyectos - Red Vital Paipa S.A. E.S.P.	Vo. Bo.	

PAIPA S.A. E.S.P. Red Vital	RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.	CÓDIGO	PE-GPD-FO-14
	GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIÓN	FECHA	02/02/2026
	SABANA DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATADAS Y EJECUTADAS	VERSIÓN	01
		PÁGINA	ENCABEZADO

CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 039 DE 2025
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE DIFERENTES TRAMOS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LOS SECTORES LLANO GRANDE, TOIBITA, PABLO SOLANO, BONZA Y CANAL CARTAGENA, UBICADOS EN LAS ZONAS RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
CONTRATISTA:	RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES

CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES										CANTIDADES EJECUTADAS INFORME 1										
ITEM	APUS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SUMINISTRO/TRANSPORTE (MUNICIPIO DE PAIPA)		OBRA CIVIL (RED VITAL)		VALOR TOTAL	SUMINISTRO/TRANSPORTE (MUNICIPIO DE PAIPA)		OBRA CIVIL (RED VITAL)			VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA ANTERIORES INFORMES	VALOR ANTERIORES INFORMES	CANTIDAD TOTAL ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO
					VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL		CANTIDAD SUMINISTRADA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	PORCENTAJE DE AVANCE	VALOR EJECUTADO						
1.1		PRELIMINARES																		
1.1.1	2.01.06	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	km	6.08	$ -	$ -	$ 4,049,000.34	$ 24,617,922.07	$ 24,617,922.07	0.00	$ -	0.15	2.45%	$ 603,341.54	$ 603,341.54	-	$ -	0.15	$ 603,341.54	2.45%
		SUB TOTAL PRELIMINARES							$ 24,617,922.07		$ -			$ 603,341.54	$ 603,341.54		$ -		$ 603,341.54	
1.2		EXCAVACIONES																	$ -	
1.2.1	2.03.10	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	m^3	463.73	$ -	$ -	$ 70,577.63	$ 32,728,964.35	$ 32,726,964.35	0.00	$ -	23.28	5.02%	$ 1,642,693.31	$ 1,642,693.31	-	$ -	23.28	$ 1,642,693.31	5.02%
1.2.2	2.02.15	EXCAVACIONES MECÁNICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	m^3	5,117.62	$ -	$ -	$ 26,955.15	$ 137,946,214.74	$ 137,946,214.74	0.00	$ -	234.67	4.59%	$ 6,326,461.54	$ 6,326,461.54	-	$ -	234.67	$ 6,326,461.54	4.59%
		SUB TOTAL EXCAVACIÓN							$ 170,675,179.10		$ -			$ 7,968,264.85	$ 7,968,264.85		$ -		$ 7,968,264.85	
1.3		TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC						$ -											$ -	
1.3.1	5.01.25	TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"	m	753.00	$ 51,050.40	$ 38,448,481.20	$ 22,093.87	$ 16,636,684.11	$ 55,085,165.31	6.00	$ 306,302.40	45.60	6.04%	$ 1,005,271.09	$ 1,311,633.49	-	$ -	45.60	$ 1,311,633.49	6.04%
1.3.2	5.01.26	TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=9"	m	274.00	$ 71,734.31	$ 19,655,360.94	$ 29,456.49	$ 8,071,536.26	$ 27,726,897.20	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -	$ -	-	$ -	0.00	$ -	0.00%
1.3.3	5.01.27	TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10"	m	1,915.13	$ 115,744.78	$ 221,665,796.24	$ 36,823.11	$ 70,520,695.35	$ 292,186,694.60	132.50	$ 15,338,180.70	132.50	6.92%	$ 4,879,062.08	$ 20,215,242.78	-	$ -	132.50	$ 20,215,242.78	6.92%
1.3.4	5.01.28	TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	m	1,899.56	$ 168,375.31	$ 319,859,687.40	$ 44,187.74	$ 83,942,742.67	$ 403,802,625.06	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -	$ -	-	$ -	0.00	$ -	0.00%
1.3.5	5.01.29	TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=14"	m	983.39	$ 240,390.43	$ 236,397,544.96	$ 51,552.35	$ 50,695,065.47	$ 287,093,610.42	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -	$ -	-	$ -	0.00	$ -	0.00%
1.3.6	5.01.30	TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=16"	m	82.99	$ 292,955.70	$ 18,452,444.81	$ 53,234.66	$ 3,478,956.06	$ 21,931,399.87	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -	$ -	-	$ -	0.00	$ -	0.00%
1.3.7	5.01.31	TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=19"	m	63.64	$ 398,092.62	$ 25,391,254.57	$ 58,916.96	$ 3,749,476.61	$ 29,140,731.18	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -	$ -	-	$ -	0.00	$ -	0.00%
		SUB TOTAL TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO PVC							$ 1,116,967,853.47		$ 15,642,543.18			$ 5,884,333.16	$ 21,526,876.36		$ -		$ 21,526,876.36	
1.4		RELLENOS																	$ -	
1.4.1	4.01.04	RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	m^3	994.03	$ 92,856.50	$ 92,302,441.05	$ 31,411.66	$ 31,224,132.55	$ 123,526,573.61	65.28	$ 6,061,711.74	65.28	6.57%	$ 2,050,559.97	$ 8,112,271.71	-	$ -	65.28	$ 8,112,271.71	6.57%
1.4.2	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA 100 VIBRO COMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	m^3	2,883.31	$ 77,030.30	$ 160,477,641.42	$ 20,857.33	$ 62,222,928.77	$ 222,700,770.19	171.97	$ 13,248,663.11	171.97	8.25%	$ 5,136,276.84	$ 18,383,139.85	-	$ -	171.97	$ 18,383,139.85	8.25%
1.4.3	2.01.02	ACARREO DE MATERIALES PETREOS, TIERRA Y VARIOS (DESPUÉS DE 5 KM.)	m^3-km	13,641.52	$ 2,127.90	$ 29,032,612.35	$ -	$ -	$ 29,032,612.35	1,117.80	$ 2,377,567.59	0.00	0.00%	$ -	$ 2,377,567.59	-	$ -	0.00	$ 2,377,567.59	0.00%
1.4.4	3.03.16	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	m^3	1,965.54	$ -	$ -	$ 31,742.33	$ 62,393,993.54	$ 62,393,993.54	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -	$ -	-	$ -	0.00	$ -	0.00%
		SUB TOTAL RELLENOS			#¡DIV/0!				$ 437,424,149.70		$ 21,686,142.43			$ 7,186,836.81	$ 28,872,979.24		$ -		$ 28,872,979.24	
1.5		POZOS DE INSPECCIÓN																	$ -	
1.5.1	5.01.06	POZO DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR 1.0 M, (H < = 1.0 M.) (NO INCLUYE ARO Y TAPA)	und	33.00	$ 630,499.23	$ 20,806,474.59	$ 490,974.82	$ 16,202,169.05	$ 37,008,643.65	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -	$ -	-	$ -	0.00	$ -	0.00%
1.5.2	5.01.07	POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO INTERIOR 1.2 M, (1.00 M. < H < 1.50 M.) (NO INCLUYE ARO Y TAPA)	und	15.00	$ 1,136,383.81	$ 17,045,445.15	$ 583,052.61	$ 8,745,468.15	$ 25,790,934.30	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -	$ -	-	$ -	0.00	$ -	0.00%
1.5.3	5.01.08	POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO INTERIOR 1.2 M, (1.50 M. < H < 2.00 M.) (NO INCLUYE ARO Y TAPA)	und	9.00	$ 1,477,124.64	$ 13,294,124.46	$ 675,699.38	$ 6,075,813.42	$ 19,369,937.88	2.00	$ 2,954,249.28	2.00	22.22%	$ 1,350,180.76	$ 4,304,430.04	-	$ -	2.00	$ 4,304,430.04	22.22%
1.5.4	5.01.09	POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO INTERIOR 1.2 M, (2.00 M. < H < 2.50 M.) (NO INCLUYE ARO Y TAPA)	und	4.00	$ 1,610,865.18	$ 7,343,460.72	$ 787,834.09	$ 3,191,336.36	$ 10,424,797.08	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -	$ -	-	$ -	0.00	$ -	0.00%
1.5.5	5.01.10	POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO INTERIOR 1.5 M, (2.50 M. < H < 3.50 M.) (NO INCLUYE ARO Y TAPA)	und	2.00	$ 3,040,045.48	$ 6,098,090.86	$ 920,577.89	$ 1,841,155.60	$ 7,939,246.56	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -	$ -	-	$ -	0.00	$ -	0.00%
1.5.6	5.01.01	ARO Y TAPA POZOS INSP EN HF	und	82.00	$ 444,426.00	$ 36,443,099.00	$ 14,612.35	$ 1,198,212.70	$ 37,641,308.70	1.00	$ 444,426.00	1.00	1.22%	$ 14,612.35	$ 459,040.35	-	$ -	1.00	$ 459,040.35	1.22%
		SUB TOTAL POZOS							$ 138,184,868.17		$ 3,398,677.98			$ 1,364,793.11	$ 4,763,470.99		$ -		$ 4,763,470.99	
1.6		CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO																	$ -	
1.6.1	5.02.04	CONEXION DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 200 MM. X 160 MM. KIT SILLA YEE 8" x 6"	und	39.00	$ 217,549.30	$ 8,484,422.70	$ 165,704.00	$ 6,462,456.00	$ 14,946,878.70	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -	$ -	-	$ -	0.00	$ -	0.00%
1.6.2	5.02.05	CONEXION DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 250 MM. X 160 MM. KIT SILLA YEE 10" x 6"	und	57.00	$ 245,774.30	$ 14,009,135.10	$ 165,704.00	$ 9,445,128.00	$ 23,454,263.10	0.00	$ -	6.00	10.53%	$ 994,224.00	$ 994,224.00	-	$ -	6.00	$ 994,224.00	10.53%
1.6.3	5.02.06	CONEXION DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 315 MM. X 160 MM. KIT SILLA YEE 12" x 6"	und	64.00	$ 365,421.30	$ 23,386,963.20	$ 165,704.00	$ 10,605,056.00	$ 33,992,019.20	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -	$ -	-	$ -	0.00	$ -	0.00%
1.6.4	ITEM REFERENCIA	CONEXION DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 350 MM. X 160 MM. KIT SILLA YEE 14" x 6"	und	55.00	$ 375,938.30	$ 21,013,344.80	$ 165,704.00	$ 9,279,424.00	$ 30,292,768.80	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -	$ -	-	$ -	0.00	$ -	0.00%
1.6.5	ITEM REFERENCIA	CONEXION DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 400 MM. X 160 MM.	und	0.00	$ 419,237.30	$ -	$ 165,704.00	$ -	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -	$ -	-	$ -	0.00	$ -	0.00%
1.6.6	ITEM REFERENCIA	CONEXION DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 450 MM. X 160 MM.	und	0.00	$ 446,077.30	$ -	$ 165,704.00	$ -	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -	$ -	-	$ -	0.00	$ -	0.00%
		SUB TOTAL SUMINISTRO CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO							$ 662,885,929.80		$ -			$ 994,224.00	$ 994,224.00		$ -		$ 994,224.00	
1.7		CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.40 X 0.40 x 0.40 M. (NO INCLUYE TAPA)																	$ -	
1.7.1	ITEM REFERENCIA	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0.40 X 0.40 X 0.40 MTS LADRILLO	und	215.00	$ -	$ -	$ 359,046.46	$ 77,554,467.09	$ 77,554,467.09	0.09	$ -	1.00	0.46%	$ 359,046.46	$ 359,046.46	-	$ -	1.00	$ 359,046.46	0.46%
1.7.2	5.03.03	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	m^3	5.16	$ -	$ -	$ 1,013,578.84	$ 5,252,365.54	$ 5,252,365.54	0.00	$ -	0.02	0.46%	$ 24,082.63	$ 24,082.63	-	$ -	0.02	$ 24,082.63	0.46%
		SUB TOTAL CAJAS DE INSPECCIÓN							$ 82,806,832.63		$ -			$ 383,131.09	$ 383,131.09		$ -		$ 383,131.09	
1.8		SUMIDEROS																	$ -	
1.8.1	5.02.14	SUMIDERO LATERAL EN LADRILLO, DIMENSIONES INTERNAS 0.40 X 0.80 M. H = 1.10 M. (INCLUYE REJILLA PLÁSTICA TRÁFICO PESADO)	und	12.00	$ -	$ -	$ 1,732,259.52	$ 20,787,114.30	$ 20,787,114.30	0.00	$ -	0.00	0.00%	$ -	$ -	-	$ -	0.00	$ -	0.00%
		SUB TOTAL CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS							$ 20,787,114.30		$ -			$ -	$ -		$ -		$ -	
					APORTE PAIPA	$ 1,320,276,263.44	APORTE RED VITAL	$ 764,579,795.79	$ 2,084,148,040.33	APORTE PAIPA	$ 40,727,353.41	APORTE RED VITAL	2.58%	$ 24,384,934.55	$ 65,112,287.97		$ -		$ 65,112,287.97	3.58%

VoBo SSP.
