ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

ALCALDIA DE PUERTO ASIS
Secretaría de Infraestructura

CONTRATO DE OBRA No. 442-2025

OBJETO: MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

CONSORCIO SARO
NIT: 902004925-8
INTERVENTORIA: C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.
NIT: 900860555-1.

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS PARA ACTA DE RECIBO FINAL

REGISTRO FOTOGRAFICO

CAPITULO:	**3,00**	**REALIZAR EXCAVACIONES, DESALOJOS Y RETIROS**										**UNIDAD**	**M2**	
ÍTEM	3,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL TIPO T2400 O SIMILAR												
	DESCRIPCIÓN	**LONG.**	**ANCHO**	**Espesor o Altura**	**AREA**	**VOL**	**CANT.**	**Long**	**Can-X**	**Can-Y**	**Diam**	**Peso x ML**	**CANT. EJECUTADA**	
	EMPALMES VIA NACIONAL				1,18								1,18	
	EMPALMES VIA NACIONAL				1,74								1,74	
	EMPALMES CALLE 5				3,41								3,41	
	EMPALMES CALLE 5				1,95								1,95	
												TOTAL	**598,14**	

Firma.
JONHY BLADIMIR SALAS RODRIGUEZ
R/L CONSORCIO SARO
Contratista de Obra

Firma.
Ing. LIZETH ALEJANDRA URBANO NARVAEZ
R/L C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.
Contratista Interventoria

ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

ALCALDIA DE PUERTO ASIS
Secretaría de Infraestructura

CONTRATO DE OBRA No. 442-2025

OBJETO: MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

CONSORCIO SARO
NIT: 902004925-8
INTERVENTORIA: C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.
NIT: 900860555-1.

REGISTRO FOTOGRAFICO





CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS PARA ACTA DE RECIBO FINAL

CAPITULO:	3,00	REALIZAR ESTRUCTURA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO								UNIDAD	M3
ÍTEM	3,20	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIAL									

DESCRIPCIÓN	LONG.	ANCHO	Espesor o Altura	AREA	VOL	CANT.	Long	Can-X	Can-Y	Diam	Peso x ML	CANT. EJECUTADA
	(M)	(M)	(M)	M2	(M3)		(M)	Un	Un	Pulg	Kg	
EJE VIAL A Absc K0+00- K0+005	5,00	6,00	0,30		9,00							9,00
EJE VIAL A Absc K0+005- K0+010	5,00	6,00	0,30		9,00							9,00
EJE VIAL A Absc K0+010- K0+015	5,00	6,00	0,30		9,00							9,00
EJE VIAL A Absc K0+015- K0+020	5,00	6,00	0,30		9,00							9,00
EJE VIAL A Absc K0+020- K0+025	5,00	6,00	0,30		9,00							9,00
EJE VIAL A Absc K0+025- K0+030	5,00	6,00	0,30		9,00							9,00
EJE VIAL A Absc K0+030- K0+035	5,00	6,00	0,30		9,00							9,00
EJE VIAL A Absc K0+035- K0+040	5,00	6,00	0,30		9,00							9,00
EJE VIAL B Absc K0+040- K0+045	5,00	6,00	0,30		9,00							9,00
FALLO ENTRE Absc K0+045- K0+055	4,50	6,00	0,58		15,66							15,66
EJE VIAL B Absc K0+045- K0+050	5,00	6,00	0,30		9,00							9,00
EJE VIAL B Absc K0+050- K0+055	5,00	6,00	0,30		9,00							9,00
FALLO ENTRE Absc K0+050- K0+075	8,00	6,00	0,52		24,96							24,96
EJE VIAL B Absc K0+055- K0+060	5,00	6,00	0,30		9,00							9,00
EJE VIAL B Absc K0+060- K0+065	5,00	6,00	0,30		9,00							9,00
EJE VIAL B Absc K0+065- K0+070	5,00	6,00	0,30		9,00							9,00
FALLO ENTRE Absc K0+070- K0+075	4,50	6,00	0,60		16,20							16,20
EJE VIAL B Absc K0+070- K0+075	5,00	6,00	0,30		9,00							9,00
EJE VIAL B Absc K0+075- K0+080	5,00	6,00	0,30		9,00							9,00
EJE VIAL B Absc K0+080- K0+085	5,00	6,00	0,30		9,00							9,00
EJE VIAL B Absc K0+085- K0+090	5,00	6,00	0,30		9,00							9,00

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ALCALDIA DE PUERTO ASIS
Secretaría de Infraestructura

CONTRATO DE OBRA No. 442-2025

OBJETO: MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

CONSORCIO SARO
NIT: 902004925-8
INTERVENTORIA: C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.
NIT: 900860555-1.

REGISTRO FOTOGRAFICO

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS PARA ACTA DE RECIBO FINAL

CAPITULO:	**3,00**	**REALIZAR ESTRUCTURA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO**										**UNIDAD**	**M3**
ÍTEM	3,20	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIAL											
EJE VIAL B Absc K0+090- K0+095	5,00	6,00	0,30		9,00								9,00
EJE VIAL B Absc K0+095- K0+098,31	3,31	6,00	0,30		5,96								5,96
FALLO ENTRE Absc K0+090- K0+098,31	4,50	6,00	0,60		16,20								16,20
EMPALMES VIA NACIONAL			0,30	1,18									0,35
EMPALMES VIA NACIONAL			0,30	1,74									0,52
EMPALMES CALLE 5			0,30	3,41									1,02
EMPALMES CALLE 5			0,30	1,95									0,59
												TOTAL	**252,46**







Firma.
JONHY BLADIMIR SALAS RODRIGUEZ
R/L CONSORCIO SARO
Contratista de Obra

Firma.
Ing. LIZETH ALEJANDRA URBANO NARVAEZ
R/L C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.
Contratista Interventoria

ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

ALCALDIA DE PUERTO ASIS
Secretaría de Infraestructura

CONTRATO DE OBRA No. 442-2025

OBJETO: MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

CONSORCIO SARO
NIT: 902004925-8
INTERVENTORIA: C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.
NIT: 900860555-1.

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS PARA ACTA DE RECIBO FINAL

REGISTRO FOTOGRAFICO





CAPITULO:	**3,00**	**REALIZAR ESTRUCTURA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO**								**UNIDAD**		**M3**	
ÍTEM	3,30	SUBBASE GRANULAR											
DESCRIPCIÓN	**LONG.**	**ANCHO**	**Espesor o Altura**	**AREA**	**VOL**	**CANT.**	**Long**	**Can-X**	**Can-Y**	**Diam**	**Peso x ML**	**CANT. EJECUTADA**
	(M)	**(M)**	**(M)**	**M2**	**(M3)**		**(M)**	**Un**	**Un**	**Pulg**	**Kg**	
EJE VIAL A Absc K0+00- K0+005	5,00	6,00	0,20		6,00							6,00
EJE VIAL A Absc K0+005- K0+010	5,00	6,00	0,20		6,00							6,00
EJE VIAL A Absc K0+010- K0+015	5,00	6,00	0,20		6,00							6,00
EJE VIAL A Absc K0+015- K0+020	5,00	6,00	0,20		6,00							6,00
EJE VIAL A Absc K0+020- K0+025	5,00	6,00	0,20		6,00							6,00
EJE VIAL A Absc K0+025- K0+030	5,00	6,00	0,20		6,00							6,00
EJE VIAL A Absc K0+030- K0+035	5,00	6,00	0,20		6,00							6,00
EJE VIAL A Absc K0+035- K0+040	5,00	6,00	0,20		6,00							6,00
EJE VIAL B Absc K0+040- K0+045	5,00	6,00	0,20		6,00							6,00
EJE VIAL B Absc K0+045- K0+050	5,00	6,00	0,20		6,00							6,00
EJE VIAL B Absc K0+050- K0+055	5,00	6,00	0,20		6,00							6,00
EJE VIAL B Absc K0+055- K0+060	5,00	6,00	0,20		6,00							6,00
EJE VIAL B Absc K0+060- K0+065	5,00	6,00	0,20		6,00							6,00
EJE VIAL B Absc K0+065- K0+070	5,00	6,00	0,20		6,00							6,00
EJE VIAL B Absc K0+070- K0+075	5,00	6,00	0,20		6,00							6,00
EJE VIAL B Absc K0+075- K0+080	5,00	6,00	0,20		6,00							6,00
EJE VIAL B Absc K0+080- K0+085	5,00	6,00	0,20		6,00							6,00
EJE VIAL B Absc K0+085- K0+090	5,00	6,00	0,20		6,00							6,00
EJE VIAL B Absc K0+090- K0+095	5,00	6,00	0,20		6,00							6,00
EJE VIAL B Absc K0+095- K0+098,31	3,31	6,00	0,20		3,97							3,97

ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

ALCALDIA DE PUERTO ASIS
Secretaría de Infraestructura

CONTRATO DE OBRA No. 442-2025

OBJETO: MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

CONSORCIO SARO
NIT: 902004925-8
INTERVENTORIA: C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.
NIT: 900860555-1.

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS PARA ACTA DE RECIBO FINAL


REGISTRO FOTOGRAFICO

CAPITULO:	**3,00**	**REALIZAR ESTRUCTURA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO**									**UNIDAD**		**M3**
ÍTEM	3,30	SUBBASE GRANULAR											
EMPALMES VIA NACIONAL			0,20	1,18									0,24
EMPALMES VIA NACIONAL			0,20	1,74									0,35
EMPALMES CALLE 4			0,20	3,41									0,68
EMPALMES CALLE 4			0,20	1,95									0,39
TOTAL													**119,63**







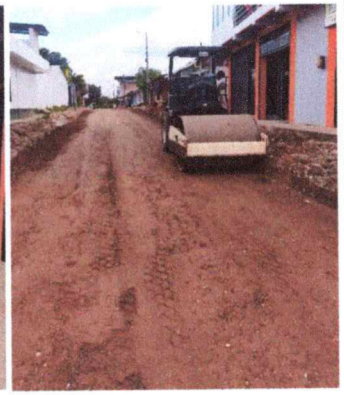

Firma.
JONHY BLADIMIR SALAS RODRIGUEZ
R/L CONSORCIO SARO
Contratista de Obra

Firma.
Ing. LIZETH ALEJANDRA URBANO NARVAEZ
R/L C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.
Contratista Interventoria

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ALCALDIA DE PUERTO ASIS
Secretaría de Infraestructura


CONTRATO DE OBRA No. 442-2025

OBJETO: MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

CONSORCIO SARO
NIT: 902004925-8
INTERVENTORIA: C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.
NIT: 900860555-1.

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS PARA ACTA DE RECIBO FINAL

REGISTRO FOTOGRAFICO

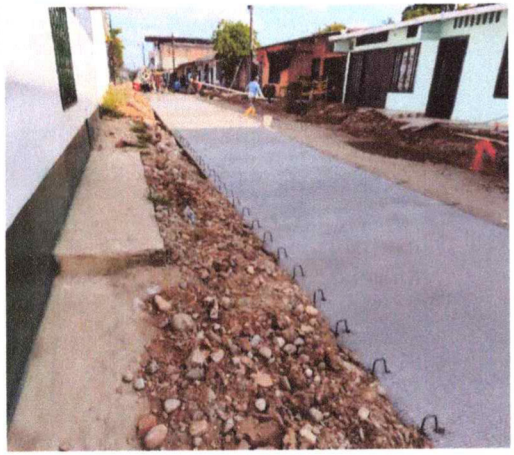



CAPITULO:	3,00	CAPITULO 3 - REALIZAR ESTRUCTURA PAVIMENTO DE						UNIDAD					M3
ÍTEM	3,40	PLACA EN CONCRETO MR: 3,8 Mpa											
DESCRIPCIÓN	LONG.	ANCHO	Espesor o Altura	AREA	VOL	CANT.	Long	Can-X	Can-Y	Diam	Peso x ML	CANT. EJECUTADA
	(M)	(M)	(M)	M2	(M3)		(M)	Un	Un	Pulg	Kg	
EJE VIAL A Absc K0+00- K0+005	5,00	6,00	0,18		5,40							5,40
EJE VIAL A Absc K0+005- K0+010	5,00	6,00	0,18		5,40							5,40
EJE VIAL A Absc K0+010- K0+015	5,00	6,00	0,18		5,40							5,40
EJE VIAL A Absc K0+015- K0+020	5,00	6,00	0,18		5,40							5,40
EJE VIAL A Absc K0+020- K0+025	5,00	6,00	0,18		5,40							5,40
EJE VIAL A Absc K0+025- K0+030	5,00	6,00	0,18		5,40							5,40
EJE VIAL A Absc K0+030- K0+035	5,00	6,00	0,18		5,40							5,40
EJE VIAL A Absc K0+035- K0+040	5,00	6,00	0,18		5,40							5,40
EJE VIAL B Absc K0+040- K0+045	5,00	6,00	0,18		5,40							5,40
EJE VIAL B Absc K0+045- K0+050	5,00	6,00	0,18		5,40							5,40
EJE VIAL B Absc K0+050- K0+055	5,00	6,00	0,18		5,40							5,40
EJE VIAL B Absc K0+055- K0+060	5,00	6,00	0,18		5,40							5,40
EJE VIAL B Absc K0+060- K0+065	5,00	6,00	0,18		5,40							5,40
EJE VIAL B Absc K0+065- K0+070	5,00	6,00	0,18		5,40							5,40
EJE VIAL B Absc K0+070- K0+075	5,00	6,00	0,18		5,40							5,40
EJE VIAL B Absc K0+075- K0+080	5,00	6,00	0,18		5,40							5,40
EJE VIAL B Absc K0+080- K0+085	5,00	6,00	0,18		5,40							5,40
EJE VIAL B Absc K0+085- K0+090	5,00	6,00	0,18		5,40							5,40
EJE VIAL B Absc K0+090- K0+095	5,00	6,00	0,18		5,40							5,40
EJE VIAL B Absc K0+095- K0+098,31	3,31	6,00	0,18		3,57							3,57

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ALCALDIA DE PUERTO ASIS
Secretaría de Infraestructura

CONTRATO DE OBRA No. 442-2025


OBJETO: MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

CONSORCIO SARO
NIT: 902004925-8
INTERVENTORIA: C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.
NIT: 900860555-1.


CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS PARA ACTA DE RECIBO FINAL

REGISTRO FOTOGRAFICO

CAPITULO:	**3,00**	**CAPITULO 3 - REALIZAR ESTRUCTURA PAVIMENTO DE**									**UNIDAD**		**M3**
ÍTEM	3,40	PLACA EN CONCRETO MR: 3,8 Mpa											
EMPALMES VIA NACIONAL			0,18	1,18									0,21
EMPALMES VIA NACIONAL			0,18	1,74									0,31
EMPALMES CALLE 4			0,18	3,41									0,61
EMPALMES CALLE 4			0,18	1,95									0,35
												TOTAL	**107,65**

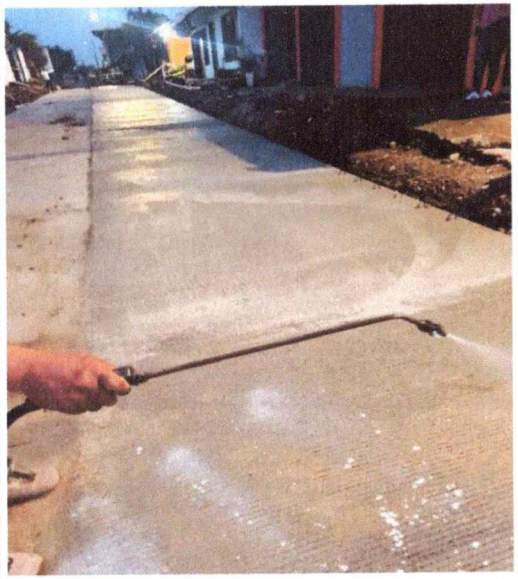



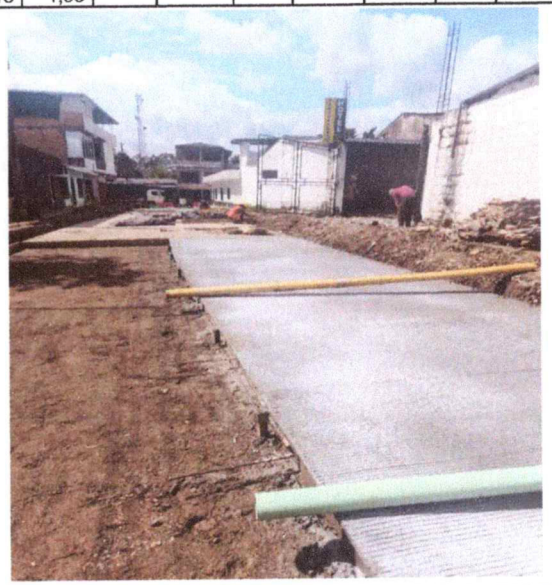

Firma.
JONHY BLADIMIR SALAS RODRIGUEZ
R/L CONSORCIO SARO
Contratista de Obra

Firma.
Ing. LIZETH ALEJANDRA URBANO NARVAEZ
R/L C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.
Contratista Interventoria

ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

ALCALDIA DE PUERTO ASIS
Secretaría de Infraestructura

CONTRATO DE OBRA No. 442-2025

OBJETO: MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

CONSORCIO SARO
NIT: 902004925-8
INTERVENTORIA: C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.
NIT: 900860555-1.

REGISTRO FOTOGRAFICO





CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS PARA ACTA DE RECIBO FINAL

CAPITULO:	**3,00**	**CAPITULO 3 - REALIZAR ESTRUCTURA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO**	**UNIDAD**	**KG**
ÍTEM	3,50	ACERO DE REFUERZO		

PASADORES DE CARGA

DESCRIPCIÓN	Ancho Via	DIS REFUERZO	Diam Pulgada	PESO MAT	UNXTRAMO	ML PASADOR	Long	PESO TOTAL
	(M)	(M)		Kg	UN	m	m	Kg
EJE VIAL A Absc K0+00- K0+087.11	6,00	0,30	7/8	3,06	20,00	0,35	7,00	21,42

CANASTILLA DE SOPORTE DE REFUERZO TRANSVERSAL

Diam	PESO MAT	ML X TRAMO	W	PESO TOTAL
MM	Kg	Kg		
6,00 MM	0,25	31,80	7,95	29,37

PESO DEL ACERO DE REFUERZO LONGITUDINAL POR LONGITUD DE VIA

DESCRIPCIÓN	Ancho Via	LONG DE VIA	DIS. REF. (G)	LONG REF	UN EJE	ML	Diam	W.m: peso material x ml
	(M)	(M)	(M)	(M)	UN	m	Pulg	
EJE VIAL A Absc K0+00- K0+087.11	6,00	98,31	1,00	1,00	98,31	98,31	1/2	**1,00**

ACERO DE REFUERZO TRANSVERSAL POR CORTE

DIST. CORTE (D.C)	No. De cortes:	PESO KILOS X CORTE TRANSV.	PESO TOTAL
	UN		
3,56	28,00	29,37	920,67

REFUERZO-INTERSECCION	Ancho Via	LONG REF	CANT	LONG REF	UN EJE	ML	Diam	W.m: peso material x ml	No de placas	No. De Cajillas:	PESO KILOS X CORTE TRANSV.	PESO TOTAL
	(M)	(M)	(Un)	(M)	UN	m	Pulg			UN		
EMPALME CON PAV EXISTENTE VIA NAL-DERECHA		20,90					1/2	**1,00**	1,00			20,90
EMPALME CON PAV EXISTENTE VIA NAL-IZQUIERDA		11,36					1/2	**1,00**	1,00			11,36
EMPALME CON PAV EXISTENTE CALLE 4-DERECHA		20,18					1/2	**1,00**	1,00			20,18
EMPALME CON PAV EXISTENTE CALLE 4- VIA NAL-IZQUIERDA		24,79					1/2	**1,00**	1,00			24,79
IRREGULAR PLACA NAL 1 DERECHA		35,00					1/2	**1,00**	1,00			35,00
PLACA NAL 2 IZQUI		44,16					1/2	**1,00**	1,00			44,16
PLACA DERECHA CALLE 4		42,56					1/2	**1,00**	1,00			42,56
PLACA IZQUIERDA CALLE 4		36,47					1/2	**1,00**	1,00			36,47
PLACA IRREGULA K0+030		43,40					1/2	**1,00**	2,00			86,80

ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

ALCALDIA DE PUERTO ASIS
Secretaría de Infraestructura

CONTRATO DE OBRA No. 442-2025

OBJETO: MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

CONSORCIO SARO
NIT: 902004925-8
INTERVENTORIA: C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.
NIT: 900860555-1.


REGISTRO FOTOGRAFICO

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS PARA ACTA DE RECIBO FINAL

CAPITULO:	**3,00**	**CAPITULO 3 - REALIZAR ESTRUCTURA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO**								**UNIDAD**		**KG**
ÍTEM	3,50	ACERO DE REFUERZO										
SARDINEL	Long	220,03					3/8	**0,56**				123,22
	Transv	0,51	502,00				3/8	**0,56**				143,37
TAPA CAJILLAS		0,85	14,00				3/8	**0,56**		**4,00**		26,66
											SUB TOTAL	**1.536,14**





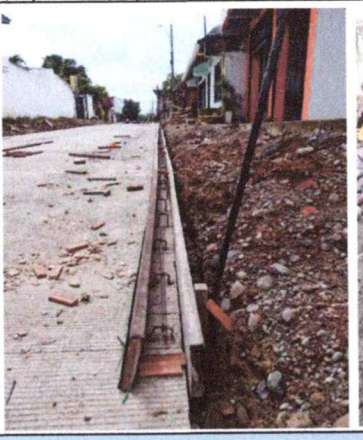



Firma.
JONHY BLADIMIR SALAS RODRIGUEZ
R/L CONSORCIO SARO
Contratista de Obra

Firma.
Ing. LIZETH ALEJANDRA URBANO NARVAEZ
R/L C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.
Contratista Interventoria

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ALCALDIA DE PUERTO ASIS
Secretaría de Infraestructura

CONTRATO DE OBRA No. 442-2025

OBJETO: MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

CONSORCIO SARO
NIT: 902004925-8
INTERVENTORIA: C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.
NIT: 900860555-1.

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS PARA ACTA DE RECIBO FINAL

REGISTRO FOTOGRAFICO

CAPITULO:	**3,00**	**CAPITULO 3 - REALIZAR ESTRUCTURA PAVIMENTO DE**										**UNIDAD**	**ML**
ÍTEM	3,60	JUNTAS DE EXPANSION Y SU RESPECTIVO SELLADO											
DESCRIPCIÓN	**LONG.**	**ANCHO**	**Espesor o Altura**	**AREA**	**VOL**	**CANT.**	**Long**	**Can-X**	**Can-Y**	**Diam**	**Peso x ML**		**CANT. EJECUTADA**
	(M)	**(M)**	**(M)**	**M2**	**(M3)**		**(M)**	**Un**	**Un**	**Pulg**	**Kg**		
EJE VIAL A Absc K0+00-K0+98,31	98,31												98,31
PASADORES	6,00					28,00							168,00
EMPALMES VIA NACIONAL	3,00												3,00
EMPALMES VIA NACIONAL	2,74												2,74
EMPALMES CALLE 5	3,14												3,14
EMPALMES CALLE 5	2,93												2,93
												TOTAL	**278,12**

Firma.
JONHY BLADIMIR BALAS RODRIGUEZ
R/L CONSORCIO SARO
Contratista de Obra

Firma.
Ing. LIZETH ALEJANDRA URBANO NARVAEZ
R/L C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.
Contratista Interventoria

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ALCALDIA DE PUERTO ASIS
Secretaría de Infraestructura

CONTRATO DE OBRA No. 442-2025


OBJETO: MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

CONSORCIO SARO
NIT: 902004925-8
INTERVENTORIA: C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.
NIT: 900860555-1.


CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS PARA ACTA DE RECIBO FINAL

REGISTRO FOTOGRAFICO

CAPITULO:	**3,00**	**CAPITULO 3 - REALIZAR ESTRUCTURA PAVIMENTO DE CONCRETO**									**UNIDAD**	**ML**	
ÍTEM	3,70	SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 PSI											
DESCRIPCIÓN	**LONG.**	**ANCHO**	**Espesor o Altura**	**AREA**	**VOL**	**CANT.**	**Long**	**Can-X**	**Can-Y**	**Diam**	**Peso x ML**	**CANT. EJECUTADA**	
	(M)	**(M)**	**(M)**	**M2**	**(M3)**		**(M)**	**Un**	**Un**	**Pulg**	**Kg**		
EJE VIAL A Absc K0+00- K0+98,31- DERECHA	99,68											99,68	
EJE VIAL A Absc K0+00- K0+98,31- IZQUIERDA	100,35											100,35	
											TOTAL	**200,03**	

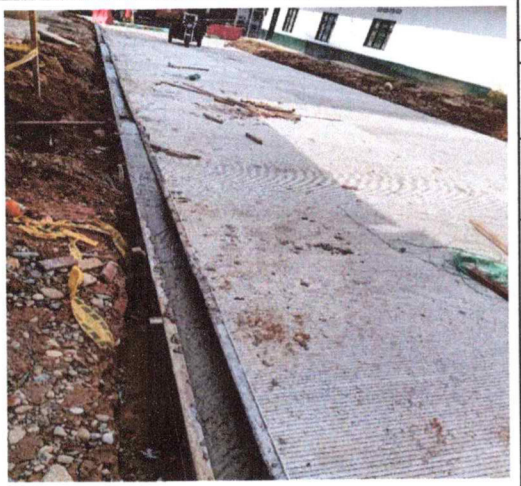



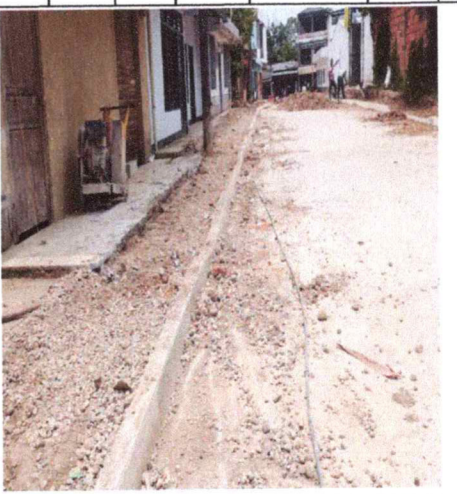

Firma.
JONHY BLADIMIR SALAS RODRIGUEZ
R/L CONSORCIO SARO
Contratista de Obra

Firma.
Ing. LIZETH ALEJANDRA URBANO NARVAEZ
R/L C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.
Contratista Interventoria

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ALCALDIA DE PUERTO ASIS
Secretaría de Infraestructura

CONTRATO DE OBRA No. 442-2025

OBJETO: MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

CONSORCIO SARO
NIT: 902004925-8
INTERVENTORIA: C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.
NIT: 900860555-1.

REGISTRO FOTOGRAFICO



CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS PARA ACTA DE RECIBO FINAL

CAPITULO:	**4,00**	**REALIZAR OBRAS DE URBANISMO-ANDENES**									**UNIDAD**	**M2**	
ÍTEM	4,10	PLACA PARA ANDEN EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA e-10cm											
DESCRIPCIÓN	**LONG.**	**ANCHO**	**Espesor o Altura**	**AREA**	**VOL**	**CANT.**	**Long**	**Can-X**	**Can-Y**	**Diam**	**Peso x ML**	**CANT. EJECUTADA**	
	(M)	**(M)**	**(M)**	**M2**	**(M3)**		**(M)**	**Un**	**Un**	**Pulg**	**Kg**		
EJE VIAL A Absc K0+00- K0+98,31- DERECHA	98,78	1,00										98,78	
EJE VIAL A Absc K0+00- K0+98,31- IZQUIERDA	98,34	1,00										98,34	
												-	
												-	
												-	
												-	



TOTAL **197,12**

Firma.
JONHY BLADIMIR SALAS RODRIGUEZ
R/L CONSORCIO SARO
Contratista de Obra

Firma.
Ing. LIZETH ALEJANDRA URBANO NARVAEZ
R/L C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.
Contratista Interventoria

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS


ALCALDIA DE PUERTO ASIS
Secretaría de Infraestructura


CONTRATO DE OBRA No. 442-2025

OBJETO: MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

CONSORCIO SARO
NIT: 902004925-8
INTERVENTORIA: C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.
NIT: 900860555-1.

REGISTRO FOTOGRAFICO

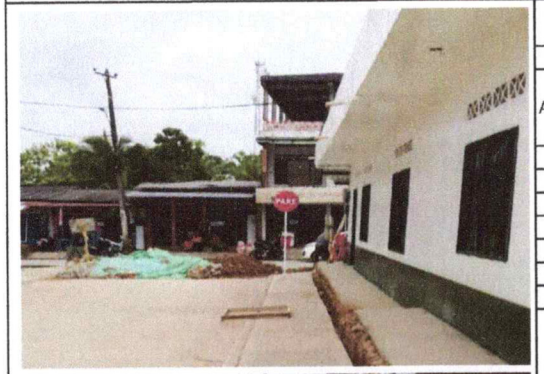

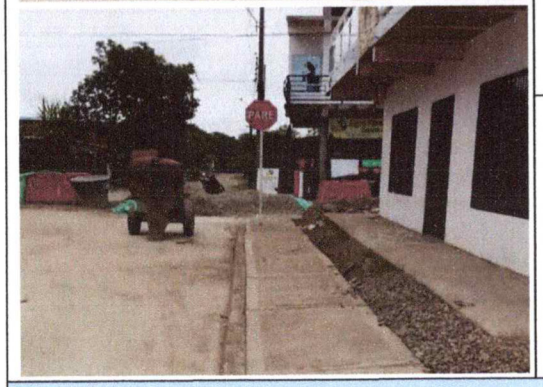

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS PARA ACTA DE RECIBO FINAL

CAPITULO:	**5,00**	**REALIZAR SEÑALIZACION**										**UNIDAD**	**UN**
ÍTEM	5,10	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO											
DESCRIPCIÓN	**LONG.**	**ANCHO**	**Espesor o Altura**	**AREA**	**VOL**	**CANT.**	**Long**	**Can-X**	**Can-Y**	**Diam**	**Peso x ML**	**CANT. EJECUTADA**	
	(M)	**(M)**	**(M)**	**M2**	**(M3)**		**(M)**	**Un**	**Un**	**Pulg**	**Kg**		
EJE VIAL ENTRE Absc K0+00 HASTA K0+98,31						2,00						2,00	
												-	
												-	
												-	
												-	
												-	
											TOTAL	**2,00**	

Firma.
JONHY BLADIMIR SALAS RODRIGUEZ
R/L CONSORCIO SARO
Contratista de Obra

Firma.
Ing. LIZETH ALEJANDRA URBANO NARVAEZ
R/L C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.
Contratista Interventoria

ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

ALCALDIA DE PUERTO ASIS
Secretaría de Infraestructura

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO DE OBRA No. 442-2025

OBJETO: MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

CONSORCIO SARO
NIT: 902004925-8
INTERVENTORIA: C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.
NIT: 900860555-1.

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS PARA ACTA DE RECIBO FINAL

CAPITULO:	**5,00**	**REALIZAR SEÑALIZACION**								**UNIDAD**		**UN**
ÍTEM	5,20	DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO										
DESCRIPCIÓN	**LONG.**	**ANCHO**	**Espesor o Altura**	**AREA**	**VOL**	**CANT.**	**Long**	**Can-X**	**Can-Y**	**Diam**	**Peso x ML**	**CANT. EJECUTADA**
	(M)	**(M)**	**(M)**	**M2**	**(M3)**		**(M)**	**Un**	**Un**	**Pulg**	**Kg**	
EJE VIAL A Absc K0+00- K0+98,31												
	flechas 2				1,20	4,00						4,80
	central e:12cm	0,12		4,13	0,50	12,00						6,00
	Cebra	0,40		2,00		17,00						13,60
		0,40		5,70		2,00						4,56
											TOTAL	**28,96**

Firma.
JONHY BLADIMIR SALAS RODRIGUEZ
R/L CONSORCIO SARO
Contratista de Obra

Firma.
Ing. LIZETH ALEJANDRA URBANO NARVAEZ
R/L C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.
Contratista Interventoria

ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

ALCALDIA DE PUERTO ASIS
Secretaría de Infraestructura

CONTRATO DE OBRA No. 442-2025

OBJETO: MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

CONSORCIO SARO
NIT: 902004925-8
INTERVENTORIA: C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.
NIT: 900860555-1.

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS PARA ACTA DE RECIBO FINAL

REGISTRO FOTOGRAFICO

CAPITULO:	6,00	REALIZAR INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS										UNIDAD	UN
ÍTEM	6,10	CONST CAJAS INSP DOMICILIARIA ALCANT 0,7X0,7											
DESCRIPCIÓN	LONG.	ANCHO	Espesor o Altura	AREA	VOL	CANT.	Long	Can-X	Can-Y	Diam	Peso x ML		CANT. EJECUTADA
	(M)	(M)	(M)	M2	(M3)		(M)	Un	Un	Pulg	Kg		
EJE VIAL A Absc K0+00- K0+98,31						3,00							3,00









TOTAL EXCAVACION 3,00

Firma.
JONHY BLADIMIR SALAS RODRIGUEZ
R/L CONSORCIO SARO
Contratista de Obra

Firma.
Ing. LIZETH ALEJANDRA URBANO NARVAEZ
R/L C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.
Contratista Interventoria

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ALCALDIA DE PUERTO ASIS
Secretaría de Infraestructura

CONTRATO DE OBRA No. 442-2025

OBJETO: MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

CONSORCIO SARO
NIT: 902004925-8
INTERVENTORIA: C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.
NIT: 900860555-1.

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS PARA ACTA DE RECIBO FINAL


REGISTRO FOTOGRAFICO

CAPITULO:	6,00	REALIZAR INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS									UNIDAD	M3
ÍTEM	6,20	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO										
DESCRIPCIÓN	LONG.	ANCHO	Espesor o Altura	AREA	VOL	CANT.	Long	Can-X	Can-Y	Diam	Peso x ML	CANT. EJECUTADA
	(M)	(M)	(M)	M2	(M3)		(M)	Un	Un	Pulg	Kg	
TUBERIA	6,00	0,50	0,50			4,00						6,00







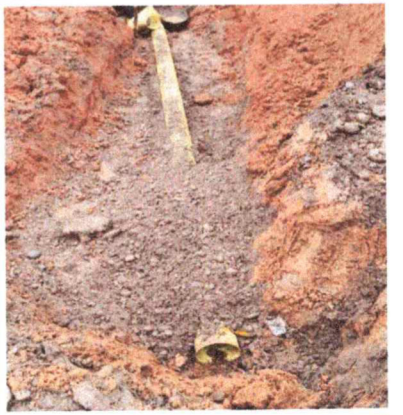

TOTAL EXCAVACION 6,00

Firma.
JONHY BLADIMIR SALAS RODRIGUEZ
R/L CONSORCIO SARO
Contratista de Obra

Firma.
Ing. LIZETH ALEJANDRA URBANO NARVAEZ
R/L C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.
Contratista Interventoria

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS


ALCALDIA DE PUERTO ASIS
Secretaría de Infraestructura

CONTRATO DE OBRA No. 442-2025


OBJETO: MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

CONSORCIO SARO
NIT: 902004925-8
INTERVENTORIA: C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.
NIT: 900860555-1.

REGISTRO FOTOGRAFICO

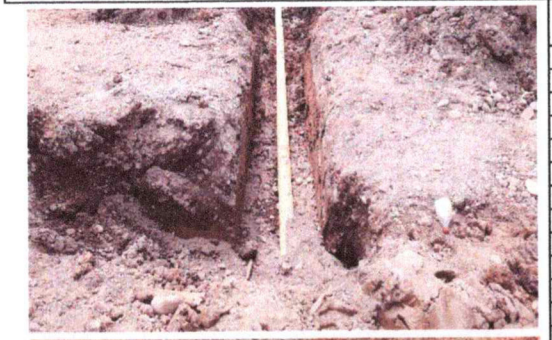



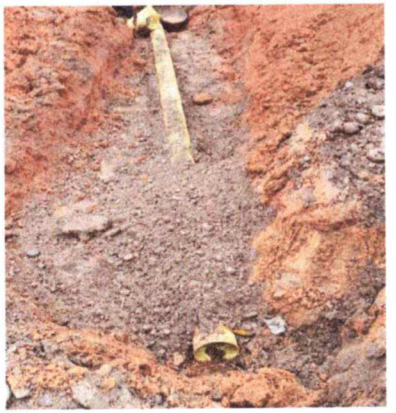

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS PARA ACTA DE RECIBO FINAL

CAPITULO:	**6,00**	**REALIZAR INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**									**UNIDAD**	**M3**	
ÍTEM	6,30	ARENA DE BASE PARA NIVELACION											
DESCRIPCIÓN	**LONG.**	**ANCHO**	**Espesor o Altura**	**AREA**	**VOL**	**CANT.**	**Long**	**Can-X**	**Can-Y**	**Diam**	**Peso x ML**		**CANT. EJECUTADA**
	(M)	**(M)**	**(M)**	**M2**	**(M3)**		**(M)**	**Un**	**Un**	**Pulg**	**Kg**		
TUBERIA	6,00	0,50	0,15			4,00							1,80
											TOTAL EXCAVACION		1,80

Firma.
JONHY BLADIMIR SALAS RODRIGUEZ
R/L CONSORCIO SARO
Contratista de Obra

Firma.
Ing. LIZETH ALEJANDRA URBANO NARVAEZ
R/L C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.
Contratista Interventoria

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ALCALDIA DE PUERTO ASIS
Secretaría de Infraestructura

CONTRATO DE OBRA No. 442-2025

OBJETO: MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

CONSORCIO SARO
NIT: 902004925-8
INTERVENTORIA: C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.
NIT: 900860555-1.

REGISTRO FOTOGRAFICO

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS PARA ACTA DE RECIBO FINAL

CAPITULO:	**6,00**	**REALIZAR INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**										**UNIDAD**	**ML**
ITEM	6,40	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PVC DIÁM: (6 pulg)											
DESCRIPCIÓN	**LONG.**	**ANCHO**	**Espesor o Altura**	**AREA**	**VOL**	**CANT.**	**Long**	**Can-X**	**Can-Y**	**Diam**	**Peso x ML**	**CANT. EJECUTADA**	
	(M)	**(M)**	**(M)**	**M2**	**(M3)**		**(M)**	**Un**	**Un**	**Pulg**	**Kg**		
TUBERIA	6,00					4,00						24,00	







TOTAL EXCAVACION 24,00

Firma.
JONHY BLADIMIR SALAS RODRIGUEZ
R/L CONSORCIO SARO
Contratista de Obra

Firma.
Ing. LIZETH ALEJANDRA URBANO NARVAEZ
R/L C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S
Contratista Interventoria

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ALCALDIA DE PUERTO ASIS
Secretaría de Infraestructura

CONTRATO DE OBRA No. 442-2025

OBJETO: MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

CONSORCIO SARO
NIT: 902004925-8
INTERVENTORIA: C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.
NIT: 900860555-1.

REGISTRO FOTOGRAFICO






CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS PARA ACTA DE RECIBO FINAL

CAPITULO:	**6,00**	**REALIZAR INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**									**UNIDAD**		**UN**
ÍTEM	6,50	SUMINISTRO E INSTALACION SILLA YEE PVC DIM:6pulg*10pulg.											
DESCRIPCIÓN	**LONG.**	**ANCHO**	**Espesor o Altura**	**AREA**	**VOL**	**CANT.**	**Long**	**Can-X**	**Can-Y**	**Diam**	**Peso x ML**		**CANT. EJECUTADA**
	(M)	**(M)**	**(M)**	**M2**	**(M3)**		**(M)**	**Un**	**Un**	**Pulg**	**Kg**		
SILLA						3,00							3,00



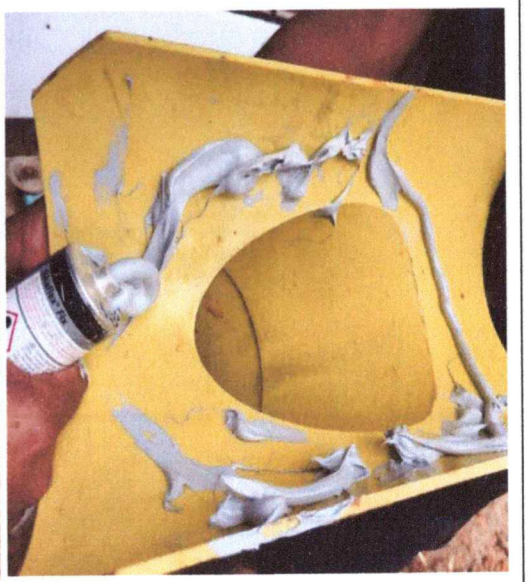

TOTAL EXCAVACION	3,00

Firma.
JONHY BLADIMIR SALAS RODRIGUEZ
R/L CONSORCIO SARO
Contratista de Obra

Firma.
Ing. LIZETH ALEJANDRA URBANO NARVAEZ
R/L C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.
Contratista Interventoria

ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

ALCALDIA DE PUERTO ASIS
Secretaría de Infraestructura

CONTRATO DE OBRA No. 442-2025

OBJETO: MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

CONSORCIO SARO
NIT: 902004925-8
INTERVENTORIA: C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.
NIT: 900860555-1.

REGISTRO FOTOGRAFICO

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS PARA ACTA DE RECIBO FINAL

CAPITULO:	**6,00**	**REALIZAR INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**									**UNIDAD**		**UN**
ÍTEM	6,60	SUMINISTRO E INSTALACION SEMICODO-6 pulg											
DESCRIPCIÓN	**LONG.**	**ANCHO**	**Espesor o Altura**	**AREA**	**VOL**	**CANT.**	**Long**	**Can-X**	**Can-Y**	**Diam**	**Peso x ML**		**CANT. EJECUTADA**
	(M)	**(M)**	**(M)**	**M2**	**(M3)**		**(M)**	**Un**	**Un**	**Pulg**	**Kg**		
SEMICOD0						3,00							3,00









TOTAL EXCAVACION 3,00

Firma.
JONHY BLADIMIR SALAS RODRIGUEZ
R/L CONSORCIO SARO
Contratista de Obra

Firma.
Ing. LIZETH ALEJANDRA URBANO NARVAEZ
R/L C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.
Contratista Interventoria

DESGLOSE DEL AIU

COSTO TOTAL PROPUESTA			**$ 412.712.260,00**	**$ 412.712.260,00**
COSTO TOTAL OBRA			**$ 375.782.260,00**	
	COSTOS DIRECTOS OBRA		**$ 278.357.230,00**	
	COSTOS INDIRECTOS OBRA		**$ 97.425.031,00**	
	ADMINISTRACION	**28,00%**	$ 77.940.023,00	
	IMPREVISTOS	**5,00%**	$ 13.917.862,00	
	UTILIDAD	**2,00%**	$ 5.567.145,00	
		TOTAL A.I.U	$ 97.425.030,00	
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)		**$ 21.190.000,00**	
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)		**$ 15.740.000,00**	

DESGLOCE ADMINISTRACION 28%

1	Gastos personal administrativo					
	PRESONAL	SALARIO BASICO	FACTOR PRESTACIONES	DEDICACION	MESES	SALARIO + PRESTACIONES
1,1	DIRECTOR DE OBRA	2.300.000,00	1,80	20%	3,00	$2.484.000
1,2	RESIDENTE DE OBRA	1.900.000,00	1,80	100%	3,00	$10.260.000
1,3	PROFESIONAL SISO	1.900.000,00	1,80	40%	3,00	$4.104.000
2						
2,1	PAPELERIA, TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE OFICINA				0,08%	$219.719,00
2,2	VALLA INFORMATIVA				0,05%	$150.000,00
2,3	ARRENDO DE BODEGA					$150.000,00
2,4	ENSAYOS DE LABORATORIO				0,63%	
	ENSAYO LAB SUELO	**UN**	**CANT**	**VALOR/UNIT**		
	DISEÑOS DE MEZCLAS CONCRETO 3000 PSI Y MR;3,8	UN	2	$ 250.000,00		$500.000,00
	DENSIDADES DE CAMPO	UN	3	$ 70.000,00		$210.000,00
	ALQUILER DE MOLDES DE CILINDROS (VIGAS Y CILINDROS)	MES	2	$ 100.000,00		$200.000,00
	TOMA DE CILINDROS	UN	6	$ 30.000,00		$180.000,00
	ENSAYOS A FLEXION	UN	8	$ 25.000,00		$200.000,00
	ENSAYOS DE COMPRENSION	UN	8	$ 35.000,00		$280.000,00
	PROCTOR	UN	1	$ 800.000,00		$800.000,00
3	IMPUESTOS DE OBRA Y LEGALIZACION					
3,1	FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA				5,00%	$13.917.862,00
3,2	ESTAMPILLA ELECTRIFICACION RURAL				1,00%	$2.783.572,00
3,3	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR				4,00%	$11.134.289,00
3,4	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO				2,00%	$5.567.145,00
3,5	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR				2,00%	$5.567.145,00
3,6	ESTAMPILLA PRO CULTURA				2,00%	$5.567.145,00
3,7	TASA PRODEPORTE				2,00%	$5.567.145,00
3,8	FONDO MAQUINARIA				2,00%	$5.567.145,00
4	**POLIZAS Y GARANTIAS**				**TASA**	
4,1	POLIZA DE CUMPLIMIENTO				0,03%	$123.814,00
4,2	POLIZA DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES				0,13%	$549.837,00
4,3	POLIZA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA				0,25%	$1.031.781,00
4,4	POLIZA DE BUEN MANEJO ANTICIPO				0,10%	$412.712,00
4,5	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES				0,10%	$412.712,00
TOTAL GASTOS POR ADMINISTRACION 28%					**28,0%**	**$77.940.023,00**
TOTAL GASTOS IMPREVISTOS					**5,0%**	**$13.917.862,00**
DESGLOCE UTILIDAD 2%						
1	Ganancia proyectada				**2,0%**	$5.567.145,00
TOTAL UTILIDAD						**$5.567.145,00**
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD						**$97.425.030,00**

JONHY BLADIMIR SALAS RODRÍGUEZ
ING. CIVIL M.P.No 25202198223 CND
R/L CONSORCIO SARO.
CONTRATISTA DE OBRA

	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO DE OBRA No. 001

CONVENIO ☐ **CONTRATO** ■		**MUNICIPIO**	**CORREGIMIENTO SANTANA PUERTO ASIS**
No. 442-2025	**FECHA**	**06/11/2025**	
OBJETO	**MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO SARO** R.P. JONHY BLADIMIR SALAS RODRIGUEZ		
INTERVENTOR	**C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.** R.P. CEDIEL CABRERA LEYDER		

FECHA DE COMITÉ	**19/12/2025**	**HORA: 3:00 PM**
CONVOCADO POR	**CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA**	
TEMA PRINCIPAL	**Ajustes a los diseños geométricos de la vía del proyecto**	

CONVOCADOS	**DEPENDENCIA/ENTIDAD**
Rep Legal JOHNY BLADIMIR SALAS RODRIGUEZ	Contratista de Obra/director de obra
Rep Legal CEDIEL CABRERA LEYDER	Contratista Interventoría/Residente Interventoría
Ing LUIS CARLOS SALAS RODRIGUEZ	Residente de obra
Ing WILLIAMS GILBERTO QUIROZ BOTINA	Director de obra
WEIMAN RIVERA ROSERO	Topógrafo contratista de Obra
Ing. LUIS FERNANDO CORREDOR	Diseñador

ORDEN DEL DIA

1. Saludo Inicial.

2. Intervención del Señor JOHNY BLADIMIR SALAS RODRÍGUEZ: Estado Actual de los Contratos de Obra .

3. Intervención del Señor WEIMAN RIVERA ROSERO

4. Intervención del señor CEDIEL CABRERA LEYDER.

5. Intervención del Señor WILLIAMS GILBERTO QUIROZ BOTINA

6. Intervención del Señor LUIS CARLOS SALAS RODRÍGUEZ

6. Intervenciones Adicionales

DESARROLLO

1. Saludo. El Ingeniero JOHNY BLADIMIR SALAS RODRÍGUEZ Saluda a los Asistentes y realiza la contextualización general de aspectos de carácter técnico que actualmente dispone el proyecto en lo que respecta a las condiciones geométricas y manifiesta que el motivo del comité técnico de obra se da en virtud de la localización y replanteo realizado en horas de la mañana y es con el fin de tomar decisiones a fin de poder proceder con ajustes en los diseños geométricos de conformidad con lo encontrado en campo.

2. Intervención del Topógrafo WEIMAN RIVERA ROSERO; Estado Actual de los Contratos de Obra e Interventoría.

2.1) En su intervención el topógrafo indica las condiciones bajo las cuales se encuentran los diseños geométricos iniciales según la localización y replanteo realizadas de ello indica que:

- si se tomara las condiciones originales según la limitante de los dos postes que están contemplados para ser movidos el eje del proyecto queda corrido hacia la parte izquierda afectando andenes y quedando desplazado de manera desproporcional.

- De acuerdo con las pendientes longitudinales el proyecto está contemplado con dos pendientes y en un solo sentido, en el momento de tomar niveles se puede determinar que las viviendas pueden tener desplantes con relación al terminado de andenes y vías bastante altos lo cual determinaría que las viviendas queden muy altas.
- Finalmente indica que según el replanteo realizado la longitud de la vía con relación a lo proyectada en los estudios iniciales no corresponde por cuanto en la actualidad la vía tiene 98,31 metros y según la proyección en los estudios iniciales correspondía a 99,40 metros lineales, es decir menos longitud, esto debido a que existe una placa sobre la via nacional la cual en la topografía inicial estaba sin ser considerada.

3. Intervención del Señor CEDIEL CABRERA LEYDER.

3.1) el ingeniero manifiesta que se evidencia que podría ser posible correr los postes hacia un costado por cuanto las cuerdas no resultan afectando las viviendas aledañas y en su nueva localización no afectaría el tráfico ni la circulación de peatones sobre los andenes.

3.2) por otro lado indica que a fin de poder garantizar la evacuación de las aguas lluvias es posible manejar la pendiente transversal en dos aguas una en el sentido original hacia la vía nacional y la otra a la calle 4, esto teniendo en cuenta que se pudo constatar en el recorrido realizado con el contratista de obra y su equipo y el de la interventoría que originalmente las aguas se vierten en estos sentidos y que desencolan en el mismo punto.

3.3 considera el ingeniero que de acuerdo con la longitud real de la vía es posible en conjunto con el contratista y la interventoría hacer seguimiento en un balance de cantidades de obra con el fin de no desfinanciar el proyecto y que los saldos en caso de requerirse puedan manejarse para garantizar la ejecución y puesta en funcionamiento del contrato.

4. Intervención del señor WILLIAMS GILBERTO QUIROZ BOTINA

4.1) el ingeniero respalda el planteamiento realizado por el ing Leyder Cediel e indica que la propuesta técnica planteada permite un adecuado manejo de las condiciones topográficas y de las viviendas generando seguridad y comodidad, en tal sentido solo recomienda que el diseño geométrico nuevo no afecte en gran medida los andenes existentes y que en caso de que no existan mas opciones se socialice con la comunidad por otro lado indica que es necesario que en el diseño se considere las condiciones reales en longitud que actualmente tiene la vía, y que las cantidades menores se realice el seguimiento respectivo en el balanceo general del contrato para que en dado caso que las mismas sirvan como respaldo para cantidades adicionales que surjan con la ejecución se pueda hacer uso de las mismas.

5. Intervención del señor LUIS CARLOS SALAS RODRÍGUEZ

5.1 el ingeniero indica que según la proyección de la nueva ubicación de los postes que se plantea con el nuevo diseño se puede evidenciar que no afecta a vehículos ni la población ya que se tratan de mantener por fuera de los andenes o paralelamente sobre el lado externo, adicionalmente indica que con la ubicación en sitio y viendo la proyección de las cuerdas las mismas queda a una distancia prudente de las viviendas. Así mismo indica que las soluciones para manejar las dos pendientes en la sección longitudinal garantizan la correcta evacuación de las aguas.

Destaca la recomendación del señor William en el sentido de no afectar andenes, pero también indica que existen viviendas salidas del paramenta de la vía las cuales se verán afectadas razones por la cual se les dará a conocer la nueva proyección y las afectaciones, por cuanto la proyección del nuevo diseño geométrico se ajusta de tal manera que pueda cumplir adecuadas condiciones de servicio, comodidad y seguridad

6. Intervención adicionales


Los equipos de interventoría y obra en su conjunto y teniendo en cuenta lo antes expuesto procede con la elaboración en campo del nuevo diseño geométrico y se constata en sitio de manera inmediata.

CONCLUSIÓN PRINCIPAL/COMPROMISOS

Dicho lo anterior se menciona los siguientes compromisos y conclusiones para resolver la situación y son:
-aprobar la nueva proyección del nuevo diseño geométrico.
-teniendo en cuenta que el nuevo diseño geométrico fue realizado en campo se procede por unanimidad aprobar el nuevo diseño por parte de los representantes legales de interventoría y obra.

-El contratista de obra e interventoría se comprometen en realizar un seguimiento en las cantidades con los valores reales encontrados en campo lo cual a futuro permita un balanceo en cantidades y un adecuado seguimiento financiero de los recursos a fin de que sean invertidos según las condiciones técnicas del contrato y de acuerdo con las condiciones reales que se encuentren en la ejecución.


FIRMA




Rep Legal JOHNY BLADIMIR SALAS RODRÍGUEZ
Contratista de Obra/director de obra
CONSOCIO SARO



Rep Legal CEDIEL CABRERA LEYDER
Contratista Interventoría/Residente Interventoría
C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.



Ing LUIS CARLOS SALAS RODRÍGUEZ
Residente de obra
CONSOCIO SARO



Ing WILLIAMS GILBERTO QUIROZ BOTINA
Contratista Interventoría/Residente Interventoría
C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.



WEIMAN RIVERA ROSERO
Topógrafo contratista de Obra

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

COMITÉ No 2

CONTRATO DE OBRA No.	442 - 2025	**FECHA DEL COMITÉ:**	23 DE FEBRERO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RIGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS. (PUTUMAYO) R/L: JORGE HERLINTO GARCÍA LÓPEZ ALCALDE MUNICIPAL		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SARO NIT. 902.004.925-8 RL. JONHY BLADIMIR SALAS RODRIGUEZ CC. 18.113.158		
INTERVENTOR:	C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S NIT. 900.860.555-1 RL. LIZETH ALEJANDRA URBANO NARVAEZ CC. 1.007.304.981		
SUPERVISOR:	JORGE EDUARDO GAITÁN ESCUDERO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA:	CUATROCIENTOS TRECE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENA Y DOS PESOS ($413.098.672) M/CTE		
VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($28.893.273) M/CTE		
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES		
FECHA DE INICIO:	11 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	10 DE MARZO DE 2026		

I. PARTICIPANTES:

CONVOCADOS:

JORGE EDUARDO GAITÁN ESCUDERO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL – SUPERVISOR.
YISELA BRIDBANY ROSERO CASTILLO	PROFESIONAL DE APOYO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

JONHY BLADIMIR SALAS RODRIGUEZ	CONTRATISTA DE OBRA
LIZETH ALEJANDRA URBANO NARVAEZ	CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MOTIVO DE LA REUNIÓN:

Aval Acta de Mayores y Menores Cantidades de Obra No. 1

II. DESARROLLO DEL COMITÉ:

En el municipio de Puerto Asís, en las instalaciones de la Secretaria de Infraestructura Municipal de Puerto Asís, a los veintitrés (23) días del mes de febrero de 2026, siendo las 9:00 a. m., se dio inicio al Comité Técnico de Obra No. 2. La sesión fue presidida por el arquitecto Jorge Eduardo Gaitán Escudero, secretario de Infraestructura Municipal y Supervisor del contrato, quien instaló formalmente la reunión, dio la bienvenida a los asistentes y destacó la importancia de garantizar la coherencia técnica y administrativa entre las cantidades contratadas y las efectivamente ejecutadas en campo, en cumplimiento de los principios de transparencia y responsabilidad en la inversión de recursos públicos.

Acto seguido, intervino el ingeniero Jonhy Salas contratista de obra, quien manifestó que, para la correcta ejecución de las obras, fue necesario realizar un balance de cantidades de obra, efectuando una comparación entre las cantidades inicialmente contratadas y las cantidades realmente ejecutadas, con el fin de asegurar que lo consignado en las memorias técnicas corresponda fielmente a lo construido en sitio. En ese sentido, indicó que fue indispensable tramitar un Acta de Mayores y Menores Cantidades de Obra, toda vez que en el Comité Técnico de Obra No. 1, posterior a las actividades de localización y replanteo, se evidenció una diferencia en la meta física del proyecto. Explicó que la meta inicialmente establecida correspondía a 99,40 metros lineales (ml), mientras que la longitud verificada en campo fue de 98,31 ml, presentándose una disminución de 1,09 ml. Señaló que dicha diferencia pudo originarse en el levantamiento topográfico inicial, en el cual se habría incluido un tramo de pavimento que conecta con la vía objeto de intervención, generando una sobreestimación de la cantidad real a intervenir.

Posteriormente, el ingeniera Lizeth Alejandra Urbano contratista de interventoría, en ejercicio de sus funciones como interventor, manifestó que en el Comité Técnico No. 1 aprobó la ejecución de las actividades necesarias para el adecuado desarrollo del objeto contractual, y que la situación evidenciada sería formalmente consignada en el Acta de Mayores y Menores Cantidades de Obra No. 1, debidamente sustentada con su respectivo informe técnico de justificación, garantizando la trazabilidad y soporte documental del ajuste.

Finalmente, el arquitecto Jorge Eduardo Gaitán Escudero, en calidad de Supervisor del contrato, expresó que, comprendiendo la justificación técnica presentada respecto a la disminución en la meta física, es indispensable que lo consignado en el acta coincida estrictamente con lo efectivamente ejecutado en campo, dado que las cantidades pueden ser verificadas por cualquier entidad que ejerza seguimiento y control, especialmente tratándose de obras financiadas con recursos del Sistema General de Regalías. En ese sentido, solicitó a los contratistas remitir a la Secretaría de Infraestructura la documentación requerida para

validar lo socializado en el presente comité y proceder con el trámite administrativo correspondiente al Modificatorio No. 1.

No siendo otro el objeto de la reunión, se dio por terminado el Comité Técnico de Obra No. 2, dejando constancia de los siguientes acuerdos:

ACUERDOS

PRIMERO: El contratista de obra remitirá a la Secretaría de Infraestructura el Acta de Mayores y Menores Cantidades de Obra No. 1 con su respectivo informe de justificación técnica.

SEGUNDO: Avalar el Acta de Mayores y Menores No. 1.

TERCERO: Adelantar los trámites administrativos pertinentes para la suscripción del Modificatorio No. 1 al contrato de obra.

Para constancia se firma la presente Acta, el día 23 de febrero de 2026.

JONHY BLADIMIR SALAS RODRIGUEZ
Representante Legal de CONSORCIO SARO
CONTRATISTA DE OBRA

LIZETH ALEJANDRA URBANO NARVAEZ
Representante Legal C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

JORGE EDUARDO GAITÁN ESCUDERO
Secretario de Infraestructura Municipal
SUPERVISOR DEL CONTRATO

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó:	Yisela Bridbany Rosero Castillo	Profesional de Apoyo. Secretaria de Infraestructura	
Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MUNICIPIO DE PUERTO ASIS *Corregimiento de Santana* *Consorcio SARO S.A.S* NIT. 902004925_8	
	ACTA DE REUNIÓN	

Acta N. ª: 1	**De:** Consorcio Saro S.A.S	**Fecha:** 26 de noviembre de 2025	**Hora:** 3:00 p.m.

SITIO DE LA REUNIÓN:

- ✓ Casa de Habitación señora Graciela Batidas, barrio Centro

OBJETO:

- ✓ Socialización inicio de obra "MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN:

NOMBRES	CARGO	PRESENTE	AUSENTE
Rosario Pai Ortiz	Pdte. J.A.C. Corregimiento Santana	x	
Juan Pablo VeraTorrez	Profesional de apoyo – Sec. Infraestructura	x	
Luis Carlos Salas	Residente de Obra	x	
Karla Sofia Burbano	Profesional Social	x	
Cediel Cabrera Leyder	Rep Legal-Interventor	x	
Jhonny Bladimir Salas	Rep Legal-Obra	x	

ORDEN DEL DÍA:

1.Saludo y bienvenida
2.Presentacion del objeto de la reunión
3.Socializacion del proyecto y sus alcances técnicos
4.Intervenciones de la comunidad
5.Compromisos
6.Lectura y aprobación del acta
7.Fin de la reunión

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MUNICIPIO DE PUERTO ASIS *Corregimiento de Santana* *Consorcio SARO S.A.S* NIT. 902004925_8	
	ACTA DE REUNIÓN	

DESARROLLO:

N°	TEMA
1.	**SALUDO Y BIENVENIDA:** Se dio inicio a la jornada de socialización con el saludo de bienvenida a cargo del profesional social del proyecto, quien agradeció la asistencia de los representantes institucionales y de la comunidad del corregimiento de Santa Ana, resaltando la importancia de la participación ciudadana en el desarrollo del proyecto.
2.	**PRESENTACIÓN DEL OBJETO DE LA REUNIÓN:** Se informa a los asistentes que el objeto de la reunión corresponde a la socialización del proyecto denominado "Mejoramiento rígido de la Carrera 4 entre Calles 4 y 5 en el corregimiento de Santa Ana del municipio de Puerto Asís, departamento del Putumayo", con el fin de dar a conocer a la comunidad los alcances generales de la obra y atender las inquietudes presentadas por los asistentes
3.	**SOCIALIZACION DEL PROYECTO:** Durante el desarrollo de la jornada se realizó la socialización detallada del proyecto denominado "Mejoramiento rígido de la Carrera 4 entre Calles 4 y 5 en el corregimiento de Santa Ana del municipio de Puerto Asís, departamento del Putumayo", exponiendo a la comunidad los alcances generales, las actividades constructivas contempladas en el contrato y los beneficios esperados con la ejecución de la obra. El equipo técnico del proyecto explicó que la intervención contempla actividades preliminares como la localización y replanteo del área a intervenir, con el fin de definir ejes, niveles y alineaciones conforme a los planos y diseños aprobados, así como el desmonte e instalación de postes de concreto que interfieran con la ejecución de la obra, procurando minimizar afectaciones a las viviendas del sector. De igual manera, se socializaron las actividades de excavación a máquina y a mano, necesarias para la conformación de la estructura del pavimento, así como el cargue, retiro y disposición final del material sobrante en sitios autorizados, garantizando el manejo adecuado de los residuos generados durante la ejecución del proyecto. Así mismo, se explicó la estructura del pavimento en concreto hidráulico, la cual incluye la instalación de geotextil, el mejoramiento de la subrasante, la conformación de la subbase granular, la construcción de la placa en concreto, la instalación de acero de refuerzo, la ejecución de juntas de expansión con su respectivo sellado y la construcción de sardinel en concreto, actividades orientadas a garantizar la durabilidad y estabilidad de la vía. Se informó también sobre las obras de urbanismo, específicamente la construcción de andenes en concreto reforzado, así como la señalización vial vertical y horizontal que se implementará durante y después de la ejecución del proyecto, con el fin de garantizar la seguridad vial y peatonal. Finalmente, se socializaron las actividades relacionadas con las instalaciones hidráulicas y sanitarias, indicando que el proyecto contempla la construcción de tres (3) cajas de inspección domiciliaria, las cuales serán priorizadas según la necesidad, además de la instalación de tubería y accesorios para el adecuado manejo de las redes existentes
4	**INTERVENCIONES DE LA COMINUDAD:** La comunidad manifiesta inquietudes relacionadas con la construcción de cajillas domiciliarias, la reubicación de postes de concreto y posibles afectaciones a los andenes existentes. Se aclara que el Proyecto contempla únicamente 3 cajillas domiciliarias, las cuales serán priorizadas según la necesidad, y que las obras se ejecutarán conforme a los diseños aprobados y líneas de paramento establecidas.

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MUNICIPIO DE PUERTO ASIS *Corregimiento de Santana* *Consorcio SARO S.A.S* NIT. 902004925_8	
	ACTA DE REUNIÓN	

<table>
<tr><th>N°</th><th>TEMA</th></tr>
<tr><td>5.</td><td>COMPROMISOS: Se establecen compromisos orientados a mantener informada a la comunidad, priorizar las cajillas domiciliarias según necesidad y minimizar afectaciones a las viviendas durante la ejecución de la obra.

COMPROMISOS Y APORTES DE LA COMUNIDAD
<table>
<tr><th>Actividad</th><th>Responsables de la ejecución</th><th>Fecha a realizarse la actividad</th></tr>
<tr><td>1. Priorizar la construcción de cajillas domiciliarias.</td><td>Contratista</td><td>Según programación</td></tr>
<tr><td>2. Reubicación de postes.</td><td>Contratista</td><td>Según programación</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA
Agotado el orden del día, la presente acta es leída y se firma por los asistentes a la reunión que se da por terminada a las 5:30pm del mismo día de inicio.</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>FIN DE LA REUNIÓN
Siendo las 5:30 pm del presente día viernes 10 de octubre se da por finalizada la jornada de socialización del proyecto en el Corregimiento de Santana del municipio de Puerto Asís.</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>RECOMENDACIONES:
Se recomienda y a través de la profesional social se recomienda a la comunidad constituir la veeduría para hacerle seguimiento a las ejecuciones de las actividades del contrato.</td></tr>
</table>

Nota: Se anexa registro fotográfico y listado de asistencia.

Registro fotográfico

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MUNICIPIO DE PUERTO ASIS *Corregimiento de Santana* *Consorcio SARO S.A.S* NIT. 902004925_8	
ACTA DE REUNIÓN		



	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MUNICIPIO DE PUERTO ASIS *Corregimiento de Santana* *Consorcio SARO S.A.S* NIT. 902004925_8	
ACTA DE REUNIÓN		





LISTADO DE ASITENCIA
SOCIALIZACION DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Contrato No. 442 del 2025

NOMBRES Y APELLIDOS	No de Documento	No de Celular	Entidad/Beneficiario	Firma
Angie Beard Andrade	1125412150	3128695678	comunidad	
Idaura Andrade	66904224	320 6039584	comunidad	Idaura Andrade
Graciela Bastidas	69035036.	3106953896.	Comunidad.	Graciela Bastidas.
Rosario Paz Ortiz	27499763	3208186598	J. A. C., presidenta	
Carlos A. Rojas Rubio	88246352	3209832572	Comunidad	Carlos A Rojas
Carlos Males Cerón	12141998	3144282640	Comunidad Santana	Carlos M C
Freddy Giraldo y	4612352	3138808387	comunidad	
Rigoberto Legarda	3138368761	3183835517	santana.	RIGO.
Doris Betancourth Burgos	41.103.097	3144554585	Comunidad Santana	Doris Betancourth
Cenelia Patiño	69026950		Comunidad Santana.	Cenelia Patiño.
Concepción Garcia	25313947	3107910493	comunidad	
Luz Mary caicedo	1123903824	3202647357	comunidad	luz Mary caicedo
Carmen Bolivar F	41100809	3107590438	Comunidad	

LISTADO DE ASITENCIA
SOCIALIZACION DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Contrato No. 442 del 2025

NOMBRES Y APELLIDOS	No de Documento	No de Celular	Entidad/Beneficiario	Firma
Juan Pablo Vaca Torres	1152464231	3157555218	Sec. Infraestructura	

VEEDURIA CIUDADANA

ACTA DE CONFORMACIÓN COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

CONTRATO No *442 DEL 2025*
"MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

PROYECTO:

En la casa de la señora Concepcion Garcez del municipio de Puerto Asis, Corregimiento de Santana Putumayo SE REUNIERON los beneficiarios del proyecto: "**MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**" y el representante del consorcio SARO identificado con Nit No. **902004925_8** Con el objetivo de conformar el comité de veeduría ciudadana y dialogar los objetivos del proyecto en defensa del cumplimiento del mismo.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 442 DEL 2025 CELEBRADO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL CONSORCIO SARO S.A.S

FECHA: 26 de Noviembre de 2025	**CIUDAD:** Corregimiento Santana, municipio Puerto Asis.
LUGAR: Casa de la señora Concepcion Garcez	**HORA: 03:00 pm**
DURACIÓN VEEDURIA: 3 meses	

OBJETO DE LA VEEDURIA

Realizar control ciudadano al proyecto "**MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**", De conformidad a lo establecido en la Constitución de 1991, Ley 850 de 2003 y demás normas vigentes sobre participación ciudadana.

Para realizar la veeduría fue elegida como presidenta a la señora: ROSARIO PAI ORTIZ identificada con la cédula de ciudadanía Nº 27.499.763, como vicepresidenta se eligio la señora: CONCEPCION GARCEZ identificada con la cédula de ciudadanía Nº 25.313.947, y como secretaria la señora: JUAN MARTIN PERAFAN, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 1.439.108.

Instalada la Asamblea, los participantes por unanimidad decidieron elegir los miembros del Comité de Veeduría Ciudadana. Compuestos por tres personas.

Las personas elegidas fueron las siguientes:

NOMBRES	CEDULA	CELULAR O FIJO	LUGAR DE RESIDENCIA	FIRMA
Rosario pai Ortiz	27499763	3208186598	Barrio Centro	
Concepcion Garcez	25313947	3107910493	Barrio Centro	Concepción Garcés

Juan Martin Perafan	1.439.108	3217296908	Barrio Centro	

Como coordinador del comité fue elegido ROSARIO PAI ORTIZ Identificada con la cédula de ciudadanía Nº 27499763.

Acto seguido se toma el juramento de rigor, al cual contestan todos sus integrantes que se comprometen a cumplir con los deberes que demande el control ciudadano.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se da por terminada a las 5:00 PM.

ROSARIO PAI ORTIZ
Presidenta Asamblea

CONCEPCION GARCEZ
vicepresidenta Asamblea

JUAN MARTIN PERAFAN
SecretariO

VEEDURIA CIUDADANA

ACTA DE RECIBO DE LA COMUNIDAD
CONTRATO DE OBRA No. 442-2025

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS PUTUMAYO Rep. Legal JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ
NIT:	891.200.461-3
CONTRATISTA	CONSORCIO SARO NIT. 902004925-8 RL. JONHY BLADIMIR SALAS RODRÍGUEZ C.C 18.113.158
OBJETO:	MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
PLAZO:	TRES (03) MES, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA EJECUCIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE INICIO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS TRECE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($413.098.672) MDA/CTE
FECHA DE INICIO:	11 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DE MARZO DE 2026.
FECHA DE PRESENTE ACTA:	10 DE MARZO DE 2026

En el corregimiento de Santa Ana, municipio de Puerto Asís, departamento del Putumayo, se reunieron el contratista de obra y los representantes de la veeduría ciudadana para la ejecución del CONTRATO DE OBRA No. 442-2025, con el fin de dejar constancia de la culminación y recibo a satisfacción final por parte de la comunidad, representada por la veeduría del proyecto, para el contrato antes descrito, el cual tiene por objeto el **MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**.

Cuyas obras fueron ejecutadas en un 100% y se entregan en óptimo funcionamiento. De manera verbal, por parte del contratista de obra, se realizan las recomendaciones de mantenimiento necesarias para el correcto funcionamiento.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo responsabilidad expresa de quienes intervienen en ella, a los diez (10) días del mes de marzo del año 2026.

ROSARIO PAI ORTIZ
Presidenta Asamblea

CONCEPCION GARCEZ
vicepresidenta Asamblea

JUAN MARTIN PERAFAN
Secretario

JONHY BLADIMIR SALAS RODRÍGUEZ
Rep. Legal CONSORCIO SARO
Contratista de Obra

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902004925	8	CONSORCIO SARO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 12 17 BRR LAS AMERICAS	PUERTO ASIS-PUTUMAYO	3204540712	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	62783589	9499680997	E	2026/01/08	2026/02/16	BANCOLOMBIA	39	$2,213,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (7 Afiliados)						$6,975,150	$1,116,500			$6,975,150	$279,300			$6,975,150	$279,300			$6,975,150	$485,800		$0	$0
Centro de Trabajo: POSITIVA (7 Afiliados)						**$6,975,150**	**$1,116,500**			**$6,975,150**	**$279,300**			**$6,975,150**	**$279,300**			**$6,975,150**	**$485,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (7 Afiliados)						**$6,975,150**	**$1,116,500**			**$6,975,150**	**$279,300**			**$6,975,150**	**$279,300**			**$6,975,150**	**$485,800**		**$0**	**$0**
1	CC	41170982	BERNAL BLANCA	230301	21	$996,450	$159,500	MIN002	21	$996,450	$39,900	CCF63	21	$996,450	$39,900	14-23	21	$996,450	$69,400	21	$0	$0
2	CC	1124860854	BURBANO KARLA	230301	21	$996,450	$159,500	EPS037	21	$996,450	$39,900	CCF63	21	$996,450	$39,900	14-23	21	$996,450	$69,400	21	$0	$0
3	CC	1125413063	CASANOVA EVER	230301	21	$996,450	$159,500	EPS037	21	$996,450	$39,900	CCF63	21	$996,450	$39,900	14-23	21	$996,450	$69,400	21	$0	$0
4	CC	1006962107	CASANOVA FERNAIN	230301	21	$996,450	$159,500	ESSC18	21	$996,450	$39,900	CCF63	21	$996,450	$39,900	14-23	21	$996,450	$69,400	21	$0	$0
5	CC	1123201953	GUZMAN EMERSON	230301	21	$996,450	$159,500	ESSC18	21	$996,450	$39,900	CCF63	21	$996,450	$39,900	14-23	21	$996,450	$69,400	21	$0	$0
6	CC	18113158	SALAS JONHY	230301	21	$996,450	$159,500	EPS037	21	$996,450	$39,900	CCF63	21	$996,450	$39,900	14-23	21	$996,450	$69,400	21	$0	$0
7	CC	1121506227	SALAS LUIS	230301	21	$996,450	$159,500	ESSC18	21	$996,450	$39,900	CCF63	21	$996,450	$39,900	14-23	21	$996,450	$69,400	21	$0	$0
Total	**Afiliados(7)**					$6,975,150	$1,116,500			$6,975,150	$279,300			$6,975,150	$279,300			$6,975,150	$485,800		$0	$0

2026/02/14 10:27 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902004925	8	CONSORCIO SARO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 12 17 BRR LAS AMERICAS	PUERTO ASIS-PUTUMAYO	3204540712	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-12	2026-01	62783589	9499680997	E	2026/01/08	2026/02/16	BANCOLOMBIA	39	$2,213,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$1,116,500	$27,100	$0	$1,143,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,116,500	$27,100	$0	$1,143,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$485,800	$11,800	$0	$497,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$485,800	$11,800	$0	$497,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$279,300	$6,800	$0	$286,100
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	7	$279,300	$6,800	$0	$286,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$279,300	$6,800	$0	$286,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	$119,700	$2,900	$0	$122,600
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$39,900	$1,000	$0	$40,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$119,700	$2,900	$0	$122,600
TOTAL				7	$2,160,900	$52,500	$0	$2,213,400

2026/02/14 10:27 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902004925	8	CONSORCIO SARO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 12 17 BRR LAS AMERICAS	PUERTO ASIS-PUTUMAYO	3204540712	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	62657684	9499679784	E	2026/02/06	2026/02/16	BANCOLOMBIA	10	$3,999,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (10 Afiliados)						$12,548,153	$2,008,100			$13,131,789	$525,800			$13,131,789	$525,800			$13,131,789	$914,500		$0	$0
Centro de Trabajo: POSITIVA (10 Afiliados)						**$12,548,153**	**$2,008,100**			**$13,131,789**	**$525,800**			**$13,131,789**	**$525,800**			**$13,131,789**	**$914,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (10 Afiliados)						**$12,548,153**	**$2,008,100**			**$13,131,789**	**$525,800**			**$13,131,789**	**$525,800**			**$13,131,789**	**$914,500**		**$0**	**$0**
1	CC	41170982	BERNAL BLANCA	230301	30	$1,750,905	$280,200	MIN002	30	$1,750,905	$70,100	CCF63	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
2	CC	1124860854	BURBANO KARLA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF63	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
3	CC	1125413063	CASANOVA EVER	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF63	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
4	CC	1006962107	CASANOVA FERNAIN	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC18	30	$1,750,905	$70,100	CCF63	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
5	CC	1123201953	GUZMAN EMERSON	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC18	30	$1,750,905	$70,100	CCF63	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
6	CC	1148195517	RAMOS FELIX	230301	5	$291,818	$46,700	ESSC18	5	$291,818	$11,700	CCF63	5	$291,818	$11,700	14-23	5	$291,818	$20,400	5	$0	$0
7	PT	6642277	RIERA OSCAR		0	$0	$0	ESSC18	5	$291,818	$11,700	CCF63	5	$291,818	$11,700	14-23	5	$291,818	$20,400	5	$0	$0
8	CC	18113158	SALAS JONHY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF63	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
9	CC	1121506227	SALAS LUIS	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC18	30	$1,750,905	$70,100	CCF63	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
10	PT	6013923	SOLARTE JAIVER		0	$0	$0	EPSIC5	5	$291,818	$11,700	CCF63	5	$291,818	$11,700	14-23	5	$291,818	$20,400	5	$0	$0
Total			**Afiliados(10)**			**$12,548,153**	**$2,008,100**			**$13,131,789**	**$525,800**			**$13,131,789**	**$525,800**			**$13,131,789**	**$914,500**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902004925	8	CONSORCIO SARO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 12 17 BRR LAS AMERICAS	PUERTO ASIS-PUTUMAYO	3204540712	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	62657684	9499679784	E	2026/02/06	2026/02/16	BANCOLOMBIA	10	$3,999,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$2,008,100	$12,800	$0	$2,020,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,008,100	$12,800	$0	$2,020,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$914,500	$5,900	$0	$920,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$914,500	$5,900	$0	$920,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$525,800	$3,400	$0	$529,200
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	10	$525,800	$3,400	$0	$529,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$525,800	$3,500	$0	$529,300
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	5	$233,700	$1,500	$0	$235,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$70,100	$500	$0	$70,600
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$11,700	$100	$0	$11,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$210,300	$1,400	$0	$211,700
TOTAL				10	$3,974,200	$25,600	$0	$3,999,800

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902004925	8	CONSORCIO SARO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 12 17 BRR LAS AMERICAS	PUERTO ASIS-PUTUMAYO	3204540712	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-02	2026-03	117151612	9501122303	E	2026/03/06	2026/03/06	BANCOLOMBIA	0	$4,537,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (10 Afiliados)						$12,956,697	$2,073,500			$16,458,507	$659,000			$16,458,507	$659,000			$16,458,507	$1,145,900		$0	$0
Centro de Trabajo: POSITIVA (10 Afiliados)						**$12,956,697**	**$2,073,500**			**$16,458,507**	**$659,000**			**$16,458,507**	**$659,000**			**$16,458,507**	**$1,145,900**		**$0**	**$0**
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (10 Afiliados)						**$12,956,697**	**$2,073,500**			**$16,458,507**	**$659,000**			**$16,458,507**	**$659,000**			**$16,458,507**	**$1,145,900**		**$0**	**$0**
1	CC	41170982	BERNAL BLANCA	230301	12	$700,362	$112,100	MIN002	12	$700,362	$28,100	CCF63	12	$700,362	$28,100	14-23	12	$700,362	$48,800	12	$0	$0
2	CC	1124860854	BURBANO KARLA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF63	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
3	CC	1125413063	CASANOVA EVER	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF63	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
4	CC	1006962107	CASANOVA FERNAIN	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC18	30	$1,750,905	$70,100	CCF63	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
5	CC	1123201953	GUZMAN EMERSON	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC18	30	$1,750,905	$70,100	CCF63	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
6	CC	1148195517	RAMOS FELIX	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC18	30	$1,750,905	$70,100	CCF63	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
7	PT	6642277	RIERA OSCAR		0	$0	$0	ESSC18	30	$1,750,905	$70,100	CCF63	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
8	CC	18113158	SALAS JONHY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF63	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
9	CC	1121506227	SALAS LUIS	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC18	30	$1,750,905	$70,100	CCF63	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
10	PT	6013923	SOLARTE JAIVER		0	$0	$0	EPSIC5	30	$1,750,905	$70,100	CCF63	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
Total			**Afiliados(10)**			**$12,956,697**	**$2,073,500**			**$16,458,507**	**$659,000**			**$16,458,507**	**$659,000**			**$16,458,507**	**$1,145,900**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902004925	8	CONSORCIO SARO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 12 17 BRR LAS AMERICAS	PUERTO ASIS-PUTUMAYO	3204540712	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	117151612	9501122303	E	2026/03/06	2026/03/06	BANCOLOMBIA	0	$4,537,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$2,073,500	$0	$0	$2,073,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,073,500	$0	$0	$2,073,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,145,900	$0	$0	$1,145,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$1,145,900	$0	$0	$1,145,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$659,000	$0	$0	$659,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	10	$659,000	$0	$0	$659,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$659,000	$0	$0	$659,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	5	$350,500	$0	$0	$350,500
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$28,100	$0	$0	$28,100
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$210,300	$0	$0	$210,300
TOTAL				10	$4,537,400	$0	$0	$4,537,400

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902004925	8	CONSORCIO SARO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 12 17 BRR LAS AMERICAS	PUERTO ASIS-PUTUMAYO	3204540712	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-03	2026-04	166422403	9502076522	E	2026/04/09	2026/03/25	BANCOLOMBIA	0	$977,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (6 Afiliados)						$3,151,629	$504,400			$3,151,629	$126,400			$3,151,629	$126,400			$3,151,629	$219,800		$0	$0
Centro de Trabajo: POSITIVA (6 Afiliados)						**$3,151,629**	**$504,400**			**$3,151,629**	**$126,400**			**$3,151,629**	**$126,400**			**$3,151,629**	**$219,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (6 Afiliados)						$3,151,629	$504,400			$3,151,629	$126,400			$3,151,629	$126,400			$3,151,629	$219,800		$0	$0
1	CC	41170982	BERNAL BLANCA	230301	4	$233,454	$37,400	MIN002	4	$233,454	$9,400	CCF63	4	$233,454	$9,400	14-23	4	$233,454	$16,300	4	$0	$0
2	CC	1124860854	BURBANO KARLA	230301	10	$583,635	$93,400	EPS037	10	$583,635	$23,400	CCF63	10	$583,635	$23,400	14-23	10	$583,635	$40,700	10	$0	$0
3	CC	1125413063	CASANOVA EVER	230301	10	$583,635	$93,400	EPS037	10	$583,635	$23,400	CCF63	10	$583,635	$23,400	14-23	10	$583,635	$40,700	10	$0	$0
4	CC	1006962107	CASANOVA FERNAIN	230301	10	$583,635	$93,400	ESSC18	10	$583,635	$23,400	CCF63	10	$583,635	$23,400	14-23	10	$583,635	$40,700	10	$0	$0
5	CC	18113158	SALAS JONHY	230301	10	$583,635	$93,400	EPS037	10	$583,635	$23,400	CCF63	10	$583,635	$23,400	14-23	10	$583,635	$40,700	10	$0	$0
6	CC	1121506227	SALAS LUIS	230301	10	$583,635	$93,400	ESSC18	10	$583,635	$23,400	CCF63	10	$583,635	$23,400	14-23	10	$583,635	$40,700	10	$0	$0
Total			**Afiliados(6)**			**$3,151,629**	**$504,400**			**$3,151,629**	**$126,400**			**$3,151,629**	**$126,400**			**$3,151,629**	**$219,800**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902004925	8	CONSORCIO SARO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 12 17 BRR LAS AMERICAS	PUERTO ASIS-PUTUMAYO	3204540712	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	166422403	9502076522	E	2026/04/09	2026/03/25	BANCOLOMBIA	0	$977,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$504,400	$0	$0	$504,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$504,400	$0	$0	$504,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$219,800	$0	$0	$219,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$219,800	$0	$0	$219,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$126,400	$0	$0	$126,400
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	6	$126,400	$0	$0	$126,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$126,400	$0	$0	$126,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$46,800	$0	$0	$46,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$9,400	$0	$0	$9,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$70,200	$0	$0	$70,200
TOTAL				6	$977,000	$0	$0	$977,000

2026/03/25 09:27 AM

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social CONSORCIO SARO identificado con el NIT 902004925, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
CTO N.442-2025	MEJ PAV RIG ENT C4-5 CSA PASIS	PUERTO ASIS	1,043,100	2026-03	27-MAR-2026	158990020
		Total	1,043,100			

Expedido por el SENA, a los veintisiete (27) dias del mes de Marzo de 2026

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2026-03-27

Generado por : Anyi Yuliana MartÃnez Pantoja

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor ingrese a la página web https://certificadoempresarios.sena.edu.co/ enlace CONSULTAR CODIGO CERTIFICADO y digite:

el código de verificación: 1054287543 y el Número de Certificado: 484229

Consorcio Saro
NIT 902.004.925-8
CL 12 17 76 BRR LAS AMERICAS
Tel: 3204540712
Puerto Asís - Colombia
groupsarocompany@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CS 1

Señores	Alcaldia Municipal de Puerto Asis		
NIT	891.200.461-3	**Teléfono**	(000) 0000000
Dirección	calle 10cra19B/El centro	**Ciudad**	Puerto Asís - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/04/2026, 15:16
Expedición	29/04/2026, 15:16
Vencimiento	29/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	PAGO FINAL PARA EL CONTRATO DE OBRA No 442-2025 OBJETO MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	1.00	412,712,260.00	412,712,260.00	0.00	0 %	412,712,260.00

Total items: 1

Total Bruto	412,712,260.00
Total a Pagar	412,712,260.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos doce millones setecientos doce mil doscientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 412,712,260.00

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 45100004946 CUYO TITULAR ES EL CONSORCIO SARO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764106303145 aprobado en 20260223 prefijo CS desde el número 1 al 24 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 52a9dda340643ae05ce83eea8ef6c0152d23065997b73090bf880b60657cc3ee0a6f5f9afb6c39d8684a0c2877cef0d2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

B&R 054-26

LA OFICINA DE BIENES Y RENTAS DE
LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS

CERTIFICA

Que, el establecimiento **CONSORCIO SARO** NIT: **902.004.925-8** Representación Legal del señor **JONHY BLADIMIR SALAS RODRIGUEZ** identificado (a) con **C.C. No. 18.113.158**

Se encuentra a **PAZ Y SALVO** por el Año **2025**

El contribuyente está sujeto a revisión por parte de las autoridades de control fiscal.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado (a), a los diez (10) días del mes de marzo 2026.

ESTA CERTIFICACIÓN TIENE UNA VIGENCIA HASTA EL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2026

YARLADY RAMIREZ MEZA
TESORERA MUNICIPAL

Proyectó:	Revisó:	Revisó:	Aprobó:
Aleigny Carolina Herrera Castillo Apoyo de Oficina de Bienes y Rentas Carolina H.	Victor Wilmer Perenguez Narváez Jefe de Bienes y Rentas	Jackeline Alvarez Apoyo a la gestión	José Fabian Flórez Hoyos Secretario De Hacienda

Los de arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo hemos encontrado ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presento para firmas

Scanned with CamScanner

seguros mundial

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.03.27 16:00:23 -05:00

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

Codigo de Seguridad: rubfWPtt7oOFQmojYiyLIg==

No. POLIZA AGP-100005627 | No. ANEXO 3 | No. CERTIFICADO 552017403 | No. RIESGO

TIPO DE DOCUMENTO | FECHA DE EXPEDICIÓN 27/03/2026 | SUC. EXPEDIDORA AGENCIA PASTO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/12/2025	24:00 Horas Del	14/03/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO SARO	No. DOC. IDENTIDAD	902.004.925-8
DIRECCIÓN	CL12 17 76 BR LAS AMERICAS	TELÉFONO	3204540712
ASEGURADO	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS PUTUMAYO	No. DOC. IDÉNTIDAD	891.200.461-3
DIRECCIÓN	CALLE 10 CARRERA 29 ESQUINA BR CENTRO	TELÉFONO	84221640
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS PUTUMAYO	No. DOC. IDENTIDAD	891.200.461-3
DIRECCIÓN	CALLE 10 CARRERA 29 ESQUINA BR CENTRO	TELÉFONO	84221640

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN ACTA FINAL DE OBRA DE FECHA, 10/03/2026 ENTRA EN VIGOR EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA POR CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL 10/03/2026 HASTA 10/03/2031.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN VIGENTES.

OBJETO.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA NO. 442-2025 DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025 , CUYO OBJETO ES

MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS,

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 11/12/2025	24:00 Horas Del 11/07/2026	41.309.867,20	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 11/12/2025	24:00 Horas Del 11/07/2026	206.549.336,00	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 11/12/2025	24:00 Horas Del 13/03/2029	20.654.933,60	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 10/03/2026	24:00 Horas Del 10/03/2031	82.619.734,40	0,00

TOTAL ASEGURADO $ 351.133.871,20

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CLAUDIA NORA QUINTAS JURADO	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPANIA	TIPO COASEGURO	POLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/03/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACION DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Somos una empresa de [illegible]
Protegemos el medio ambiente [illegible]

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	AGP-100005627	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	552017403	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/03/2026	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA PASTO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	11/12/2025	24:00 Horas Del	14/03/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

NOTA: EL AMPRARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS TIENE UNA VIGENCIA DE (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL

ASEGURADO/ BENEFICIARIO: ALCALDIA DE PUERTO ASIS PUTUMAYO IDENTIFICADA CON NIT 891200461-3 Y EL CONTRATISTA.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - NIT: 900764492 (PART. 10,0 %)
INTEGRANTE 2 - NIT: 901965830 (PART. 90,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO SARO)

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **AGP-100005627** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **CONSORCIO SARO** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE PUERTO ASIS PUTUMAYO / MUNICIPIO DE PUERTO ASIS PUTUMAYO** , expedida por la Compañía en **27/03/2026,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA PASTO a los **27** días del mes **MARZO** del año **2026.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
