HSA Hospital San Antonio Buriticá	CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE BURITICA-ANTIOQUIA				SAN JOSÉ GRUPO DE INVERSIONES
	CONTRATISTA: GRUPO DE INVERSIONES SAN JOSÉ				
	INTERVENTORIA: JUAN ESTEBAN PATIÑO VENEGAS				
	CODIGO:	VERSIÓN No. 01	FECHA: 13/01/2026	Hoja: 02 de 16	

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO N°:	CO-001-2025	**OBJETO:**	REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN LOCATIVA DE INMUEBLE PROVISIONAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA				
ING RESPONSABLE:	PEDRO RAMOS			**CORTE Nº:**	2	**FECHA :**	13/01/2026
ITEM Nº:	4,1	**DESCRIPCION ITEM**	Construcción de losa de contrapiso en concreto de 28MPa. e=0.10m. Incluye malla D106, vidrado, encofrada todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. El entresuelo y el acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.			**UND:**	m²

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA







LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud	Ancho	Profundidad		
Piso sotano adecuación áreas					
	5,20	0,47	-	1,0	2,43
TOTAL					**2,43**

CONTRATISTA		INTERVENTORIA		SUPERVISOR	
ELABORO		Vo.Bo.		Vo.Bo.	
NOMBRE	PEDRO RAMOS	NOMBRE	JUAN ESTEBAN PATIÑO	NOMBRE	MARIA TERESA TAMAYO

HSA Hospital San Antonio Buriticá	CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE BURITICA-ANTIOQUIA			SAN JOSÉ GRUPO DE INVERSIONES
	CONTRATISTA: GRUPO DE INVERSIONES SAN JOSÉ			
	INTERVENTORIA: JUAN ESTEBAN PATIÑO VENEGAS			
	CODIGO:	VERSIÓN No. 01	FECHA: 13/01/2026	Hoja: 03 de 16

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATO N°:	CO-001-2025	**OBJETO:**	REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN LOCATIVA DE INMUEBLE PROVISIONAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA				
ING RESPONSABLE:	PEDRO RAMOS			**CORTE Nº:**	2	**FECHA :**	13/01/2026
ITEM Nº:	6,1	**DESCRIPCION ITEM**	Suministro, transporte e instalación de muro en drywall. Incluye, placa yeso 1/2", masillado, pintura de alta asepsia acril uretano, perfilería de aluminio para soporte, chazos, cintas, ángulos, cortes y todo los demás elementos necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	**UND:**	m²		

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud	Alto	Profundidad		
ADECUACIÓN PARA HOSPITALIZACIÓN					
	10,53	2,83	-	1,0	29,80
	2,10	0,90	-	-4,0	-7,56
	3,10	3,83	-	1,0	11,87
ADECUACIÓN PARA FARMACIA	5,92	2,72	-	1,0	16,10
	1,20	2,00	-	-1,0	-2,40
	7,70	2,72	-	1,0	20,94
	2,93	2,72	-	1,0	7,97
	1,91	2,72	-	1,0	5,20
	2,84	1,00	-	1,0	2,84
	3,55	1,60	-	1,0	5,68
	2,50	1,70	-	1,0	4,25
ADECUACIÓN PARA CONSULTORIOS	13,24	2,83	-	1,0	37,47
	2,57	2,38	-	1,0	6,12
	3,62	2,83	-	1,0	10,24
	2,10	0,90	-	-5,0	-9,45
ADECUACIÓN PARA URGENCIAS	3,60	3,70	-	1,0	13,32
	19,40	1,00	-	1,0	19,40
	7,51	3,83	-	1,0	28,76
	2,10	1,60	-	-3,0	-10,08
	3,98	3,83	-	3,0	45,73
	3,82	0,90	-	1,0	3,44













ADECUACIÓN PARA ADMINISTRACIÓN	2,72	2,52	-	1,0	6,85
	2,65	2,37	-	1,0	6,28
	3,53	2,62	-	1,0	9,25
	2,37	1,12	-	1,0	2,65
	2,63	2,55	-	1,0	6,71
	0,93	0,43	-	1,0	0,40
	2,40	2,55	-	1,0	6,12
	0,93	0,43	-	1,0	0,40
ADECUACIÓN PARA ODONTOLOGIA	6,55	2,55	-	1,0	16,70
	6,54	2,55	-	1,0	16,68
	3,53	2,55	-	1,0	9,00
	2,30	2,55	-	1,0	5,87
	2,65	1,20	-	1,0	3,18
ADECUACIÓN PARA LAVANDERIA	2,65	2,66	-	1,0	7,05
	2,00	0,80	-	-1,0	-1,60
Pago acta 1					-98,00
			-		
TOTAL					**237,19**

CONTRATISTA		INTERVENTORIA		SUPERVISOR	
ELABORO		Vo.Bo.		Vo.Bo.	
NOMBRE	PEDRO RAMOS	NOMBRE	JUAN ESTEBAN PATIÑO	NOMBRE	MARIA TERESA TAMAYO

HSA Hospital San Antonio Buriticá	CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE BURITICA-ANTIOQUIA				SAN JOSÉ GRUPO DE INVERSIONES
	CONTRATISTA: GRUPO DE INVERSIONES SAN JOSÉ				
	INTERVENTORIA: JUAN ESTEBAN PATIÑO VENEGAS				
	CODIGO:	VERSIÓN No. 01	FECHA: 13/01/2026	Hoja: 04 de 16	

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO N°:	CO-001-2025	**OBJETO:**	REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN LOCATIVA DE INMUEBLE PROVISIONAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA				
ING RESPONSABLE:	PEDRO RAMOS			**CORTE Nº:**	2	**FECHA :**	13/01/2026
ITEM Nº:	7,1,2	**DESCRIPCION ITEM**	Suministro, transporte e instalación de salida de abasto con camará de aire en PVC-P 3/4", incluye accesorios de conexión, instalación y funcionamiento.			**UND:**	und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA






LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud	Ancho	Profundidad		
Adecuación Odontología	-	-	-	10,0	10,00
Adecuación Urgencias	-	-	-	3,0	3,00
Adecuación Hsopitalización	-	-	-	2,0	2,00
Adecuación laboratorio	-	-	-	2,0	2,00
Adecuación consultorios	-	-	-	4,0	4,00
TOTAL					**21,00**


CONTRATISTA		INTERVENTORIA		SUPERVISOR	
ELABORO		Vo.Bo.		Vo.Bo.	
NOMBRE	PEDRO RAMOS	NOMBRE	JUAN ESTEBAN PATIÑO	NOMBRE	MARIA TERESA TAMAYO


HSA Hospital San Antonio Buriticá	CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE BURITICA-ANTIOQUIA				SAN JOSÉ GRUPO DE INVERSIONES
	CONTRATISTA: GRUPO DE INVERSIONES SAN JOSÉ				
	INTERVENTORIA: JUAN ESTEBAN PATIÑO VENEGAS				
	CODIGO:	VERSIÓN No. 01	FECHA: 13/01/2026	Hoja: 05 de 16	

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO N°:	CO-001-2025	**OBJETO:**	REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN LOCATIVA DE INMUEBLE PROVISIONAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA				
ING RESPONSABLE:	PEDRO RAMOS			**CORTE Nº:**	2	**FECHA :**	13/01/2026
ITEM Nº:	7,2,2	**DESCRIPCION ITEM**	Suministro, transporte e instalación de tuberia PVC-S 2", incluye accesorios de conexión, instalación y funcionamiento.			**UND:**	m

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud	Ancho	Profundidad		
Adecuación Urgencias	5,00	-	-	1,0	5,00
Adecuación laboratorio	4,80	-	-	1,0	4,80
Adecuación consultorios	12,0	-	-	1,0	12,0
TOTAL					**21,80**

CONTRATISTA		INTERVENTORIA		SUPERVISOR	
ELABORO		Vo.Bo.		Vo.Bo.	
NOMBRE	PEDRO RAMOS	NOMBRE	JUAN ESTEBAN PATIÑO	NOMBRE	MARIA TERESA TAMAYO

HSA Hospital San Antonio Buriticá	CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE BURITICA-ANTIOQUIA				SAN JOSÉ GRUPO DE INVERSIONES
	CONTRATISTA: GRUPO DE INVERSIONES SAN JOSÉ				
	INTERVENTORIA: JUAN ESTEBAN PATIÑO VENEGAS				
	CODIGO:	VERSIÓN No. 01	FECHA: 13/01/2026	Hoja: 06 de 16	


MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO N°:	CO-001-2025	**OBJETO:**	REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN LOCATIVA DE INMUEBLE PROVISIONAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA				
ING RESPONSABLE:	PEDRO RAMOS			**CORTE Nº:**	2	**FECHA :**	13/01/2026
ITEM Nº:	7,2,3	**DESCRIPCION ITEM**	Suministro, transporte e instalación de salida de sanitaria de PVC-S 2", incluye accesorios de conexión, instalación y funcionamiento.			**UND:**	und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA







LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud	Ancho	Profundidad		
Adecuación Urgencias	-	-	-	3,0	3,00
Adecuación Hsopitalización	-	-	-	2,0	2,00
Adecuación laboratorio	-	-	-	2,0	2,00
Adecuación consultorios	-	-	-	4,0	4,00
Pago acta 1					-4,00
TOTAL					**7,00**

CONTRATISTA		INTERVENTORIA		SUPERVISOR	
ELABORO		Vo.Bo.		Vo.Bo.	
NOMBRE	PEDRO RAMOS	NOMBRE	JUAN ESTEBAN PATIÑO	NOMBRE	MARIA TERESA TAMAYO

HSA Hospital San Antonio Buriticá	CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE BURITICA-ANTIOQUIA				SAN JOSÉ GRUPO DE INVERSIONES
	CONTRATISTA: GRUPO DE INVERSIONES SAN JOSÉ				
	INTERVENTORIA: JUAN ESTEBAN PATIÑO VENEGAS				
	CODIGO:	VERSIÓN No. 01	FECHA: 13/01/2026	Hoja: 07 de 16	

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO N°:	CO-001-2025	**OBJETO:**	REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN LOCATIVA DE INMUEBLE PROVISIONAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA				
ING RESPONSABLE:	PEDRO RAMOS			**CORTE Nº:**	2	**FECHA :**	13/01/2026
ITEM Nº:	7,3,2	**DESCRIPCION ITEM**	Suministro, transporte e instalación de lavamanos Acuacer de colgar blanco, incluye griferia, abasto metálico, sifón y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.			**UND:**	und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud	Ancho	Profundidad		
Adecuación consultorio	-	-	-	4,0	4,00
Adecuación urgencias	-	-	-	2,0	2,00
Adecuación farmacia	-	-	-	1,0	1,00
Pago acta 1					-3,00
TOTAL					**4,00**



CONTRATISTA		INTERVENTORIA		SUPERVISOR	
ELABORO		Vo.Bo.		Vo.Bo.	
NOMBRE	PEDRO RAMOS	NOMBRE	JUAN ESTEBAN PATIÑO	NOMBRE	MARIA TERESA TAMAYO

HSA Hospital San Antonio Buriticá	CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE BURITICA-ANTIOQUIA				SAN JOSÉ GRUPO DE INVERSIONES
	CONTRATISTA: GRUPO DE INVERSIONES SAN JOSÉ				
	INTERVENTORIA: JUAN ESTEBAN PATIÑO VENEGAS				
	CODIGO:	VERSIÓN No. 01	FECHA: 13/01/2026	Hoja: 08 de 16	

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO N°:	CO-001-2025	**OBJETO:**	REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN LOCATIVA DE INMUEBLE PROVISIONAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA				
ING RESPONSABLE:	PEDRO RAMOS			**CORTE Nº:**	2	**FECHA :**	13/01/2026
ITEM Nº:	9,1,1	**DESCRIPCION ITEM**	Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo de iluminación (5601-2W Decora Leviton), incluye tuberia, cable 12 AWG-CU-THHN/THWN-90ºC, accesorios de fijación para su correcta instalación y funcionamiento			**UND:**	und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

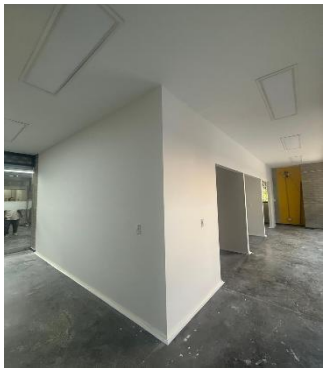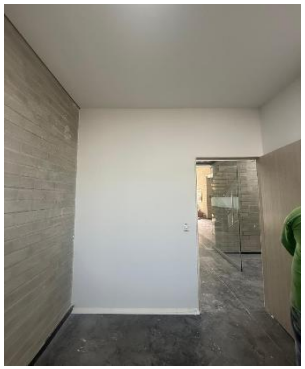LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud	Ancho	Profundidad		
Adecuación consultorio	-	-	-	9,0	9,00
Adecuación administrativo-farmacia	-	-	-	4,0	4,00
Pago acta 1					-9,00
TOTAL					**4,00**

CONTRATISTA		INTERVENTORIA		SUPERVISOR	
ELABORO		Vo.Bo.		Vo.Bo.	
NOMBRE	PEDRO RAMOS	NOMBRE	JUAN ESTEBAN PATIÑO	NOMBRE	MARIA TERESA TAMAYO

HSA Hospital San Antonio Buriticá	CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE BURITICA-ANTIOQUIA				SAN JOSÉ GRUPO DE INVERSIONES
	CONTRATISTA: GRUPO DE INVERSIONES SAN JOSÉ				
	INTERVENTORIA: JUAN ESTEBAN PATIÑO VENEGAS				
	CODIGO:	VERSIÓN No. 01	FECHA: 13/01/2026	Hoja: 09 de 16	

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO N°:	CO-001-2025	**OBJETO:**	REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN LOCATIVA DE INMUEBLE PROVISIONAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA				
ING RESPONSABLE:	PEDRO RAMOS			**CORTE Nº:**	2	**FECHA :**	13/01/2026
ITEM Nº:	9,1,2	**DESCRIPCION ITEM**	Suministro, transporte e instalación de salida para luminaria LED en muro o techo, incluye tuberia empotrada, cable 12 AWG-CU-THHN/THWN-90ºC, encintada y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento			**UND:**	und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA







LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud	Ancho	Profundidad		
Adecuación consultorio	-	-	-	9,0	9,00
Adecuación administrativo-farmacia	-	-	-	4,0	4,00
Pago acta 1					-9,00
TOTAL					**4,00**


CONTRATISTA		INTERVENTORIA		SUPERVISOR	
ELABORO		Vo.Bo.		Vo.Bo.	
NOMBRE	PEDRO RAMOS	NOMBRE	JUAN ESTEBAN PATIÑO	NOMBRE	MARIA TERESA TAMAYO

HSA Hospital San Antonio Buriticá	CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE BURITICA-ANTIOQUIA				SAN JOSÉ GRUPO DE INVERSIONES
	CONTRATISTA: GRUPO DE INVERSIONES SAN JOSÉ				
	INTERVENTORIA: JUAN ESTEBAN PATIÑO VENEGAS				
	CODIGO:	VERSIÓN No. 01	FECHA: 13/01/2026	Hoja: 10 de 16	

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO N°:	CO-001-2025	**OBJETO:**	REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN LOCATIVA DE INMUEBLE PROVISIONAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA				
ING RESPONSABLE:	PEDRO RAMOS			**CORTE Nº:**	2	**FECHA :**	13/01/2026
ITEM Nº:	9,4,1	**DESCRIPCION ITEM**	Suministro, transporte e instalación de aplique, Panel Led 48w Tamaño 60x60 Cm, Luz Fria, Instalacion Incrustar Y Sobreponer, 3200 Lumen, 100-277v, Ip20-RETIE, y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.			**UND:**	und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud	Ancho	Profundidad		
Adecuación consultorio	-	-	-	9,0	9,00
Adecuación administrativo-farmacia	-	-	-	4,0	4,00
			TOTAL		13,00

CONTRATISTA		INTERVENTORIA		SUPERVISOR	
ELABORO		Vo.Bo.		Vo.Bo.	
NOMBRE	PEDRO RAMOS	NOMBRE	JUAN ESTEBAN PATIÑO	NOMBRE	MARIA TERESA TAMAYO

HSA Hospital San Antonio Buriticá	CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE BURITICA-ANTIOQUIA				SAN JOSÉ GRUPO DE INVERSIONES
	CONTRATISTA: GRUPO DE INVERSIONES SAN JOSÉ				
	INTERVENTORIA: JUAN ESTEBAN PATIÑO VENEGAS				
	CODIGO:	VERSIÓN No. 01	FECHA: 13/01/2026	Hoja: 11 de 16	

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO N°:	CO-001-2025	**OBJETO:**	REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN LOCATIVA DE INMUEBLE PROVISIONAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA				
ING RESPONSABLE:	PEDRO RAMOS			**CORTE Nº:**	2	**FECHA :**	13/01/2026
ITEM Nº:	12,1	**DESCRIPCION ITEM**	Suministro, transporte e instalación de mesón en acero inoxidable mueble, incluye salpicadero, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.			**UND:**	m²

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA







LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud	Ancho	Profundidad		
Adecuación urgencias	1,55	0,60	-	2,0	1,86
	4,55	0,60	-	2,0	5,46
	1,97	0,60	-	2,0	2,36
Adecuación consultorio-administración	1,58	0,60	-	3,0	2,84
Pago acta 1					-7,92
TOTAL					**4,61**

CONTRATISTA		INTERVENTORIA		SUPERVISOR	
ELABORO		Vo.Bo.		Vo.Bo.	
NOMBRE	PEDRO RAMOS	NOMBRE	JUAN ESTEBAN PATIÑO	NOMBRE	MARIA TERESA TAMAYO

CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE BURITICA-ANTIOQUIA				
CONTRATISTA	GRUPO DE INVERSIONES SAN JOSÉ				
INTERVENTORIA	JUAN ESTEBAN PATIÑO VENEGAS				
CODIGO:		VERSIÓN No. 01	FECHA: 13/01/2026	Hoja: 12 de 16	

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO N°:	CO-001-2025	**OBJETO:**	REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN LOCATIVA DE INMUEBLE PROVISIONAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA

ING RESPONSABLE:	PEDRO RAMOS		**CORTE Nº:**	2	**FECHA :**	13/01/2026	
ITEM Nº:	13,2	**DESCRIPCION ITEM**	Suministro, transporte e instalación de griferia cuello alto con sensor, incluye accesorios de drenaje.			**UND:**	und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud	Ancho	Profundidad		
Adecuación urgencias	-	-	-	2,0	2,00
	-	-	-	2,0	2,00
	-	-	-	2,0	2,00
TOTAL					**6,00**

CONTRATISTA		INTERVENTORIA		SUPERVISOR	
ELABORO		Vo.Bo.		Vo.Bo.	
NOMBRE	PEDRO RAMOS	NOMBRE	JUAN ESTEBAN PATIÑO	NOMBRE	MARIA TERESA TAMAYO

CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE BURITICA-ANTIOQUIA				
CONTRATISTA	GRUPO DE INVERSIONES SAN JOSÉ				
INTERVENTORIA	JUAN ESTEBAN PATIÑO VENEGAS				
CODIGO:		VERSIÓN No. 01	FECHA: 13/01/2026	Hoja: 13 de 16	

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO N°:	CO-001-2025	**OBJETO:**	REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN LOCATIVA DE INMUEBLE PROVISIONAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA				
ING RESPONSABLE:	PEDRO RAMOS			**CORTE Nº:**	2	**FECHA :**	13/01/2026
ITEM Nº:	NP.01	**DESCRIPCION ITEM**	Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica expuesta en tubería EMT para toma doble con polo a tierra 15A, 125 V Tipo LEV referencia 5320 ACPo equivalente, en tubería EMT. Incluye toma, ducto EMT, encintada, conductores de cobre 12 AWG y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento			**UND:**	und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA







LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud	Ancho	Profundidad		
Adecuación urgencias	-	-	-	2,0	2,00
	-	-	-	2,0	2,00
	-	-	-	2,0	2,00
Adecuación administración	-	-	-	3,0	3,00
	-	-	-	3,0	3,00
Adecuación consultorios	-	-	-	15,0	15,00
TOTAL					**27,00**

CONTRATISTA		INTERVENTORIA		SUPERVISOR	
ELABORO		Vo.Bo.		Vo.Bo.	
NOMBRE	PEDRO RAMOS	NOMBRE	JUAN ESTEBAN PATIÑO	NOMBRE	MARIA TERESA TAMAYO

HSA Hospital San Antonio Buriticá	CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE BURITICA-ANTIOQUIA				SAN JOSÉ GRUPO DE INVERSIONES
	CONTRATISTA: GRUPO DE INVERSIONES SAN JOSÉ				
	INTERVENTORIA: JUAN ESTEBAN PATIÑO VENEGAS				
	CODIGO:	VERSIÓN No. 01	FECHA: 13/01/2026	Hoja: 14 de 16	

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO N°:	CO-001-2025	**OBJETO:**	REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN LOCATIVA DE INMUEBLE PROVISIONAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA				
ING RESPONSABLE:	PEDRO RAMOS			**CORTE Nº:**	2	**FECHA :**	13/01/2026
ITEM Nº:	NP.02	**DESCRIPCION ITEM**	Retiro de equipos administrativos, muebles,módulos incluye transporte hasta disposición final y/o recuperación final.			**UND:**	und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA








LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud	Ancho	Profundidad		
Adecuación administración	-	-	-	10,0	10,00
	-	-	-	10,0	10,00
	-	-	-	12,0	12,00
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
			TOTAL		32,00



CONTRATISTA		INTERVENTORIA		SUPERVISOR	
ELABORO		Vo.Bo.		Vo.Bo.	
NOMBRE	PEDRO RAMOS	NOMBRE	JUAN ESTEBAN PATIÑO	NOMBRE	MARIA TERESA TAMAYO

CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE BURITICA-ANTIOQUIA				
CONTRATISTA	GRUPO DE INVERSIONES SAN JOSÉ				
INTERVENTORIA	JUAN ESTEBAN PATIÑO VENEGAS				
CODIGO:		VERSIÓN No. 01	FECHA: 13/01/2026	Hoja: 15 de 16	

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO N°:	CO-001-2025	**OBJETO:**	REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN LOCATIVA DE INMUEBLE PROVISIONAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA				
ING RESPONSABLE:	PEDRO RAMOS			**CORTE Nº:**	2	**FECHA :**	13/01/2026
ITEM Nº:	NP.03	**DESCRIPCION ITEM**	Suministro, transporte e instalación de superboard, incluye perfiles, tornillos, separadores y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento			**UND:**	m²

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

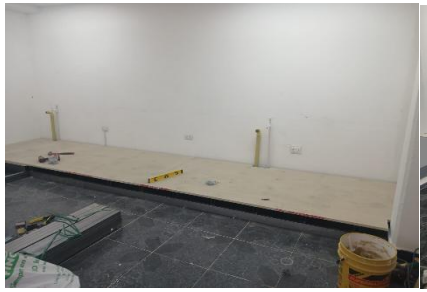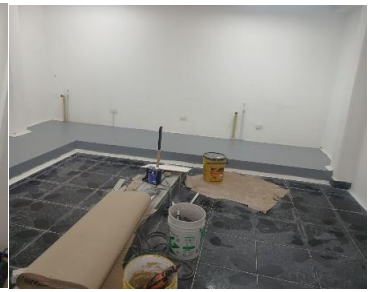

LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud	Ancho	Profundidad		
Adecuación urgencias	3,20	2,60	-	1,0	8,32
	2,44	3,15	-	1,0	7,69
Adecuación odontologia	9,56	1,83	-	1,0	17,48
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
TOTAL					**33,49**

CONTRATISTA		INTERVENTORIA		SUPERVISOR	
ELABORO		Vo.Bo.		Vo.Bo.	
NOMBRE	PEDRO RAMOS	NOMBRE	JUAN ESTEBAN PATIÑO	NOMBRE	MARIA TERESA TAMAYO

HSA Hospital San Antonio Buriticá	CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE BURITICA-ANTIOQUIA				SAN JOSÉ GRUPO DE INVERSIONES
	CONTRATISTA: GRUPO DE INVERSIONES SAN JOSÉ				
	INTERVENTORIA: JUAN ESTEBAN PATIÑO VENEGAS				
	CODIGO:	VERSIÓN No. 01	FECHA: 13/01/2026	Hoja: 16 de 16	


MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO N°:	CO-001-2025	**OBJETO:**	REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN LOCATIVA DE INMUEBLE PROVISIONAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, ANTIOQUIA				
ING RESPONSABLE:	PEDRO RAMOS			**CORTE Nº:**	2	**FECHA :**	13/01/2026
ITEM Nº:	NP.04	**DESCRIPCION ITEM**	Mantenimiento y reparación de cubierta, incluye manto asfaltico, mortero nivelación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento			**UND:**	m²

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA










LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
	Longitud	Ancho	Profundidad		
Mantenimiento cubierta para zona de atención hospitalaria	142,00	0,80	-	1,0	113,60
	85,00	0,80	-	1,0	68,00
	57,73	0,80	-	1,0	46,18
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
TOTAL					**227,78**

CONTRATISTA		INTERVENTORIA		SUPERVISOR	
ELABORO		Vo.Bo.		Vo.Bo.	
NOMBRE	PEDRO RAMOS	NOMBRE	JUAN ESTEBAN PATIÑO	NOMBRE	MARIA TERESA TAMAYO
