Neiva 9 de marzo del 2026

INFORME DE EJECUCION PALACIO DE JUSTICIA DE GARZÓN DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATO No: 063 DE 2025

OBJETO: Contratar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los equipos del Circuito de Televisión instalado en el Palacio de Justicia “Rodrigo Lara Bonilla” de Neiva, Palacio de Justicia de Pitalito y Garzon.

LOCALIZACIÓN: Palacio de Justicia Neiva, Pitalito y Garzon

FECHA DE INICIO: 29 de diciembre de 2025

FECHA DE TERMINACION: 31 de enero de 2025

CONTRATISTA: ASCHLY DANIELA BARRIOS CAMERO

SUPERVISOR: HERMES TOVAR CUELLAR

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del Contrato No. **063 de 2025**, cuyo objeto corresponde al mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) instalado en el Palacio de Justicia del Municipio de Garzon Departamento del Huila, se realizaron las actividades técnicas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos de videovigilancia. A continuación, se describen los servicios brindados:

ACTIVIDADES EJECUTADAS	
1	Mantenimiento de 24 cámaras. Detalle del mantenimiento: – Se realizó una visita técnica para la verificación del estado inicial de los componentes del CCTV. – Prueba de las centrales de comando y dispositivos iniciadores – Verificación del estado de conservación y operatividad de los equipos. – Revisión y ajuste de configuraciones en Switch y NVRs del cuarto de monitoreo. – Limpieza general y evaluación de funcionamiento de las cámaras internas y externas, incluyendo ajuste de ubicación y rotulado de puntos de video. – Lubricación y ajuste de partes móviles en cámaras externas. – Optimización y configuración del disco duro en el NVR. – Limpieza general del NVR Dahua - NVR52324K PARA 32 Cámaras y NVD1805DH-4I-4K, incluyendo lubricación de elementos de ventilación. – Mantenimiento y limpieza de todos los componentes de la central y sus accesorios. – Programación, calibración y enfoque de las señales de las cámaras y domos PTZ.

	– Pruebas y verificación de instalaciones eléctricas, lógicas y de video. – Inspección y verificación del cableado y empalmes. – Revisión del estado de canaletas y cajas de paso. – Simulación de funcionamiento del sistema. – Limpieza y ajuste de relés. – Revisión de uniones roscadas y soldadas. – Prueba final del sistema con cada fuente de suministro. – Rectificación de fases, conexiones a tierra y red regulada. – Acciones Correctivas Implementadas – Sustitución de accesorios defectuosos. – Ajuste y refuerzo de conexiones eléctricas y de señal. – Reconfiguración de equipos con fallos operativos. – Reparación de partes móviles en cámaras externas. – Se realizaron pruebas funcionales del sistema para garantizar su correcto desempeño. – Se verificó el estado de los equipos tras el mantenimiento y se documentaron los resultados.
2	Cambio de Access control en el área de sistema con reconocimiento facial, huella, código de seguridad y tarjeta. Detalle: -instalación del acces control en la oficina de cctv completamente nuevo se da de baja el anterior ya que se evidencia un daño en el lector de huella -configuración se agrega el rostro y la huella de cada uno de los vigilantes (se deja como administrador al ing. de sistemas encargado) - se realiza capacitación al ing de sistemas de como agregar nuevo personal o eliminar en caso que lo requiera - se verifico el completo funcionamiento del mismo
3	Cambio de 4 Jack CT6e con su respectivo patchcord Detalle: -se evidencia que los Jack y los patchcord de 4 cámaras se encontraban en malas condiciones por que se encontraban al exterior, se realizó cambio por unas completamente nuevas blindadas y de categoría 6e
4	Reconfiguración y asignación de las IP. Detalle: -al momento de revisar el correcto funcionamiento de las cámaras se evidencia que tienen un direccionamiento ip erróneo se procede a reconfigurar las ip de acuerdo a la segmentación que se tenia en el CCTV


5	Reparación de los botones del joystick para ptz. Detalle: -Los botones del joystick para el monitoreo de las cámaras de seguridad se encontraron sin funcionamiento al pulsarlos se realizó el cambio de cada uno de los botones verificando su funcionamiento. -se realizó la configuración para control desde el joystick de cada una de las cámaras de seguridad -se realiza capacitación al personal de seguridad del palacio indicándole como controlar cada ptz del palacio
6	Reparación de viedo Wall. Detalle: -se evidencia que el video Wall está presentando un pitido agudo el cual se debía por una advertencia de uno de los ventiladores que estaba frenado. -se realiza el cambio del ventilador dañado por uno totalmente nuevo -se reconfigura el video Wall para que se puedan visualizar las cámaras en los cuatro monitores que tiene el palacio
7	Reparación y mantenimiento de 2 pantallas con cambio de puerto HDMI Detalle: -se evidencia que 2 monitores tenían los puertos hdmi partidos internamente. -se procede a cambiar los puertos por unos nuevos quedando en completo funcionamiento

Agradecemos de antemano la atención prestada al presente informe de ejecución del Contrato No. 063 de 2025 y quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera para la correspondiente revisión y autorización.

Cordialmente,

Aschly Barrios Camero
Representante legal
3213996960

-EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
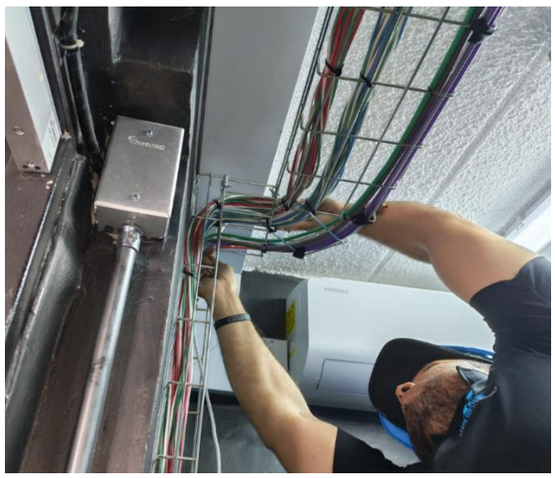
<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

































alhua


JOL STORE LABORATORIO S.A.S



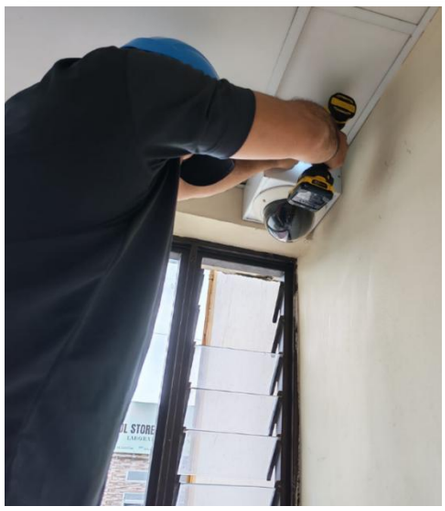


















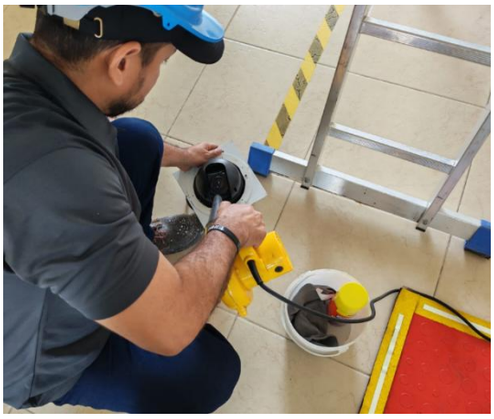




JUZGADO 2°
CIVIL MPAL

















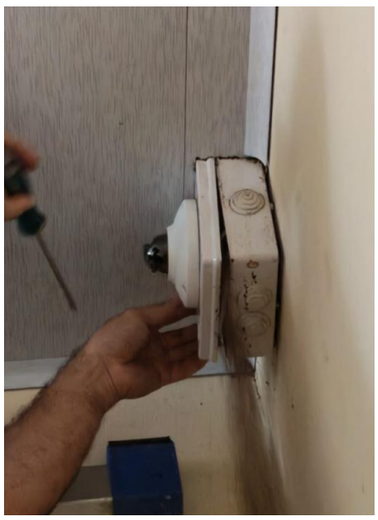

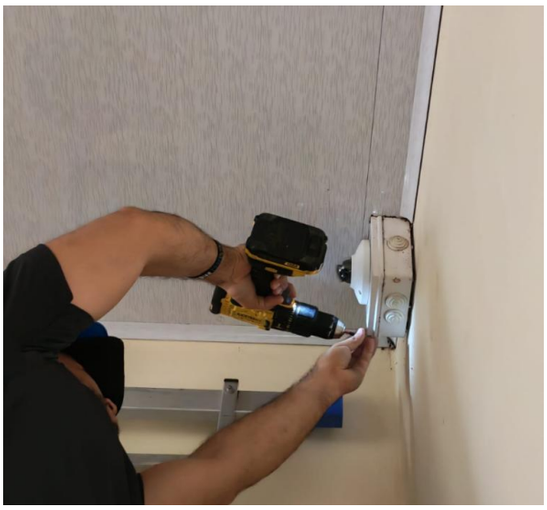


















alhua















	
	
	




	alhua
UNIDAD LOCAL DE GARZON	alhua
UNIDAD LOCAL	alhua

JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA RAMA JUDICIAL REPÚBLICA DE CO	alhua
	IP55 100X100X70
	RAMA JUDICIAL


	
	
	



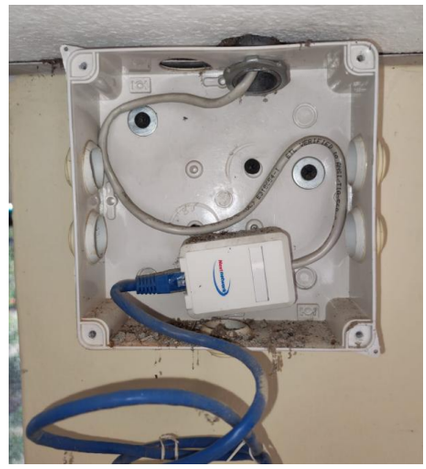

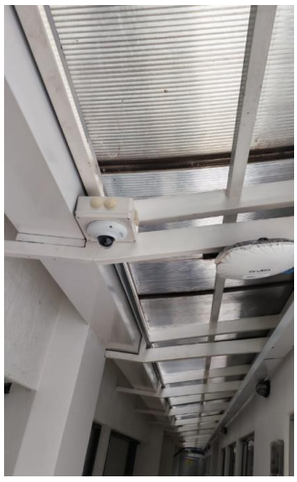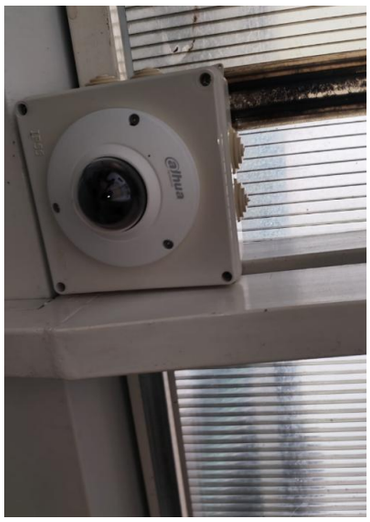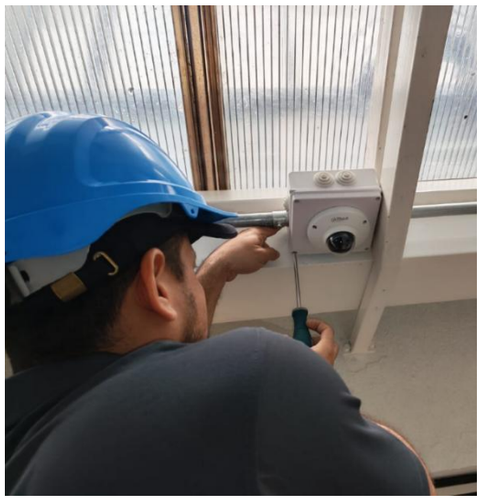
alhua




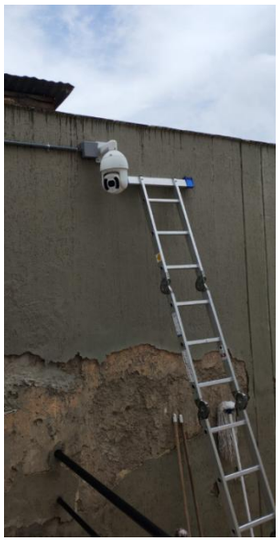



	
	alhua
UNIDAD LOCAL DE GARZON	alhua




alhua


JUZGADO SEGUNDO
PROMISCUO DE FAMILIA
RAMA JUDICIAL
REPÚBLICA DE CO


alhua




IP55















alhua




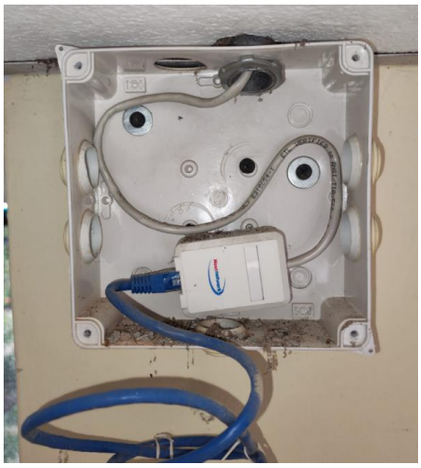

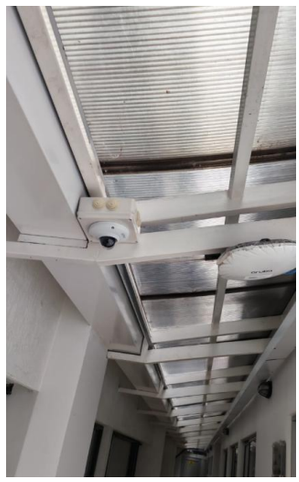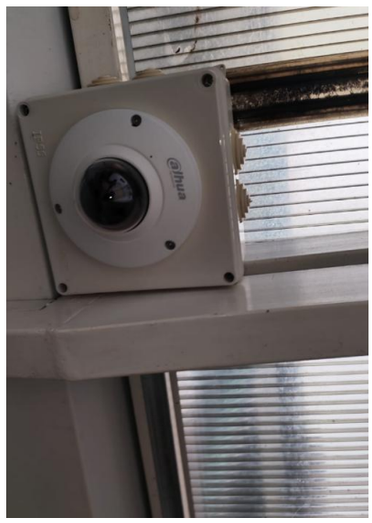

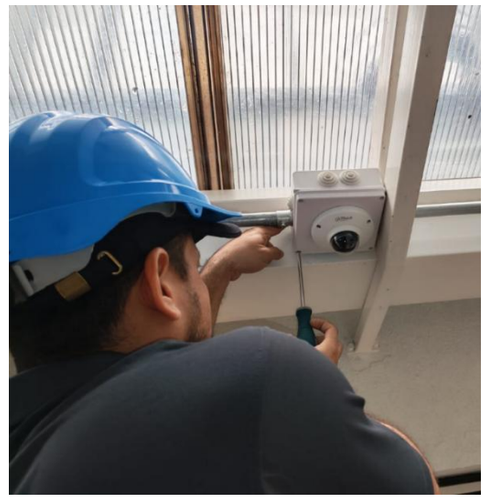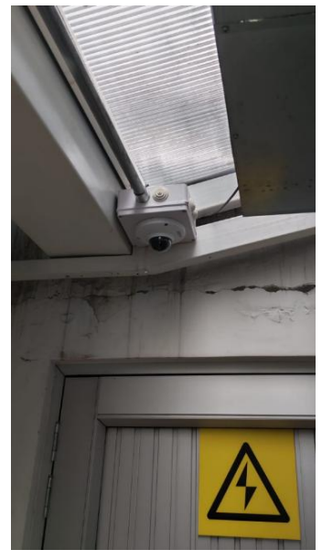
de Justicia

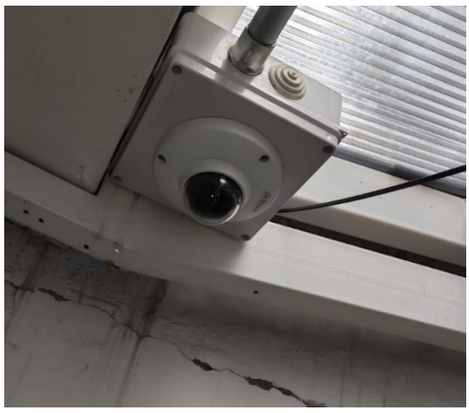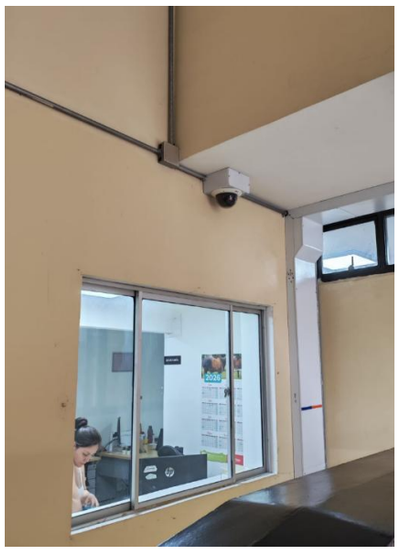

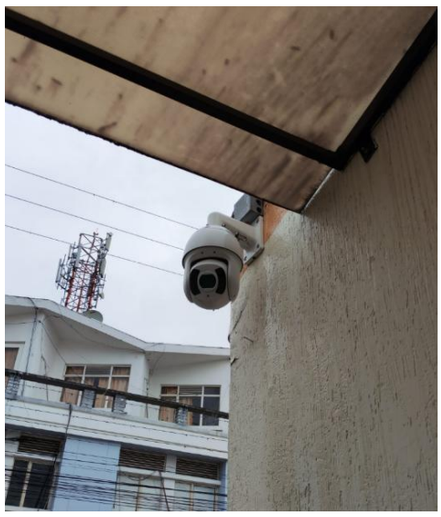














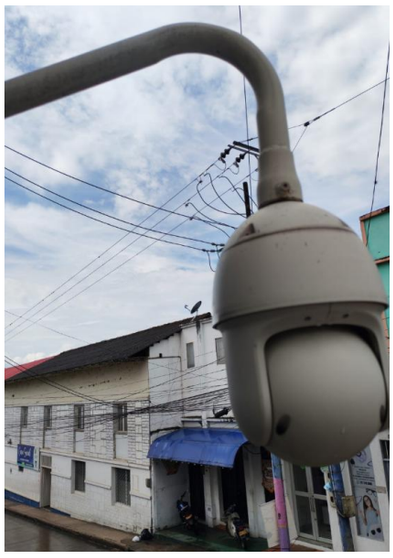

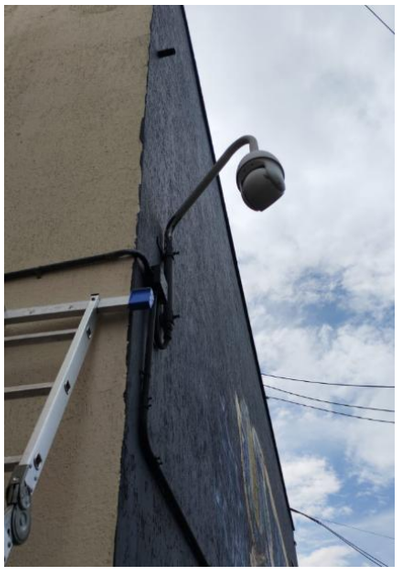





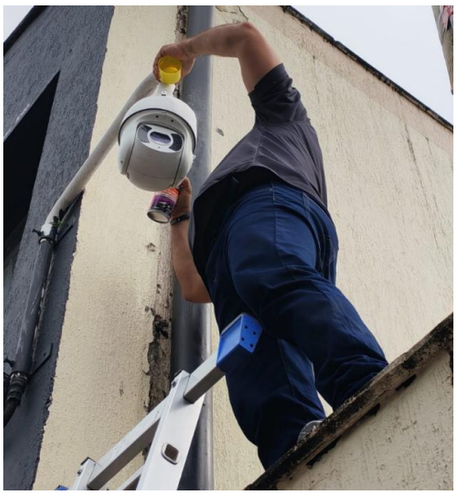




M121450
T24167



