| | | | |
|---|---|---|---|
| Gobernación de Cundinamarca | **ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO** | CÓDIGO: | |
| | | VERSIÓN: | |
| | **SECRETARIA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA DE CUNDINAMARCA** | VIGENCIA: | **2025/01/22** |

| | |
|---|---|
| **ACTA No:** | 138 |
| **FECHA:** | 05/12/ 2025 |
| **CONTRATO No:** | C.I. No.STM-CM-010-2025 |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA |

| **PARTICIPANTES** | |
|---|---|
| En Representación de | SMC |
| NOMBRE | Giovanna Naranjo |
| Cargo | Apoyo a la supervisión |
| En Representación de | SMC |
| NOMBRE | María Virginia Rocha |
| Cargo | Especialista en transito |
| En Representación de | SMC |
| NOMBRE | Juan Heredia |
| Cargo | Supervisor |
| En Representación de | SMC |
| NOMBRE | Alejandro Leguizamo Flórez |
| Cargo | Profesional Universitario |
| En Representación de | Consorcio INT SEGURIDAD VIAL |
| NOMBRE | Ernesto Perdomo |
| Cargo | Director Interventoría |
| En Representación de | Consorcio INT SEGURIDAD VIAL |
| NOMBRE | Dalila Otálora |
| Cargo | Especialista en Transito |
| En representación de | Consorcio INT SEGURIDAD VIAL |
| NOMBRE | Bibiana Rojas |
| Cargo | Residente Interventoría |

| SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **CUMPLIMIENTO** | | **OBSERVACIONES** |
| | | **SI** | **NO** | |
| Paquetes de cobro CI 5 y 6 | CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL | X | | Cumplido |
| Subsanación Informe Mensual N°7 | CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL | X | | Cumplido |
| Subsanación Informe Mensual N°8 | CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL | X | | Cumplido |
| Cronograma entrega informes finales | CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL | | X | Sin cumplir |
| Respuesta meta contractual 8 | CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL | X | | Cumplido |
| Subsanación observaciones visita recibo Une | CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL | X | | Cumplido |
| Revisión concepto resaltos San Bernardo. | CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL | X | | Cumplido |
| Envío proyección cobro 5 L1 y cobro 4 / 5 L2 | CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL | | X | Sin cumplir |
| Subsanaciones informes finales Tabio, Nemocón Cucunubá | CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL | X | | Cumplido |
| Revisiones informes finales Guayabetal, Ubalá, Sutatausa, Tausa, Fosca, Cáqueza, Une | CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL | X | | Cumplido parcialmente solo se ha enviado GUAYABETAL |
| Revisiones informes finales Anolaima, Agua de D, Pulí, Guayabal de S, Vianí, Nilo, El Colegio, Cachipay, Rosal | CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL | X | | Cumplido parcialmente solo se ha enviado ANOLAIMA. |

## TEMAS PRESENTE ACTA

Dentro de los compromisos establecidos se encontraba la entrega de los paquetes de cobro N° 5 y N° 6 para el 27 de noviembre, dicho compromiso se cumplió, la entidad menciona que se realizaron algunas observaciones a la cuenta de cobro N°6, es necesario que el abogado Nicolás de la SMC, revise la planilla observada. Una vez él confirme que todo está en orden, podrá proceder con la emisión del RAS y del supervisa, interventoría queda a la espera del resultado de la revisión, respecto a la cuenta de cobro N° 5, menciona la interventoría que se llevará en el transcurso de la mañana para radicar la documentación antes del mediodía.

sobre la subsanación del Informe Mensual N° 7, la entidad menciona que realizo nuevamente la revisión y aún no fueron atendidas la totalidad de las observaciones, haciendo una solicitud a interventoría que revisen previamente la información antes de remitirla, para evitar reprocesos, la interventoría menciona que el paquete N° 7, ya se encuentra listo para radicar, al igual que el N° 8. Mencionando la interventoría que Si entregan hoy las subsanaciones del N°7, el martes podría radicarse el paquete N° 7, La entidad menciona el cumplimiento del informe mensual N°8.

La interventoría menciona que el contratista no ha subsanado la cuenta de cobro N°5 de LOTE-1 porque no ha presentado las planillas de seguridad social. Para el Lote-2 presenta las mismas observaciones con las planillas para las cuentas de cobro N°4 Y N°5.

La interventoría menciona la relación de informes finales pendientes por entregar, mencionando las mesas de trabajo que se han realizado entre interventoría y los contratistas por ende no se ha presentado cronograma de entrega de informes

## Aspectos Contractuales

La interventoría menciona que el contratista CONSORCIO INGENIO VIAL no ha enviado cuenta de cobro N°4 Y N°5 Por que no ha presentado planillas de seguridad social correspondiente al periodo septiembre y octubre 2025.

La interventoría menciona que el contratista CONSORCIO MS no ha enviado cuenta de cobro N°5 por que no ha presentado planillas de seguridad social correspondiente al periodo Octubre del 2025.

## Aspectos Técnicos

la interventoría presentó la relación de informes finales pendientes por entregar. Señaló que, debido a las mesas de trabajo realizadas entre interventoría y contratista, aún no ha sido posible presentar el cronograma de entrega de dichos informes.

## Seguimiento Metas Contractuales y Cronograma Proyecto

| | |
|---|---|
| EN REVISION DE INTERVENTORIA | 23 |
| RADICADO A LA SMC | 5 |
| DEVUELTO AL CONTRATISTA | 13 |
| SIN ENTREGAR | 7 |

LOTE - 1

| | |
|---|---|
| EN REVISION DE INTERVENTORIA | 34 |
| RADICADO A LA SMC | 10 |
| DEVUELTO AL CONTRATISTA | 9 |
| SIN ENTREGAR | 9 |

LOTE -2

## Aspectos Administrativos y de SST

- Se menciona el cumplimiento por parte del contratista CONSORCIO MS entrega de las planillas correspondiente al informe N°8, haciendo referencia el incumplimiento por parte del CONSORCIO INGENIO VIAL.

| **Aspectos sociales y/o ambientales** |
|---|
| Entre la entidad y la interventoría se da cumplimiento a mesa se trabajó para subsanar los informes mensuales ambientales por parte de interventoría. |
| **Aspectos Presupuestales** |
| Se radica la cuenta N°5 de interventoría en la SMC. |

## ACCIONES Y COMPROMISOS FORMULADOS EN LA PRESENTE ACTA

| COMPROMISO | RESPONSABLE | CUMPLIMIENTO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | |
| Paquete de Cobro N°7 | CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL | | | Compromiso para el 05-12-2025 |
| Revisión informes mensuales 9 CO | CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL | | | Compromiso para el 10-12-2025 |
| Mesa de trabajo CO y CI para avanzar con informes finales y entregar reporte actualizado | CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL | | | |
| Envío de cronograma de entrega informes finales L1 y L2 | CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL | | | Compromiso para el 09-12-2025 |
| Envío reportes diarios | CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL | | | |
| Informe mensual 9 | CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL | | | Compromiso para la semana del 09-12-2025 |

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma_____
Nombre: Juan Heredia
**SUPERVISOR SMC**


Firma_____
Nombre: Ernesto Perdomo
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

**Para uso exclusivo del supervisor de SMC:** utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

| |
|---|
| |
| |
| |
| **FIRMA SUPERVISOR SMC** |

Copia: interventoría
Copia: contratista

- **REGISTRO DE ASISTENCIA**

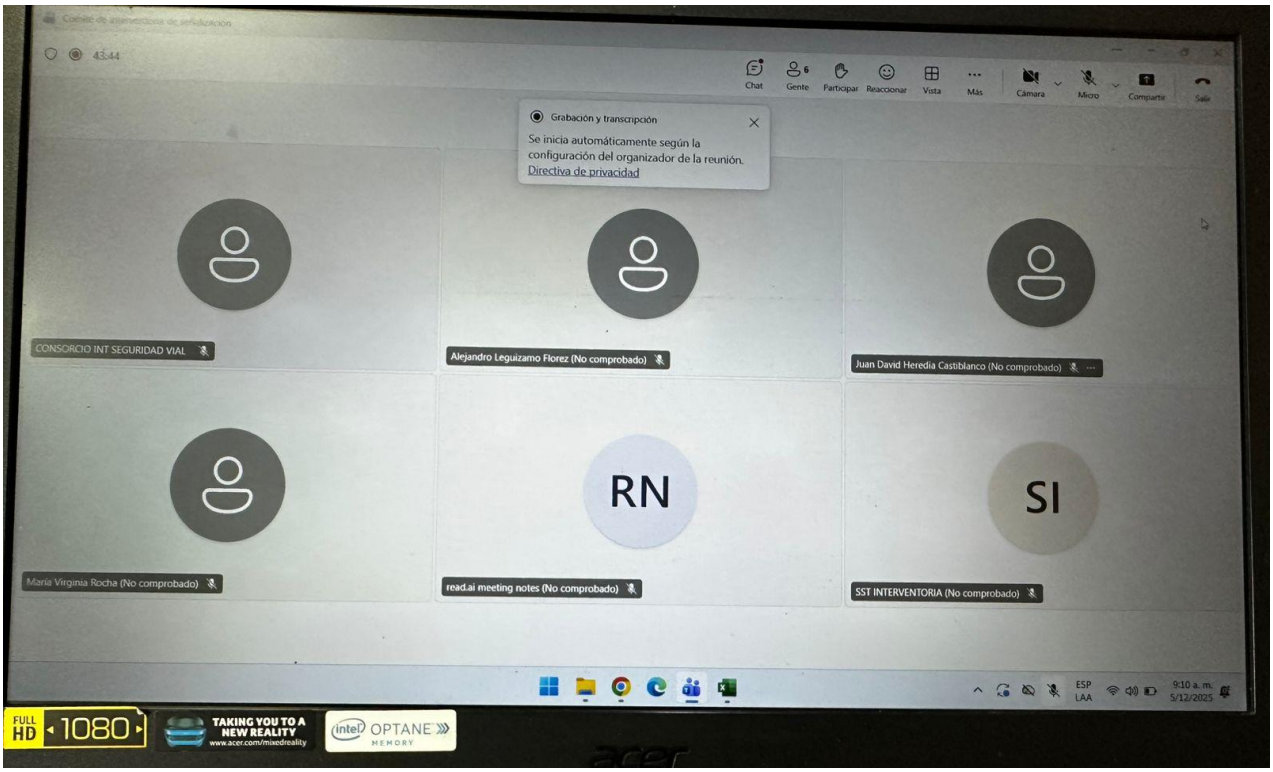

## AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Secretaria de Movilidad Contemporánea -SMC , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página contactenos@cundinamarca.gov.co

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, SMC sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No 51-53 Bogotá D.C., al correo electrónico contactenos@cundinamarca.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(601) 7490000, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.
