FORMATO
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MA-GP-FR-038
VERSIÓN	1
FECHA	06/11/2025

FECHA: 25/03/2026 (Día / Mes / Año)

DEPENDENCIA: Subdirección de Infraestructura Vial **ACTA No.** 3 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.675.888.435,96 **MES** 01 de octubre de 2025 al 30 de noviembre de 2025

ACTA FINAL

CONTRATO No : 276 de 2025 (Indique número y año)

OBJETO:

OBJETO: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: Consorcio ICCU G3 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 234 de 2025 INTERVENTOR: Consorcio Infraestructura 26

PLAZO INICIAL: Seis (06) meses (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: Doce (12) meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/04/2025 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO A 21/04/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 6.860.453.716,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido $ 1.768.909.440,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 8.629.363.156,00

No.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 30/12/2026		Última de fecha		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA				ACUMULADO	
		INVIAS		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR			CANTIDAD	VALOR
1				**CAPITULO 1. EXPLANACION Y EXCAVACIONES**												$ 99.079.005
1.1.	2.9	INV 600.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE	M3	3496	$ 33.468,00	$ 117.004.128,00	356,92	$ 11.945.345,01	243,41	$ 8.146.445,88			243,41	$ 8.146.445,88
1.2.	1.1	201 P		DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO	M3	380	$ 252.773,00	$ 96.053.740,00	674,47	$ 170.488.437,24	359,74	$ 90.932.559,02			359,74	$ 90.932.559,02
1.3.	1.6	***		TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACION, CANALES,	M3-KM	162612	$ 2.064,00	$ 335.631.168,00	54804,69	$ 113.116.880,16		$ -			0,00	$ -
2				**CAPITULO 2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**				$ -		$ -		$ -				$ 1.792.820.252,25
2.1.	3.1	INV 460.1		FRESADO CONCRETO ASFALTICO (E=5-15 cm)	M2	15323	$ 9.123,00	$ 139.791.729,00	597,78	$ 5.453.546,94		$ -			0,00	$ -
2.2.	3.3	INV 330.1		BASE GRANULAR	M3	2668	$ 231.804,00	$ 618.453.072,00	74,36	$ 17.236.481,83		$ -			0,00	$ -
2.3.	3.2	INV 320.1		SUBBASE GRANULAR	M3	667	$ 185.350,00	$ 123.628.450,00	74,36	$ 13.782.255,30		$ -			0,00	$ -
2.4.	3.5	INV 420.1		RIEGO DE IMPRIMACION	M2	16498	$ 7.255,00	$ 119.692.990,00	19236,00	$ 139.557.180,00	6749,50	$ 48.967.622,50			12304,45	$ 89.268.784,75
2.5.	3.6	INV 421.1		RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	M2	16370	$ 3.524,00	$ 57.687.880,00		$ -		$ -			0,00	$ -
2.6.	3.10	INV 450.2 P		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO	M3	923	$ 1.366.942,00	$ 1.261.687.466,00	1923,60	$ 2.629.449.631,20	674,95	$ 922.617.502,90			1246,25	$ 1.703.551.467,50
2.7.	3.9	INV 450.1 P		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO	M3	921	$ 1.357.240,00	$ 1.250.018.040,00	0,00	$ -		$ -			0,00	$ -
2.8.	3.11	INV 450.9 P		MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO	M3	4	$ 1.492.438,00	$ 5.969.752,00	4,00	$ 5.969.752,00		$ -			0,00	$ -
2.9.	3.15	INV 311.1		AFIRMADO	M3	116	$ 107.988,00	$ 12.526.608,00	116,00	$ 12.526.608,00		$ -			0,00	$ -
2.10.	3.22	***		RAJON PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	391	$ 159.209,00	$ 62.250.719,00	145,80	$ 23.212.672,20		$ -			0,00	$ -
3				**CAPITULO 3. OBRAS DE ARTE**				$ -		$ -		$ -				$ 133.946.985,68
3.1.	4.6	INV 630.4		CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	12	$ 917.525,00	$ 11.010.300,00	12,00	$ 11.010.300,00	5,99	$ 5.495.974,75			5,99	$ 5.495.974,75
3.2.	4.7	INV 630.4		CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (elevaciones)	M3	13	$ 1.098.120,00	$ 14.275.560,00	13,00	$ 14.275.560,00	18,81	$ 20.655.637,20			18,81	$ 20.655.637,20
3.3.	APU	APU		CUNETA DE CONCRETO CLASE D, 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	733	$ 809.549,00	$ 593.399.417,00	900,97	$ 729.380.981,63	41,23	$ 33.377.705,27			41,23	$ 33.377.705,27
3.4.	4.23	INV 610.1		RELLENO PARA ESTRUCTURAS (AFIRMADO)	M3	34	$ 107.988,00	$ 3.671.592,00	34,00	$ 3.671.592,00		$ -			0,00	$ -
3.5.	4.24	INV 630.6		CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	4	$ 597.616,00	$ 2.390.464,00	4,00	$ 2.390.464,00	6,24	$ 3.729.123,84			6,24	$ 3.729.123,84
3.6.	4.48	INV 661.1		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO	ML	27	$ 1.045.661,00	$ 28.232.847,00	27,00	$ 28.232.847,00	26,00	$ 27.187.186,00			26,00	$ 27.187.186,00
3.7.	4.52	INV 640.1		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000	KG	53578	$ 9.649,00	$ 516.974.122,00	71027,66	$ 685.345.906,78	4508,38	$ 43.501.358,62			4508,38	$ 43.501.358,62
3.8.	4.56	INV 682.1 P		COLCHONETA RENO	M3	18	$ 351.609,00	$ 6.328.962,00	18,00	$ 6.328.962,00		$ -			0,00	$ -
3.9.	4.22	673.1		MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	m3		$ 182.113,00	$ -	169,06	$ 30.787.227,09		$ -			0,00	$ -
3.10.	2.9	INV 600.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE	m3		$ 33.468,00	$ -	169,06	$ 5.657.953,67		$ -			0,00	$ -
3.11.	4.41	***		SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2000	m2		$ 14.072,00	$ -	1549,68	$ 21.807.048,63		$ -			0,00	$ -
3.12.	1.6	***		TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACION, CANALES,	M3-KM		$ 2.064,00	$ -	10143,34	$ 20.935.848,64		$ -			0,00	$ -
3.13.	4.20	***		TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ml		$ 49.297,00	$ -	469,60	$ 23.149.819,89		$ -			0,00	$ -
4				**CAPITULO 4. OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTURAS DE CONTENCION**				$ -		$ -		$ -				$ 292.819.751,98
4.1.	2.9	INV 600.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE	m3	680	$ 33.468,00	$ 22.758.240,00	405,00	$ 13.554.540,00	384,46	$ 12.867.107,28			384,46	$ 12.867.107,28
4.2.	4.23	610.1		RELLENO PARA ESTRUCTURAS	m3	505	$ 135.455,00	$ 68.404.775,00	364,50	$ 49.373.347,50		$ -			0,00	$ -
4.3.	4.24	630.6		CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	m3	3	$ 597.616,00	$ 1.792.848,00	1,90	$ 1.133.421,07	2,85	$ 1.704.400,83			2,85	$ 1.704.400,83
4.4.	4.6	630.4		CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 PSI (BASES)	m3	64	$ 917.525,00	$ 58.721.600,00	31,50	$ 28.902.037,50	31,50	$ 28.902.037,50			31,50	$ 28.902.037,50
4.5.	4.7	630.4		CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 PSI (ELEVACIONES)	m3	46	$ 1.098.120,00	$ 50.513.520,00	51,60	$ 56.662.992,00	47,40	$ 52.050.888,00			47,40	$ 52.050.888,00
4.6.	4,15	621.1 P		PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN	m	30	$ 7.618.416,00	$ 228.552.480,00	20,00	$ 152.368.320,00	20,00	$ 152.368.320,00			20,00	$ 152.368.320,00
4.7.	4,52	640-1		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000	kg	19339	$ 9.649,00	$ 186.602.011,00	4741,32	$ 45.748.996,68	4656,13	$ 44.926.998,37			4656,13	$ 44.926.998,37
4.8.	4,41	***		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000	m2	159	$ 14.072,00	$ 2.237.448,00	153,60	$ 2.161.459,20		$ -			0,00	$ -
4.9.	4,22	673,1		MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	m3	25	$ 182.113,00	$ 4.552.825,00	28,80	$ 5.244.854,40		$ -			0,00	$ -
4.10.	4,20	***		DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	ml	48	$ 28.997,00	$ 1.391.856,00	48,00	$ 1.391.856,00		$ -			0,00	$ -
4.11.	3,11	***		TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ml	41	$ 49.297,00	$ 2.021.177,00	30,00	$ 1.478.910,00		$ -			0,00	$ -
4.12.	1,6	***		TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES,	M3-KM		$ 2.064,00	$ -	24300,00	$ 50.155.200,00		$ -			0,00	$ -
4.13.	3,2	INV 320.1		SUBBASE GRANULAR	M3		$ 185.350,00	$ -	30,00	$ 5.560.500,00		$ -			0,00	$ -
5				**CAPITULO 5. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL**				$ -		$ -		$ -				$ -
5.1.	6.2	INV 801.6		LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø=	UN	3	$ 269.021,00	$ 807.063,00	24,00	$ 6.456.504,00		$ -			0,00	$ -
5.2.	6.6	INV 801.4		LIMPIEZA A MANO DE CUENTAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE	ML	360	$ 2.899,00	$ 1.043.640,00	360,00	$ 1.043.640,00		$ -			0,00	$ -
6				**CAPITULO 6. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL**				$ -		$ -		$ -				$ -
6.1.	7.1			LINEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	7590	$ 6.538,00	$ 49.623.420,00	10356,00	$ 67.707.528,00		$ -			0,00	$ -
6.2.	7.2			MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	600	$ 72.172,00	$ 43.303.200,00	600,00	$ 43.303.200,00		$ -			0,00	$ -
6.3.	5.3	730.3		TOPE DEFENSA METÁLICA	UN	180	$ 137.466,00	$ 24.743.880,00	180,00	$ 24.743.880,00		$ -			0,00	$ -
6.4.	5.4	730.2		SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	UN	12	$ 114.767,00	$ 1.377.204,00	12,00	$ 1.377.204,00		$ -			0,00	$ -
6.5.	5.5	730.1		DEFENSA METÁLICA	ML	720	$ 240.468,00	$ 173.136.960,00	720,00	$ 173.136.960,00		$ -			0,00	$ -
6.6.	5,6	701.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS	UN	1266	$ 22.239,00	$ 28.154.574,00	1266,00	$ 28.154.574,00		$ -			0,00	$ -
6.7.	7.6			SEÑAL DE TRANSITO GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M	UN	168	$ 672.629,00	$ 113.001.672,00	168,00	$ 113.001.672,00		$ -			0,00	$ -
6.8.	7.9			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES DE 10x3.0 CM	UN	720	$ 23.711,00	$ 17.071.920,00	720,00	$ 17.071.920,00		$ -			0,00	$ -
6.9.				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTAFAROS (EN DEFENSAS	UN	180	$ 57.342,00	$ 10.321.560,00	180,00	$ 10.321.560,00		$ -			0,00	$ -
				ITEM NO PREVISTOS				$ -		$ -		$ -				$ -
2.11 NP	APU			BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFALTICA CRL-1 Y CEMENTO	M3		$ 536.656,00	$ -	4126,10	$ 2.214.298.468,22	228,00	$ 122.357.568,00			2444,78	$ 1.312.005.855,68
2.12 NP	APU	APU		GEOCELDA	M2		$ 99.665,00	$ -	486,00	$ 48.437.190,00		$ -			0,00	$ -
2.13 NP	3,8			PAVIMENTO DE ADOQUINES EN CONCRETO	M2		$ 130.595,00	$ -	486,00	$ 63.469.170,00		$ -			0,00	$ -
3.14 NP	APU			CORTE EN ASFALTO E = 10CM	ML		$ 13.000,00	$ -	6412,00	$ 83.356.000,00		$ -			0,00	$ -
3.15 NP	2,13			EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO			$ 88.217,10	$ -	1380,80	$ 121.810.171,68		$ -			0,00	$ -
							SUB TOTAL	**$ 6.466.812.879,00**		**$ 8.157.139.377,46**		**$ 1.619.788.435,96**				**$ 3.630.671.850,49**
*				PROVISION PARA AJUSTE POR POSIBLE VARIACION COSTOS EN INSUMOS				$ 93.000.000,00		$ 93.000.000,00		$ -				$ -
*				COMPLEMENTACION Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISENOS (IVA INCLUIDO)				$ 35.055.066,00		$ 44.217.926,92		$ 21.000.000,00				$ 21.000.000,00
*				PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				$ 131.060.000,00		$ 165.317.090,02		$ -				$ 13.223.954,00
*				PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL				$ 134.525.771,00		$ 169.688.760,83		$ 35.100.000,00				$ 48.673.650,29
*							**VALOR TOTAL**	**$ 6.860.453.716,00**		**$ 8.629.363.155,23**		**$ 1.675.888.435,96**				**$ 3.713.569.454,78**
*				**VALOR TOTAL**												

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 35 %
Utilidad %

SEGUIMIENTO ANTICIPO ALCANCE INICIAL

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 1.372.090.743,20	20%
Valor Amortizado Acta No 1	$ 135.840.987,46	2%
Valor Amortizado Acta No 2	$ 271.695.216,38	4%
Valor Amortizar Presenta Acta	$ 335.177.687,19	5%
Valor Amortizado Acumulado	$ 742.713.891,03	11%
Valor Saldo por Amortizar	$ 629.376.852,17	9%

SEGUIMIENTO ANTICIPO ALCANCE ADICIÓN N1

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 353.781.888,00	4%
Valor Amortizar Presente Acta	$ 353.781.888,00	4%
Valor Amortizado Acumulado	$ 353.781.888,00	4%
Valor Saldo por Amortizar	$ -	0%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	AIU	TOTAL PRESENTE MES
*EXCAVACIONES Y EXPLANACIONES	$ 99.079.004,90		$ 99.079.004,90
*ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$ 971.585.125,40		$ 971.585.125,40
*OBRAS DE ARTE	$ 133.946.985,68		$ 133.946.985,68
*OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN	$ 292.819.751,98		$ 292.819.751,98
*SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$ -		$ -
*SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$ -		$ -
*NO PREVISTOS	$ 122.357.568,00		$ 122.357.568,00
COMPLEMENTACION Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (IVA INCLUIDO)	$ 21.000.000,00		$ 21.000.000,00
PMT			$ -
PAGA	$ 35.100.000,00		$ 35.100.000,00
VALOR TOTAL	$ 1.675.888.435,96		$ 1.675.888.435,96

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA INCLUYENDO AIU	VR. ACUMULADO
EYE	$ 99.079.004,90	$ 99.079.004,90
EP	$ 971.585.125,40	$ 1.792.820.252,25
OA	$ 133.946.985,68	$ 133.946.985,68
OAEC	$ 292.819.751,98	$ 292.819.751,98
SSV	$ -	
SSV	$ -	
NP	$ 122.357.568,00	$ 1.312.005.855,68
PMT	$ -	$ 13.223.954,00
PAGA	$ 35.100.000,00	$ 48.673.650,29
CAED	$ 21.000.000,00	$ 21.000.000,00
TOTAL	$ 1.675.888.435,96	$ 3.713.569.454,78

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

			% ejecución	
VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 6.860.453.716,00			
VALOR ADICIÓN No. 1	$ 1.768.909.440,00			
ANTICIPO		$ 1.725.872.631,20	20%	20%
ACTA 1		$ 679.204.937,29	8%	6%
AMORTIZACION ACTA 1		-$ 135.840.987,46	-2%	
ACTA 2		$ 1.358.476.081,89	16%	13%
AMORTIZACION ACTA 2		-$ 271.695.216,38	-3%	
ACTA 3		$ 1.675.888.435,96	19%	11%
AMORTIZACION ACTA 3		-$ 688.959.575,19	-8%	
		$ -	0%	0%
		$ -	0%	
SALDO A FAVOR DEL ICCU		$ 4.286.416.848,69	50%	50%
SUMAS IGUALES	**$ 8.629.363.156,00**	**$ 8.629.363.156,00**	**100%**	**100%**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1.675.888.435,96
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 986.928.860,77

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 986.928.860,77
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES, NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS.

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES
Dentro de la presente acta se autoriza la amortización del 100% del anticipo girado correspondiente a la adición de recursos N°1 al contrato de obra ICCU 276-2025

NOTAS:

1. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina
2. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
3. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: RAUL CAMILO QUINTERO BLANCO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: CONSORCIO ICCU G3
Matrícula Profesional No.: 15202-320125

Firma:
Nombre: ALEJANDRO PALACIOS OTERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
Matrícula Profesional No.: 19000-00263

Firma:
Nombre: MARIADELPILAR SUAREZ MONZON
GESTORA DE CONTRATO ICCU 276
SUPERVISORA DE CONTRATO ICCU 234
ICCU

Firma:
Nombre: SANDRA ROCIO CASTILLO
SUBDIRECTORA TECNICA
ICCU

Firma:
Nombre: LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ
DIRECTORA TECNICA - DIRECCION DE CAMINOS
ICCU

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Dirección Administrativa y Financiera).
Copias: Dirección Técnica (Concesiones, Construcciones o Caminos), Contratista, Interventor y Supervisor.

MEMORIAS DE CALCULO

MEMORIAS DE CALCULO		**ACTA PARCIAL Nº**	3	**PERIODO DESDE**	01/10/2025	**HASTA**	30/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO	**“REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA”.**						
INTERVENTOR	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26**			**NIT**	901920055-0	**CONTRATO N°**	234-2025
CONTRATISTA	**CONSORCIO ICCU G3**			**NIT**	901917583-7	**CONTRATO N°**	276-2025
CAPÍTULO 1	**1,1**	**DESCRIPCIÓN**	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)			**UNID.**	M3





UBICACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD
	LARGO	ANCHO	ALTO	
K2+160 - K2+070	90	5,85	0,1	52,65
K1+330 - K1+260	70	6	0,1	42,00
K1+260 - K1+228	32	3	0,1	9,60
K1+228 - K1+220	28	6	0,1	16,80
K1+130 - K1+070	60	6	0,1	36,00
K0+240 - K0+180	60	6	0,14	50,40
Alcantarilla Km 0+730	9	1,7	2,35	35,96

OBSERVACIONES:

TOTAL OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA	243,41

CONSORCIO ICCU G3
HERNÁN JOANNY TORRES CASASBUENAS
RESIDENTE DE OBRA


CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
WALTER CAMILO QUINTERO PRIETO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO ICCU G3
JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
ABEL SOLER CÁRDENAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CALCULO

MEMORIAS DE CALCULO		ACTA PARCIAL Nº	3	PERIODO DESDE	01/10/2025	HASTA	30/11/2025
OBJETO DEL	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA".						
INTERVENTOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26			NIT	901920055-0	CONTRATO Nº	234-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ICCU G3			NIT	901917583-7	CONTRATO Nº	276-2025
CAPÍTULO 1	1,1	DESCRIPCIÓN	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)			UNID.	M3

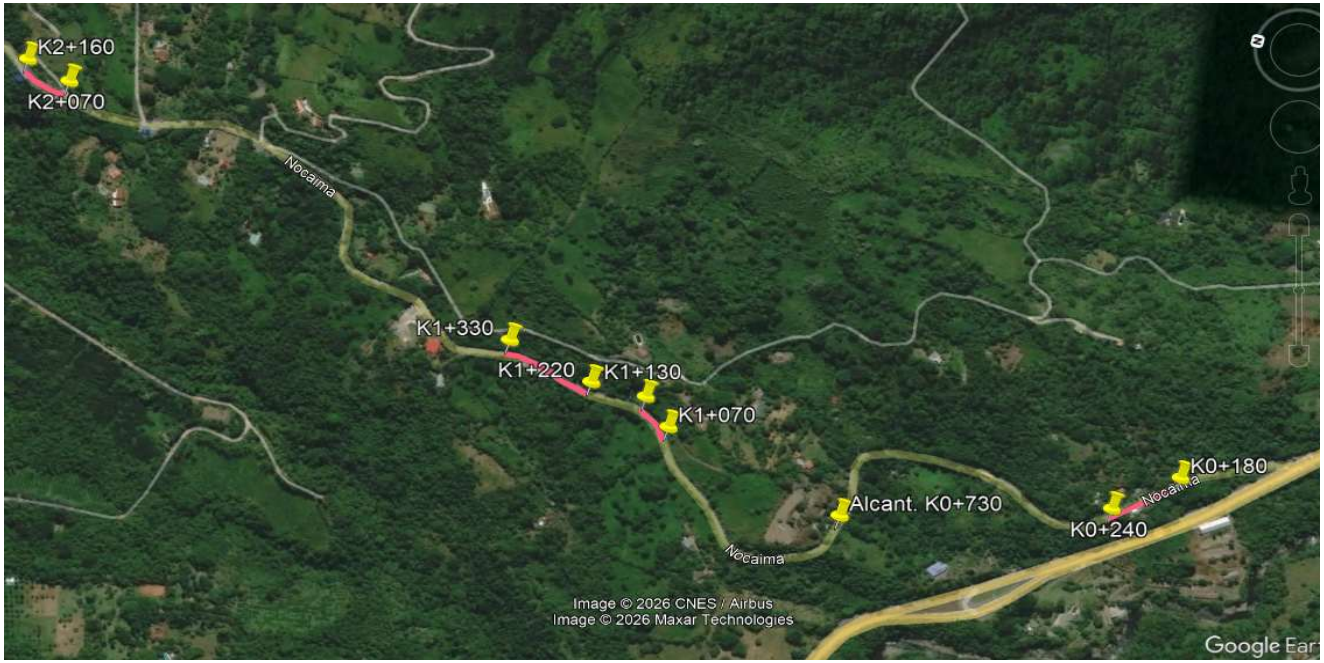

CONSORCIO ICCU G3
HERNAN JOANNY TORRES CASASBUENAS
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ICCU G3
JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
WALTER CAMILO QUINTERO PRIETO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
ABEL SOLER CÁRDENAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CALCULO

MEMORIAS DE CALCULO		ACTA PARCIAL Nº	3	PERIODO DESDE	01/10/2025	HASTA	30/11/2025	
OBJETO DEL CONTRATO	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA".							
INTERVENTOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26			NIT	901920055-0	CONTRATO N°		234-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ICCU G3			NIT	901917583-7	CONTRATO N°		276-2025
CAPÍTULO 1	1,2	DESCRIPCIÓN	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)			UNID.		M3





DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD
	LARGO	ANCHO	ALTO	ELEMENTOS	
Encole K1+496	1,4	0,35	2,2	1	1,08
Aletas descole K1+496	0,7	0,25	1,5	2	0,53
Descole guarda rueda K1+496	1,2	0,25	2	1	0,60
CUNETA PLACA k0+316 hasta K0+332	16	3,2	0,125	1	6,40
Cuneta derecha K2+070 hasta K2+210	140	0,93	0,13	1	16,93
Demolición bodillo derecho K2+070 hasta K2+210	140	0,15	0,32	1	6,72
Demolición bodillo derecho K2+070 hasta K2+210	5	0,15	0,32	-1	-0,24
Cuneta derecha K1+517 hasta K1+320	197	0,73	0,13	1	18,70
Demolición bodillo derecho K1+517 hasta K1+320	197	0,15	0,32	1	9,46
Cuneta izquierda K1+360 hasta K1+260	100	0,8	0,12	1	9,60
Cuneta izquierda K1+227 hasta K1+150	77	0,8	0,12	1	7,39
Cuneta derecha K2+070 hasta K1+984	86	0,88	0,12	1	9,08
Cuenta derecha K1+976 hasta K1+936	40	0,78	0,12	1	3,74
Cueneta izquierda K2+160 hasta K2+088	72	0,74	0,11	1	5,86
Cuenta derecha K1+795 hasta K1+780	15	0,63	0,12	1	1,13
Cuenta izquierda K1+755 hasta K1+700	55	0,82	0,11	1	4,96
Cuneta derecha K+317 Hasta K1+000	317	0,8	0,12	1	30,43
Cuneta izquierda K1+080 hasta K1+150	70	0,7	0,12	1	5,88
Cuneta izquierda K1+000 hasta K1+080	80	0,8	0,15	1	9,60
Cuneta izquierda K0+940 hasta K!+000	60	0,85	0,15	1	7,65

Cuenta izquierda K0+910 hasta K0+940	30	0,9	0,15	1	4,05
Cuenta izquierda K0+730 hasta K0+785	55	0,8	0,15	1	6,60
Cuenta izquierda K0+635 hasta K0+713	78	0,6	0,15	1	7,02
Cuenta izquierda K0+570 hasta K0+618	48	0,6	0,15	1	4,32
Cuneta derecha K0+635 Hasta K1+000	365	0,8	0,15	1	43,80
Cuneta derecha K0+605 Hasta K0+625	20	0,8	0,15	1	2,40
Cuneta derecha K0+542 Hasta K0+605	63	0,8	0,15	1	7,56
Cuneta derecha K0+500 Hasta K0+542	42	0,8	0,15	1	5,04
Cuneta derecha K0+010 Hasta K0+380	370	0,8	0,15	1	44,40
Cuenta izquierda K0+500 hasta K0+570	70	0,8	0,15	1	8,40
Cuneta izquierda K0+230 Hasta K0+380	150	0,8	0,15	1	18,00
Cuenta izquierda K0+025 hasta K0+190	165	0,8	0,15	1	19,80
Cuneta derecha K0+380 hasta K0+500	120	0,8	0,15	1	14,40
Cuneta derecha K2+550 hasta K2+660	110	0,8	0,15	1	13,20
DescoleK0+730 (cabezal)	1,84	0,25	2,45	1	1,13
Descole K0+730 (aleta 1)	1,5	0,25	1,96	1	0,74
Descole K0+730 (aleta 2)	1,46	0,25	1,85	1	0,68
Descole K0+730 (basel)	2	0,15	1,4	1	0,42
Encole K0+730 (cabezal)	1,75	0,25	2,1	1	0,92
Encole K0+730 (muros laterales)	1	0,25	2,1	2	1,05
Encole K0+730 (base)	1,25	0,15	1,75	1	0,33
TOTAL OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA					359,74

OBSERVACIONES:

CONSORCIO ICCU G3
HERNÁN JOANNY TORRES CASASBUENAS
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ICCU G3
JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO
DIRECTOR DE OBRA


CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
WALTER CAMILO QUINTERO PRIETO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
ABEL SOLER CÁRDENAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CALCULO

MEMORIAS DE CALCULO		ACTA PARCIAL Nº	3	PERIODO DESDE	01/10/2025	HASTA	30/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA".						
INTERVENTOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26			NIT	901920055-0	CONTRATO N°	234-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ICCU G3			NIT	901917583-7	CONTRATO N°	276-2025
CAPÍTULO 1	2,4	DESCRIPCIÓN	RIEGO DE IMPRIMACIÓN			UNID.	M2



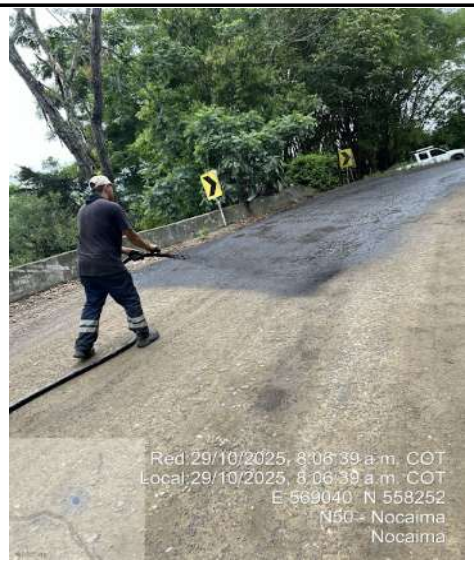

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			TOTAL
	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	
K0+260-K0+380	120	6,00		720,00
K0+530-K0+700	170	6,05		1028,50
K0+732-K1+230	498	6		2988,00
K1+230-K1+260	30	3,1		93,00
K1+260-K1+540	280	6		1680,00
K2+370 - K2+410	40	6,00		240,00
TOTAL OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA				6749,50

OBSERVACIONES: Longitudes y anchos abstraidos de memoria de MDC - 19.

CONSORCIO ICCU G3
HERNÁN JOANNY TORRES CASASBUENAS
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ICCU G3
JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
WALTER CAMILO QUINTERO PRIETO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
ABEL SOLER CÁRDENAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CALCULO

MEMORIAS DE CALCULO		ACTA PARCIAL Nº	3	PERIODO DESDE	01/10/2025	HASTA	30/11/2025
OBJETO DEL	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA".						
INTERVENTOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26			NIT	901920055-0	CONTRATO N°	234-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ICCU G3			NIT	901917583-7	CONTRATO N°	276-2025
CAPÍTULO 1	2,4	DESCRIPCIÓN	RIEGO DE IMPRIMACIÓN			UNID.	M2



CONSORCIO ICCU G3
HERNÁN JOANNY TORRES CASASBUENAS
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ICCU G3
JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
WALTER CAMILO QUINTERO PRIETO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
ABEL SOLER CÁRDENAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CALCULO

MEMORIAS DE CALCULO		ACTA PARCIAL Nº	3	PERIODO DESDE	01/10/2025	HASTA	30/11/2025

OBJETO DEL CONTRATO	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA".				
INTERVENTOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26	NIT	901920055-0	CONTRATO Nº	234-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ICCU G3	NIT	901917583-7	CONTRATO Nº	276-2025

CAPÍTULO 1	2,6	DESCRIPCIÓN	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	UNID.	M3



Instalación de carpeta asfáltica





Compactación

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD
	LARGO	ANCHO	ALTO	
K0+260-K0+380	120	6,00	0,1	72,00
K0+530-K0+700	170	6,05	0,1	102,85
K0+732-K1+230	498	6	0,1	298,80
K1+230-K1+260	30	3,1	0,1	9,30
K1+260-K1+540	280	6	0,1	168,00
K2+370 - K2+410	40	6,00	0,1	24,00
TOTAL OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA				674,95

OBSERVACIONES: SE ADJUNTA CARTERAS TOPOGRAFICAS

CONSORCIO ICCU G3
HERNÁN JOANNY TORRES CASASBUENAS
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ICCU G3
JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
WALTER CAMILO QUINTERO PRIETO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
ABEL SOLER CÁRDENAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CALCULO

MEMORIAS DE CALCULO		ACTA PARCIAL Nº	3	PERIODO DESDE	01/10/2025	HASTA	30/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA".						
INTERVENTOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26			NIT	901920055-0	CONTRATO N°	234-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ICCU G3			NIT	901917583-7	CONTRATO N°	276-2025
CAPÍTULO 1	2,6	DESCRIPCIÓN	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)			UNID.	M3



CONSORCIO ICCU G3
HERNÁN JOANNY TORRES CASASBUENAS
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ICCU G3
JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
WALTER CAMILO QUINTERO PRIETO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
ABEL SOLER CÁRDENAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CALCULO

CONSORCIO ICCU G3

ICCU
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

MEMORIAS DE CALCULO		ACTA PARCIAL Nº	3	PERIODO DESDE	01/10/2025	HASTA	30/11/2025

OBJETO DEL CONTRATO	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA".						
INTERVENTOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26			NIT	901920055-0	CONTRATO N°	234-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ICCU G3			NIT	901917583-7	CONTRATO N°	276-2025
CAPÍTULO 1	2,11NP	DESCRIPCIÓN	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 Y CEMENTO INCLUYE RECICLADO			UNID.	M3



Reciclaje de remanente



Aplicación de emulsión asfaltica



Aplicación de cemento



Nivelación de base estabilizada

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD
	LARGO	ANCHO	ALTO	
K0+600 - K0+530	70,00	6,00	0,20	84,00
K0+380 - K0+260	120,00	6,00	0,20	144,00
TOTAL OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA				228,00

OBSERVACIONES: SE ADJUNTA CARTERAS TOPOGRAFICAS

CONSORCIO ICCU G3
HERNÁN JOANNY TORRES CASASBUENAS
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ICCU G3
JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
WALTER CAMILO QUINTERO PRIETO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
ABEL SOLER CÁRDENAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CALCULO

CONSORCIO ICCU G3

ICCU
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

MEMORIAS DE CALCULO		ACTA PARCIAL Nº	3	PERIODO DESDE	01/10/2025	HASTA	30/11/2025

OBJETO DEL CONTRATO	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA".				
INTERVENTOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26	NIT	901920055-0	CONTRATO N°	234-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ICCU G3	NIT	901917583-7	CONTRATO N°	276-2025

CAPÍTULO 1	2,11NP	DESCRIPCIÓN	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 Y CEMENTO INCLUYE RECICLADO	UNID.	M3



CONSORCIO ICCU G3
HERNÁN JOANNY TORRES CASASBUENAS
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
WALTER CAMILO QUINTERO PRIETO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO ICCU G3
JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
ABEL SOLER CÁRDENAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CALCULO

MEMORIAS DE CALCULO		**ACTA PARCIAL Nº**	3	**PERIODO DESDE**	01/10/2025	**HASTA**	30/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO	**"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA".**						
INTERVENTOR	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26**			**NIT**	901920055-0	**CONTRATO N°**	234-2025
CONTRATISTA	**CONSORCIO ICCU G3**			**NIT**	901917583-7	**CONTRATO N°**	276-2025
CAPÍTULO 1	**3,1**	**DESCRIPCIÓN**	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)			**UNID.**	M3





DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD
	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
Piso alcantarilla Km 2+375 Encole	1,9	1,9	0,25	0,90
Piso alcantarilla Km 1+496 Encole	1,9	1,5	0,25	0,71
Zarpa descole Alcantarilla Km 1+496	2,8	0,8	0,4	0,90
Piso alcantarilla Km 2+375 Descole	2,55	1,73	0,25	1,10
Piso alcantarilla Km 0+730 encole	1,9	1,9	0,25	0,90
Piso alcantarilla Km 0+730 Descole	1,9	3,12	0,25	1,48
TOTAL OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA				5,99

OBSERVACIONES:

CONSORCIO ICCU G3
HERNÁN JOANNY TORRES CASASBUENAS
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ICCU G3
JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
WALTER CAMILO QUINTERO PRIETO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
ABEL SOLER CÁRDENAS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CALCULO

MEMORIAS DE CALCULO		**ACTA PARCIAL Nº**	3	**PERIODO DESDE**	01/10/2025	**HASTA**	30/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO	**"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA".**						
INTERVENTOR	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26**			**NIT**	901920055-0	**CONTRATO N°**	234-2025
CONTRATISTA	**CONSORCIO ICCU G3**			**NIT**	901917583-7	**CONTRATO N°**	276-2025
CAPÍTULO 1	**3,1**	**DESCRIPCIÓN**	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)			**UNID.**	M3



CONSORCIO ICCU G3
HERNÁN JOANNY TORRES CASASBUENAS
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ICCU G3
JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
WALTER CAMILO QUINTERO PRIETO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
ABEL SOLER CÁRDENAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CALCULO

MEMORIAS DE CALCULO		ACTA PARCIAL Nº	3	PERIODO DESDE	01/10/2025	HASTA	30/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA".						
INTERVENTOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26			NIT	901920055-0	CONTRATO N°	234-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ICCU G3			NIT	901917583-7	CONTRATO N°	276-2025
CAPÍTULO 1	3,2	DESCRIPCIÓN	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)			UNID.	M3





DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
caja encole alcantarilla Km 2+375 guarda rueda	2,75	1,9	0,25	1	1,31
Muros laterales Alc Km 2+375	1,35	2,25	0,25	2	1,52
Muro posterior Alc Km 2+375	1,9	2,25	0,25	1	1,07
caja encole alcantarilla Km 1+496 guarda rueda	1,9	2,5	0,25	1	1,19
Muros laterales Alc Km 1+496	1	2,05	0,25	2	1,03
Muro posterior Alc Km 1+496	1,9	3,3	0,25	1	1,57
Muro descole alc Km 1+496	2,8	2,45	0,25	1	1,72
muro cabezal descole alc km 2+375	1,76	2,82	0,25	1	1,24
Aleta derecha descole alc Km 2+375	1,55	2,3	0,25	1	0,89
Aleta izquierda descole alc Km 2+375	1,66	2,4	0,25	1	1,00
Muro cabezal descole Alc Km 0+730	2,98	2	0,25	1	1,49
Aletas descole Alc Km 0+730	1,7	1,88	0,25	2	1,60
Muro cabezal encole Alc Km 0+730	2,61	1,9	0,25	1	1,24
Muro posterior Alc Km 0+730	3,12	1,9	0,25	1	1,48
Muro lateral km 0+730	2,07	1,4	0,25	2	1,45
	Descuento tuberia de 36"				
caja encole alcantarilla Km 2+375 guarda rueda					-0,164
caja encole alcantarilla Km 1+496 guarda rueda					-0,164
Muro descole alc Km 1+496					-0,164
muro cabezal descole alc km 2+375					-0,164
Muro cabezal descole Alc Km 0+730					-0,164
Muro cabezal encole Alc Km 0+730					-0,164
TOTAL OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA					18,81

OBSERVACIONES:

CONSORCIO ICCU G3
HERNÁN JOANNY TORRES CASASBUENAS
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ICCU G3
JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
WALTER CAMILO QUINTERO PRIETO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
ABEL SOLER CÁRDENAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CALCULO

MEMORIAS DE CALCULO		ACTA PARCIAL Nº	3	PERIODO DESDE	01/10/2025	HASTA	30/11/2025	
OBJETO DEL CONTRATO	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA".							
INTERVENTOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26			NIT	901920055-0	CONTRATO N°		234-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ICCU G3			NIT	901917583-7	CONTRATO N°		276-2025
CAPÍTULO 1	3,2	DESCRIPCIÓN	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)			UNID.		M3



CONSORCIO ICCU G3
HERNÁN JOANNY TORRES CASASBUENAS
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ICCU G3
JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
WALTER CAMILO QUINTERO PRIETO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
ABEL SOLER CÁRDENAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CALCULO

MEMORIAS DE CALCULO		ACTA PARCIAL Nº	3	PERIODO DESDE	01/10/2025	HASTA	30/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA".						
INTERVENTOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26			NIT	901920055-0	CONTRATO N°	234-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ICCU G3			NIT	901917583-7	CONTRATO N°	276-2025
CAPÍTULO 1	3,3	DESCRIPCIÓN	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR			UNID.	M3





DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD
	LARGO	ANCHO	ALTO	
COSTADO IZQUIERDO				
Cuneta Izquierda K0+525 hasta K0+540	15	0,8	0,15	1,80
Cuneta izquierda K0+540 hasta K0+545.55 (Alcantarilla sección 1)	0,9	1,2	0,15	0,16
Cuneta izquierda K0+540 hasta K0+545.55 (Alcantarilla sección 2)	1,5	1,62	0,15	0,36
Cuneta izquierda K0+540 hasta K0+545.55 (Alcantarilla sección 2)	3,15	1,8	0,15	0,85
Cuneta izquierda K0+545.55 hasta K0+561	15,45	0,8	0,15	1,85
Cuneta izquierda K0+573 hasta K0+622.30	49,3	0,8	0,15	5,92
Cuneta izquierda K0+622.3 hasta K0+628.1 (Llegada puente sección 1)	1,3	1,35	0,15	0,26
Cuneta izquierda K0+622.3 hasta K0+628.1 (Llegada puente sección 2)	2,7	1,35	0,15	0,55
Cuneta izquierda K0+622.3 hasta K0+628.1 (Llegada puente sección 3)	1,8	0,8	0,15	0,22
Cuneta izquierda K0´+628.1 hasta K0+700	71,9	0,8	0,15	8,63
COSTADO DERECHO				
Cuneta Derecha K0+525 hasta K0+540	15	0,8	0,15	1,80
Cuneta Derecha K0+540 hasta K0+545.85 (Alcantarilla sección 1)	1,2	0,95	0,15	0,17





Cuneta Derecha K0+540 hasta K0+545.85 (Alcantarilla sección 2)	1,4	1,12	0,15	0,24
Cuneta Derecha K0+540 hasta K0+545.85 (Alcantarilla sección 3)	3,25	1,52	0,15	0,74
Cuneta Derecha K0+545.85 hasta K0+600	54,15	0,8	0,15	6,50
Cuneta Derecha K0+600 hasta K0+607.7 (Entrada predio Sección 1)	2,2	1,2	0,15	0,40
Cuneta Derecha K0+600 hasta K0+607.7 (Entrada predio Sección 2)	5	1,4	0,15	1,05
Cuneta Derecha K0+600 hasta K0+607.7 (Entrada predio Sección 3)	0,5	1,2	0,15	0,09
Cuneta Derecha K0+607.7 hasta K0+615.7	8	0,8	0,15	0,96
Cuneta Derecha K0+615.7 hasta K0+622.73(Puente sección 1)	1,3	0,55	0,15	0,11
Cuneta Derecha K0+615.7 hasta K0+622.73 (Puente sección 2)	8	0,45	0,15	0,54
Cuenta Derecha K0+640 hasta K0+648.8	8,8	0,8	0,15	1,06
Cuneta Derecha K0+648.8 hasta K0+660.6 (Entrada predio sección 1)	0,9	1,05	0,15	0,14
Cuneta Derecha K0+648.8 hasta K0+660.6 (Entrada predio sección 2)	10,1	1,3	0,15	1,97
Cuneta Derecha K0+648.8 hasta K0+660.6 (Entrada predio sección 3)	0,8	1,05	0,15	0,13
Cuenta Derecha K0+660.6 hasta K0+700	39,4	0,8	0,15	4,73
TOTAL OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA				41,23

OBSERVACIONES:

CONSORCIO ICCU G3
HERNÁN JOANNY TORRES CASASBUENAS
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ICCU G3
JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
WALTER CAMILO QUINTERO PRIETO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
ABEL SOLER CÁRDENAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CALCULO

MEMORIAS DE CALCULO		ACTA PARCIAL Nº	3	PERIODO DESDE	01/10/2025	HASTA	30/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA".						
INTERVENTOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26			NIT	901920055-0	CONTRATO N°	234-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ICCU G3			NIT	901917583-7	CONTRATO N°	276-2025
CAPÍTULO 1	3,3	DESCRIPCIÓN	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR			UNID.	M3



CONSORCIO ICCU G3
HERNÁN JOANNY TORRES CASASBUENAS
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
WALTER CAMILO QUINTERO PRIETO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO ICCU G3
JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
ABEL SOLER CÁRDENAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CALCULO

MEMORIAS DE CALCULO		ACTA PARCIAL Nº	3	PERIODO DESDE	01/10/2025	HASTA	30/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA".						
INTERVENTOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26			NIT	901920055-0	CONTRATO N°	234-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ICCU G3			NIT	901917583-7	CONTRATO N°	276-2025
CAPÍTULO 1	3,5	DESCRIPCIÓN	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES			UNID.	M3







DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD
	LARGO	ANCHO	ALTO	
Alcantarilla Km 0+730 - Solado	9	1,7	0,15	2,30
Alcantarilla Km 0+730 - Atraque / menos área tuberia	9	1,7	0,45	6,89
Descuento tuberia 36"				-2,955

MEMORIAS DE CALCULO

MEMORIAS DE CALCULO		**ACTA PARCIAL Nº**	3	**PERIODO DESDE**	01/10/2025	**HASTA**	30/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO	**"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA".**						
INTERVENTOR	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26**			**NIT**	901920055-0	**CONTRATO N°**	234-2025
CONTRATISTA	**CONSORCIO ICCU G3**			**NIT**	901917583-7	**CONTRATO N°**	276-2025
CAPÍTULO 1	**3,5**	**DESCRIPCIÓN**	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES			**UNID.**	M3



CONSORCIO ICCU G3
HERNÁN JOANNY TORRES CASASBUENAS
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ICCU G3
JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
WALTER CAMILO QUINTERO PRIETO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
ABEL SOLER CÁRDENAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CALCULO

MEMORIAS DE CALCULO		ACTA PARCIAL Nº	3	PERIODO DESDE	01/10/2025	HASTA	30/11/2025

OBJETO DEL CONTRATO	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA".				
INTERVENTOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26	NIT	901920055-0	CONTRATO N°	234-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ICCU G3	NIT	901917583-7	CONTRATO N°	276-2025

CAPÍTULO 1	3,6	DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	UNID.	ML





DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			TOTAL
	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	
Alcantarilla Km 2+375	1		8	8,000
Alcantarilla Km 1+496	1		9	9,000
Alcantarilla Km 0+730	1		9	9,000
TOTAL OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA				26,00

OBSERVACIONES:

CONSORCIO ICCU G3
HERNÁN JOANNY TORRES CASASBUENAS
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ICCU G3
JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
WALTER CAMILO QUINTERO PRIETO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
ABEL SOLER CÁRDENAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CALCULO

MEMORIAS DE CALCULO		**ACTA PARCIAL Nº**	3	**PERIODO DESDE**	01/10/2025	**HASTA**	30/11/2025

OBJETO DEL CONTRATO	**"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA".**				
INTERVENTOR	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26**	**NIT**	901920055-0	**CONTRATO N°**	234-2025
CONTRATISTA	**CONSORCIO ICCU G3**	**NIT**	901917583-7	**CONTRATO N°**	276-2025

CAPÍTULO 1	**3,6**	**DESCRIPCIÓN**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	**UNID.**	ML



CONSORCIO ICCU G3
HERNÁN JOANNY TORRES CASASBUENAS
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ICCU G3
JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
WALTER CAMILO QUINTERO PRIETO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
ABEL SOLER CÁRDENAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CALCULO

MEMORIAS DE CALCULO		ACTA PARCIAL Nº	3	PERIODO DESDE	01/10/2025	HASTA	30/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA".						
INTERVENTOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26			NIT	901920055-0	CONTRATO N°	234-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ICCU G3			NIT	901917583-7	CONTRATO N°	276-2025
CAPÍTULO 1	3,7	DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI			UNID.	KG





DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	LARGO	# BARRA	PESO x ml (Kg)	CANT	
Encole Km 2+375 alcantarilla	6	4	0,99	17	100,98
	6	4	0,99	4	23,76
	5,3	4	0,99	4	20,99
	3,9	4	0,99	5	19,31
	3,7	4	0,99	5	18,32
	5,5	4	0,99	10	54,45
	3,25	4	0,99	7	22,52
	6	4	0,99	10	59,40
	2	4	0,99	10	19,80
Descole Km 2+375 alcantarilla	4	4	0,99	36	142,56
	1,5	4	0,99	14	20,79
	1,2	4	0,99	4	4,75
	1,7	4	0,99	56	94,25
	1,65	4	0,99	10	16,34
	1,35	4	0,99	10	13,37





	2	4	0,99	12	23,76
Encole Km 1+496	6	4	0,99	17	100,98
	2	4	0,99	17	33,66
	4	4	0,99	12	47,52
	6	4	0,99	14	83,16
	6	4	0,99	20	118,80
	3,2	4	0,99	8	25,34
	1,8	4	0,99	4	7,13
Descole Km 1+496	3	4	0,99	16	47,52
	1,5	4	0,99	8	11,88
	2,7	4	0,99	12	32,08
	0,8	4	0,99	16	12,67

ACERO CUNETA

Cuenta izquierda K0+525 hasta K0+561 Longitudinal	40,00	4	0,99	5	198,80
Cuenta izquierda K0+525 hasta K0+540 Transversal	0,80	4	0,99	75	59,64
Cuneta izquierda K0+540 hasta k0+545.55 (Alcantarilla K0+542)	20,87	4	0,99	1	20,74
Cuneta izquierda K0+540 hasta k0+545.55 (Alcantarilla K0+542) Transversal	43,60	4	0,99	1	43,34
Cuenta izquierda K0+545.55 hasta K0+561 Transversal	0,80	4	0,99	78	62,03
Cuneta izquierda K0+573 hasta K0+622.30 Longitudinal	54,78	4	0,99	5	272,25
Cuneta izquierda K0+573 hasta K0+622.30 Transversal	0,80	4	0,99	246,5	196,02
Cuneta izquierda K0+622.3 hasta K0+628.1 (Llegada puente) Longitudinal	15,25	4	0,99	1	15,16
Cuneta izquierda K0+622.3 hasta K0+628.1 (Llegada puente) Transversal	19,86	4	0,99	1	19,74
Cuneta izquierda K0+628.1 hasta K0+700 Longitudinal	79,89	4	0,99	5	397,05
Cuneta izquierda K0+628.1 hasta K0+700 Transversal	0,80	4	0,99	359,5	285,87
Cuneta Derecha K0+525 hasta K0+600 Longitudinal	83,33	4	0,99	5	414,17
Cuneta Derecha K0+525 hasta K0+540 Transversal	0,80	4	0,99	75	59,64
Cuneta Derecha K0+540 hasta K0+445.85 (Alcantarilla K0+542)	14,07	4	0,99	1	13,99

Cuneta Derecha K0+540 hasta K0+445.85 (Alcantarilla K0+542)	31,37	4	0,99	1	31,18
Cuneta Derecha K0+545.85 hasta K0+600 transversal	0,80	4	0,99	270,75	215,30
Cuneta Derecha K0+600 hasta K0+615.7 Longitudinal	17,44	4	0,99	5	86,70
Cuneta Derecha K0+600 hasta K0+607.7 (Entrada predio K0+605) Longitudinal	13,20	4	0,99	1	13,12
Cuneta Derecha K0+600 hasta K0+607.7 (Entrada predio K0+605) Transversal	45,55	4	0,99	1	45,28
Cuneta Derecha K0+607.7 hasta K0+615.7 Transversal	0,80	4	0,99	40	31,81
Cuneta Derecha K0+615.7 hasta K0+622.73(Puente K0+620) Longitudinal	12,00	4	0,99	1	11,93
Cuneta Derecha K0+615.7 hasta K0+622.73(Puente K0+620) Transversal	10,55	4	0,99	1	10,49
Cuenta Derecha K0+640 hasta K0+700 Longitudinal	66,67	4	0,99	5	331,33
Cuenta Derecha K0+640 hasta K0+648.8 Transversal	0,80	4	0,99	44	34,99
Cuneta Derecha K0+648.8 hasta K0+660.6 (Entrada predio K0+650)	22,02	4	0,99	1	21,89
Cuneta Derecha K0+648.8 hasta K0+660.6 (Entrada predio K0+650)	66,04	4	0,99	1	65,64
Cuenta Derecha K0+660.6 hasta K0+700 Longitudinal	43,78	4	0,99	5	217,58
Cuenta Derecha K0+660.6 hasta K0+700 Transversal	0,80	4	0,99	197	156,65
OBSERVACIONES:	**TOTAL OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA**				4508,38

CONSORCIO ICCU G3
HERNÁN JOANNY TORRES CASASBUENAS
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ICCU G3
JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
WALTER CAMILO QUINTERO PRIETO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
ABEL SOLER CÁRDENAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CALCULO

MEMORIAS DE CALCULO		**ACTA PARCIAL Nº**	3	**PERIODO DESDE**	01/10/2025	**HASTA**	30/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO	**"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA".**						
INTERVENTOR	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26**			**NIT**	901920055-0	**CONTRATO N°**	234-2025
CONTRATISTA	**CONSORCIO ICCU G3**			**NIT**	901917583-7	**CONTRATO N°**	276-2025
CAPÍTULO 1	**3,7**	**DESCRIPCIÓN**	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI			**UNID.**	KG



CONSORCIO ICCU G3
HERNÁN JOANNY TORRES CASASBUENAS
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
WALTER CAMILO QUINTERO PRIETO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO ICCU G3
JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
ABEL SOLER CÁRDENAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CALCULO

MEMORIAS DE CALCULO		**ACTA PARCIAL Nº**	3	**PERIODO DESDE**	01/10/2025	**HASTA**	30/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO	**"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA".**						
INTERVENTOR	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26**			**NIT**	901920055-0	**CONTRATO N°**	234-2025
CONTRATISTA	**CONSORCIO ICCU G3**			**NIT**	901917583-7	**CONTRATO N°**	276-2025
CAPÍTULO 1	**3,7**	**DESCRIPCIÓN**	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI			**UNID.**	KG



CONSORCIO ICCU G3
HERNÁN JOANNY TORRES CASASBUENAS
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ICCU G3
JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
WALTER CAMILO QUINTERO PRIETO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
ABEL SOLER CÁRDENAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CALCULO

MEMORIAS DE CALCULO		**ACTA PARCIAL Nº**	3	**PERIODO DESDE**	01/10/2025	**HASTA**	30/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO	**"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA".**						
INTERVENTOR	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26**			**NIT**	901920055-0	**CONTRATO N°**	234-2025
CONTRATISTA	**CONSORCIO ICCU G3**			**NIT**	901917583-7	**CONTRATO N°**	276-2025
CAPÍTULO 1	**4,1**	**DESCRIPCIÓN**	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)			**UNID.**	M3





DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD
	LARGO	ANCHO	ALTO	
Km 0+420 al Km 0+435	7,50	1,68	4,65	58,7
	7,50	1,73	3,00	39,0
Km 0+420 al Km 0+405	15,00	3,00	4,00	180,0
	15,00	3,00	2,37	106,8
TOTAL OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA				384,46

OBSERVACIONES:

CONSORCIO ICCU G3
HERNÁN JOANNY TORRES CASASBUENAS
RESIDENTE DE OBRA


CONSORCIO ICCU G3
JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
WALTER CAMILO QUINTERO PRIETO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
ABEL SOLER CÁRDENAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CALCULO

MEMORIAS DE CALCULO		ACTA PARCIAL Nº	3	PERIODO DESDE	01/10/2025	HASTA	30/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA".						
INTERVENTOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26			NIT	901920055-0	CONTRATO N°	234-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ICCU G3			NIT	901917583-7	CONTRATO N°	276-2025
CAPÍTULO 1	4,1	DESCRIPCIÓN	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)			UNID.	M3

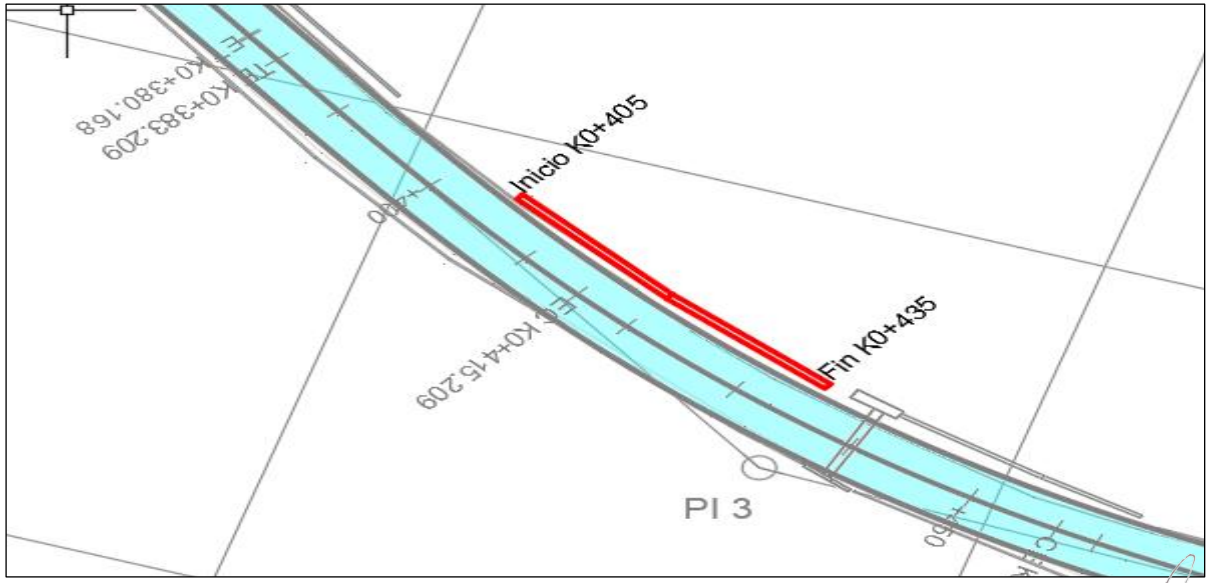

CONSORCIO ICCU G3
HERNÁN JOANNY TORRES CASASBUENAS
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ICCU G3
JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
WALTER CAMILO QUINTERO PRIETO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
ABEL SOLER CÁRDENAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CALCULO

MEMORIAS DE CALCULO		ACTA PARCIAL Nº	3	PERIODO DESDE	01/10/2025	HASTA	30/11/2025

OBJETO DEL CONTRATO	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA".						
INTERVENTOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26			NIT	901920055-0	CONTRATO N°	234-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ICCU G3			NIT	901917583-7	CONTRATO N°	276-2025
CAPÍTULO 1	4,3	DESCRIPCIÓN	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES			UNID.	M3





DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD
	LARGO	ANCHO	ALTO	
VIGA DE CIMENTACIÓN	15,00	1,5	0,1	2,250
	15,00	1,5	0,05	1,130

Menos area caisson

	Area	Espesor	Cantidad	
Caisson 1 y 2	1,76	0,1	2	0,352
Caisson 3 y 4	1,76	0,05	2	0,176

TOTAL OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA	2,85

OBSERVACIONES:

CONSORCIO ICCU G3
HERNÁN JOANNY TORRES CASASBUENAS
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ICCU G3
JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
WALTER CAMILO QUINTERO PRIETO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
ABEL SOLER CÁRDENAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CALCULO

MEMORIAS DE CALCULO		**ACTA PARCIAL Nº**	3	**PERIODO DESDE**	01/10/2025	**HASTA**	30/11/2025

OBJETO DEL CONTRATO	**"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA".**						
INTERVENTOR	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26**			**NIT**	901920055-0	**CONTRATO N°**	234-2025
CONTRATISTA	**CONSORCIO ICCU G3**			**NIT**	901917583-7	**CONTRATO N°**	276-2025
CAPÍTULO 1	**4,3**	**DESCRIPCIÓN**	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES			**UNID.**	M3



CONSORCIO ICCU G3
HERNÁN JOANNY TORRES CASASBUENAS
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ICCU G3
JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
WALTER CAMILO QUINTERO PRIETO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
ABEL SOLER CÁRDENAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CALCULO

CONSORCIO ICCU G3

ICCU
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

MEMORIAS DE CALCULO		ACTA PARCIAL Nº	3	PERIODO DESDE	01/10/2025	HASTA	30/11/2025

OBJETO DEL CONTRATO	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA".				
INTERVENTOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26	NIT	901920055-0	CONTRATO N°	234-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ICCU G3	NIT	901917583-7	CONTRATO N°	276-2025

CAPÍTULO 1	4,4	DESCRIPCIÓN	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 PSI (BASES)	UNID.	M3





DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD
	LARGO	ANCHO	ALTO	
VIGA DE AMARRE 2	15	1,5	0,7	15,750
VIGA DE AMARRE 1	15	1,5	0,7	15,750

MEMORIAS DE CALCULO

MEMORIAS DE CALCULO		ACTA PARCIAL Nº	3	PERIODO DESDE	01/10/2025	HASTA	30/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA".						
INTERVENTOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26			NIT	901920055-0	CONTRATO N°	234-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ICCU G3			NIT	901917583-7	CONTRATO N°	276-2025
CAPÍTULO 1	4,4	DESCRIPCIÓN	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 PSI (BASES)			UNID.	M3



CONSORCIO ICCU G3
HERNÁN JOANNY TORRES CASASBUENAS
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
WALTER CAMILO QUINTERO PRIETO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO ICCU G3
JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
ABEL SOLER CÁRDENAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CALCULO

MEMORIAS DE CALCULO		**ACTA PARCIAL Nº**	3	**PERIODO DESDE**	01/10/2025	**HASTA**	30/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO	**"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA".**						
INTERVENTOR	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26**			**NIT**	901920055-0	**CONTRATO N°**	234-2025
CONTRATISTA	**CONSORCIO ICCU G3**			**NIT**	901917583-7	**CONTRATO N°**	276-2025
CAPÍTULO 1	**4,5**	**DESCRIPCIÓN**	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 PSI (ELEVACIONES)			**UNID.**	M3





DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD
	LARGO	ANCHO	ALTO	
VASTAGO MODULO 2	15	0,4	3,95	23,700
VASTAGO MODULO 1	15	0,4	3,95	23,700
TOTAL OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA				47,40

OBSERVACIONES:

CONSORCIO ICCU G3
HERNÁN JOANNY TORRES CASASBUENAS
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ICCU G3
JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
WALTER CAMILO QUINTERO PRIETO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
ABEL SOLER CÁRDENAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CALCULO


CONSORCIO ICCU G3

ICCU
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

MEMORIAS DE CALCULO		ACTA PARCIAL Nº	3	PERIODO DESDE	01/10/2025	HASTA	30/11/2025

OBJETO DEL CONTRATO	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA".						
INTERVENTOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26			NIT	901920055-0	CONTRATO N°	234-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ICCU G3			NIT	901917583-7	CONTRATO N°	276-2025
CAPÍTULO 1	4,5	DESCRIPCIÓN	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 PSI (ELEVACIONES)			UNID.	M3

PERFIL DE MURO CON COTA REALES

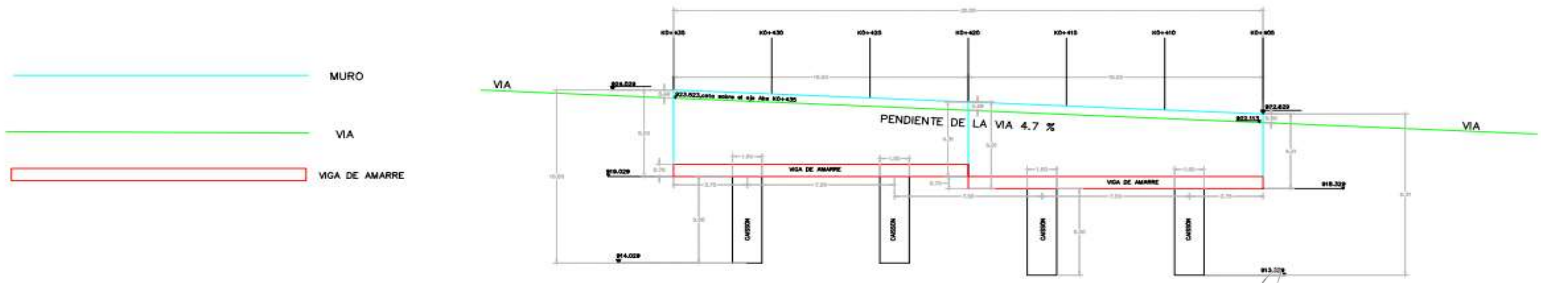

CONSORCIO ICCU G3
HERNÁN JOANNY TORRES CASASBUENAS
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ICCU G3
JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
WALTER CAMILO QUINTERO PRIETO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
ABEL SOLER CÁRDENAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CALCULO

MEMORIAS DE CALCULO		**ACTA PARCIAL Nº**	3	**PERIODO DESDE**	01/10/2025	**HASTA**	30/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO	**"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA".**						
INTERVENTOR	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26**			**NIT**	901920055-0	**CONTRATO N°**	234-2025
CONTRATISTA	**CONSORCIO ICCU G3**			**NIT**	901917583-7	**CONTRATO N°**	276-2025
CAPÍTULO 1	**4,6**	**DESCRIPCIÓN**	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)			**UNID.**	M





DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD
	LARGO	ANCHO	ALTO	
Caisson No. 1			5	5,000
Caisson No. 2			5	5,000
Caisson No. 3			5	5,000
Caisson No. 4			5	5,000
TOTAL OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA				20,00

OBSERVACIONES:

CONSORCIO ICCU G3
HERNÁN JOANNY TORRES CASASBUENAS
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ICCU G3
JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
WALTER CAMILO QUINTERO PRIETO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
ABEL SOLER CÁRDENAS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CALCULO

MEMORIAS DE CALCULO		**ACTA PARCIAL Nº**	3	**PERIODO DESDE**	01/10/2025	**HASTA**	30/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO	**"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA".**						
INTERVENTOR	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26**			**NIT**	901920055-0	**CONTRATO N°**	234-2025
CONTRATISTA	**CONSORCIO ICCU G3**			**NIT**	901917583-7	**CONTRATO N°**	276-2025
CAPÍTULO 1	**4,6**	**DESCRIPCIÓN**	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)			**UNID.**	M



CONSORCIO ICCU G3
HERNÁN JOANNY TORRES CASASBUENAS
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ICCU G3
JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
WALTER CAMILO QUINTERO PRIETO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
ABEL SOLER CÁRDENAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CALCULO

MEMORIAS DE CALCULO		ACTA PARCIAL Nº	3	PERIODO DESDE	01/10/2025	HASTA	30/11/2025	
OBJETO DEL CONTRATO	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA".							
INTERVENTOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26			NIT	901920055-0	CONTRATO Nº		234-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ICCU G3			NIT	901917583-7	CONTRATO Nº		276-2025
CAPÍTULO 1	4,7	DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI			UNID.		KG





DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					TOTAL
	LARGO	# BARRA	PESO BARRA Kg	CANT. ELEM	CANT. MODULOS	
Z1VIGA DE AMARRE	4,1	5	1,56	61	2	781,56
Z2VIGA DE AMARRE	1,7	4	0,99	61	2	205,33
Z3VIGA DE AMARRE	5	5	1,56	16	2	250,00
Z4VIGA DE AMARRE	4,2	5	1,56	16	2	210,00
Z5VIGA DE AMARRE	6	5	1,56	12	2	225,00
Z6VIGA DE AMARRE	6	5	1,56	6	2	112,50
M1VASTAGO	4,60	5	1,56	1	2	14,38
	4,63	5	1,56	1	2	14,47
	4,65	5	1,56	1	2	14,53
	4,67	5	1,56	1	2	14,59
	4,69	5	1,56	1	2	14,66
	4,71	5	1,56	1	2	14,72
	4,73	5	1,56	1	2	14,78
	4,75	5	1,56	1	2	14,84
	4,77	5	1,56	1	2	14,91
	4,80	5	1,56	1	2	15,00
	4,82	5	1,56	1	2	15,06
	4,84	5	1,56	1	2	15,13
	4,86	5	1,56	1	2	15,19
	4,88	5	1,56	1	2	15,25
	4,90	5	1,56	1	2	15,31
	4,92	5	1,56	1	2	15,38
	4,94	5	1,56	1	2	15,44
	4,96	5	1,56	1	2	15,50
	4,98	5	1,56	1	2	15,56
	5,01	5	1,56	1	2	15,66
	5,03	5	1,56	1	2	15,72
	5,05	5	1,56	1	2	15,78
	5,07	5	1,56	1	2	15,84
	5,09	5	1,56	1	2	15,91
	5,11	5	1,56	1	2	15,97
	5,13	5	1,56	1	2	16,03
	5,15	5	1,56	1	2	16,09
	5,17	5	1,56	1	2	16,16
	5,20	5	1,56	1	2	16,25
	5,22	5	1,56	1	2	16,31
	5,24	5	1,56	1	2	16,38
	5,26	5	1,56	1	2	16,44
	5,28	5	1,56	1	2	16,50
	5,30	5	1,56	1	2	16,56
M2VASTAGO	3,7	5	1,56	34	2	392
M3VASTAGO	2,1	5	1,56	32	2	210,00
M4VASTAGO	5,5	4	0,99	102	2	1122,00
	4,80	4	0,99	1	2	9,50

	4,82	4	0,99	1	2	9,54
	4,83	4	0,99	1	2	9,56
	4,84	4	0,99	1	2	9,58
	4,85	4	0,99	1	2	9,60
	4,86	4	0,99	1	2	9,62
	4,87	4	0,99	1	2	9,64
	4,88	4	0,99	1	2	9,66
	4,89	4	0,99	1	2	9,68
	4,90	4	0,99	1	2	9,70
	4,91	4	0,99	1	2	9,72
	4,92	4	0,99	1	2	9,74
	4,93	4	0,99	1	2	9,76
	4,94	4	0,99	1	2	9,78
	4,95	4	0,99	1	2	9,80
	4,96	4	0,99	1	2	9,82
	4,97	4	0,99	1	2	9,84
	4,98	4	0,99	1	2	9,86
	5,00	4	0,99	1	2	9,90
	5,01	4	0,99	1	2	9,92
	5,02	4	0,99	1	2	9,94
	5,03	4	0,99	1	2	9,96
	5,04	4	0,99	1	2	9,98
	5,05	4	0,99	1	2	10,00
	5,06	4	0,99	1	2	10,02
	5,07	4	0,99	1	2	10,04
	5,08	4	0,99	1	2	10,06
	5,09	4	0,99	1	2	10,08
	5,11	4	0,99	1	2	10,12
M5VASTAGO	5,12	4	0,99	1	2	10,14
	5,13	4	0,99	1	2	10,16
	5,14	4	0,99	1	2	10,18
	5,15	4	0,99	1	2	10,20
	5,18	4	0,99	1	2	10,26
	5,22	4	0,99	2	2	20,67
	5,23	4	0,99	1	2	10,36
	5,24	4	0,99	1	2	10,38
	5,26	4	0,99	2	2	20,83
	5,27	4	0,99	1	2	10,43
	5,28	4	0,99	1	2	10,45
	5,29	4	0,99	1	2	10,47
	5,30	4	0,99	1	2	10,49
	5,31	4	0,99	1	2	10,51
	5,33	4	0,99	1	2	10,55
	5,34	4	0,99	1	2	10,57
	5,35	4	0,99	1	2	10,59

5,36	4	0,99	1	2	10,61
5,37	4	0,99	1	2	10,63
5,38	4	0,99	1	2	10,65
5,40	4	0,99	1	2	10,69
5,41	4	0,99	1	2	10,71
5,42	4	0,99	1	2	10,73
5,43	4	0,99	1	2	10,75
5,44	4	0,99	1	2	10,77
5,45	4	0,99	1	2	10,79
5,46	4	0,99	1	2	10,81
5,48	4	0,99	1	2	10,85
5,49	4	0,99	1	2	10,87
5,50	4	0,99	1	2	10,89
TOTAL OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA					4656,13

OBSERVACIONES:

CONSORCIO ICCU G3
HERNÁN JOANNY TORRES CASASBUENAS
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO ICCU G3
JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
WALTER CAMILO QUINTERO PRIETO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
ABEL SOLER CÁRDENAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CALCULO

MEMORIAS DE CALCULO		ACTA PARCIAL Nº	3	PERIODO DESDE	01/10/2025	HASTA	30/11/2025	
OBJETO DEL CONTRATO	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA".							
INTERVENTOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26			NIT	901920055-0	CONTRATO N°		234-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ICCU G3			NIT	901917583-7	CONTRATO N°		276-2025
CAPÍTULO 1	4,7	DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI			UNID.		KG



POSICIÓN	FIGURA
M1	0,5 — 4,8
M2	0,5 — Long. variable
M3	0,5 — 1,6
M4	5,5
M5	0,5 — Long. variable — 0,2

CONSORCIO ICCU G3
HERNÁN JOANNY TORRES CASASBUENAS
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
WALTER CAMILO QUINTERO PRIETO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO ICCU G3
JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
ABEL SOLER CÁRDENAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CALCULO

CONSORCIO ICCU G3

ICCU
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

MEMORIAS DE CALCULO		ACTA	3	PERIODO DESDE	1/10/2025	HASTA	30/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA".						
INTERVENTOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26			NIT	901920055-0	CONTRATO N°	234-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ICCU G3			NIT	901917583-7	CONTRATO N°	276-2025
CAPÍTULO 1		DESCRIPCIÓN	COMPLEMENTACION Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (IVA INCLUIDO)			UNID.	GLB

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
INFORME DE TOPOGRAFIA (181 folios)	1.00
INFORME DE PAVIMENTOS (342 folios)	1.00
INFORME DE GEOTECNIA (44 folios)	1.00

OBSERVACIONES: Se aclara que a la fecha se ha realizado la totalidad de la revisión y ajuste de los estudios y diseños que fueron entregados por la entidad contratante respecto al alcance inicial. No obstante, en la presente acta no se cobra la totalidad del monto toda vez que no se ha recibido pronunciamiento de recibido a satisfacción por parte de la entidad. La información relacionada en esta memoria corresponde a la remitida por la interventoría a la entidad a traves de comunicado con consecutivo CI26-293-25.

TOTAL VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA	$ 21,000,000.00

CONSORCIO ICCU G3
JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26
ABEL SOLER CÁRDENAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

RELACIÓN SOPORTES DE PAGO ACTA No. 3 JUNIO - NOVIEMBRE 2025									
VALOR PAGADO:		**$ 13.573.650**		**VALOR SOPORTES**		**$**			**35.100.000,00**
PROYECTOS	**ÍTEM**	**UNIDAD**	**CANTIDAD PRESENTE ACTA**	**VR PRESENTE ACTA**	**DETALLE SOPORTE**	**VALOR FACTURA O SOPORTE TOMADO**	**VALOR TOTAL FACTURA O SOPORTE**	**No. FACTURA O SOPORTE**	**OBSERVACIONES**
1.1 CONFORMACIÓN DEL GRUPO GESTIÓN AMBIENTAL	Profesional Ambiental	h/mes	5,4	$ 18.900.000,00	Planillas Seguridad Social Junio 2025 - JUAN PABLO JIMENEZ IBAÑEZ	$ 1.400.000,00	$ 4.500.000,00	88487615	Se adjunta como soporte planilla de seguridad social de los profesionales correspondientes
					Planillas Seguridad Social Julio 2025 - JUAN PABLO JIMENEZ IBAÑEZ	$ 3.500.000,00	$ 4.500.000,00	88822273	Se adjunta como soporte planilla de seguridad social de los profesionales correspondientes
					Planillas Seguridad Social Agosto 2025 - JENNIFER ASTRID CAPERA SANCHEZ	$ 3.500.000,00	$ 4.999.702,50	89469770	Se adjunta como soporte planilla de seguridad social de los profesionales correspondientes
					Planillas Seguridad Social Septiembre 2025 - JENNIFER ASTRID CAPERA SANCHEZ	$ 3.500.000,00	$ 4.999.702,50	90350141	Se adjunta como soporte planilla de seguridad social de los profesionales correspondientes
					Planillas Seguridad Social Octubre 2025 - JENNIFER ASTRID CAPERA SANCHEZ	$ 3.500.000,00	$ 4.999.702,50	90350209	Se adjunta como soporte planilla de seguridad social de los profesionales correspondientes
					Planillas Seguridad Social Noviembre 2025 - JENNIFER ASTRID CAPERA SANCHEZ	$ 3.500.000,00	$ 4.999.702,50	91990415	Se adjunta como soporte planilla de seguridad social de los profesionales correspondientes
	Profesional Social	h/mes	5,4	$ 16.200.000,00	Planillas Seguridad Social Junio - Noviembre - PAOLA YISED RUEDA SANCHEZ	$ 1.200.000,00	$ 3.558.750,00	1073681657	Se adjunta como soporte planilla de seguridad social de los profesionales correspondientes
					Planillas Seguridad Social Julio 2025 - PAOLA YISED RUEDA SANCHEZ	$ 3.000.000,00	$ 3.558.750,00	1074527914	Se adjunta como soporte planilla de seguridad social de los profesionales correspondientes
					Planillas Seguridad Social Agosto 2025 - PAOLA YISED RUEDA SANCHEZ	$ 3.000.000,00	$ 3.558.750,00	1075147262	Se adjunta como soporte planilla de seguridad social de los profesionales correspondientes
					Planillas Seguridad Social Septiembre 2025 - PAOLA YISED RUEDA SANCHEZ	$ 3.000.000,00	$ 3.558.750,00	1075922361	Se adjunta como soporte planilla de seguridad social de los profesionales correspondientes
					Planillas Seguridad Social Octubre 2025 - PAOLA YISED RUEDA SANCHEZ	$ 3.000.000,00	$ 3.558.750,00	1076578471	Se adjunta como soporte planilla de seguridad social de los profesionales correspondientes
					Planillas Seguridad Social Noviembre 2025 - PAOLA YISED RUEDA SANCHEZ	$ 3.000.000,00	$ 3.558.750,00	1077473922	Se adjunta como soporte planilla de seguridad social de los profesionales correspondientes
				$ 35.100.000,00		**$ 35.100.000,00**			

CONSORCIO ICCU G3

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ICCU — INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

FECHA	DD	30	MM	11	AA	2025	CORTE N°	3	MEMORIAS DE CALCULO

OBJETO DEL CONTRATO	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA				
INTERVENTOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26	NIT O C.C.	901920055-0	CONTRATO N°	ICCU-CTO-234-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ICCU G3	NIT O C.C.	901917583-7	CONTRATO N°	ICCU-CTO-276-2025
PROGRAMA	1 DESARROLLO Y ATENCIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL		PERIODO	01 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE	

PROYECTO	CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL	ÍTEM	1,1	PROFESIONAL AMBIENTAL	UND	H/MES	FASE	1





PROFESIONAL AMBIENTAL	Dimensiones					Total (h/mes)
	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL			CANTIDAD	
JUAN PABLO JIMENEZ IBAÑEZ	20/06/2025	31/07/2025			1,4	1,4
JENIFFER ASTRID CAPERA	01/08/2025	30/11/2025			4,0	4,0

OBSERVACIONES:

TOTAL PRESENTE PRE ACTA	5,4
Acumulado Anterior	0,0
TOTAL	5,4

JENIFFER ASTRID CAPERA
RESIDENTE AMBIENTAL
CONSORCIO ICCU G3

Ana Milena Rodríguez Arias
RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26

CONSORCIO ICCU G3

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ICCU

FECHA	DD	30	MM	11	AA	2025	CORTE N°	3	MEMORIAS DE CALCULO

OBJETO DEL CONTRATO	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA				
INTERVENTOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 26	NIT O C.C.	901920055-0	CONTRATO N°	ICCU-CTO-234-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ICCU G3	NIT O C.C.	901917583-7	CONTRATO N°	ICCU-CTO-276-2025
PROGRAMA	1 DESARROLLO Y ATENCIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL		PERIODO	01 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE	

PROYECTO	CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL	ÍTEM	1,1	PROFESIONAL SOCIAL	UND	H/MES	FASE	1



PROFESIONAL	Dimensiones				CANTIDAD	Total (h/mes)
	FECHA INICIO	FECHA FINAL				
PAOLA RUEDA	20/06/2025	30/11/2025			5,4	5,4

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1070326000	JUAN PABLO JIMENEZ IBAÑEZ	Carrera 7 N° 9-36	3042733001	ambiental.0713@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	EL COLEGIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-06	I	02/07/2025	88487615	$513.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	225.000	0		0		0	0	0	0	225.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	288.000	0	0	0	0	0	0	0	288.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	225.000	225.000
Pensión	1	288.000	288.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	513.000	513.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1070326000	JUAN PABLO JIMENEZ IBAÑEZ		Carrera 7 N° 9-36	3042733001	ambiental.0713@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	EL COLEGIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-06	I	02/07/2025	88487615	$513.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1070326000	JIMENEZ IBAÑEZ JUAN PABLO	3	0			N																	230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	225.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1070326000	JUAN PABLO JIMENEZ IBAÑEZ	Carrera 7 N° 9-36	3042733001	ambiental.0713@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	EL COLEGIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	I	06/08/2025	88822273	$513.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	225.000	0		0		0	2	300	0	225.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	288.000	0	0	0	0	2	400	0	288.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	225.000	225.300
Pensión	1	288.000	288.400
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	513.000	513.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1070326000	JUAN PABLO JIMENEZ IBAÑEZ		Carrera 7 N° 9-36	3042733001	ambiental.0713@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	EL COLEGIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	I	06/08/2025	88822273	$513.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1070326000	JIMENEZ IBAÑEZ JUAN PABLO	3	0			N																	230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	225.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

El aportante **JENNIFER ASTRID CAPERA SANCHEZ**, identificado con **CC** número **1136880609**, aportó por **JENNIFER ASTRID CAPERA SANCHEZ**, identificado(a) con **CC** número **1136880609** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **59 - Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2025-08** y salud **2025-08** de la siguiente manera:

CODIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones															0		30	$1.999.881	$0	$0	Agosto - 2025	89469770	02/09/2025	N
14-11	ARL SURA															0		30	$1.999.881	$0	$0	Agosto - 2025	89469770	02/09/2025	N
EPS008	Compensar EPS															0		30	$1.999.881	$0	$0	Agosto - 2025	89469770	02/09/2025	N

PAGADA

El presente certificado se expide a los 1 días del mes Septiembre de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1136880609	JENNIFER ASTRID CAPERA SANCHEZ	Carrera 18 # 137-58 Apto 502	3234998980	jennifer.capera@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	03/10/2025	90350141	$590.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	250.000	0		0		0	0	0	0	250.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	20.900				20.900	0	0	20.900			209	20.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	250.000
Pensión	1	320.000	320.000
Riesgos Laborales	1	20.900	20.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	590.900	590.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1136880609	JENNIFER ASTRID CAPERA SANCHEZ		Carrera 18 # 137-58 Apto 502	3234998980	jennifer.capera@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	03/10/2025	90350141	$590.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1136880609	CAPERA SANCHEZ JENNIFER ASTRID	59	0			N																	25-14	1.999.881	320.000	0	0	0	0	EPS008	1.999.881	250.000	14-11	1.999.881	2	20.900		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1136880609	JENNIFER ASTRID CAPERA SANCHEZ	Carrera 18 # 137-58 Apto 502	3234998980	jennifer.capera@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	05/11/2025	90350209	$590.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	250.000	0		0		0	0	0	0	250.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	20.900				20.900	0	0	20.900			209	20.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	250.000
Pensión	1	320.000	320.000
Riesgos Laborales	1	20.900	20.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	590.900	590.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1136880609	JENNIFER ASTRID CAPERA SANCHEZ		Carrera 18 # 137-58 Apto 502	3234998980	jennifer.capera@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	05/11/2025	90350209	$590.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1136880609	CAPERA SANCHEZ JENNIFER ASTRID	59	0			N																	25-14	1.999.881	320.000	0	0	0	0	EPS008	1.999.881	250.000	14-11	1.999.881	2	20.900		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1136880609	JENNIFER ASTRID CAPERA SANCHEZ	Carrera 18 # 137-58 Apto 502	3234998980	jennifer.capera@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	02/12/2025	91990415	$590.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	250.000	0		0		0	0	0	0	250.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	20.900				20.900	0	0	20.900			209	20.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	250.000
Pensión	1	320.000	320.000
Riesgos Laborales	1	20.900	20.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	590.900	590.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1136880609	JENNIFER ASTRID CAPERA SANCHEZ		Carrera 18 # 137-58 Apto 502	3234998980	jennifer.capera@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	02/12/2025	91990415	$590.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1136880609	CAPERA SANCHEZ JENNIFER ASTRID	59	0			N																	25-14	1.999.881	320.000	0	0	0	0	EPS008	1.999.881	250.000	14-11	1.999.881	2	20.900		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-06-30, 11:08:29 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1073681657

Periodo Cotización 202506 **Periodo Servicio** 202506

PAGADA 2025-06-30 11:07:32.0 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PAOLA YISED RUEDA SANCHEZ				
Documento	CC 1032397006	**Dirección**	CLLE 14 N 753		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3345130		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1032397006		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	03	00					RUEDA SANCHEZ PAOLA YISED	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF						**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
															0	30	30	0	0				$ 1.423.500	25-14		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS017		12,5 %	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	NIN-AR		0,000 %	$ 0	$ 0	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	NINGUNA ARP	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-07-31, 03:17:11 p. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1074527914

Periodo Cotización 202507 **Periodo Servicio** 202507

PAGADA 2025-07-31 15:16:32.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PAOLA YISED RUEDA SANCHEZ				
Documento	CC 1032397006	**Dirección**	CLLE 14 N 753		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3345130		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1032397006		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	03	00					RUEDA SANCHEZ PAOLA YISED	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF						**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
															0	30	30	0	0				$ 1.423.500	25-14		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS017		12,5 %	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	NIN-AR		0,000 %	$ 0	$ 0	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	NINGUNA ARP	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-08-26, 07:41:13 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1075147262

Periodo Cotización 202508 **Periodo Servicio** 202508

PAGADA 2025-08-26 06:54:55.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PAOLA YISED RUEDA SANCHEZ				
Documento	CC 1032397006	**Dirección**	CLLE 14 N 753		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3345130		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1032397006		**Residente**		**Exonerado**		**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	03	00				N	RUEDA SANCHEZ PAOLA YISED	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
															0	30	30	0	0			$ 1.423.500	25-14		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS017		12,5 %	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	NIN-AR		0,000 %	$ 0	$ 0	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	NINGUNA ARP	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-08-26, 06:51:29 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2025
Empresa	PAOLA YISED RUEDA SANCHEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 1032397006
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1075147262
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1726989518
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 405.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 178.000	$ 0

SubTotales:	$ 405.800	$ 0
Total a Pagar:		$ 405.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-09-25, 08:43:30 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1075922361

Periodo Cotización 202509 **Periodo Servicio** 202509

PAGADA 2025-09-25 08:38:50.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PAOLA YISED RUEDA SANCHEZ				
Documento	CC 1032397006	**Dirección**	CLLE 14 N 753		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3345130		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1032397006		**Residente**		**Exonerado**		**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	03	00				N	RUEDA SANCHEZ PAOLA YISED	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF						**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
															0	30	30	0	0				$ 1.423.500	25-14		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS017		12,5 %	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	NIN-AR		0,000 %	$ 0	$ 0	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	NINGUNA ARP	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-10-21, 11:30:56 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1076578471

Periodo Cotización 202510 **Periodo Servicio** 202510

PAGADA 2025-10-21 10:02:11.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PAOLA YISED RUEDA SANCHEZ				
Documento	CC 1032397006	**Dirección**	CLLE 14 N 753		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3345130		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1032397006		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	03	00					RUEDA SANCHEZ PAOLA YISED	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	0	0			$ 1.423.500	25-14		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS017		12,5 %	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	NIN-AR		0,000 %	$ 0	$ 0	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	NINGUNA ARP	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-11-25, 10:52:06 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1077473922

Periodo Cotización 202511 **Periodo Servicio** 202511

PAGADA 2025-11-25 08:48:07.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PAOLA YISED RUEDA SANCHEZ				
Documento	CC 1032397006	**Dirección**	CLLE 14 N 753		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3345130		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1032397006		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	03	00					RUEDA SANCHEZ PAOLA YISED	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF						**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
															0	30	30	0	0			$ 1.423.500	25-14		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS017		12,5 %	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	NIN-AR		0,000 %	$ 0	$ 0	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	NINGUNA ARP	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!
