	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión
	Vigencia a partir de **1/12/2025**	**01**

ACTA No.	**1**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	**13/12/2025 AL 13/04/2026**
OBJETO	CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN DE LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL BOYACÁ.		
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.8651877	**SUPERVISOR**	ÁNGEL LEONARDO PEDRAZA SILVA
CONTRATISTA	CONSUL CONSTRUCCIONES E&E S.A.S.	**DESIGNADO ENTE TERRITORIAL**	SENA CEDEAGRO
ITEM	**8.01** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, PARA BATERIA SANITARIA. (REF.304 SATINADO).	**UNIDAD**	**M2**


FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2026-01-26	**BAÑOS CAFETERIA 1-6 H**		1,31	1,8	1	M2	**2,36**
	BAÑOS CAFETERIA 1-6 H		0,92	1,49	1	M2	**1,37**
	BAÑOS CAFETERIA 1-6 H		0,46	1,79	1	M2	**0,82**
	BAÑOS CAFETERIA 1-6 H		1,5	1,49	1	M2	**2,24**
	BAÑOS CAFETERIA 1-6 H		0,4	1,78	1	M2	**0,71**
	BAÑOS CAFETERIA 1-6 H		0,47	1,79	1	M2	**0,84**
	BAÑOS CAFETERIA 1-6 H		0,65	1,49	1	M2	**0,97**
	BAÑOS CAFETERIA 1-6 H		0,55	1,5	3	M2	**2,48**
	BAÑOS CAFETERIA 1-6 M		0,38	1,78	4	M2	**2,71**
	BAÑOS CAFETERIA 1-6 M		0,65	1,49	4	M2	**3,87**
	BAÑOS CAFETERIA 1-6 M		1,49	1,49	3	M2	**6,66**
	BAÑOS CAFETERIA 1-6 M		0,45	1,49	1	M2	**0,67**
	BAÑOS CAFETERIA 1-6 M		1,52	1,49	1	M2	**2,26**
	BAÑOS CAFETERIA 1-6 M		0,92	1,49	1	M2	**1,37**
	BAÑOS CAFETERIA 1-6 M		0,23	1,78	1	M2	**0,41**
	BAÑOS CAFETERIA 1-6 M		0,37	1,78	1	M2	**0,66**
2026-02-19	**BAÑOS LAB ADMIN**		0,21	1,78	4	M2	**1,50**
	BAÑOS LAB ADMIN		0,65	1,49	4	M2	**3,87**
	BAÑOS LAB ADMIN		1,2	1,49	2	M2	**3,58**
	BAÑOS LAB ADMIN		0,19	1,78	1	M2	**0,34**
	BAÑOS LAB ADMIN		0,2	1,78	1	M2	**0,36**
	BAÑOS LAB ADMIN		0,85	1,5	2	M2	**2,55**
2026-02-20	**BAÑOS BIBLIOTECA M**		0,15	1,78	1	M2	**0,27**
	BAÑOS BIBLIOTECA M		0,65	1,49	3	M2	**2,91**
	BAÑOS BIBLIOTECA M		1,28	1,49	2	M2	**3,81**
	BAÑOS BIBLIOTECA M		0,29	1,78	1	M2	**0,52**
	BAÑOS BIBLIOTECA M		0,28	1,78	1	M2	**0,50**
	BAÑOS BIBLIOTECA M		0,17	1,78	1	M2	**0,30**
	BAÑOS BIBLIOTECA H		0,16	1,78	1	M2	**0,28**
	BAÑOS BIBLIOTECA H		0,65	1,49	3	M2	**2,91**
	BAÑOS BIBLIOTECA H		1,28	1,49	2	M2	**3,81**
	BAÑOS BIBLIOTECA H		0,28	1,78	2	M2	**1,00**
	BAÑOS BIBLIOTECA H		0,16	1,78	1	M2	**0,28**
	BAÑOS BIBLIOTECA H		0,55	1,5	2	M2	**1,65**
2026-02-21	**BAÑOS GYM M**		0,16	1,78	2	M2	**0,57**
	BAÑOS GYM M		0,65	1,49	1	M2	**0,97**
	BAÑOS GYM M		0,21	1,78	3	M2	**1,12**
	BAÑOS GYM M		1,28	1,49	1	M2	**1,91**
	BAÑOS GYM M		1	1,49	1	M2	**1,49**
	BAÑOS GYM M		0,26	1,78	1	M2	**0,46**
	BAÑOS GYM M		1,49	1,49	1	M2	**2,22**
	BAÑOS GYM M		0,88	1,49	2	M2	**2,62**
	BAÑOS GYM M		0,91	1,49	2	M2	**2,71**

FOTOGRAFIA








	BAÑOS GYM H		0,15	1,78	2	M2	**0,53**
	BAÑOS GYM H		0,65	1,48	1	M2	**0,96**
	BAÑOS GYM H		0,23	1,78	1	M2	**0,41**
	BAÑOS GYM H		1,41	1,49	1	M2	**2,10**
	BAÑOS GYM H		1	1,49	1	M2	**1,49**
	BAÑOS GYM H		0,22	1,78	1	M2	**0,39**
	BAÑOS GYM H		1,49	1,49	1	M2	**2,22**
	BAÑOS GYM H		0,31	1,78	1	M2	**0,55**
	BAÑOS GYM H		0,55	1,5	2	M2	**1,65**
	BAÑOS GYM H		0,85	1,49	1	M2	**1,27**
	BAÑOS GYM H		0,87	1,49	1	M2	**1,30**
2026-02-22	**BAÑOS INVERNADERO**		0,55	1,5	1	M2	**0,83**
	BAÑOS INVERNADERO		0,97	1,78	1	M2	**1,73**
	BAÑOS INVERNADERO		0,65	1,49	2	M2	**1,94**
	BAÑOS INVERNADERO		0,21	1,78	1	M2	**0,37**
	BAÑOS INVERNADERO		1	1,78	1	M2	**1,78**
	BAÑOS INVERNADERO		1,49	1,49	1	M2	**2,22**
	BAÑOS INVERNADERO		0,23	1,78	1	M2	**0,41**
	BAÑOS INVERNADERO		0,92	1,49	1	M2	**1,37**
	BAÑOS INVERNADERO		0,26	1,79	1	M2	**0,47**
	BAÑOS INVERNADERO		1,5	1,49	1	M2	**2,24**
	BAÑOS INVERNADERO		0,35	1,79	1	M2	**0,63**
	BAÑOS INVERNADERO		0,8	1,5	1	M2	**1,20**
2026-02-23	**BAÑOS ANTUMARAL M**		0,31	1,79	2	M2	**1,11**
	BAÑOS ANTUMARAL M		0,65	1,49	2	M2	**1,94**
	BAÑOS ANTUMARAL M		1,61	1,49	1	M2	**2,40**
	BAÑOS ANTUMARAL M		0,33	1,79	1	M2	**0,59**
	BAÑOS ANTUMARAL H		0,34	1,79	2	M2	**1,22**
	BAÑOS ANTUMARAL H		0,65	1,49	2	M2	**1,94**
	BAÑOS ANTUMARAL H		1,61	1,49	1	M2	**2,40**
	BAÑOS ANTUMARAL H		0,35	1,79	1	M2	**0,63**
	BAÑOS ANTUMARAL H		0,55	1,5	2	M2	**1,65**
					TOTAL	**UND**	**116,81**












WC Biblioteca

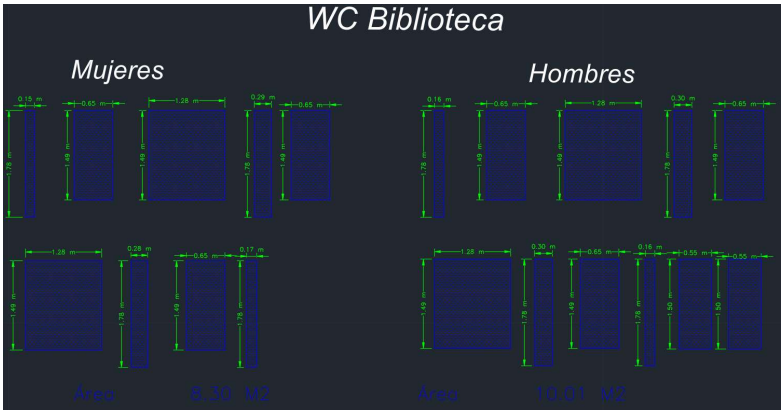

WC Gimnasio

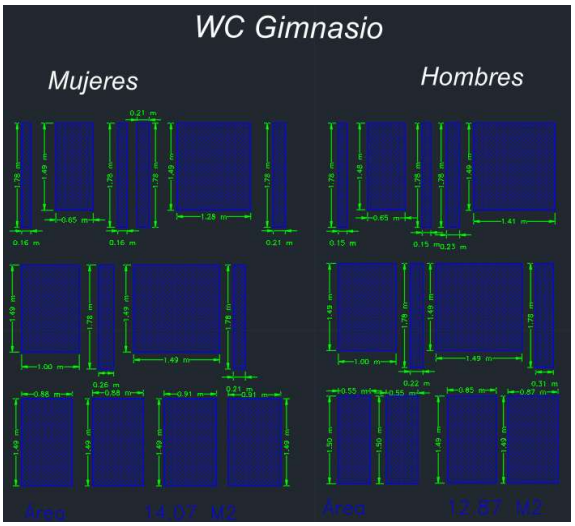


WC Antumaral

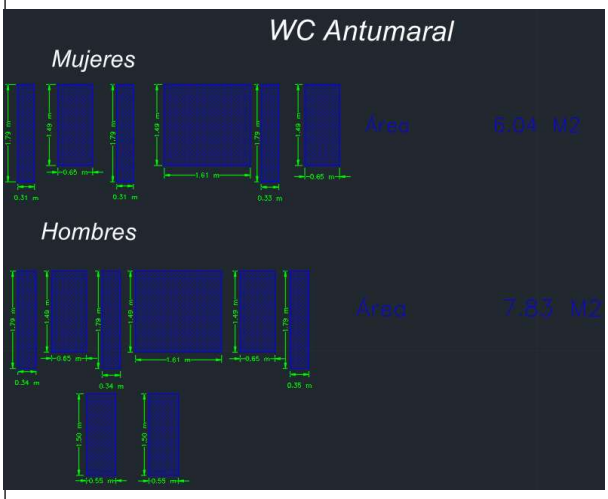

WC Invernadero



WC Lab. Administrativo

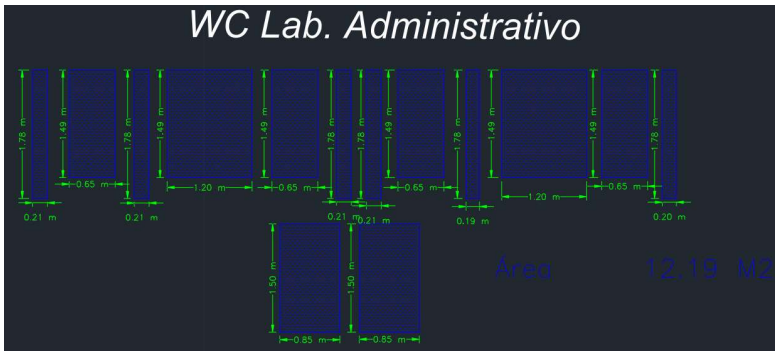

WC Ambientes 1-6

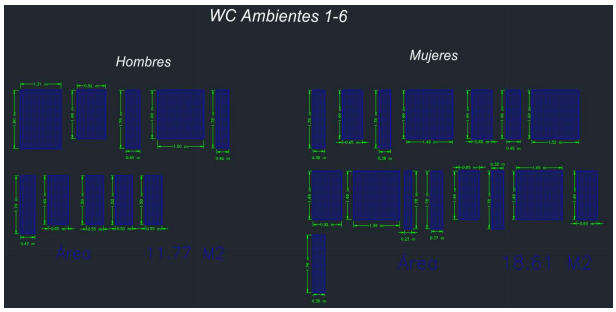


DIAGRAMA-PLANO-ESQUEMA

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Vo.Bo
APOYO A LA SUPERVISIÓN:

Firma:

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión
	Vigencia a partir de **1/12/2025**	**01**


ACTA No.	**1**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	**13/12/2025 AL 13/04/2026**
OBJETO	CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN DE LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL BOYACÁ.		
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.8651877	**SUPERVISOR**	ÁNGEL LEONARDO PEDRAZA SILVA
CONTRATISTA	CONSUL CONSTRUCCIONES E&E S.A.S.	**DESIGNADO ENTE TERRITORIAL**	SENA CEDEAGRO
ITEM	**8.03** MANTENIMIENTO Y PINTURA PUERTAS Y MARCOS, INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS.	**UNIDAD**	**M2**


FECHA aaaa-mm-dd	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto			
2025-12-22	BAÑOS GYM (PUERTAS)		1,1	2,2	4	M2	**9,68**
2025-12-29	BAÑOS ANTUMARAL (PUERTAS)		1,1	2	4	M2	**8,80**
2026-01-05	BAÑOS GYM (MARCOS)		0,04	2,54	8	M2	**0,81**
	BAÑOS GYM (MARCOS)		0,04	4,52	2	M2	**0,36**
2026-01-06	BAÑOS ANTUMARAL(MARCOS)		0,04	5,6	1	M2	**0,22**
					TOTAL	**M2**	**19,88**

FOTOGRAFIA





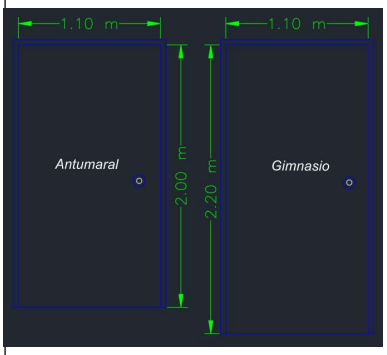

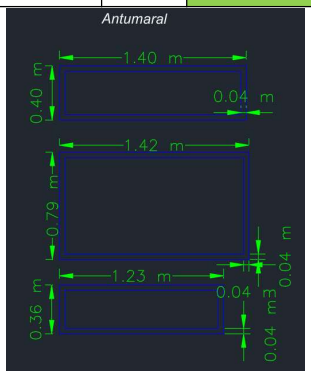

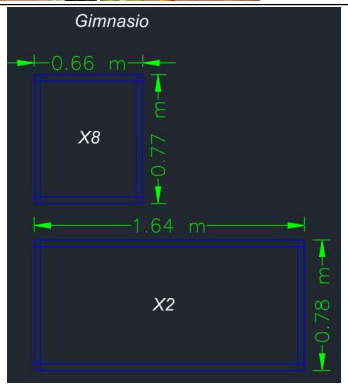


DIAGRAMA-PLANO-ESQUEMA

Elaboró
EL CONTRATISTA:
Firma:

Vo.Bo
APOYO A LA SUPERVISIÓN:
Firma:
